

**Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2026-4886-M**

**Puyo, 02 de junio de 2026**

**PARA:** Sr. Mgs. Luis Salvador Lascano Andrade  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Informe de cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado  
Mes de mayo 2026.

Estimado Director, de acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Art. 92.- Recomendaciones de auditoría. - *"Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento e inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado"*. Tomando en cuenta las recomendaciones de las siguientes auditorías: Examen especial a las garantías en valores, bienes, y documentos, por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2010 y al 30 de diciembre de **2013 DR3-DPP-AI-0004-2014 N.-001**, "Examen especial a los procesos de entrega y liquidación de anticipos a servidores públicos; pago de viáticos, subsistencias, movilización y transporte, por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2013 y el 30 de junio de 2017 **DR3-DPP-PPz-AI-0001-2018, N.- 001**"; "Examen especial a los procesos de reclutamiento y selección de personal; gastos en personal (corriente e inversión); y, procesos precontractuales, contractuales y ejecución para la adquisición de bienes y servicios del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, por el periodo comprendido entre el 01 de abril del 2013 y el 31 de agosto del 2016 examen especial **005-2017, N° 5,6,8,9,18,19 y 20**; "Examen Especial a los anticipos de fondos a rendir cuentas, transferencias y donaciones recibidas y entregadas; y a los procesos de contratación, entrega recepción y pagos, por la adquisición de bienes, servicios dispositivos e insumos médicos, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19, por el periodo comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 16 de junio de 2020"; **DPP-0010-2021 N° 5, 6 y 31** y "Cumplimiento de Recomendación del informe de auditoría **No. DPP-0004-2023**" N° 1 emitidas por la Contraloría General del Estado se cumple con las recomendaciones y se detalla según la matriz de cumplimiento adjunta y anexos, correspondiente al mes de mayo 2026.

Se adjunta los justificativos de cumplimiento de cada uno de los servidores que laboran en el área financiera, las mismas que dentro de sus funciones que les ha sido asignada.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes  
**DIRECTORA FINANCIERA (E)**



**Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2026-4886-M**

**Puyo, 02 de junio de 2026**

**Anexos:**

- nexo\_de\_cumplimiento\_a\_la\_recomendacion\_n\_-\_5-6-8\_-9\_examen\_especial\_005-20170379251001780420873.pdf
- anexo\_de\_cumplimiento\_a\_la\_recomendacion\_n.-\_18-19\_examen\_especial\_005\_-2017\_compressed.pdf
- anexo\_de\_cumplimiento\_de\_la\_recomendacion\_dpp-0010-2021\_n°\_31\_compressed\_(1)0676393001780420879.pdf
- nexo\_de\_cumplimiento\_de\_la\_recomendacion\_n,\_\_05\_y\_06\_examen\_especial\_010-20210505522001780420881.pdf
- anexo\_de\_la\_recomendaciones\_de\_contraloría\_informe\_de\_auditoria\_004-20230740636001780420882.pdf
- anexo\_de\_recomendaciones\_de\_contraloría\_examen\_especial\_0004-20140814313001780420883.pdf
- cumplimiento\_de\_recomendaciones\_de\_contraloría\_examen\_especial\_0001-20180710227001780420884.pdf
- cumplimiento\_de\_recomendaciones\_de\_contraloría\_examen\_especial\_0004-20140100989001780420885.pdf
- cumplimiento\_de\_recomendaciones\_de\_contraloría\_examen\_especial\_005-20170871520001780420885.pdf
- cumplimiento\_de\_recomendaciones\_de\_contraloría\_examen\_especial\_010-20210313633001780420886.pdf
- cumplimiento\_de\_recomendaciones\_de\_contraloría\_informe\_de\_auditoria\_004-20230452039001780420921.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Ing. Mayra Patricia Aguaguña Malusin - Contador 1



Validar únicamente en FirmaEC.  
Firmado electrónicamente por:  
**LIVIA MARILU  
ORDONEZ PAREDES**

**CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIONES DE CONTRALORÍA CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA**

DIRIGIDA A:	REFERENTE:	RECOMENDACIÓN N.-5	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
CONTADOR GENERAL 1		Realizará el control previo de las operaciones financieras vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias respecto a las horas suplementarias y extraordinarias, al efectuar el registro contable de los roles de pago en el sistema para garantizar la confiabilidad e integridad de la información financiera.	X		La Dirección de Talento Humano, dispone la presentación de requisitos básicos de control previo al pago de horas suplementarias y extraordinarias, en base a estos parámetros el Departamento de Contabilidad procede con la verificación de los documentos, el registro en el sistema contable el cual está parametrizado para realizar el respectivo cálculo y se seguidamente el registro contable en los roles de pago para conocimiento del funcionario.
Tesorero General 1		<b>RECOMENDACIÓN N.-6</b> Previo al pago de la nómina en el Sistema de Pagos Interbancarios del Banco Central del Ecuador por concepto de horas suplementarias y extraordinarias de los servidores y trabajadores del GADPZ, verificar la legalidad, veracidad, propiedad y conformidad de los documentos de respaldo.	X		Revisión de los roles de pagos en el sistema Yupak de los trabajadores y empleados de la Institución.
CONTADOR GENERAL 1		<b>RECOMENDACIÓN N.-8</b> Realizará el control previo de las operaciones administrativas y financieras al efectuar el registro contable del extra rol en el sistema, a fin de garantizar la confiabilidad e integridad de la información financiera y vigilará el cumplimiento de la Sentencia emitida por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y el artículo 27 del Décimo Sexto Contrato Colectivo.	X		Una vez socializada la presente recomendación: "Según el Art. 27 del Décimo Sexto Contrato Colectivo, obedece al criterio jurídico emitido por el señor Procurador Síndico con soporte en las providencias judiciales emitidas por la señora Jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Pastaza, dentro del Proceso Constitucional N.-16201-2015-0012 de fecha 23 de febrero del 2022, a las 12h07, y la providencia ratificatoria, en la que resolvió el recurso de aclaración y ampliación de fecha 22 de marzo del 2022 a las 17h01", los compañeros que conforman el equipo de trabajo del departamento de Contabilidad, aplicaron los debidos procesos de control para registrar contablemente las transacciones necesarias, de esa manera reflejara una información fluida para que los funcionarios accedan a la información requerida.
Tesorero General 1		<b>RECOMENDACIÓN N.-9</b> Previo al pago de las diferencias salariales constantes en el Extra Rol, verificará la legalidad, veracidad, propiedad y conformidad de los documentos de respaldo; y, realizará el registro de la erogaciones de recursos económicos en el Sistema de Pagos Interbancarios del Banco Central del Ecuador, verificando que estos cálculos, guarden conformidad con el artículo 2 del Décimo Sexto Contrato Colectivo y a la Sentencia emitida por el Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje.	X		En aplicación a la recomendación, se implementó una hoja cheklist con el objetivo de verificar los documentos contractuales, que nos permite un control previo de los contratos, la cual contiene lo siguiente: 1.- Requerimiento 2.- Estudios del Proyecto 3.- Informe técnico y económico 4.- Factibilidad Ambiental 5.- Certificación POA 6.- Certificación Presupuestaria 7.- Convenio 8.- Publicación herramienta de ínfima cuantía 9.- Proformas 10.- Acta de cierre de recepción de proformas 11.- Cuadro comparativo de evaluación de proformas 12.- Pliegos del procedimiento 13.- Informe Técnico de evaluación de ofertas 14.- Resolución de adjudicación 15.- Garantía Original de fiel cumplimiento del contrato 16.- Garantía Original de buen uso del anticipo 17.- Certificación de no adeudar al GADPZ 18.- Documentos personales /Representante legal 19.- Certificación Bancaria 20.- Certificado de cumplimiento tributario (SRI) 21.- RUC actualizado 22.- Contrato original y disposición escrita de trabajo (proceso completo) 23.- Planilla de Reajuste de precios del anticipo 24.- Orden de Inicio de trabajo
	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL; GASTOS EN PERSONAL (CORRIENTE E INVERSIÓN); Y PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ABRIL DEL 2013 Y EL 31 DE AGOSTO DEL 2016.		X		
DIRECTORES DEPARTAMENTALES		Vigilará y velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de los contratos y adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá multas y sanciones a que hubiere lugar por su incumplimiento; además, realizará el seguimiento periódico a los servicios contratados, de existir novedades informará a la máxima autoridad para la toma de acciones correctivas.			


DIRECTORES DEPARTAMENTALES			<p>25.- Planilla de obra con Informe de Fiscalización (Fiscalizador Externo)</p> <p>26.- Anexos de Obra</p> <p>27.- Cuadro de Diferencia de Cantidades</p> <p>28.- Conformidad Ambiental</p> <p>29.- Informe de Avance de Obra del Administrador de Contrato</p> <p>30.- Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales (FESS) planilla</p> <p>31.- Certificado de no ser obra nueva</p> <p>32.- Multa</p> <p>33.- Autorización de la máxima autoridad para prórroga de plazos</p> <p>34.- Autorización de la máxima autoridad para rubros nuevos</p> <p>35.- Solicitud de recepción de Obra</p> <p>36.- Solicitud de pago del Administrador del Contrato</p> <p>37.- Solicitud de pago del Director de la Unidad al Financiero</p> <p>38.- Factura/Nota de Venta</p> <p>39.- Validación de la Factura/Nota de Venta</p>
DIRECTORES DEPARTAMENTALES	<p><b>RECOMENDACIÓN N.-19</b></p> <p>Disponerá y vigilará que los administradores de contrato y los responsables de la recepción de los productos de las Consultorías contratadas por la entidad, que previo a la suscripción del acta de entrega recepción respectiva, verifiquen el cumplimiento del objeto contractual en concordancia con los pliegos del proceso de contratación.</p>	<p style="text-align: center;">x</p>	<p>Se implementó una hoja check list para verificar el cumplimiento de la fase contractual y verificar el informe a satisfacción del Administrador de Contrato; se revisa que en el informe consten los productos según el contrato y pliegos; la hoja de control previo contiene lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Factura/Nota de venta</li> <li>2.- Informe de Productos realizados</li> <li>3.- Informe de Actividades</li> <li>4.- Certificación Presupuestaria</li> <li>5.- Términos de Referencia</li> <li>6.- Poliza de Buen Uso del Anticipo</li> <li>7.- Autorización de Contratación por la Máxima Autoridad</li> <li>8.- Certificación POA</li> <li>9.- Certificación PAC</li> <li>10.- Certificación de que no existe en el Catálogo Electrónico</li> <li>11.- Control Previo Fase Preparatoria de los procesos de adquisición y/o</li> <li>12.- Acta Entrega-Recepción del Administrador del Proceso</li> <li>13.- Recibi conforme el servicio</li> <li>14.- Documentos Personales/Representante Legal</li> <li>15.- CD Respaldo Información</li> <li>16.- Validación de la Factura/Nota de Venta</li> <li>17.- Solicitud de Pago</li> <li>18.- Existencia Convenio/Contrato/Ordenanza</li> </ol>
DIRECTORES DEPARTAMENTALES	<p><b>RECOMENDACIÓN N.-20</b></p> <p>En caso de cesación de funciones de los administradores de contrato designará a otros servidores que cumplan con esta función, a fin de dar seguimiento y velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de los contratos.</p>	<p style="text-align: center;">x</p>	<p>Al personal que labora en el departamento financiero no se les ha asignado como administradores de contratos</p>



Lcda. Mariú Ordoñez  
Directora Financiera (E)



Ing. Maritza Flores  
Tesorero (E)



Ing. Jessie Rivadeneira  
Jefe de Contabilidad (S)

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**  
**COMPROBANTE DE PAGO N° 808**

Fecha: 13/05/2026

Asiento N° 2085

Compromiso N° 683

1BCE PRINCIPAL Cta Cte No 01210014

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **CAYAMBE GUILCAPI CLAUDIO FERMIN** **USD 49,636.80**

LA SUMA DE: **CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS Dolares 80/100 CtvS**

PUYO, 13 de Mayo del 2026

**DETALLE DEL COMPROBANTE:**

**CAYAMBE GUILCAPI CLAUDIO FERMIN.-PAGO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN SEGÚN CONTRATO SUSCRITO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTON MERA, PROVINCIA DE PASTAZA. REF. ASIEN TO DIARIO N° 2034 DE FECHA 12/05/2026**

Usuario: ERIKA

**DOCUMENTOS BANCARIOS**

No	Beneficiario	Valor
CTA 1072010991	CAYAMBE GUILCAPI CLAUDIO FERMIN	49,636.80


TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD 49,636.80

**APLICACION CONTABLE**

Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	49,636.80	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014		49,636.80
SUMAN o PASAN USD		49,636.80	49,636.80

**APLICACION PRESUPUESTARIA**

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.505.750105.000.16.01.50.000.0000.0000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIA:			49,636.80
TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	49,636.80

  
 MGS. MARCELO JÁCOME  
 Asesor 1

  
 LCDA. MARILÚ ORDÓÑEZ  
 Directora Financiera E.

  
 ING. JESSIE RIVADENEIRA  
 Jefa De Contabilidad S.

  
 ING. MARITZA FLORES  
 Tesorera E.

13/05/2026 15:37

Página 1/1

923 279  
 14/05/2026



GOBIERNO DE  
**PASTAZA**  
*El Gobierno del Azuero*

**Orden de Pago Nro. GADPPZ-ASESORIA-2026-0120-GOP**

**Puyo, 13 de mayo de 2026**

**PARA:** Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes  
**Directora Financiera (E)**

**ASUNTO:** Orden de pago a favor de CAYAMBE GUILCAPI CLAUDIO FERMIN

De mi consideración:

Solicitud orden de pago Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2026-5520-SOLOP, de acuerdo a la sumilla inserta del señor Prefecto y en uso de las atribuciones conferidas de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nro. GADPPZ-GADPPZ-2026-0803-R, considerando que la Dirección Financiera ha realizado el **control previo** del trámite del proceso de "PAGO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN SEGÚN CONTRATO SUSCRITO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTON MERA, PROVINCIA DE PASTAZA", en concordancia a las disposiciones legales, me permito autorizar se proceda con el pago a favor de CAYAMBE GUILCAPI CLAUDIO FERMÍN, por el valor de \$ 49.636,80 (Cuarenta y nueve mil seiscientos treinta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América con 80/100 centavos).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. Marcelo Sebastian Jácome Perez  
**ASESOR 1**

Referencias:

- GADPPZ-FINANCIERO-2026-5520-SOLOP

Anexos:

- check\_list\_de\_la\_planilla\_de\_liquidacio\_\_de\_las\_varias\_via\_shell\_ing.\_cayambe-signed.pdf
- memorando\_nro.\_gadppz-estudios-proyectos-2026-12163-m.pdf
- 05\_recepción\_de\_obra.rar
- 07\_cronograma\_de\_trabajos\_valorados\_aprobado.rar
- mco\_contrato\_varias\_vias\_parroquia\_shell-signed-signed-signed-signed0658654001774039592.pdf
- 14\_informe\_de\_conformidad\_ambiental.rar
- 11\_certificado\_cumplimiento\_tributario\_e\_iess.rar
- 12\_constatacion\_de\_personal\_obrero\_y\_tecnico.rar
- 13\_polizas0922616001774039549.rar
- 06\_sabana\_de\_diferencia\_de\_cantidades\_de\_obra.rar
- 08\_ampliación\_de\_plazo.rar
- 09\_libro\_de\_obra.rar
- 10\_anexo\_fotografico\_por\_cada\_rubro.rar
- 01\_solicitud\_de\_pago0424202001774039499.rar
- 02\_sabana\_planilla\_de\_liquidación.rar
- 03\_calculo\_de\_volumenes\_y\_anexos\_graficos\_por\_cada\_rubro0215487001774039501.rar



GOBIERNO DE  
**PASTAZA**  
*El Gobierno del Animo*

**Orden de Pago Nro. GADPPZ-ASESORIA-2026-0120-GOP**

**Puyo, 13 de mayo de 2026**

- 04\_informe\_de\_fiscalizacion0970050001774039502.rar
- check\_list\_trámites\_de\_pago-signed0876884001774995332.pdf
- informe\_administrador\_planilla\_liquidación-signed0428158001774995333.pdf
- 37624-e.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Ing. Carla Del Rocio Diaz Pacushca - Analista de Compras Públicas 1



**CERTIFICADO QUE ACREDITA QUE EL CONTRATISTA NO MANTIENE OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO DERIVADAS DE RESPONSABILIDADES EN FIRME Y QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESOS COACTIVOS, DETERMINADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO**

**Fecha:** 13-05-2026  
**Entidad Requirente:** GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA  
**Ruc Requirente:** 1660000170001  
**Servidor solicitante:** ORDOÑEZ PAREDES LIVIA MARILU

De acuerdo con la información verificada en el aplicativo cgeConsultaCompensacion el cual está integrado con los sistemas existentes en la Contraloría General del Estado como bases de datos y otros sistemas administrativos que gestionan la información de los administrados y las obligaciones pendientes, se certifica que el/la contratista **CAYAMBE GUILCAPI CLAUDIO FERMIN** con **Ruc N.º 1600462723001**, a la fecha **NO** mantiene obligaciones en firme que se encuentre en procesos coactivos.

La información contenida en el presente certificado tiene carácter confidencial y su uso está destinado exclusivamente para fines institucionales de la entidad contratante.

El presente certificado tendrá una validez de (2) dos días término.



**DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN Y COACTIVAS**

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA****COMPROBANTE DE DIARIO N° 949**

Fecha: 12/05/2026

Asiento N° 2034

Compromiso N° 683

Retención N° 001-010-000025360

## DETALLE DEL COMPROBANTE:

CAYAMBE GUILCAPI CLAUDIO FERMIN.-CONTABILIZACIÓN DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN SEGÚN CONTRATO SUSCRITO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTON MERA, PROVINCIA DE PASTAZA

Usuario: ERIKA

DOCUMENTOS			
Fecha	Documento	No Autorización	Valor
07/05/2026	FACTURA	00110000000008992316148613	64,192.34

APLICACION CONTABLE			
Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IVA	8,372.91	
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	55,819.43	
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS		54,703.04
2.1.3.75.01.021	2% IMPUESTO A LA RENTA		1,116.39
2.1.3.81.14.001	CXP IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI		8,372.91
SUMAN o PASAN USD		64,192.34	64,192.34

APLICACION PRESUPUESTARIA			
Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.505.750105.000.16.01.50.000.0000.0000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE		55,819.43	
TOTAL GASTOS USD	0.00	55,819.43	0.00

  
Ing. Jessie Rivadeneira  
Jefa De Contabilidad S.

  
Ing. Erika Inmunda  
Contador 1

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**COMPROBANTE DE DIARIO N° 950**

Fecha: 12/05/2026

Asiento N° 2035

Compromiso N° 683

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CAYAMBE GUILCAPI CLAUDIO FERMIN.-COBRO DEL ANTICIPO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN SEGÚN CONTRATO SUSCRITO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTON MERA, PROVINCIA DE PASTAZA

Usuario: ERIKA

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS AI	5,066.24	
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	5,066.24	
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES		5,066.24
1.2.4.97.08.001	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR EJERCICIOS ANTER. DE GAD'S Y EMPR. F		5,066.24
SUMAN o PASAN USD		10,132.48	10,132.48

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.505.750105.000.16.01.50.000.0000.0000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIA			5,066.24
TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	5,066.24
01.01.A100.114.380108.000.000.0000.0918 DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE E.		5,066.24	5,066.24
TOTAL INGRESOS USD		5,066.24	5,066.24

Ing. Jessie Riyadeneira  
Jefa De Contabilidad S.

Ing. Erika Inmunda  
Contador 1

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**  
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

**Compromiso No: 683**

Transacción No: 4310

Fecha: 07/05/2026

Proveedor: CAYAMBE GUILCAPI CLAUDIO FERMIN

Identificación: Ruc 1600462723001

Programa: 05 FUNCION SERVICIO CONECTIVIDAD VIALIDAD Y ENERGIA

SubPrograma: 01 MOVILIDAD CONECTIVIDAD Y ENERGIA

Proyecto: D505 CONSTRUCCION VIAL RURAL PROVINCIAL

Actividad: 505 CONSTRUCCION VIAS ASFALTADAS

**DOCUMENTOS DE REFERENCIA**

Documento	No	Fecha	Valor
MEMORANDO 10421-M		15/05/2026	55,819.43

**DETALLE:**

CAYAMBE GUILCAPI CLAUDIO FERMIN.- CONSTRUCCIÓN DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTON MERA, PROVINCIA DE PASTAZA

MARCELO

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
05.01.D505.505.750105.000.16.01.50.000.0000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPOR	55,819.43	2,573,814.41
Total =>	55,819.43	2,573,814.41



Validez únicamente en firmas:  
Firmado electrónicamente por:  
**JORGE MARCELO CUEVA**  
**ROMERO**

Lic. Marcelo Cueva  
Contador 1



# ESTADO DE TRANSFERENCIA

Producto: SISTEMA SERVICIO DE PAGOS

Fecha Inicio: 14/05/2026

Identificación Beneficiario: 1600462723

Fecha Fin: 14/05/2026

Cuenta Ordenante: 1210014

# Ref. BCE	# Cuenta Ordenante	Institución Ordenante	Institución Financiera	# Cuenta Beneficiario	Monto	Identificador del Beneficiario	Nombre del Beneficiario	Tipo de Cuenta del Beneficiario	Fecha del Proceso de la EFI	Estado	Observación	
22306227	1210014	GAD PROV PASTAZA	B. DEL PACIFICO	1072010961	49.636.80	1600462723	CAYAMBE GUILCAPI CLAUDIO FERMI	02	14.05.2026 15:20:57	AFECTADA	OPI ACREDITADA	
Monto Total:											Total Número de Registros:	
											49.636.80	1



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
**PROVINCIAL DE PASTAZA**

Dirección: Francisco de Orellana y 27 de Febrero

Teléfono: 032885380 / Fax: 032886179

E-mail: financiero@pastaza.gob.ec

Web: www.pastaza.gob.ec

Contribuyente Especial: 590

RUC: 1660000170001

COMPROBANTE DE RETENCION

Nº 001-010-000025360

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1205202607166000017000120010100000253601438917213

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

12/05/2026 18:54:19

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1205202607166000017000120010100000253601438917213

Razon Social / Nombres y Apellidos: CAYAMBE GUILCAPI CLAUDIO FERMIN

RUC/CI: 1600462723001

Fecha Emisión: 12 de Mayo del 2026

Guía de Remisión:

Número de Documento	Cód. SRI	Descrip. Reten.	% Reten.	Base Retención	Valor Retenido
001-100-000000089	731	100% SRI RESOLUCION 074 075	100.00	8,372.91	8,372.91
001-100-000000089	343B	2% IMPUESTO A LA RENTA	2.00	55,819.43	1,116.39
				Total	9,489.30


Información Adicional:

Dirección:

Teléfono:

## CONTROL PREVIO

"Construcción de Afirmado de varias vías ubicadas en la parroquia Shell, cantón Mera, provincia de Pastaza"		FINANCIERO			
NOMBRE	Ing. Claudio Fermín Cayambe Guilcapi	TIPO DE PROCESO		TIPO DE PROCESO	
DOCUMENTO:	Planilla de liquidación	PLANILLA	CONTRATO	PLANILLA	X
CONCEPTO:	PAGO				
FECHA DEL DOCUMENTO	11 de mayo de 2026				
TIPO DE PROCESO	Licitación				
VALOR SIN IVA:	\$58366.17	APLICA		APLICA	
CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS		SI	NO	SI	NO
1	Requerimiento				
2	Estudios del proyecto				
3	Informe técnico y económico				
4	Factibilidad Ambiental				
5	Certificación POA				
6	Certificación Presupuestaria				
7	Convenio				
8	Pliegos del Procedimiento				
9	Informe Técnico de Evaluación de Ofertas				
10	Resolución de Adjudicación				
11	Garantía Original de fiel Cumplimiento del contrato				
12	Garantía Original de Buen Uso del Anticipo				
13	Certificado de no Adeudar al GADPPz				
14	Documentos Personales / Representante Legal				
15	Certificación Bancaria				
16	Certificado de cumplimiento Tributario (SRI)				
17	RUC Actualizado				
18	Contrato original y disposición escrita de trabajo (proceso completo)	X			
19	Contrato original (COMPLEMENTARIO)				
20	Planilla de Reajuste de Precios			X	
21	Reinicio de obra				
22	Orden de Inicio de Trabajos				
23	Planilla de obra con informe de Fiscalización (Fiscalizador Externo)	X		X	
24	Informes y Planilla de Orden de Trabajo				
25	Informes y Planilla de Excedentes				
26	Anexos de Obra	X		X	
27	Cuadro de Diferencia de Cantidades				
28	Conformidad Ambiental	X		X	
29	Informe de avance de Obra de Administrador de contrato	X		X	
30	Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales (IESS) Planilla	X		X	
31	Certificado de no ser obra nueva				
32	Multa				
33	Autorización de la máxima Autoridad para prórroga de Plazos				
34	Autorización de la máxima Autoridad para Rubros Nuevos				
35	Ampliación de plazo				
36	Certificado que no es obra nueva				
37	Solicitud de recepción de Obra				
38	Solicitud de pago del Administrador del Contrato	X		X	
39	Solicitud de pago del director (a) de la Unidad al Financiero	X		X	
40	Factura/Nota de Venta			X	
41	Validación de la factura/Nota de Venta	X		X	
42	Certificado de Obligaciones Pendientes de Pago e Responsabilidades Controlaría General del Estado. (Planilla de Liquidación)			X	



Validado electrónicamente en FirmadOT  
 Firmado electrónicamente por:  
**MERCY JOHANNA**  
**QUISHPI CUENCA**

DEPARTAMENTO FINANCIERO

R.U.C.: 1600462723001

FACTURA

No. 001-100-000000089

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202601160046272300120011000000000892316148613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2026 13:35:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202601160046272300120011000000000892316148613

CAYAMBE GUILCAPI CLAUDIO FERMIN

CFCG INGENIERIA Y CONSTRUCCION

Dirección Barrio: SAN ANTONIO Calle: LUIS CARRION Numero:  
Matriz: SN Interseccion: BOBONAZA

Dirección Barrio: SAN ANTONIO Calle: LUIS CARRION Numero:  
Sucursal: SN Interseccion: BOBONAZA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Identificación 1660000170001

Fecha 07/05/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Francisco de Orellana y 27 de Febrero, Puyo, Pastaza

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PLA001		1.00	PLANILLA NRO 4 DE LIQUIDACION DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE AFIRMADO DE VARIAS VÍAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA".		50462.65	0.00	0.00	0.00	50462.65
RPPL004		1.00	REAJUSTE PROVISIONAL DE PLANILLA NRO 4 DE LIQUIDACION		5356.78	0.00	0.00	0.00	5356.78

Información Adicional	
Telefono:	032792130
Email:	financiero@pastaza.gob.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	64192.34

SUBTOTAL 15%	55819.43
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	55819.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	8372.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	64192.34

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2026-10421-M**

**Puyo, 15 de abril de 2026**

**PARA:** Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes  
**Directora Financiera (E)**

**ASUNTO:** Trámite de pago: Planilla de liquidación proceso MCO-GADPPz-098-2022  
"Construcción de Afirmado de varias vías ubicadas en la parroquia Shell, cantón Mera, provincia de Pastaza"

En atención a los siguientes documentos:

- Oficio nro. CC-028-2025, de fecha 26 de diciembre de 2025, suscrito por el Ing. Claudio Cayambe, contratista;
- Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2026-10315-M, de fecha 20 de marzo de 2026, suscrito por el Ing. Rodrigo Pico, Fiscalizador; y,
- Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2026-12163-M, de fecha 31 de marzo de 2026, suscrito por el Ing. Jairo Narváez, Jefe de Estudios y Proyectos, quien actúa como Administrador de Contrato.

Me permito señalar lo siguiente:

Con base en las disposiciones contenidas en las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado, se destaca lo siguiente:

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado 408-17 Administrador del contrato, que indica: *"El administrador del contrato velará porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegación y supervisión de esas tareas, la comunicación constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicación de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de sí para lograr el éxito del proyecto.- Es función del administrador del contrato establecer un sistema que evalúe el logro de los objetivos, mediante el cual pueda obtenerse información sobre su estado. Esto con el fin de tomar oportunamente acciones correctivas o para informar a las autoridades de la entidad sobre el desarrollo del proyecto"*

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado **408-18** Jefe de Fiscalización, indica: *"El Jefe de Fiscalización establecerá un sistema para asegurar la correcta ejecución de la obra, mediante el control de la calidad, el avance físico y el avance financiero de la obra. Dichos controles conllevan una evaluación mensual, de los aspectos mencionados y la comunicación de resultados a los mandos superiores, incluyendo los problemas surgidos, especialmente cuando afectan las condiciones pactadas en relación al plazo, presupuesto y calidad de la obra.- El Jefe de Fiscalización, se asegurará de que la obra se ejecute de conformidad con las bases establecidas en los estudios de preinversión, es decir, de acuerdo con el diseño definitivo, las especificaciones y demás normas técnicas aplicables, para lograr obtener del proyecto los beneficios esperados"*.

Puyo, 15 de abril de 2026

En este contexto, se adjunta la Planilla de Liquidación de la obra:

**CONSTRUCCIÓN DE AFIRMADO DE VARIAS VÍAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"**

Dicha documentación ha sido revisada y aprobada por el Administrador del Contrato y Fiscalización, cumpliendo con los requisitos técnicos y contractuales establecidos; por tanto, y con base en los informes técnicos que se anexan, se determina como viable y procedente realizar el pago de \$ 50.753,19 (CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 19/100), a favor del Ing. Claudio Cayambe, contratista.

Detalle del Pago:

DETALLE	VALOR
VALOR TOTAL PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	\$ 50,462.65
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	\$ 5,356.78
VALOR TOTAL PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EXCEDENTES	\$ 0.00
VALOR TOTAL REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EXCEDENTES	\$ 0.00
DEVENGACIÓN DEL ANTICIPO EN ESTE PERÍODO	\$ 5,066.24
DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTAS PARA ESTA PLANILLA	\$ 0.00
<b>VALOR LIQUIDO A PAGAR</b>	<b>\$ 50,753.19</b>

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Dirto: CONTADOR (A) GENERAL  
Fecha: 15 ABR 2026

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Dirto: CONTADOR (A) GENERAL  
Postaza  
Fecha: 15 ABR 2026

Atentamente, Ejecutar el control previo al pago de conformidad con la Ley y Reglamento Vigentes.

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eryka Mireya Silva Manzano  
DIRECTORA DE FISCALIZACIÓN (E)

Referencias:  
- GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2026-12163-M

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Dirto: TESORERO (A) GENERAL  
Postaza  
Fecha: 15 ABR 2026

Ejecutar el control previo al pago de conformidad con la Ley y Reglamento Vigentes.

**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2026-10421-M**

**Puyo, 15 de abril de 2026**

**Anexos:**

- 37624-e.pdf
- 05\_recepción\_de\_obra.rar
- 07\_ Cronograma\_de\_trabajos\_valorados\_aprobado.rar
- mco\_contrato\_varias\_vias\_parroquia\_shell-signed-signed-signed-signed0658654001774039592.pdf
- 14\_informe\_de\_conformidad\_ambiental.rar
- 11\_certificado\_cumplimiento\_tributario\_e\_iesr.rar
- 12\_constatacion\_de\_personal\_obrero\_y\_tecnico.rar
- 13\_polizas0922616001774039549.rar
- 06\_sabana\_de\_diferencia\_de\_cantidades\_de\_obra.rar
- 08\_ampliación\_de\_plazo.rar
- 09\_libro\_de\_obra.rar
- 10\_anexo\_fotografico\_por\_cada\_rubro.rar
- 01\_solicitud\_de\_pago0424202001774039499.rar
- 02\_sabana\_planilla\_de\_liquidación.rar
- 03\_calculo\_de\_volumenes\_y\_anexos\_graficos\_por\_cada\_rubro0215487001774039501.rar
- 04\_informe\_de\_fiscalizacion0970050001774039502.rar
- check\_list\_trámites\_de\_pago-signed0876884001774995332.pdf
- informe\_administrador\_planilla\_liquidación-signed0428158001774995333.pdf
- memorando\_nro\_gadppz-estudios-proyectos-2026-12163-m.pdf

**Copia:**

Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malusin León - **Secretaria Ejecutiva 2** / Srta. Ing. Grace Estefania Valdiviezo Quispe - **Subdirectora de Fiscalización** / Srta. Arq. Kendra Milena Espin Mejía - **Asistente Administrativo 2** /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Ing. Grace Estefania Valdiviezo Quispe - Subdirectora de Fiscalización --> Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malusin León - Secretaria Ejecutiva 2

21 = 1116.39"  
Ant = 5.066.24"  
Deref = 49.636.80"



Firmado electrónicamente por:  
**ERYKA MIREYA SILVA  
MANZANO**  
Código: 5022616001774039549



CD-R  
700MB/80Min

HCO-6ADPP2-098-2022  
PRINCCO.COM

2X-56X  
CD-Recordable

Contents: FAMILIA DE UOI DICEBON  
FIERRO DO DE VARIAS CAUSAS  
DE SHELL. ANTON HEDA

Do not put into direct sunlight. Write with special soft marker pen only.

**Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2026-12163-M**

**Puyo, 31 de marzo de 2026**

**PARA:** Sr. Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas  
**Director de Fiscalización**

**ASUNTO:** Aprobación y solicitud de trámite de pago: Planilla de liquidación/proceso MCO-GADPPz-098-2022 "Construcción de Afirmado de varias vías ubicadas en la parroquia Shell, cantón Mera, provincia de Pastaza"

En respuesta al Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2026-10315-M, suscrito por el Ing. Rodrigo Pico, Fiscalizador del proceso MCO-GADPPz-098-2022 correspondiente a la "Construcción de Afirmado de varias vías ubicadas en la parroquia Shell, cantón Mera, provincia de Pastaza", me permito remitir la siguiente documentación relativa a la Planilla de liquidación:

- Planilla de liquidación
- Reajuste provisional de la planilla liquidación
- Cuadro de diferencias
- Informe de Fiscalización
- Informe de Conformidad Ambiental
- Informe de Conformidad del Administrador del Contrato
- Acta de recepción provisional

Con base en lo establecido en los artículos 70 de la LOSNCP, 121 de su Reglamento, y los numerales 408-16 y 408-17 de las Normas de Control Interno para las Entidades y Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que Manejan Recursos Públicos, y en ejercicio de mis atribuciones como Administrador del Contrato, informo que, una vez revisada la documentación remitida por el Fiscalizador, se determina su conformidad para continuar con el trámite correspondiente.

En cumplimiento de lo estipulado en la Cláusula Sexta: Forma de Pago del contrato, se solicita gestionar el pago a favor del contratista Ing. Claudio Fermín Cayambe Guilcapi, conforme al siguiente detalle:

DETALLE	VALOR
VALOR TOTAL PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	\$ 50,462.65
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	\$ 5,356.78
VALOR TOTAL PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EXCEDENTES	\$ 0.00
VALOR TOTAL REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EXCEDENTES	\$ 0.00
DEVENGACIÓN DEL ANTICIPO EN ESTE PERÍODO	\$ 5,066.24
DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTAS PARA ESTA PLANILLA	\$ 0.00
<b>VALOR LIQUIDO A PAGAR</b>	<b>\$ 50,753.19</b>

**Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2026-12163-M**

**Puyo, 31 de marzo de 2026**

Por tanto, el valor neto a cancelar es de USD \$ 50,753.19 (Cincuenta mil setecientos cincuenta y tres dólares con diecinueve centavos) sin I.V.A

Se remite además el expediente físico en 1 folder y el expediente digital en 1 CD correspondiente a la planilla, y el archivo físico y digital completo de la conformidad ambiental.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Jairo Alberto Narváz Guevara  
**JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**

Referencias:

- GADPPZ-FISCALIZACION-2026-10315-M

Anexos:

- 37624-e.pdf
- 07\_cronograma\_de\_trabajos\_valorados\_aprobado.rar
- 05\_recepción\_de\_obra.rar
- 04\_informe\_de\_fiscalizacion0970050001774039502.rar
- 03\_calculo\_de\_volumenes\_y\_anexos\_graficos\_por\_cada\_rubro0215487001774039501.rar
- 02\_sabana\_planilla\_de\_liquidación.rar
- 01\_solicitud\_de\_pago0424202001774039499.rar
- 10\_anexo\_fotografico\_por\_cada\_rubro.rar
- 09\_libro\_de\_obra.rar
- 08\_ampliación\_de\_plazo.rar
- 06\_sabana\_de\_diferencia\_de\_cantidades\_de\_obra.rar
- 13\_polizas0922616001774039549.rar
- 12\_constatacion\_de\_personal\_obrero\_y\_tecnico.rar
- 11\_certificado\_cumplimiento\_tributario\_e\_ies.rar
- 14\_informe\_de\_conformidad\_ambiental.rar
- mco\_contrato\_varias\_vias\_parroquia\_shell-signed-signed-signed-signed0658654001774039592.pdf
- check\_list\_trámites\_de\_pago-signed0876884001774995332.pdf
- informe\_administrador\_planilla\_liquidación-signed0428158001774995333.pdf

Copia:

Sr. Ing. Jorge Rodrigo Pico Angulo - **Fiscalizador 1** /



## INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRA

PROCESO MCO-GADPPz-098-2022

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN

*Período de Ejecución: 01 de agosto de 2025 a 1 de septiembre de 2025*

DATOS GENERALES	
Código del proceso de contratación	MCO-GADPPz-098-2022
Objeto del contrato	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA
Monto del contrato	USD \$ 112,829.17 sin incluir IVA
Fecha de suscripción	08 de febrero de 2023
Monto del anticipo	USD \$ 11,282.92 sin IVA
Plazo Contractual	75 días
Fecha de inicio de plazo	22 de mayo de 2025
Fecha de terminación contractual	04 de agosto de 2025
Ampliaciones de plazo aprobadas	28 días
Fecha de terminación actual	01 de septiembre de 2025
Contratista	Ing. Claudio Fermín Cayambe Guilcapi
Fiscalizador	Ing. Jorge Rodrigo Pico Angulo
Administrador de Contrato	Ing. Jairo Alberto Narváez Guevara

### 1. ANTECEDENTES:

#### 1.1. CONTRATO

- Con fecha 08 de febrero de 2023, se suscribió el contrato entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza (GADPPz) y el Ing. Claudio Fermín Cayambe Guilcapi, cuyo objeto de contratación es la "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA". Los trabajos que se ejecutarán deberán estar sujetos a diseños, especificaciones y más documentos contractuales, por un monto de USD \$ 112,829.17 (Ciento doce mil ochocientos veintinueve dólares con diecisiete centavos) sin incluir el IVA, a ejecutarse en un plazo de 75 días.
- Mediante NOTIFICACIÓN DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 047-2023, de fecha 9 de febrero de 2023, se notifica al Ing. Fabián Salazar, como Administrador de Contrato del proceso MCO-GADPPz-098-2022 para la CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA.
- Mediante Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4610-M de fecha 27 de febrero de 2023, se designa como Fiscalizador del Contrato al Ing. Rodrigo Pico para el proceso MCO-GADPPz-098-2022 para la CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA.
- Mediante Memorando Nro. GADPPZ-COMPRAS-PUBLICAS-2023-9830-M, de fecha 31 de mayo de 2023 se designa al Ing. Jairo Narváez como nuevo Administrador del Contrato.
- Con fecha 8 de mayo de 2025 se realiza una adenda modificatoria al contrato a fin de establecer el nuevo número de póliza y la vigencia de la misma.



- Mediante Oficio N.º GADPPZ - JN - ADMSHELL - 002, suscrito por el Administrador, se solicita la entrega de personal técnico, equipo y metodología de trabajo a ser empleados en la ejecución del contrato para verificar el cumplimiento de lo requerido en el contrato.
- Mediante Oficio N.º CC-001-2025, el contratista entrega la documentación solicitada.

### 1.2. PLANILLA N°1

- Mediante Oficio N.º Oficio N.º JN-001-2025-SHELL, de fecha 21 de mayo de 2025, se notifica al contratista la disponibilidad del anticipo, conforme a lo estipulado en la cláusula sexta del contrato.
- Con fecha 22 de mayo de 2025 se inician los trabajos mediante acta de inicio, terminándose el plazo contractual original el 04 de agosto de 2025.
- Mediante Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2024-10536-M del 26 de mayo de 2025, el administrador solicita la designación de un técnico ambiental para control del proyecto.
- Mediante Memorando Nro. GADPPZ-DGA-2025-21248-M, se designa a la Ing. Teresa Briggite Jácome Vargas, Analista de Calidad Ambiental como Técnica Ambiental para el seguimiento, control y Monitoreo.
- Mediante Oficio nro. CC-004-2025, el contratista remite la Reprogramación N.º 1, misma que se aprueba a través del Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2025-10576-M.
- Mediante Memorando Nro. GADPPZ-DGA-2025-13462-M la Técnica Ambiental designada remite el INFORME TÉCNICO No. 001-DGA-JGA-TJ-2025 de cumplimiento ambiental de la Planilla de Avance N.º 1.
- Mediante Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2025-9422-M el Fiscalizador remite la planilla de Avance N.º 1 aprobada.
- Mediante Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2024-11026-M del 19 de agosto se remite el informe de administrador de aprobación para pago de la Planilla N.º 1

### 1.3. PLANILLA N°2

- Mediante Oficio nro. CC-007-2025 del 11 de junio de 2025 el contratista solicita la autorización para el ingreso de maquinaria y explotación de material pétreo en la Mina Alpayacu, mismo que se comunica a la ARCOM mediante Oficio Nro. GADPPZ-DGA-2025-3287-O del 16 de junio de 2025.
- Mediante Oficio nro. CC-009-2025 del 30 de junio de 2025, el contratista solicita una reprogramación de trabajos a causa de las condiciones climáticas, misma que se aprueba Mediante Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2025-9232-M.
- Mediante Memorando Nro. GADPPZ-DGA-2025-212845-M la Técnica Ambiental designada remite el INFORME TÉCNICO No. 002-DGA-JGA-TJ-2025 de cumplimiento ambiental de la Planilla de Avance N.º 2.
- Mediante Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2025-9423-M el Fiscalizador remite la planilla de Avance N.º 2 aprobada.
- Mediante Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2025-11031-M del 19 de agosto se remite el informe de administrador de aprobación para el pago de la Planilla N.º 2

### 1.4. PLANILLA N° 3

- Mediante Oficio nro. CC-015-2025 del 28 de julio de 2025, el contratista realiza una solicitud de reprogramación y prórroga del plazo contractual por un total de 37 días, lo cual se remite al Fiscalizador para análisis e informe técnico correspondiente.
- Mediante Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2025-9387-M del 1 de agosto de 2025, el fiscalizador remite la respuesta sobre el pedido de prórroga de plazo recomendando una ampliación de plazo de 28 días.



- Mediante Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2025-10936-M del 01 de agosto de 2025, el administrador remite el informe técnico y hace la solicitud de una prórroga de 28 días, misma que es aprobada mediante RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 del PROCESO NRO. MCO-GADPPZ-098-2022 de fecha 04 de agosto de 2025, lo cual es comunicado al fiscalizador y contratista.
- Mediante Oficio nro. CC-024-2025 del 17 de agosto de 2025, el contratista entrega las correcciones de la planilla N° 3 al fiscalizador.
- Mediante Memorando Nro. GADPPZ-JGA-GA-2025-15034-M la Técnica Ambiental designada remite el INFORME TÉCNICO No. 004-DGA-JGA-TJ-2025 de cumplimiento ambiental de la Planilla de Avance N° 3.
- Mediante Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2025-9646-M el Fiscalizador remite la planilla de Avance N° 3 aprobada.

### 1.5. PLANILLA DE LIQUIDACIÓN

- Mediante Oficio nro. CC-028-2025 del 26 de diciembre de 2025, el contratista remite la planilla de liquidación al fiscalizador.
- Mediante Memorando N° GADPPZ-FISCALIZACION-2026-10315-M del 20 de marzo de 2026, el Fiscalizador remite el informe con la planilla para el pago.

## 2. PLAZO DEL CONTRATO

Plazo total inicial: 75 días

Plazo total con ampliaciones: 103 días

### 2.1. AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA DE LA PLANILLA

A la fecha de la presente planilla, no se han autorizado ampliaciones de plazo.

ORDEN DE AMPLIACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DÍAS APROBADOS	MOTIVACIÓN	DOCUMENTO HABILITANTE
1	04/Ago/2025	28	Condiciones climáticas: - Imposibilidad de extracción de material pétreo. - Afectaciones en trabajos de excavación y relleno a causa de suelos expansivos	RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 CONTRATO NRO. MCO 049 02-2023 PROCESO NRO. MCO-GADPPZ-098-2022

### 2.2. PARALIZACIONES EN EL MES A PLANILLAR

A la fecha de la presente planilla, no se han autorizado paralizaciones de plazo.

N°	FECHA DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REINICIO	DOCUMENTO HABILITANTE



### 2.3. REPROGRAMACIONES

N°	FECHA	MOTIVACIÓN
1	04 de junio de 2025	Reprogramación por anticipo y orden de inicio
2	01 de julio de 2025	Reprogramación por condiciones climáticas
3	05 de agosto de 2025	Reprogramación por prórroga de plazo

### 2.4. CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

N°	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	CÓDIGO DE CONTRATO	MONTO	MOTIVACIÓN

### 2.5. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS EN EL PERÍODO DE PLANILLAJE

DETALLE	VALOR/FECHA
Fecha de inicio	22 de mayo de 2025
Plazo	75 días
Fecha de terminación original	04 de agosto de 2025
Total de días aprobados de ampliación	28 días
Total de días paralizados	0 días
Fecha de terminación final	01 de septiembre de 2025

## 3. DESARROLLO DEL PLANILLAJE

### 3.1. RESUMEN DE PLANILLAS EJECUTADAS

N°	DETALLE	MONTO	AVANCE PARCIAL	OBSERVACIONES
1	Planilla de avance N° 01	\$ 2,162.32	0.88%	Pagada
2	Planilla de avance N° 02	\$ 15,629.57	13.94%	Pagada
3	Planilla de avance N° 03	\$ 40,897.16	40.27%	Pagada

### 3.2. ANÁLISIS DE MULTAS

N°	DETALLE DEL OBJETO DE SANCIÓN	MONTO BASE PARA CÁLCULO	%	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	No DÍAS	VALOR DE LA MULTA
TOTAL DE MULTAS EN ESTE PERÍODO DE PLANILLAJE:							\$ 0.00

### 3.3. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

AL INICIO DEL CONTRATO			
N°	DETALLE	MONTO	% PARCIAL
1	Valor total del contrato Sin IVA	\$ 112,829.17	100.00%
2	Anticipo	\$ 11,282.92	10.00%
3	Reajuste del Anticipo	\$ 1,173.42	
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
N°	DETALLE	MONTO	% PARCIAL
1	Planilla de avance N° 01	\$ 995.27	0.88%
2	Reajuste de Planilla de avance N° 01	\$ 93.16	0.00%
3	Planilla de avance N° 02	\$ 15,730.24	13.94 %
4	Reajuste de Planilla de avance N° 02	\$ 1,472.35	0.00%
5	Planilla de avance N° 03	\$ 45,441.29	40.27%
6	Reajuste de Planilla de avance N° 03	\$ 4,662.28	0.00%
7	Planilla de Liquidación	\$ 50,462.65	44.72%
8	Reajuste de Planilla de Liquidación	\$ 5,356.78	0.00%

### 3.4. DETALLE DE PLANILLA ACTUAL

DETALLE	MONTO
Monto Planilla de Avance N° liquidación	\$ 50,462.65
Anticipo devengado Planilla de Avance N° liquidación	\$ 5,066.24
Reajuste de precios de Planilla de Avance N° liquidación	\$ 5,356.78
Multas en este período	\$ 0.00
<b>VALOR LÍQUIDO A PAGAR EN ESTA PLANILLA</b>	<b>\$ 50,753.19</b>

**Nota:** De acuerdo al trámite de la solicitud de pago el detalle de esta planilla se adjunta en el Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2026-10315-M, del 20 de marzo de 2026, se detalla la Planilla de liquidación y reajuste provisional de la planilla de liquidación.

### 4. CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN

PÓLIZAS	Vigentes
SEGURO SOCIAL	Sí cumple

En virtud del presente informe y en calidad de Administrador de Contrato, **se aprueba y se solicita se proceda con el pago** de la Planilla de liquidación y Reajuste provisional de la planilla de liquidación, con el siguiente detalle:

DETALLE	VALOR
PORCENTAJE DE AVANCE PARCIAL EN ESTE PERÍODO (%)	44.72 %
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO (%)	99.82 %
VALOR TOTAL PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	\$ 50,462.65
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	\$ 5,356.78
VALOR TOTAL PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EXCEDENTES	\$ 0.00



DETALLE	VALOR
VALOR TOTAL REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EXCEDENTES	\$ 0.00
DEVENGACIÓN DEL ANTICIPO EN ESTE PERÍODO	\$ 5,066.24
DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTAS PARA ESTA PLANILLA	\$ 0.00
<b>VALOR LIQUIDO A PAGAR</b>	<b>\$ 50,753.19</b>

Son USD \$ 50,753.19 (Cincuenta mil setecientos cincuenta y tres dólares con diecinueve centavos) sin I.V.A

Todas las retenciones tributarias serán responsabilidad de la Dirección Financiera del GADPPz.

Atentamente,



Jairo A. Narváez Guevara  
*INGENIERO CIVIL*  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**

**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2026-10315-M**

**Puyo, 20 de marzo de 2026**

**PARA:** Sr. Ing. Jairo Alberto Narváez Guevara  
**Jefe de Estudios y Proyectos**

**ASUNTO:** RECEPCIÓN PROVISIONAL: MCO-GADPPz-098-2022 "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA".

En respuesta al Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2026-24597-M, de fecha 06 de marzo de 2026; y en referencia al Documento No. Oficio nro. CC-022-2025, de fecha 1 de septiembre de 2025, suscrito por el Ing. Claudio Fermin Cayambe Guilcapi, el mismo que funge como CONTRATISTA; documento en el cual solicita: la **Recepción Provisional**. Se ha procedido de acuerdo a las NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO numeral 408-28, a la LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Art. 93 y al REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA SISTEMA NACIONAL CONTRATACIÓN PÚBLICA Art. 364 y Art. 365.

En respuesta al Documento Oficio nro. CC-026-2025, tengo a bien remitir la planilla de liquidación, memo de pago de la planilla de liquidación, reajuste provisional de planilla de liquidación, informe de fiscalización de la planilla de liquidación, cuadro de diferencias, acta provisional y anexos de volúmenes; en mi calidad de Fiscalizador, de acuerdo al numeral 408-18 de las NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS y al Art. 362 del REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, he procedido a **APROBAR LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN**, del Contrato Complementario "**CONSTRUCCIÓN DE AFIRMADO DE VARIAS VÍAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA**", cuyo código de Proceso es **MCO-GADPPz-098-2022**, para lo cual en cumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas en el CONTRATO-CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO, agradeceré proceder con el trámite respectivo para cancelar a favor del Ing. Claudio Fermín Cayambe Guilcapi, el valor de **50,753.19 USD** (CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 19/100), conforme al siguiente detalle:

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	\$ 45,396.41
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	\$ 5,356.78
<b>Total</b>	<b>\$ 50,753.19</b>

Atentamente,

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2026-10315-M

Puyo, 20 de marzo de 2026

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Jorge Rodrigo Pico Angulo  
**FISCALIZADOR 1**

Referencias:

- GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2026-24597-M

Anexos:

- 37624-e.pdf
- 01\_solicitud\_de\_pago0424202001774039499.rar
- 02\_sabana\_planilla\_de\_liquidación.rar
- 03\_calculo\_de\_volumenes\_y\_anexos\_graficos\_por\_cada\_rubro0215487001774039501.rar
- 04\_informe\_de\_fiscalizacion0970050001774039502.rar
- 05\_recepción\_de\_obra.rar
- 06\_sabana\_de\_diferencia\_de\_cantidades\_de\_obra.rar
- 07\_cronograma\_de\_trabajos\_valorados\_aprobado.rar
- 08\_ampliación\_de\_plazo.rar
- 09\_libro\_de\_obra.rar
- 10\_anexo\_fotografico\_por\_cada\_rubro.rar
- 11\_certificado\_cumplimiento\_tributario\_e\_ies.rar
- 12\_constatacion\_de\_personal\_ouero\_y\_tecnico.rar
- 13\_polizas0922616001774039549.rar
- 14\_informe\_de\_conformidad\_ambiental.rar
- mco\_contrato\_varias\_vias\_parroquia\_shell-signed-signed-signed-signed0658654001774039592.pdf



JORGE RODRIGO PICO  
ANGULO

Alícuo electrónicamente con FomAD



GOBIERNO DE  
**PASTAZA**  
*El Gobierno del Añimo*

# **1 SOLICITUD DE PAGO**

**PROYECTO:**

**“CONSTRUCCIÓN DE AFIRMADO DE VARIAS VÍAS UBICADA EN LA  
PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA”.**

**PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA**

Oficio nro. CC-028-2025

Puyo, 26 de diciembre de 2025

Asunto: PLANILLA NRO 4 DE LIQUIDACION DE OBRA

Ing. Rodrigo Pico  
Fiscalizador

Presente. -

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en las funciones que acertadamente desempeña al frente de la Institución.

Por medio de la presente, sírvase encontrar la documentación para que se proceda con el pago de la **Planilla N° 4 de Liquidación de Obra**, correspondiente al período comprendido entre el **1 de agosto de 2025 y el 31 de agosto de 2025**, junto con todos sus anexos, relacionada con el contrato de la obra: **"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"**

Se remite la documentación para su **revisión y aprobación**, en caso de ser procedente.

La documentación no se presentada en su momento exclusivamente a situaciones estrictamente personales que enfrenté durante los meses anteriores y que me impidieron gestionar oportunamente los certificados tributarios y de Seguridad Social, así como la emisión de la factura correspondiente.

Hoy, habiendo superado dichas circunstancias, cumplo con subsanar por completo el requisito pendiente y pongo a disposición todos los documentos necesarios para que se inicie de inmediato el trámite de pago.

Sin otro particular, me suscribo atentamente.

Atentamente,



Ing. Claudio Fermin Cayambe Guilcapi  
RUC: 1600462723001  
CONTRATISTA





GOBIERNO DE  
**PASTAZA**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA  
*El Gobierno del Afán*

**DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL ING. CAYAMBE GUILCABI CLAUDIO FERMÍN MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA PARA: CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA.**

En la ciudad de Puyo el once de marzo del 2026, nos constituimos los señores: Ing. Jairo Narváz como administrador, Ing. Edison Andrés Paguay Córdova delegado, y el (la) Ing. Rodrigo Pico Fiscalizador, en calidad de observador, por el Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial De Pastaza; y el (la) Ing. Cayambe Guilcabi Claudio Fermín en calidad de contratista, con el objeto de celebrar la diligencia de recepción provisional de los trabajos.

**Cláusula Primera.- Antecedentes**

En la ciudad de Puyo el ocho de febrero de 2023 se celebra el contrato suscrito por el Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial De Pastaza, representado por el Señor Prefecto, y por otra parte el Ing. Cayambe Guilcabi Claudio Fermín en calidad de Contratista para la Construcción De Afirmado De Varias Vías Ubicada En La Parroquia Shell, Cantón Mera, Provincia De Pastaza, en la provincia de Pastaza.

El valor del contrato es \$112,829.17 de conformidad con el presupuesto elaborado por el Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial De Pastaza.

**Cláusula Segunda.- Plazo de Ejecución**

Del analisis realizado en la cláusula anterior, revisadas las planillas de obra se desprende lo siguiente:

Fecha de inicio:	22 de mayo de 2025
Plazo contractual:	75 Días
Fecha de terminación:	4 de agosto de 2025
Suspensión de plazo:	Ninguna
Ampliación de plazo:	28 Días
Fecha de terminación ampliada:	1 de septiembre de 2025
Mora:	Ninguna
Multa diaria:	Ninguna
Multa total:	Ninguna

**Cláusula Tercera.- Inspección de la Obra**

Previo al cumplimiento de los requisitos legales, la comisión de recepción se trasladó al lugar de los trabajos y efectuó la inspección de los mismos, comprobándose que la obra ha sido ejecutada en su totalidad de lo contratado, con sujeción a las especificaciones técnicas y cláusulas contractuales, con resultados satisfactorios, en consecuencia, la comisión recibe en forma provisional todos los trabajos realizados en la: Construcción De Afirmado De Varias Vías Ubicada En La Parroquia Shell, Cantón Mera, Provincia De Pastaza.

La comisión deja constancia expresa que será de cuenta del contratista la reparación o reposición de parte de la obra que se deba a defectos de la construcción.

**Cláusula Cuarta.- Cantidades de Obra Contratadas y Ejecutadas**

Es de estricta responsabilidad de la Fiscalización las cantidades de obra contratadas y ejecutadas en el contrato de Construcción De Afirmado De Varias Vías Ubicada En La Parroquia Shell, Cantón Mera, Provincia De Pastaza, que se detalla en el siguiente cuadro de la presente acta de entrega Recepción Provisional.

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL
	AFIRMADO LOS ALTARES				



## GOBIERNO DE PASTAZA

2	Transporte de maquinaria	glb	4.00	\$ 547.44	100.00%
3	Replanteo y nivelación	km	0.50	\$ 236.97	100.00%
3	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m <sup>3</sup>	943.16	\$ 980.89	943.16%
4	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m <sup>3</sup>	1831.02	\$ 5,309.96	114.44%
5	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	m <sup>3</sup> -km	18438.37	\$ 7,190.96	115.24%
6	Limpieza de cunetas a máquina	m	882.00	\$ 502.74	88.20%
SEÑALES AMBIENTALES					
7	Pancarta informativa de la obra (letrero)-con estructura	u	1.00	\$ 377.45	100.00%
8	Señales informativas y reglamentarias (1.30mx0.80m)	u	3.00	\$ 227.82	100.00%
9	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	m	100.00	\$ 33.00	100.00%
10	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1.00	\$ 18.11	100.00%
11	Kit antiderrames	u	2.00	\$ 325.00	100.00%
12	Charla Ambiental	hora	4.00	\$ 250.00	100.00%
AFIRMADO CAMINO A2 (ALTARES)					
13	Transporte de maquinaria	glb	4.00	\$ 547.44	100.00%
14	Replanteo y nivelación	km	0.40	\$ 189.58	100.00%
15	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m <sup>3</sup>	884.69	\$ 920.08	884.69%
16	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m <sup>3</sup>	1545.99	\$ 4,483.37	120.78%
17	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	m <sup>3</sup> -km	16974.97	\$ 6,620.24	132.62%
18	Limpieza de cunetas a máquina	m	732.36	\$ 417.45	91.55%
SEÑALES AMBIENTALES					
19	Pancarta informativa de la obra (letrero)-con estructura	u	1.00	\$ 377.45	100.00%
20	Señales informativas y reglamentarias (1.30mx0.80m)	u	0.00	\$ 0.00	0.00%
21	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	m	100.00	\$ 33.00	100.00%
22	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1.00	\$ 18.11	100.00%
23	Kit antiderrames	u	2.00	\$ 325.00	100.00%
24	Charla Ambiental	hora	4.00	\$ 250.00	100.00%
AFIRMADO MONTE SINAI (AMPLIACION DE VIA)					
25	Transporte de maquinaria	glb	4.00	\$ 547.44	100.00%
26	Replanteo y nivelación	km	0.60	\$ 284.36	100.00%
27	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m <sup>3</sup>	386.43	\$ 401.89	386.43%
28	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m <sup>3</sup>	2895.49	\$ 8,396.92	100.54%
29	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	m <sup>3</sup> -km	9584.07	\$ 3,737.79	33.28%
30	Limpieza de cunetas a máquina	m	600.00	\$ 342.00	100.00%
SEÑALES AMBIENTALES					
31	Pancarta informativa de la obra (letrero)-con estructura	u	1.00	\$ 377.45	100.00%
32	Señales informativas y reglamentarias (1.30mx0.80m)	u	0.00	\$ 0.00	0.00%
33	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	m	100.00	\$ 33.00	100.00%
34	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1.00	\$ 18.11	100.00%
35	Kit antiderrames	u	2.00	\$ 325.00	100.00%
36	Charla Ambiental	hora	4.00	\$ 250.00	100.00%
AFIRMADO PRAGA SACHA					
37	Transporte de maquinaria	glb	8.00	\$ 1,094.88	200.00%
38	Replanteo y nivelación	km	1.00	\$ 473.94	166.67%
39	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m <sup>3</sup>	2197.59	\$ 2,285.50	2197.59%
40	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m <sup>3</sup>	4764.33	\$ 13,816.56	248.14%
41	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	m <sup>3</sup> -km	49262.04	\$ 19,212.20	256.57%
42	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m, e=2.5 mm, PM-	m	6.00	\$ 2,096.52	100.00%
43	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1.50 m, e=2.5 mm, PM-	m	12.00	\$ 5,181.60	100.00%
44	S.C. Tubería de acero corrugado D= 2.00 m .e=2.5 mm, PM-	m	6.00	\$ 3,447.78	100.00%
45	Relleno compactado/mejoramiento*capas=20cm	m <sup>3</sup>	28.80	\$ 325.44	96.00%
46	Limpieza de cunetas a máquina	m	1920.00	\$ 1,094.40	192.00%
SEÑALES AMBIENTALES					
47	Pancarta informativa de la obra (letrero)-con estructura	u	1.00	\$ 377.45	100.00%
48	Señales informativas y reglamentarias (1.30mx0.80m)	u	0.00	\$ 0.00	0.00%
49	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	m	100.00	\$ 33.00	100.00%
50	Contenedores metálicos de 55 galones	u	2.00	\$ 36.22	200.00%
51	Kit antiderrames	u	4.00	\$ 650.00	200.00%

50	Charla Ambiental	hora	6.00	\$ 375.00	150.00%
<b>AFIRMADO NUEVO MILEÑO (AMPLIACION)</b>					
53	Transporte de maquinaria	glb	4.00	\$ 547.44	100.00%
54	Replanteo y nivelacion	km	0.31	\$ 146.92	62.00%
55	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m <sup>3</sup>	568.05	\$ 590.77	568.05%
56	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m <sup>3</sup>	1647.84	\$ 4,778.74	117.70%
57	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	m <sup>3</sup> -km	14583.37	\$ 5,687.51	104.17%
58	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1.50 m, e=2.5 mm, PM-	m	10.00	\$ 4,318.00	100.00%
59	Limpieza de cunetas a máquina	m	500.00	\$ 285.00	100.00%
<b>SEÑALES AMBIENTALES</b>					
60	Pancarta informativa de la obra (letrero)-con estructura	u	1.00	\$ 377.45	100.00%
61	Señales informativas y reglamentarias (1.30mx0.80m)	u	0.00	\$ 0.00	0.00%
62	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	m	100.00	\$ 33.00	100.00%
63	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1.00	\$ 18.11	100.00%
64	Kit antiderrames	u	2.00	\$ 325.00	100.00%
65	Charla Ambiental	hora	2.00	\$ 125.00	50.00%
<b>PLATAFORMA NUEVO AMANECER</b>					
66	Transporte de maquinaria	glb	0.00	\$ 0.00	0.00%
67	Replanteo y nivelacion	m <sup>2</sup>	0.00	\$ 0.00	0.00%
68	Desbroce, desbosque y limpieza	ha	0.00	\$ 0.00	0.00%
69	Relleno compactado/mejoramiento*capas=20cm (CANCHA)	m <sup>3</sup>	0.00	\$ 0.00	0.00%
70	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m <sup>3</sup>	0.00	\$ 0.00	0.00%
71	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	m <sup>3</sup> -km	0.00	\$ 0.00	0.00%
<b>SEÑALES AMBIENTALES</b>					
72	Pancarta informativa de la obra (letrero)-con estructura	u	0.00	\$ 0.00	0.00%
73	Señales informativas y reglamentarias (1.30mx0.80m)	u	0.00	\$ 0.00	0.00%
74	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	m	0.00	\$ 0.00	0.00%
75	Contenedores metálicos de 55 galones	u	0.00	\$ 0.00	0.00%
76	Kit antiderrames	u	0.00	\$ 0.00	0.00%
77	Charla Ambiental	hora	0.00	\$ 0.00	0.00%
<b>TOTAL PLANILLADO</b>				<b>\$ 112,629.45</b>	

#### Cláusula Quinta.- Liquidación Económica

Por los trabajos realizados el contratista presentó las planillas que a continuación se detalla y cuyo valor alcanza los ciento veinte y cinco mil trescientos ochenta y siete dólares, 44/ 100 centavos ( \$125,387.44 ).

PLANILLAS	MONTOS
PLANILLA DE AVANCE No. 1	\$ 995.27
PLANILLA DE AVANCE No. 2	\$ 15,730.24
PLANILLA DE AVANCE No. 3	\$ 45,441.29
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	\$ 50,462.65
REAJUSTE DEFINITIVO DEL ANTICIPO	\$ 1,173.42
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE AVANCE No. 1	\$ 93.16
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE AVANCE No. 2	\$ 1,472.35
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE AVANCE No. 3	\$ 4,662.28
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	\$ 5,356.78
<b>TOTAL PLANILLADO</b>	<b>\$ 125,387.44</b>

#### Cláusula Sexta.- Reajuste de Precios

Se han enviado las planillas de reajuste provisionales, quedando por calcularse los reajustes definitivos que se incluirán en el acta de entrega recepción definitiva.

#### Cláusula Séptima.- Recepción de la Obra

Habiéndose constatado que los trabajos ejecutados se han realizado de conformidad con las normas, Especificaciones Generales y cláusulas contractuales, la comisión procede a la recepción provisional de los trabajos



**GOBIERNO DE  
PASTAZA**

de Construcción De Afirmado De Varias Vias Ubicada En La Parroquia Shell, Cantón Mera, Provincia De Pastaza y en base a la información presentada por el Fiscalizador y avalada por el Administrador del Contrato; deja expresa constancia de lo siguiente:

- 1.- Que es de responsabilidad del Fiscalizador y Administrador del contrato:
  - a) La liquidación técnica económica constante en el ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL.
  - b) Liquidación de plazos.
  - c) La verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales y de resultados de laboratorio de ensayo de materiales.
  - d) El LIBRO DE OBRA, del proceso de ejecución de las obras, que está en custodia de la Dirección Financiera.
- 2.- Que recibe del contratista a entera satisfacción las obras objeto del contrato, por lo que no amerita la elaboración de informe de observaciones.
- 3.- Se acuerda con el Contratista que: "En cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, será obligación del contratista satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la contratante, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.
- 4.- Las partes dejan constancia mediante la suscripción de la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL** que los trabajos han sido concluidos y que el contratista, **NO OBSTANTE**, la suscripción del **ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA**, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1936, 1937 y de conformidad con los artículos 1938, 1939, 1940 de la Codificación del Código Civil, y el inciso final de la Norma 408-29, esto es hasta por **diez (10) años, contados a partir de la fecha de celebrada la ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA** y para constancia firman en unidad de acto en original.



Ing. Jairo Narváz

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**



Ing. Edison Andrés Paguay Córdova

**DELEGADO**



Ing. Cayambe Guilcapi Claudio Fermín

**CONTRATISTA**

Oficio nro. CC-026-2025

Puyo, 1 de septiembre de 2025

Asunto: PLANILLA NRO 4 DE AVANCE DE OBRA ✓

Ing. Rodrigo Pico  
Fiscalizador

Presente. -

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en las funciones que acertadamente desempeña al frente de la Institución.

Por medio de la presente, sírvase encontrar las correcciones de la **Planilla N° 4 de Avance de Obra**, correspondiente al período comprendido entre el **1 de agosto de 2025** y el **31 de agosto de 2025**, junto con todos sus anexos, relacionada con el contrato de la obra: **"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"**

Se remite la documentación para su **revisión y aprobación**, en caso de ser procedente.

Sin otro particular, me suscribo atentamente.

Atentamente,



Ing. Claudio Fermin Cayambe Guilcapi  
RUC: 1600462723001  
CONTRATISTA





GOBIERNO DE  
**PASTAZA**  
*El Gobierno del Añimo*

## **2 SABANA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA**

**PROYECTO:**

**“CONSTRUCCIÓN DE AFIRMADO DE VARIAS VÍAS UBICADA EN LA  
PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA”.**

**PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA**



**GOBIERNO DE PASTAZA**

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**DPTO. PASTAZA FISCALIZACIÓN**

**PLANILLA DE LIQUIDACIÓN**

CONSTRUCCIÓN DE APRIMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA

**OBRA** : micróteos, 8 de febrero de 2023  
**FECHA DE CONTRATO** : Ing. Cajumbe Guilaipi Claudio Fermín  
**CONTRATISTA** : 75 Días a partir de la orden de inicio  
**PLAZO** : 28 Días  
**AMPLIACIONES** : 0 Días  
**SUSPENSIÓN** : 103 Días  
**TOTAL** :

**V. CONTRATO** : 112.829,17  
**V. PLANILLAS** : 50.462,65  
**V. EXCEDENTES** : 19.617,92  
**% DE AVANCE** : 44,72%

PARCIAL

ACUMULADO

112.829,17  
 112.629,45  
 31.373,11  
 99,82%

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CONTRATO	TOTAL	CANTIDADES		% TOTAL	IMPORTE		TOTAL FECHA
						T. ANTERIOR	ESTE PERIODO		T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	
<b>AFRIMADO LOS ALTARES</b>											
1	Transporte de maquinaria	gib	4,00	\$ 136,86	\$ 547,44	1,00	3,00	100,00%	136,86	410,58	547,44
2	Replanteo y nivelación	km	0,50	\$ 473,94	\$ 236,97	0,50		100,00%	236,97		236,97
3	Excavación sin clasificamos de tierra	m³	100,00	\$ 1,04	\$ 104,00	943,16		943,16%	980,89		980,89
4	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y reg)	m³	1.600,00	\$ 2,90	\$ 4.640,00	1.831,02		114,44%	5.309,96		5.309,96
5	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	m³-km	16.000,00	\$ 0,39	\$ 6.240,00	18.438,37		115,24%	7.190,96		7.190,96
6	Limpieza de cunetas a máquina	m	1.000,00	\$ 0,57	\$ 570,00	882,00		88,20%	502,74		502,74
<b>SENALES AMBIENTALES</b>											
7	Pancarta informativa de la obra (letero)-con estructura	u	1,00	\$ 377,45	\$ 377,45	1,00		100,00%	377,45		377,45
8	Señales informativas y reglamentarias (1,30mx0,80m)	u	3,00	\$ 75,94	\$ 227,82	3,00		100,00%	227,82		227,82
9	Cinta peligro colores intensos (mat. poliéster)	m	100,00	\$ 0,33	\$ 33,00	100,00		100,00%	33,00		33,00
10	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1,00	\$ 18,11	\$ 18,11	1,00		100,00%	18,11		18,11
11	Kit antiderrames	u	2,00	\$ 162,50	\$ 325,00	2,00		100,00%	325,00		325,00
12	Charla Ambiental	hora	4,00	\$ 62,50	\$ 250,00	4,00		100,00%	250,00		250,00
<b>AFRIMADO CAMINO A2 (ALTARES)</b>											
13	Transporte de maquinaria	gib	4,00	\$ 136,86	\$ 547,44	2,00		100,00%	273,72		547,44
14	Replanteo y nivelación	km	0,40	\$ 473,94	\$ 189,58	0,40		100,00%	189,58		189,58
15	Excavación sin clasificamos de tierra	m³	100,00	\$ 1,04	\$ 104,00	884,69		884,69%	920,08		920,08
16	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y reg)	m³	1.280,00	\$ 2,90	\$ 3.712,00	1.545,99		120,78%	4.483,37		4.483,37
17	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	m³-km	12.800,00	\$ 0,39	\$ 4.992,00	16.974,97		132,62%	6.620,24		6.620,24
18	Limpieza de cunetas a máquina	m	800,00	\$ 0,57	\$ 456,00	732,36		91,55%	417,45		417,45
<b>SENALES AMBIENTALES</b>											
19	Pancarta informativa de la obra (letero)-con estructura	u	1,00	\$ 377,45	\$ 377,45	1,00		100,00%	377,45		377,45
20	Señales informativas y reglamentarias (1,30mx0,80m)	u	3,00	\$ 75,94	\$ 227,82	3,00		100,00%	227,82		227,82
21	Cinta peligro colores intensos (mat. poliéster)	m	100,00	\$ 0,33	\$ 33,00	100,00		100,00%	33,00		33,00
22	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1,00	\$ 18,11	\$ 18,11	1,00		100,00%	18,11		18,11
23	Kit antiderrames	u	2,00	\$ 162,50	\$ 325,00	2,00		100,00%	325,00		325,00
24	Charla Ambiental	hora	4,00	\$ 62,50	\$ 250,00	4,00		100,00%	250,00		250,00
<b>AFRIMADO MONTE SINAI (AMPLIACION DE VIA)</b>											
25	Transporte de maquinaria	gib	4,00	\$ 136,86	\$ 547,44		4,00	100,00%		547,44	547,44
26	Replanteo y nivelación	km	0,60	\$ 473,94	\$ 284,36	0,60		100,00%	284,36		284,36
27	Excavación sin clasificamos de tierra	m³	100,00	\$ 1,04	\$ 104,00		386,43	386,43%	401,89		401,89
28	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y reg)	m³	2.880,00	\$ 2,90	\$ 8.352,00		2.895,49	100,54%	8.396,92		8.396,92
29	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	m³-km	28.800,00	\$ 0,39	\$ 11.232,00		9.584,07	33,28%	3.737,79		3.737,79
30	Limpieza de cunetas a máquina	m	600,00	\$ 0,57	\$ 342,00		600,00	100,00%	342,00		342,00
<b>SENALES AMBIENTALES</b>											
31	Pancarta informativa de la obra (letero)-con estructura	u	1,00	\$ 377,45	\$ 377,45		1,00	100,00%		377,45	377,45
32	Señales informativas y reglamentarias (1,30mx0,80m)	u	3,00	\$ 75,94	\$ 227,82		3,00	100,00%		227,82	227,82
33	Cinta peligro colores intensos (mat. poliéster)	m	100,00	\$ 0,33	\$ 33,00		100,00	100,00%		33,00	33,00
34	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1,00	\$ 18,11	\$ 18,11		1,00	100,00%		18,11	18,11
35	Kit antiderrames	u	2,00	\$ 162,50	\$ 325,00		2,00	100,00%		325,00	325,00

Francisco de Orellana y 27 de febrero, Puyo, Pastaza

PBX: (593)032-994-220

<https://pastaza.gob.ec>



GOBIERNO DE PASTAZA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO. PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FISCALIZACIÓN

OBRA : CONSTRUCCION DE AFERRADO DE VARIAS VAS LENCADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTON MIRA, PROVINCIA DE PASTAZA
FECHA DE CONTRATO : miercoles, 8 de febrero de 2023
CONTRATISTA : Ing. Cuyumbi Gutierrez Claudio Ferrn
PLAZO : 75 Dias a partir de la orden de inicio
AMPLIACIONES : 28 Dias
SUSPENSION : 0 Dias
TOTAL : 103 Dias

FECHA DE PLANILLA : 25 de febrero de 2026
INICIO DEL PLAZO : 22 de mayo de 2025
TERMINACION DEL PLAZO : 1 de septiembre de 2025
PERIODO : 01-ago-25 A 01-sep-25

PARCIAL ACREDITADO
V. CONTRATO : 112,829.17
V. PLANILLAS : 50,462.65
V. EXCEDENTES : 19,617.92
% DE AVANCE : 44.72%
31,373.11
99.82%

Table with columns: ITEMS, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO CONTRATO, TOTAL, T ANTERIOR, ESTE PERIODO, CANTIDADES, TOTAL FECHA, % TOTAL, T ANTERIOR, ESTE PERIODO, IMPORTANTE, TOTAL FECHA. Rows include items like 'Charra Ambiental', 'AFERRADO PRAGA SACHA', 'Replanteo y nivelacion', etc.



**GOBIERNO DE PASTAZA**

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

DPTO. **FISCALIZACIÓN**

**PLANILLA DE LIQUIDACIÓN**

**OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN NERA, PROVINCIA DE PASTAZA  
**FECHA DE CONTRATO:** miércoles, 8 de febrero de 2023  
**CONTRATISTA:** Ing. Cayambe Guilcapí Claudio Fermín  
**PLAZO:** 75 Días a partir de la orden de inicio  
**AMPLIACIONES:** 28 Días  
**SUSPENSIÓN:** 0 Días  
**TOTAL:** 103 Días

**V. CONTRATO:** 112,829.17  
**V. PLANILLAS:** 50,462.65  
**V. EXCEDENTES:** 19,617.92  
**% DE AVANCE:** 44.72%

**ACTIVADO:** 112,829.17  
**PARCIAL:** 50,462.65  
**19,617.92**  
**44.72%**

**FECHA DE PLANILLA:** 25 de febrero de 2026  
**INICIO DEL PLAZO:** 22 de mayo de 2025  
**TERMINACIÓN DEL PLAZO:** 1 de septiembre de 2025  
**PERÍODO:** 01-ago-25 A 01-sep-25

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CONTRATO	TOTAL	CANTIDADES			IMPORTE			
						T. ANTERIOR	ESTE PERÍODO	TOTAL FECHA	T. ANTERIOR	ESTE PERÍODO	TOTAL FECHA	
<b>SEÑALES AMBIENTALES</b>												
72	Pancarta informativa de la obra (letrero) con estructura	u	1 00	\$ 377.45	\$ 377.45	-	-	-	-	-	0.00%	0.00
73	Señales informativas y reglamentarias (1 30mx0 80m)	u	3 00	\$ 75.94	\$ 227.82	-	-	-	-	-	0.00%	0.00
74	Chita peligro colores intensos (mat. poliéster)	m	100 00	\$ 0.33	\$ 33.00	-	-	-	-	-	0.00%	0.00
75	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1 00	\$ 18.11	\$ 18.11	-	-	-	-	-	0.00%	0.00
76	Kit antiheridas	u	2 00	\$ 162.50	\$ 325.00	-	-	-	-	-	0.00%	0.00
77	Charla Ambiental	hora	4 00	\$ 62.50	\$ 250.00	-	-	-	-	-	0.00%	0.00
<b>DESCUENTOS:</b>					<b>\$ 112,829.17</b>							
Anticipo												
Multa por Mora												
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 50,462.65</b>	<b>\$ 62,166.80</b>	<b>\$ 112,629.43</b>	<b>\$ 62,166.80</b>	<b>\$ 50,462.65</b>	<b>\$ 112,629.43</b>	<b>\$ 11,282.92</b>	<b>\$ 11,282.92</b>
<b>LÍQUIDO</b>					<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	

SON: CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS DÓLARES, 41/100 CENTAVOS



**JORGE RODRIGO PICO**  
**ANGULO**  
**FISCALIZADOR**



**CLAUDIO FERMIN**  
**CAJAMBE GUILCAPI**  
**CONTRATISTA**



**GOBIERNO DE  
PASTAZA**

*El Gobierno del Azuay*

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN**

**OBRA:** CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA

**Fecha de elaboración:** 25 de febrero de 2026

**Contratista:** Ing. Cayambe Guilcapi Claudio Fermín

**Fecha de índices sub-cero:** dic-22

**Fecha de índices sub-uno:** ago-25

**Fecha de contrato:** 08-feb-23

**Monto del contrato:** \$ 112,829.17

**Valor de planilla o anticipo:** \$ 50,462.65

**Anticipo descontado:** \$ 5,066.24

**Po:** 45,396.41 \$

**CUADRILLA TIPO**

Categoría	Coficiente C	Salarios Reales Diarios		CxBI	CxBo
		B1 241	Bo 209		
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 (GRUPO I)	0.148	37.990	34.350	5.623	5.084
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2 (GRUPO II)	0.040	36.160	32.700	1.446	1.308
SIN TITULO D2	0.019	34.280	31.000	0.651	0.589
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3	0.000	38.050	34.410	-	-
CHOFERES PROFESIONALES CH C1	0.362	49.730	44.970	18.002	16.279
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	0.012	37.990	34.350	0.456	0.412
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2	0.003	36.160	32.700	0.108	0.098
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	0.213	34.280	31.000	7.302	6.603
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	0.203	33.860	30.620	6.874	6.216

**TOTAL**

1.000 40.462 36.589

**Coficiente** **Indices** **Factor**

C I1 Io Cx I1/Io

241 209

<b>Mano de obra</b>	0.177	40.462	36.589	0.196
<b>Equipo y maquinaria de Construc. vial</b>	0.634	208.880	184.950	0.716
<b>Acero en barras</b>	0.009	347.850	301.350	0.010
<b>Tubos y Acc. de hierro o acero (I)</b>	0.122	311.020	276.010	0.137
<b>IPC TUNGURAHUA</b>	0.058	111.230	109.390	0.059

**TOTAL**

1.000 1.118

**Valor a reajustarse en esta planilla**

(Po) \$ 45,396.41

**Factor de reajuste -1**

(-1) 0.118

**Valor de reajuste**

(Pr) \$ 5,356.78

**Valor de reajuste provisional**

(Vr) \$ 5,356.78

**Diferencia de reajuste**

**LIQUIDO A PAGARSE**

**\$ 5,356.78**



FISCALIZADOR  
JORGE RODRIGO PICO  
ANGULO

**Ing. Rodrigo Pico**

FISCALIZADOR



CLAUDIO FERMIN  
CAYAMBE GUILCAPI

**Ing. Cayambe Guilcapi Claudio Fermín**

CONTRATISTA



GOBIERNO DE  
**PASTAZA**  
*El Gobierno del Añono*

# **3 CÁLCULO DE VOLUMENES Y SECCIONES TRANSVERSALES POR CADA RUBRO**

**PROYECTO:**

***“CONSTRUCCIÓN DE AFIRMADO DE VARIAS VÍAS UBICADA EN LA  
PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA”.***

***PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA***

AFIRMADO LOS ALTARES			
ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA			
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	<b>PERIODO:</b>	01/08/2025 - 31/08/2025
<b>ÍTEM</b>	<b>RUBRO</b>	<b>PLANILLA:</b>	N° 4 DE LIQUIDACION DE OBRA
1	Transporte de maquinaria	<b>UNIDAD</b>	g/b

ÍTEM	LARGO (Km)	ANCHO (m)	ESPEJOR (m)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL ( g/b)	OBSERVACIONES
LOS ALTARES					3	3.00	
<b>PLANILLADO:</b>						<b>3.00</b>	

CONTRATADO 4.00  
 EJECUTADO ESTE PERIODO 3.00  
 EJECUTADO PLANILLAS ANTERIORES 1.00  
 TOTAL EJECUTADO 4.00  
 TOTAL ESTA PLANILLA= 3.00

AFIRMADO LOS ALTARES			
ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA			
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	<b>PERIODO:</b>	01/08/2025 - 31/08/2025
<b>ÍTEM</b>	<b>RUBRO</b>	<b>PLANILLA:</b>	N° 4 DE LIQUIDACION DE OBRA
13	Transporte de maquinaria	<b>UNIDAD</b>	g/b

ÍTEM	LARGO (Km)	ANCHO (m)	ESPEJOR (m)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL ( g/b)	OBSERVACIONES
LOS ALTARES					2	2.00	
<b>PLANILLADO:</b>						<b>2.00</b>	

CONTRATADO 4.00  
 EJECUTADO ESTE PERIODO 2.00  
 EJECUTADO PLANILLAS ANTERIORES 2.00  
 TOTAL EJECUTADO 4.00  
 TOTAL ESTA PLANILLA= 2.00

AFIRMADO MONTE SINAI (AMPLIACION DE VIA)			
ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA			
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	<b>PERIODO:</b>	01/08/2025 - 31/08/2025
<b>ÍTEM</b>	<b>RUBRO</b>	<b>PLANILLA:</b>	N° 4 DE LIQUIDACION DE OBRA
25	Transporte de maquinaria	<b>UNIDAD</b>	g/b

ÍTEM	LARGO (Km)	ANCHO (m)	ESPEJOR (m)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL ( g/b)	OBSERVACIONES
MONTE SINAI					4	4.00	
<b>PLANILLADO:</b>						<b>4.00</b>	

CONTRATADO 4.00  
 EJECUTADO ESTE PERIODO 4.00  
 EJECUTADO PLANILLAS ANTERIORES -  
 TOTAL EJECUTADO 4.00  
 TOTAL ESTA PLANILLA= 4.00

AFIRMADO MONTE SINAI (AMPLIACION DE VIA)			
ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA			
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	<b>PERIODO:</b>	01/08/2025 - 31/08/2025
<b>ÍTEM</b>	<b>RUBRO</b>	<b>PLANILLA:</b>	N° 4 DE LIQUIDACION DE OBRA
27	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	<b>UNIDAD</b>	m³

EXCAVACION NRO 1								
Station	Cut Area (Sq.m.)	Cut Volume (Cu.m.)	Reusable Volume (Cu.m.)	Fill Area (Sq.m.)	Fill Volume (Cu.m.)	Cum. Cut Vol. (Cu.m.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.m.)	Cum. Fill Vol. (Cu.m.)
0+00,000	0.98	0	0	0.28	0	0	0	0
0+05,000	0.78	4.4	4.4	0.31	1.48	4.4	4.4	1.48
0+10,000	1.16	4.86	4.86	0	0.79	9.27	9.27	2.28
0+15,000	0.88	5.1	5.1	0	0.01	14.37	14.37	2.29
0+20,000	0.84	4.29	4.29	0	0	18.66	18.66	2.29
0+25,000	1.44	5.69	5.69	0	0	24.35	24.35	2.3
0+30,000	1.63	7.67	7.67	0	0	32.02	32.02	2.3
0+35,000	1.63	8.14	8.14	0	0	40.16	40.16	2.3
0+40,000	2.09	9.3	9.3	0	0	49.46	49.46	2.3
0+45,000	2.8	12.23	12.23	0	0	61.69	61.69	2.3
0+50,000	2.32	12.79	12.79	0	0	74.48	74.48	2.3
0+55,000	2.1	11.04	11.04	0	0	85.52	85.52	2.3
0+60,000	0.79	7.21	7.21	0.68	1.69	92.73	92.73	3.99
0+65,000	0.39	2.94	2.94	0.84	3.79	95.66	95.66	7.77
0+70,000	0.08	1.16	1.16	0.87	4.27	96.83	96.83	12.04
0+75,000	0.02	0.23	0.23	0.65	3.8	97.06	97.06	15.84
0+80,000	0.01	0.07	0.07	0.37	2.56	97.13	97.13	18.4
0+85,000	0.1	0.27	0.27	0.26	1.58	97.39	97.39	19.99
0+90,000	0.25	0.87	0.87	0.23	1.2	98.26	98.26	21.19
0+95,000	0.44	1.73	1.73	0.18	1.03	99.99	99.99	22.22
1+00,000	0.31	1.85	1.85	0.22	1	101.84	101.84	23.23
1+05,000	0	0.76	0.76	1.41	4.07	102.6	102.6	27.3
1+10,000	0.06	0.14	0.14	3.88	13.21	102.75	102.75	40.51
1+15,000	0.18	0.59	0.59	1.2	12.69	103.34	103.34	53.2
1+20,000	0.18	0.91	0.91	1.34	6.35	104.25	104.25	59.55
1+25,000	0.27	1.12	1.12	2.11	8.62	105.37	105.37	68.17
1+30,000	0.14	1.01	1.01	2.26	10.93	106.38	106.38	79.1
1+35,000	0.04	0.45	0.45	2.36	11.55	106.82	106.82	90.66
1+40,000	0.25	0.72	0.72	2.27	11.56	107.55	107.55	102.22
1+45,000	0.5	1.88	1.88	1.88	10.36	109.43	109.43	112.58
1+50,000	0.82	3.3	3.3	1.19	7.66	112.73	112.73	120.23
1+55,000	1.08	4.84	4.84	1.01	5.52	117.56	117.56	125.75
1+60,000	0.78	4.66	4.66	1.32	5.82	122.23	122.23	131.57
1+65,000	0.28	2.72	2.72	2.01	8.36	124.94	124.94	139.93
1+70,000	0.14	1.07	1.07	2	10.04	126.02	126.02	149.97
1+75,000	0.31	1.15	1.15	1.62	9.05	127.17	127.17	159.03
1+80,000	0.37	1.72	1.72	1.64	8.15	128.89	128.89	167.18
1+85,000	0.21	1.47	1.47	1.77	8.53	130.36	130.36	175.71
1+90,000	0.1	0.76	0.76	1.88	9.05	131.11	131.11	184.76
1+95,000	0.05	0.36	0.36	1.85	9.33	131.47	131.47	194.09
2+00,000	0	0.12	0.12	1.23	7.7	131.59	131.59	201.8
2+05,000	0.39	0.96	0.96	0.71	4.81	132.55	132.55	206.61
2+10,000	0.72	2.77	2.77	0.79	3.74	135.32	135.32	210.35
2+15,000	0.56	3.19	3.19	0.69	3.7	138.51	138.51	214.05
2+20,000	0.47	2.58	2.58	0.79	3.72	141.09	141.09	217.77
2+25,000	0.27	1.87	1.87	1.18	4.92	142.96	142.96	222.69
2+30,000	0.27	1.37	1.37	1.59	6.9	144.32	144.32	229.6
2+35,000	0.49	1.91	1.91	1.77	8.38	146.23	146.23	237.97
2+40,000	0.25	1.84	1.84	1.73	8.73	148.07	148.07	246.7
2+45,000	0.16	1.01	1.01	1.68	8.51	149.08	149.08	255.21
2+50,000	0.19	0.87	0.87	1.42	7.75	149.95	149.95	262.96
2+55,000	0.45	1.61	1.61	0.97	5.98	151.56	151.56	268.94
2+60,000	0.26	1.78	1.78	1.01	4.94	153.34	153.34	273.88
2+65,000	0.17	1.06	1.06	1.1	5.26	154.4	154.4	279.14
2+70,000	0.09	0.64	0.64	1	5.23	155.04	155.04	284.37
2+75,000	0.27	0.9	0.9	0.88	4.68	155.94	155.94	289.05
2+80,000	0.45	1.81	1.81	0.8	4.2	157.75	157.75	293.25
2+85,000	0.64	2.75	2.75	0.6	3.5	160.5	160.5	296.75
2+87,048	0.59	1.26	1.26	0.68	1.31	161.76	161.76	298.07

EXCAVACION NRO 2								
Station	Cut Area (Sq.m.)	Cut Volume (Cu.m.)	Reusable Volume (Cu.m.)	Fill Area (Sq.m.)	Fill Volume (Cu.m.)	Cum. Cut Vol. (Cu.m.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.m.)	Cum. Fill Vol. (Cu.m.)
0+00,000	1.01	0	0	0	0	0	0	0
0+05,000	0.93	4.86	4.86	0	0	4.86	4.86	0
0+10,000	0.87	4.51	4.51	0	0	9.36	9.36	0
0+15,000	0.85	4.31	4.31	0	0	13.68	13.68	0
0+20,000	0.88	4.32	4.32	0	0	18	18	0.01
0+25,000	1.1	4.94	4.94	0	0	22.94	22.94	0.01
0+30,000	1.2	5.76	5.76	0	0	28.7	28.7	0.01
0+35,000	0.96	5.41	5.41	0	0	34.11	34.11	0.01
0+40,000	0.87	4.57	4.57	0	0	38.69	38.69	0.01
0+45,000	0.93	4.51	4.51	0	0	43.19	43.19	0.01
0+50,000	1.06	4.97	4.97	0	0	48.16	48.16	0.01
0+55,000	1.1	5.4	5.4	0	0	53.56	53.56	0.01
0+58,386	1.09	3.71	3.71	0	0	57.28	57.28	0.01

EXCAVACION NRO 3								
Station	Cut Area (Sq.m.)	Cut Volume (Cu.m.)	Reusable Volume (Cu.m.)	Fill Area (Sq.m.)	Fill Volume (Cu.m.)	Cum. Cut Vol. (Cu.m.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.m.)	Cum. Fill Vol. (Cu.m.)
0+00,000	1.35	0	0	0	0	0	0	0
0+10,000	1.24	12.96	12.96	0	0	12.96	12.96	0
0+20,000	1.53	13.85	13.85	0	0	26.8	26.8	0
0+30,000	1.17	13.52	13.52	0	0	40.32	40.32	0
0+40,000	1.04	11.06	11.06	0	0	51.38	51.38	0
0+50,000	1.42	12.27	12.27	0	0	63.65	63.65	0
0+60,000	1.31	13.64	13.64	0	0	77.29	77.29	0
0+70,000	1.33	13.2	13.2	0	0	90.49	90.49	0
0+80,000	0.16	7.44	7.44	0.35	1.73	97.93	97.93	1.73
0+90,000	0.18	1.68	1.68	0.28	3.11	99.61	99.61	4.84
1+00,000	0.68	4.27	4.27	0.22	2.47	103.88	103.88	7.31
1+10,000	1.01	8.45	8.45	0	1.09	112.33	112.33	8.4
1+10.031	1.01	0.03	0.03	0	0	112.36	112.36	8.4

EXCAVACION NRO 4								
Station	Cut Area (Sq.m.)	Cut Volume (Cu.m.)	Reusable Volume (Cu.m.)	Fill Area (Sq.m.)	Fill Volume (Cu.m.)	Cum. Cut Vol. (Cu.m.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.m.)	Cum. Fill Vol. (Cu.m.)
0+00,000	1.71	0	0	0	0	0	0	0
0+05,000	1.55	8.14	8.14	0	0	8.14	8.14	0
0+10,000	1.44	7.47	7.47	0	0	15.61	15.61	0
0+15,000	1.22	6.65	6.65	0	0	22.26	22.26	0
0+20,000	0.91	5.32	5.32	0	0	27.58	27.58	0
0+25,000	0.76	4.17	4.17	0.14	0.35	31.75	31.75	0.35
0+30,000	0.87	4.07	4.07	0.15	0.71	35.82	35.82	1.06
0+35,000	1.11	4.94	4.94	0	0.37	40.77	40.77	1.43
0+40,000	1.46	6.42	6.42	0	0.01	47.19	47.19	1.43
0+44,999	1.68	7.84	7.84	0	0	55.03	55.03	1.43

Mejoramiento 1:	298.07
Mejoramiento 2:	0.01
Mejoramiento 3:	8.4
Mejoramiento 4:	1.43
<b>PLANILLADO RUBRO 28:</b>	<b>307.91</b>

EXCAVACION NRO 1	161.76
EXCAVACION NRO 2	57.28
EXCAVACION NRO 3	112.36
EXCAVACION NRO 4	55.03
<b>PLANILLADO:</b>	<b>386.43</b>

Nota: Al momento de realizar el calculo del corte, se calcula tambien desde el perfil de corte al suelo natural el mejoramiento colocada en el software.

CONTRATADO	100.00
EJECUTADO ESTE PERIODO	386.43
EJECUTADO PLANILLAS ANTERIORES	-
<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>386.43</b>
<b>TOTAL ESTA PLANILLA=</b>	<b>386.43</b>

AFIRMADO MONTE SINAI (AMPLIACION DE VIA)			
ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA			
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	<b>PERIODO:</b>	01/08/2025 - 31/08/2025
<b>ÍTEM</b>	<b>RUBRO</b>	<b>PLANILLA:</b>	N° 4 DE LIQUIDACION DE OBRA
28	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	<b>UNIDAD</b>	m³

ÍTEM	LARGO (Km)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m²)	CANTIDAD	TOTAL ( m³)		
PLANILLADO EN RUBRO 27:					1	307.91		
Station	Cut Area (Sq.m.)	Cut Volume (Cu.m.)	Reusable Volume (Cu.m.)	Fill Area (Sq.m.)	Fill Volume (Cu.m.)	Cum. Cut Vol. (Cu.m.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.m.)	Cum. Fill Vol. (Cu.m.)
0+00,000	0	0	0	2.26	0	0	0	0
0+05,000	0	0	0	2.43	11.73	0	0	11.73
0+10,000	0	0	0	2.56	12.47	0	0	24.2
0+15,000	0	0	0	2.4	12.42	0	0	36.62
0+20,000	0	0	0	2.73	12.83	0	0	49.45
0+25,000	0	0	0	2.53	13.14	0	0	62.6
0+30,000	0	0	0	2.52	12.63	0	0	75.23
0+35,000	0	0	0	2.63	12.89	0	0	88.11
0+40,000	0	0	0	2.5	12.83	0	0	100.94
0+45,000	0	0	0	2.76	13.15	0	0	114.1
0+50,000	0	0	0	2.81	13.92	0	0	128.02
0+55,000	0	0	0	2.65	13.65	0	0	141.67
0+60,000	0	0	0	2.6	13.13	0	0	154.8
0+65,000	0	0	0	2.63	13.08	0	0	167.88
0+70,000	0	0	0	2.56	12.97	0	0	180.85
0+75,000	0	0	0	2.73	13.23	0	0	194.08
0+80,000	0	0	0	2.79	13.81	0	0	207.89
0+85,000	0	0	0	2.75	13.85	0	0	221.74
0+90,000	0	0	0	2.87	14.04	0	0	235.78
0+95,000	0	0	0	2.89	14.58	0	0	250.36
1+00,000	0	0	0	2.99	14.7	0	0	265.06
1+05,000	0	0	0	4.26	18.14	0	0	283.2
1+10,000	0	0	0	4.54	22.01	0	0	305.21
1+15,000	0	0	0	3.68	20.55	0	0	325.76
1+20,000	0	0	0	4.2	19.7	0	0	345.47
1+25,000	0	0	0	4.52	21.82	0	0	367.29
1+30,000	0	0	0	4.07	21.5	0	0	388.78
1+35,000	0	0	0	4.17	20.62	0	0	409.4
1+40,000	0	0	0	4.38	21.39	0	0	430.79
1+45,000	0	0	0	4.77	22.87	0	0	453.66
1+50,000	0	0	0	4.8	23.91	0	0	477.57
1+55,000	0	0	0	4.56	23.26	0	0	500.83
1+60,000	0	0	0	4.73	23.04	0	0	523.87
1+65,000	0	0	0	4.26	22.46	0	0	546.33
1+70,000	0	0	0	4.27	21.32	0	0	567.65
1+75,000	0	0	0	4.59	22.14	0	0	589.79
1+80,000	0	0	0	4.73	23.3	0	0	613.1
1+85,000	0	0	0	4.76	23.73	0	0	636.83
1+90,000	0	0	0	4.67	23.56	0	0	660.39
1+95,000	0	0	0	4.48	23.12	0	0	683.51
2+00,000	0	0	0	4.91	23.7	0	0	707.21
2+05,000	0	0	0	5.51	26.06	0	0	733.27
2+10,000	0	0	0	5.42	27.32	0	0	760.59
2+15,000	0	0	0	5.15	26.42	0	0	787.01
2+20,000	0	0	0	5.03	25.46	0	0	812.47
2+25,000	0	0	0	5.08	25.29	0	0	837.76
2+30,000	0	0	0	5.34	26.07	0	0	863.83
2+35,000	0	0	0	5.26	26.5	0	0	890.34
2+40,000	0	0	0	4.33	23.97	0	0	914.31
2+45,000	0	0	0	3.66	19.99	0	0	934.3
2+50,000	0	0	0	5.47	22.83	0	0	957.13
2+55,000	0	0	0	6.46	29.82	0	0	986.95
2+60,000	0	0	0	6.5	32.4	0	0	1019.35
2+65,000	0	0	0	6.4	32.27	0	0	1051.61
2+70,000	0	0	0	6.34	31.86	0	0	1083.47
2+75,000	0	0	0	6.3	31.6	0	0	1115.07
2+80,000	0	0	0	7.23	33.83	0	0	1148.9
2+85,000	0	0	0	8.27	38.75	0	0	1187.65
2+90,000	0	0	0	9.4	44.18	0	0	1231.83
2+95,000	0	0	0	10.39	49.49	0	0	1281.31
3+00,000	0	0	0	10.37	51.91	0	0	1333.22
3+05,000	0	0	0	9.18	48.88	0	0	1382.1
3+10,000	0	0	0	8.1	43.2	0	0	1425.3
3+15,000	0	0	0	7.22	38.31	0	0	1463.61
3+20,000	0	0	0	6.94	35.82	0	0	1499.43

3+25,000	0	0	0	6.89	34.58	0	0	1534.01
3+30,000	0	0	0	7.49	36.32	0	0	1570.32
3+35,000	0	0	0	8.54	40.07	0	0	1610.39
3+40,000	0	0	0	9.3	44.61	0	0	1655
3+45,000	0	0	0	10.42	49.3	0	0	1704.3
3+50,000	0	0	0	9.44	49.85	0	0	1753.95
3+55,000	0	0	0	7.47	42.26	0	0	1796.21
3+60,000	0	0	0	4.01	28.69	0	0	1824.9
3+65,000	0	0	0	3.1	17.77	0	0	1842.67
3+70,000	0	0	0	3.72	17.05	0	0	1859.72
3+75,000	0	0	0	5.43	22.88	0	0	1882.6
3+80,000	0	0	0	5.49	27.31	0	0	1909.91
3+85,000	0	0	0	5.5	27.47	0	0	1937.38
3+90,000	0	0	0	4.2	24.24	0	0	1961.62
3+95,000	0	0	0	3.62	19.54	0	0	1981.17
4+00,000	0	0	0	3.27	17.22	0	0	1998.38
4+05,000	0	0	0	3.24	16.27	0	0	2014.66
4+10,000	0	0	0	4.18	18.54	0	0	2033.2
4+15,000	0	0	0	4.33	21.27	0	0	2054.47
4+20,000	0	0	0	4.43	21.91	0	0	2076.38
4+25,000	0	0	0	4.78	23.03	0	0	2099.41
4+30,000	0	0	0	5.41	25.46	0	0	2124.87
4+35,000	0	0	0	5.47	27.2	0	0	2152.07
4+40,000	0	0	0	5.96	28.58	0	0	2180.65
4+45,000	0	0	0	4.42	25.93	0	0	2206.59
4+50,000	0	0	0	3.94	20.88	0	0	2227.47
4+55,000	0	0	0	3.62	18.9	0	0	2246.37
4+60,000	0	0	0	3.09	16.79	0	0	2263.16
4+65,000	0	0	0	3.15	15.6	0	0	2278.76
4+70,000	0	0	0	3.52	16.68	0	0	2295.44
4+75,000	0	0	0	3.72	18.12	0	0	2313.55
4+80,000	0	0	0	3.15	17.19	0	0	2330.75
4+85,000	0	0	0	2.37	13.81	0	0	2344.55
4+90,000	0	0	0	0.71	7.7	0	0	2352.25
4+95,000	0	0	0	1.56	5.67	0	0	2357.92
5+00,000	0	0	0	1.87	8.56	0	0	2366.48
5+05,000	0	0	0	1.58	8.61	0	0	2375.09
5+10,000	0	0	0	1.26	7.1	0	0	2382.19
5+15,000	0	0	0	1.52	6.95	0	0	2389.14
5+20,000	0	0	0	1.8	8.29	0	0	2397.43
5+25,000	0	0	0	2.25	10.12	0	0	2407.55
5+30,000	0	0	0	2.39	11.6	0	0	2419.15
5+35,000	0	0	0	2.35	11.83	0	0	2430.98
5+40,000	0	0	0	2.19	11.35	0	0	2442.33
5+45,000	0	0	0	2.35	11.37	0	0	2453.7
5+50,000	0	0	0	2.49	12.11	0	0	2465.82
5+55,000	0	0	0	2.82	13.28	0	0	2479.1
5+60,000	0	0	0	3.58	16	0	0	2495.1
5+65,000	0	0	0	4.34	19.8	0	0	2514.9
5+70,000	0	0	0	4.54	22.21	0	0	2537.1
5+75,000	0	0	0	2.35	17.22	0	0	2554.32
5+80,000	0	0	0	1.63	9.95	0	0	2564.27
5+85,000	0	0	0	1.22	7.14	0	0	2571.41
5+90,000	0	0	0	0.78	5.01	0	0	2576.42
5+95,000	0	0	0	0.67	3.63	0	0	2580.05
6+00,000	0	0	0	0.51	2.96	0	0	2583.02
6+05,000	0	0	0	0.36	2.19	0	0	2585.21
6+10,000	0	0	0	0.22	1.45	0	0	2586.65
6+15,000	0	0	0	0.12	0.85	0	0	2587.5
6+15,622	0	0	0	0.14	0.08	0	0	2587.58

MEJORAMIENTO EN CORTES: 307.91

MEJORAMIENTO VIAL: 2587.58

**PLANILLADO: 2895.49**

CONTRATADO 2,880.00  
EJECUTADO ESTE PERIODO 2,895.49  
EJECUTADO PLANILLAS ANTERIORES -  
**TOTAL EJECUTADO 2,895.49**  
**TOTAL ESTA PLANILLA= 2,895.49**

**AFIRMADO MONTE SINAI (AMPLIACION DE VIA)**

**ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA**

<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	<b>PERIODO:</b>	01/08/2025 - 31/08/2025
<b>ÍTEM</b>	<b>RUBRO</b>	<b>PLANILLA:</b>	N° 4 DE LIQUIDACION DE OBRA
29	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	<b>UNIDAD</b>	m³-km

ÍTEM		LARGO (Km)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL ( m³-km)	
PLANILLADO EN RUBRO 27:						1	307.91	
Station	Cut Area (Sq.m.)	Cut Volume (Cu.m.)	Reusable Volume (Cu.m.)	Fill Area (Sq.m.)	Fill Volume (Cu.m.)	Cum. Cut Vol. (Cu.m.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.m.)	Cum. Fill Vol. (Cu.m.)
0+00,000	0	0	0	2.26	0	0	0	0
0+05,000	0	0	0	2.43	11.73	0	0	11.73
0+10,000	0	0	0	2.56	12.47	0	0	24.2
0+15,000	0	0	0	2.4	12.42	0	0	36.62
0+20,000	0	0	0	2.73	12.83	0	0	49.45
0+25,000	0	0	0	2.53	13.14	0	0	62.6
0+30,000	0	0	0	2.52	12.63	0	0	75.23
0+35,000	0	0	0	2.63	12.89	0	0	88.11
0+40,000	0	0	0	2.5	12.83	0	0	100.94
0+45,000	0	0	0	2.76	13.15	0	0	114.1
0+50,000	0	0	0	2.81	13.92	0	0	128.02
0+55,000	0	0	0	2.65	13.65	0	0	141.67
0+60,000	0	0	0	2.6	13.13	0	0	154.8
0+65,000	0	0	0	2.63	13.08	0	0	167.88
0+70,000	0	0	0	2.56	12.97	0	0	180.85
0+75,000	0	0	0	2.73	13.23	0	0	194.08
0+80,000	0	0	0	2.79	13.81	0	0	207.89
0+85,000	0	0	0	2.75	13.85	0	0	221.74
0+90,000	0	0	0	2.87	14.04	0	0	235.78
0+95,000	0	0	0	2.89	14.58	0	0	250.36
1+00,000	0	0	0	2.99	14.7	0	0	265.06
1+05,000	0	0	0	4.26	18.14	0	0	283.2
1+10,000	0	0	0	4.54	22.01	0	0	305.21
1+15,000	0	0	0	3.68	20.55	0	0	325.76
1+20,000	0	0	0	4.2	19.7	0	0	345.47
1+25,000	0	0	0	4.52	21.82	0	0	367.29
1+30,000	0	0	0	4.07	21.5	0	0	388.78
1+35,000	0	0	0	4.17	20.62	0	0	409.4
1+40,000	0	0	0	4.38	21.39	0	0	430.79
1+45,000	0	0	0	4.77	22.87	0	0	453.66
1+50,000	0	0	0	4.8	23.91	0	0	477.57
1+55,000	0	0	0	4.56	23.26	0	0	500.83
1+60,000	0	0	0	4.73	23.04	0	0	523.87
1+65,000	0	0	0	4.26	22.46	0	0	546.33
1+70,000	0	0	0	4.27	21.32	0	0	567.65
1+75,000	0	0	0	4.59	22.14	0	0	589.79
1+80,000	0	0	0	4.73	23.3	0	0	613.1
1+85,000	0	0	0	4.76	23.73	0	0	636.83
1+90,000	0	0	0	4.67	23.56	0	0	660.39
1+95,000	0	0	0	4.48	23.12	0	0	683.51
2+00,000	0	0	0	4.91	23.7	0	0	707.21
2+05,000	0	0	0	5.51	26.06	0	0	733.27
2+10,000	0	0	0	5.42	27.32	0	0	760.59
2+15,000	0	0	0	5.15	26.42	0	0	787.01
2+20,000	0	0	0	5.03	25.46	0	0	812.47
2+25,000	0	0	0	5.08	25.29	0	0	837.76
2+30,000	0	0	0	5.34	26.07	0	0	863.83
2+35,000	0	0	0	5.26	26.5	0	0	890.34
2+40,000	0	0	0	4.33	23.97	0	0	914.31
2+45,000	0	0	0	3.66	19.99	0	0	934.3
2+50,000	0	0	0	5.47	22.83	0	0	957.13
2+55,000	0	0	0	6.46	29.82	0	0	986.95
2+60,000	0	0	0	6.5	32.4	0	0	1019.35
2+65,000	0	0	0	6.4	32.27	0	0	1051.61
2+70,000	0	0	0	6.34	31.86	0	0	1083.47
2+75,000	0	0	0	6.3	31.6	0	0	1115.07
2+80,000	0	0	0	7.23	33.83	0	0	1148.9
2+85,000	0	0	0	8.27	38.75	0	0	1187.65
2+90,000	0	0	0	9.4	44.18	0	0	1231.83
2+95,000	0	0	0	10.39	49.49	0	0	1281.31
3+00,000	0	0	0	10.37	51.91	0	0	1333.22
3+05,000	0	0	0	9.18	48.88	0	0	1382.1
3+10,000	0	0	0	8.1	43.2	0	0	1425.3
3+15,000	0	0	0	7.22	38.31	0	0	1463.61
3+20,000	0	0	0	6.94	35.82	0	0	1499.43

3+25,000	0	0	0	6.89	34.58	0	0	1534.01
3+30,000	0	0	0	7.49	36.32	0	0	1570.32
3+35,000	0	0	0	8.54	40.07	0	0	1610.39
3+40,000	0	0	0	9.3	44.61	0	0	1655
3+45,000	0	0	0	10.42	49.3	0	0	1704.3
3+50,000	0	0	0	9.44	49.65	0	0	1753.95
3+55,000	0	0	0	7.47	42.26	0	0	1796.21
3+60,000	0	0	0	4.01	28.69	0	0	1824.9
3+65,000	0	0	0	3.1	17.77	0	0	1842.67
3+70,000	0	0	0	3.72	17.05	0	0	1859.72
3+75,000	0	0	0	5.43	22.88	0	0	1882.6
3+80,000	0	0	0	5.49	27.31	0	0	1909.91
3+85,000	0	0	0	5.5	27.47	0	0	1937.38
3+90,000	0	0	0	4.2	24.24	0	0	1961.62
3+95,000	0	0	0	3.62	19.54	0	0	1981.17
4+00,000	0	0	0	3.27	17.22	0	0	1998.38
4+05,000	0	0	0	3.24	16.27	0	0	2014.66
4+10,000	0	0	0	4.18	18.54	0	0	2033.2
4+15,000	0	0	0	4.33	21.27	0	0	2054.47
4+20,000	0	0	0	4.43	21.91	0	0	2076.38
4+25,000	0	0	0	4.78	23.03	0	0	2099.41
4+30,000	0	0	0	5.41	25.46	0	0	2124.87
4+35,000	0	0	0	5.47	27.2	0	0	2152.07
4+40,000	0	0	0	5.96	28.58	0	0	2180.65
4+45,000	0	0	0	4.42	25.93	0	0	2206.59
4+50,000	0	0	0	3.94	20.88	0	0	2227.47
4+55,000	0	0	0	3.62	18.9	0	0	2246.37
4+60,000	0	0	0	3.09	16.79	0	0	2263.16
4+65,000	0	0	0	3.15	15.6	0	0	2278.76
4+70,000	0	0	0	3.52	16.68	0	0	2295.44
4+75,000	0	0	0	3.72	18.12	0	0	2313.55
4+80,000	0	0	0	3.15	17.19	0	0	2330.75
4+85,000	0	0	0	2.37	13.81	0	0	2344.55
4+90,000	0	0	0	0.71	7.7	0	0	2352.25
4+95,000	0	0	0	1.56	5.67	0	0	2357.92
5+00,000	0	0	0	1.87	8.56	0	0	2366.48
5+05,000	0	0	0	1.58	8.61	0	0	2375.09
5+10,000	0	0	0	1.26	7.1	0	0	2382.19
5+15,000	0	0	0	1.52	6.95	0	0	2389.14
5+20,000	0	0	0	1.8	8.29	0	0	2397.43
5+25,000	0	0	0	2.25	10.12	0	0	2407.55
5+30,000	0	0	0	2.39	11.6	0	0	2419.15
5+35,000	0	0	0	2.35	11.83	0	0	2430.98
5+40,000	0	0	0	2.19	11.35	0	0	2442.33
5+45,000	0	0	0	2.35	11.37	0	0	2453.7
5+50,000	0	0	0	2.49	12.11	0	0	2465.82
5+55,000	0	0	0	2.82	13.28	0	0	2479.1
5+60,000	0	0	0	3.58	16	0	0	2495.1
5+65,000	0	0	0	4.34	19.8	0	0	2514.9
5+70,000	0	0	0	4.54	22.21	0	0	2537.1
5+75,000	0	0	0	2.35	17.22	0	0	2554.32
5+80,000	0	0	0	1.63	9.95	0	0	2564.27
5+85,000	0	0	0	1.22	7.14	0	0	2571.41
5+90,000	0	0	0	0.78	5.01	0	0	2576.42
5+95,000	0	0	0	0.67	3.63	0	0	2580.05
6+00,000	0	0	0	0.51	2.96	0	0	2583.02
6+05,000	0	0	0	0.36	2.19	0	0	2585.21
6+10,000	0	0	0	0.22	1.45	0	0	2586.65
6+15,000	0	0	0	0.12	0.85	0	0	2587.5
6+15,622	0	0	0	0.14	0.08	0	0	2587.58

MEJORAMIENTO EN CORTES: 307.91

MEJORAMIENTO VIAL: 2587.58

PLANILLADO RUBRO 29: 2895.49

LONGITUD DE RECORRIDO 3.31 KM

PLANILLADO: 9584.07

CONTRATADO 28,800.00  
EJECUTADO ESTE PERIODO 9,584.07  
EJECUTADO PLANILLAS ANTERIORES -  
TOTAL EJECUTADO 9,584.07  
TOTAL ESTA PLANILLA= 9,584.07

AFIRMADO MONTE SINAI (AMPLIACION DE VIA)			
ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA			
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	<b>PERIODO:</b>	01/08/2025 - 31/08/2025
<b>ÍTEM</b>	<b>RUBRO</b>	<b>PLANILLA:</b>	N° 4 DE LIQUIDACION DE OBRA
30	Limpieza de cunetas a máquina	<b>UNIDAD</b>	m

ÍTEM	LARGO (Km)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL ( m)	OBSERVACIONES
MONTE SINAI	300.00				1	300.00	
MONTE SINAI	300.00				1	300.00	

**PLANILLADO:** 600.00

CONTRATADO 600.00  
 EJECUTADO ESTE PERIODO 600.00  
 EJECUTADO PLANILLAS ANTERIORES -  
 TOTAL EJECUTADO 600.00  
 TOTAL ESTA PLANILLA= 600.00

AFIRMADO MONTE SINAI (AMPLIACION DE VIA)			
ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA			
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	<b>PERIODO:</b>	01/08/2025 - 31/08/2025
<b>ÍTEM</b>	<b>RUBRO</b>	<b>PLANILLA:</b>	N° 4 DE LIQUIDACION DE OBRA
31	Pancarta informativa de la obra (letrero)-con estructura	<b>UNIDAD</b>	u

ÍTEM	LARGO (Km)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL ( u)	OBSERVACIONES
MONTE SINAI					1	1.00	

**PLANILLADO:** 1.00

CONTRATADO 1.00  
 EJECUTADO ESTE PERIODO 1.00  
 EJECUTADO PLANILLAS ANTERIORES -  
 TOTAL EJECUTADO 1.00  
 TOTAL ESTA PLANILLA= 1.00

AFIRMADO MONTE SINAI (AMPLIACION DE VIA)			
ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA			
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	<b>PERIODO:</b>	01/08/2025 - 31/08/2025
<b>ÍTEM</b>	<b>RUBRO</b>	<b>PLANILLA:</b>	N° 4 DE LIQUIDACION DE OBRA
33	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	<b>UNIDAD</b>	m

ÍTEM	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL ( m)	OBSERVACIONES
MONTE SINAI	100.00				1	100.00	

**PLANILLADO:** 100.00

CONTRATADO 100.00  
 EJECUTADO ESTE PERIODO 100.00  
 EJECUTADO PLANILLAS ANTERIORES -  
 TOTAL EJECUTADO 100.00  
 TOTAL ESTA PLANILLA= 100.00

AFIRMADO MONTE SINAI (AMPLIACION DE VIA)			
ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA			
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	<b>PERIODO:</b>	01/08/2025 - 31/08/2025
<b>ÍTEM</b>	<b>RUBRO</b>	<b>PLANILLA:</b>	N° 4 DE LIQUIDACION DE OBRA
34	Contenedores metálicos de 55 galones	<b>UNIDAD</b>	u

ÍTEM	LARGO (Km)	ANCHO (m)	ESPEJOR (m)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL ( u )	OBSERVACIONES
MONTE SINAI					1	1.00	

**PLANILLADO:** 1.00

CONTRATADO 1.00  
 EJECUTADO ESTE PERIODO 1.00  
 EJECUTADO PLANILLAS ANTERIORES -  
 TOTAL EJECUTADO 1.00  
 TOTAL ESTA PLANILLA= 1.00

AFIRMADO MONTE SINAI (AMPLIACION DE VIA)			
ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA			
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	<b>PERIODO:</b>	01/08/2025 - 31/08/2025
<b>ÍTEM</b>	<b>RUBRO</b>	<b>PLANILLA:</b>	N° 4 DE LIQUIDACION DE OBRA
35	Kit antiderrames	<b>UNIDAD</b>	u

ÍTEM	LARGO (Km)	ANCHO (m)	ESPEJOR (m)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL ( u )	OBSERVACIONES
MONTE SINAI					2	2.00	

**PLANILLADO:** 2.00

CONTRATADO 2.00  
 EJECUTADO ESTE PERIODO 2.00  
 EJECUTADO PLANILLAS ANTERIORES -  
 TOTAL EJECUTADO 2.00  
 TOTAL ESTA PLANILLA= 2.00

AFIRMADO MONTE SINAI (AMPLIACION DE VIA)			
ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA			
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	<b>PERIODO:</b>	01/08/2025 - 31/08/2025
<b>ÍTEM</b>	<b>RUBRO</b>	<b>PLANILLA:</b>	N° 4 DE LIQUIDACION DE OBRA
36	Charla Ambiental	<b>UNIDAD</b>	hora

ÍTEM	LARGO (Km)	ANCHO (m)	ESPEJOR (m)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL ( hora )	OBSERVACIONES
MONTE SINAI					4	4.00	

**PLANILLADO:** 4.00

CONTRATADO 4.00  
 EJECUTADO ESTE PERIODO 4.00  
 EJECUTADO PLANILLAS ANTERIORES -  
 TOTAL EJECUTADO 4.00  
 TOTAL ESTA PLANILLA= 4.00

AFIRMADO PRAGA SACHA			
ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA			
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	<b>PERIODO:</b>	01/08/2025 - 31/08/2025
<b>ÍTEM</b>	<b>RUBRO</b>	<b>PLANILLA:</b>	N° 4 DE LIQUIDACION DE OBRA
37	Transporte de maquinaria	<b>UNIDAD</b>	glb

ÍTEM	LARGO (Km)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL ( glb)	OBSERVACIONES
<b>PRAGA SACHA</b>					6	6.00	
<b>PLANILLADO:</b>						<b>6.00</b>	

CONTRATADO	4.00
EJECUTADO ESTE PERIODO	6.00
EJECUTADO PLANILLAS ANTERIORES	2.00
<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>8.00</b>
<b>TOTAL ESTA PLANILLA=</b>	<b>6.00</b>

AFIRMADO PRAGA SACHA			
ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA			
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	<b>PERIODO:</b>	01/08/2025 - 31/08/2025
<b>ÍTEM</b>	<b>RUBRO</b>	<b>PLANILLA:</b>	N° 4 DE LIQUIDACION DE OBRA
38	Replanteo y nivelacion	<b>UNIDAD</b>	km

ÍTEM	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL ( km)	OBSERVACIONES
<b>PRAGA SACHA</b>	0.40				1	0.40	
<b>PLANILLADO:</b>						<b>0.40</b>	

CONTRATADO	0.60
EJECUTADO ESTE PERIODO	0.40
EJECUTADO PLANILLAS ANTERIORES	0.60
<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL ESTA PLANILLA=</b>	<b>0.40</b>

AFIRMADO PRAGA SACHA			
ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA			
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	<b>PERIODO:</b>	01/08/2025 - 31/08/2025
<b>ÍTEM</b>	<b>RUBRO</b>	<b>PLANILLA:</b>	N° 4 DE LIQUIDACION DE OBRA
39	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	<b>UNIDAD</b>	m³

ÍTEM	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL ( m³)	OBSERVACIONES
<b>PRAGA SACHA</b>	25.00	5.50	1.75		1	240.63	
	375.00	6.00	0.15		1	337.50	
<b>PLANILLADO:</b>						<b>578.13</b>	

CONTRATADO	100.00
EJECUTADO ESTE PERIODO	578.13
EJECUTADO PLANILLAS ANTERIORES	1,619.46
<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>2,197.59</b>
<b>TOTAL ESTA PLANILLA=</b>	<b>578.13</b>

AFIRMADO PRAGA SACHA			
ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA			
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	<b>PERIODO:</b>	01/08/2025 - 31/08/2025
<b>ÍTEM</b>	<b>RUBRO</b>	<b>PLANILLA:</b>	N° 4 DE LIQUIDACION DE OBRA
40	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	<b>UNIDAD:</b>	m <sup>3</sup>

Station	Cut Area (Sq.m.)	Cut Volume (Cu.m.)	Reusable Volume (Cu.m.)	Fill Area (Sq.m.)	Fill Volume (Cu.m.)	Cum. Cut Vol. (Cu.m.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.m.)	Cum. Fill Vol. (Cu.m.)
0+00,000	0	0	0	6.49	0	0	0	0
0+10,000	0	0	0	5	57.46	0	0	57.46
0+20,000	0	0	0	6.82	59.12	0	0	116.58
0+30,000	0	0	0	6.93	68.75	0	0	185.33
0+40,000	0	0	0	5.99	64.62	0	0	249.95
0+50,000	0	0	0	5.58	57.79	0	0	307.74
0+60,000	0	0	0	4.66	51.2	0	0	358.93
0+70,000	0	0	0	5.01	48.32	0	0	407.26
0+80,000	0	0	0	4.34	46.75	0	0	454.01
0+90,000	0	0	0	4.42	43.81	0	0	497.82
1+00,000	0	0	0	5.06	47.41	0	0	545.23
1+10,000	0	0	0	4.8	49.29	0	0	594.52
1+20,000	0	0	0	4.7	47.42	0	0	641.94
1+30,000	0	0	0	5.35	50.02	0	0	691.96
1+40,000	0	0	0	5.13	52.29	0	0	744.25
1+50,000	0	0	0	12.07	85.47	0	0	829.72
1+60,000	0	0	0	7.22	96.21	0	0	925.93
1+70,000	0	0	0	4.71	59.69	0	0	985.63
1+80,000	0	0	0	4.53	46.25	0	0	1031.88
1+90,000	0	0	0	4.6	45.67	0	0	1077.55
2+00,000	0	0	0	4.9	47.51	0	0	1125.07
2+10,000	0	0	0	5.11	49.96	0	0	1175.02
2+20,000	0	0	0	5.61	53.58	0	0	1228.6
2+30,000	0	0	0	4.96	52.81	0	0	1281.41
2+40,000	0	0	0	5.18	50.64	0	0	1332.05
2+50,000	0	0	0	5.51	53.26	0	0	1385.32
2+60,000	0	0	0	4.66	50.86	0	0	1436.18
2+70,000	0	0	0	8.78	67.27	0	0	1503.44
2+80,000	0	0	0	5.52	71.48	0	0	1574.92
2+90,000	0	0	0	5.02	52.7	0	0	1627.63
3+00,000	0	0	0	4.96	49.94	0	0	1677.57
3+10,000	0	0	0	4.95	49.56	0	0	1727.12
3+20,000	0	0	0	6	54.72	0	0	1781.84
3+30,000	0	0	0	4.89	54.76	0	0	1836.6
3+40,000	0	0	0	4.65	47.46	0	0	1884.06
3+50,000	0	0	0	5.01	48.29	0	0	1932.36
3+60,000	0	0	0	4.5	47.63	0	0	1979.98
3+70,000	0	0	0	4.64	45.79	0	0	2025.78
3+80,000	0	0	0	4.95	47.84	0	0	2073.62
3+90,000	0	0	0	5.8	53.61	0	0	2127.23
4+00,000	0	0	0	5.56	56.79	0	0	2184.02
4+00,934	0	0	0	5.54	5.18	0	0	2189.2
CAMBIO, PARA PASO DE VOLQUETAS				22.5	13.5			2202.7
						<b>PLANILLADO:</b>	<b>2202.70</b>	

Nota: el cambio es de 4.5m \* 5.0m, dando 22.5m<sup>2</sup>, por un espesor de 0.60m

CONTRATADO	1,920.00
EJECUTADO ESTE PERIODO	2,202.70
EJECUTADO PLANILLAS ANTERIORES	2,561.63
<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>4,764.33</b>
<b>TOTAL ESTA PLANILLA=</b>	<b>2,202.70</b>

AFIRMADO PRAGA SACHA			
ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA			
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	<b>PERIODO:</b>	01/08/2025 - 31/08/2025
<b>ÍTEM</b>	<b>RUBRO</b>	<b>PLANILLA:</b>	N° 4 DE LIQUIDACION DE OBRA
41	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	<b>UNIDAD</b>	m³-km

Station	Cut Area (Sq.m.)	Cut Volume (Cu.m.)	Reusable Volume (Cu.m.)	Fill Area (Sq.m.)	Fill Volume (Cu.m.)	Cum. Cut Vol. (Cu.m.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.m.)	Cum. Fill Vol. (Cu.m.)
0+00,000	0	0	0	6.49	0	0	0	0
0+10,000	0	0	0	5	57.46	0	0	57.46
0+20,000	0	0	0	6.82	59.12	0	0	116.58
0+30,000	0	0	0	6.93	68.75	0	0	185.33
0+40,000	0	0	0	5.99	64.62	0	0	249.95
0+50,000	0	0	0	5.58	57.79	0	0	307.74
0+60,000	0	0	0	4.66	51.2	0	0	358.93
0+70,000	0	0	0	5.01	48.32	0	0	407.26
0+80,000	0	0	0	4.34	46.75	0	0	454.01
0+90,000	0	0	0	4.42	43.81	0	0	497.82
1+00,000	0	0	0	5.06	47.41	0	0	545.23
1+10,000	0	0	0	4.8	49.29	0	0	594.52
1+20,000	0	0	0	4.7	47.42	0	0	641.94
1+30,000	0	0	0	5.35	50.02	0	0	691.96
1+40,000	0	0	0	5.13	52.29	0	0	744.25
1+50,000	0	0	0	12.07	85.47	0	0	829.72
1+60,000	0	0	0	7.22	96.21	0	0	925.93
1+70,000	0	0	0	4.71	59.69	0	0	985.63
1+80,000	0	0	0	4.53	46.25	0	0	1031.88
1+90,000	0	0	0	4.6	45.67	0	0	1077.55
2+00,000	0	0	0	4.9	47.51	0	0	1125.07
2+10,000	0	0	0	5.11	49.96	0	0	1175.02
2+20,000	0	0	0	5.61	53.58	0	0	1228.6
2+30,000	0	0	0	4.96	52.81	0	0	1281.41
2+40,000	0	0	0	5.18	50.64	0	0	1332.05
2+50,000	0	0	0	5.51	53.26	0	0	1385.32
2+60,000	0	0	0	4.66	50.86	0	0	1436.18
2+70,000	0	0	0	8.78	67.27	0	0	1503.44
2+80,000	0	0	0	5.52	71.48	0	0	1574.92
2+90,000	0	0	0	5.02	52.7	0	0	1627.63
3+00,000	0	0	0	4.96	49.94	0	0	1677.57
3+10,000	0	0	0	4.95	49.56	0	0	1727.12
3+20,000	0	0	0	6	54.72	0	0	1781.84
3+30,000	0	0	0	4.89	54.76	0	0	1836.6
3+40,000	0	0	0	4.65	47.46	0	0	1884.06
3+50,000	0	0	0	5.01	48.29	0	0	1932.36
3+60,000	0	0	0	4.5	47.63	0	0	1979.98
3+70,000	0	0	0	4.64	45.79	0	0	2025.78
3+80,000	0	0	0	4.95	47.84	0	0	2073.62
3+90,000	0	0	0	5.8	53.61	0	0	2127.23
4+00,000	0	0	0	5.56	56.79	0	0	2184.02
4+00,934	0	0	0	5.54	5.18	0	0	2189.2
CAMBIO, PARA PASO DE VOLQUETAS				22.5	13.5			2202.7

Nota: el cambio es de 4.5m \* 5.0m, dando 22.5m2, por un espesor de 0.60m, siendo un volumen de 13.5 m3

PLANILLADO Rubro 40: 2202.70

DISTANCIA: 10.70

PLANILLADO: #####

CONTRATADO	19,200.00
EJECUTADO ESTE PERIODO	23,568.89
EJECUTADO PLANILLAS ANTERIORES	25,693.15
<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>49,262.04</b>
TOTAL ESTA PLANILLA=	23,568.89

AFIRMADO PRAGA SACHA			
ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA			
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	<b>PERIODO:</b>	01/08/2025 - 31/08/2025
<b>ÍTEM</b>	<b>RUBRO</b>	<b>PLANILLA:</b>	N° 4 DE LIQUIDACION DE OBRA
46	Limpieza de cunetas a máquina	<b>UNIDAD</b>	m

ÍTEM	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL ( m)	OBSERVACIONES
<b>PRAGA SACHA</b>	400.00				2	800.00	
<b>PLANILLADO:</b>						<b>800.00</b>	

CONTRATADO 1,000.00  
 EJECUTADO ESTE PERIODO 800.00  
 EJECUTADO PLANILLAS ANTERIORES 1,120.00  
 TOTAL EJECUTADO 1,920.00  
 TOTAL ESTA PLANILLA= 800.00

AFIRMADO PRAGA SACHA			
ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA			
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	<b>PERIODO:</b>	01/08/2025 - 31/08/2025
<b>ÍTEM</b>	<b>RUBRO</b>	<b>PLANILLA:</b>	N° 4 DE LIQUIDACION DE OBRA
50	Contenedores metálicos de 55 galones	<b>UNIDAD</b>	u

ÍTEM	LARGO (Km)	ANCHO (m)	ESPEJOR (m)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL ( u )	OBSERVACIONES
PRAGA SACHA					1	1.00	

**PLANILLADO:** 1.00

CONTRATADO 1.00  
 EJECUTADO ESTE PERIODO 1.00  
 EJECUTADO PLANILLAS ANTERIORES 1.00  
 TOTAL EJECUTADO 2.00  
 TOTAL ESTA PLANILLA= 1.00

AFIRMADO PRAGA SACHA			
ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA			
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	<b>PERIODO:</b>	01/08/2025 - 31/08/2025
<b>ÍTEM</b>	<b>RUBRO</b>	<b>PLANILLA:</b>	N° 4 DE LIQUIDACION DE OBRA
51	Kit antiderrames	<b>UNIDAD</b>	u

ÍTEM	LARGO (Km)	ANCHO (m)	ESPEJOR (m)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL ( u )	OBSERVACIONES
PRAGA SACHA					2	2.00	

**PLANILLADO:** 2.00

CONTRATADO 2.00  
 EJECUTADO ESTE PERIODO 2.00  
 EJECUTADO PLANILLAS ANTERIORES 2.00  
 TOTAL EJECUTADO 4.00  
 TOTAL ESTA PLANILLA= 2.00

AFIRMADO PRAGA SACHA			
ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA			
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	<b>PERIODO:</b>	01/08/2025 - 31/08/2025
<b>ÍTEM</b>	<b>RUBRO</b>	<b>PLANILLA:</b>	N° 4 DE LIQUIDACION DE OBRA
52	Charla Ambiental	<b>UNIDAD</b>	ho

ÍTEM	LARGO (Km)	ANCHO (m)	ESPEJOR (m)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL ( ho )	OBSERVACIONES
PRAGA SACHA					2	2.00	

**PLANILLADO:** 2.00

CONTRATADO 4.00  
 EJECUTADO ESTE PERIODO 2.00  
 EJECUTADO PLANILLAS ANTERIORES 4.00  
 TOTAL EJECUTADO 6.00  
 TOTAL ESTA PLANILLA= 2.00

AFIRMADO NUEVO MILEÑO ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA			
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	<b>PERIODO:</b>	01/08/2025 - 31/08/2025
<b>ÍTEM</b>	<b>RUBRO</b>	<b>PLANILLA:</b>	N° 4 DE LIQUIDACION DE OBRA
53	Transporte de maquinaria	<b>UNIDAD</b>	gib

ÍTEM	LARGO (Km)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL ( gib)	OBSERVACIONES
NUEVO MILEÑO					4	4.00	

**PLANILLADO:** 4.00

CONTRATADO 4.00  
 EJECUTADO ESTE PERIODO 4.00  
 EJECUTADO PLANILLAS ANTERIORES -  
 TOTAL EJECUTADO 4.00  
 TOTAL ESTA PLANILLA= 4.00

AFIRMADO NUEVO MILEÑO ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA			
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	<b>PERIODO:</b>	01/08/2025 - 31/08/2025
<b>ÍTEM</b>	<b>RUBRO</b>	<b>PLANILLA:</b>	N° 4 DE LIQUIDACION DE OBRA
54	Replanteo y nivelacion	<b>UNIDAD</b>	km

ÍTEM	LARGO (Km)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL ( km)	OBSERVACIONES
NUEVO MILEÑO	0.31				1	0.31	

**PLANILLADO:** 0.31

CONTRATADO 0.50  
 EJECUTADO ESTE PERIODO 0.31  
 EJECUTADO PLANILLAS ANTERIORES -  
 TOTAL EJECUTADO 0.31  
 TOTAL ESTA PLANILLA= 0.31

AFIRMADO NUEVO MILEÑO ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA			
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	<b>PERIODO:</b>	01/08/2025 - 31/08/2025
<b>ÍTEM</b>	<b>RUBRO</b>	<b>PLANILLA:</b>	N° 4 DE LIQUIDACION DE OBRA
55	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	<b>UNIDAD</b>	m³

**EXCAVACION 1**

Station	Cut Area (Sq.m.)	Cut Volume (Cu.m.)	Reusable Volume (Cu.m.)	Fill Area (Sq.m.)	Fill Volume (Cu.m.)	Cum. Cut Vol. (Cu.m.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.m.)	Cum. Fill Vol. (Cu.m.)
0+00,000	2.33	0	0	0	0	0	0	0
0+05,000	2.1	11.07	11.07	0	0	11.07	11.07	0
0+10,000	2.22	10.81	10.81	0	0	21.87	21.87	0
0+15,000	2.39	11.53	11.53	0	0	33.4	33.4	0
0+20,000	2.5	12.23	12.23	0	0	45.64	45.64	0
0+25,000	2.48	12.47	12.47	0	0	58.1	58.1	0
0+30,000	2.25	11.83	11.83	0	0	69.93	69.93	0
0+35,000	2	10.63	10.63	0	0	80.56	80.56	0
0+40,000	1.91	9.78	9.78	0	0	90.34	90.34	0
0+45,000	2.09	10	10	0	0	100.34	100.34	0
0+50,000	2.1	10.47	10.47	0	0	110.82	110.82	0
0+55,000	2.09	10.47	10.47	0	0	121.29	121.29	0
0+60,000	2.09	10.44	10.44	0	0	131.72	131.72	0
0+62,273	0	2.37	2.37	0	0	134.1	134.1	0

**EXCAVACION 2**

Station	Cut Area (Sq.m.)	Cut Volume (Cu.m.)	Reusable Volume (Cu.m.)	Fill Area (Sq.m.)	Fill Volume (Cu.m.)	Cum. Cut Vol. (Cu.m.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.m.)	Cum. Fill Vol. (Cu.m.)
0+00,000	2.31	0	0	0	0	0	0	0
0+05,000	2.78	12.72	12.72	0	0	12.72	12.72	0
0+10,000	3.07	14.61	14.61	0	0	27.33	27.33	0
0+15,000	3.2	15.68	15.68	0	0	43.01	43.01	0
0+20,000	2.94	15.36	15.36	0	0	58.37	58.37	0
0+25,000	2.8	14.35	14.35	0	0	72.72	72.72	0
0+30,000	2.68	13.7	13.7	0	0	86.43	86.43	0
0+35,000	2.6	13.21	13.21	0	0	99.63	99.63	0
0+40,000	2.58	12.94	12.94	0	0	112.57	112.57	0
0+45,000	2.57	12.87	12.87	0	0	125.44	125.44	0
0+50,000	2.54	12.79	12.79	0	0	138.24	138.24	0
0+55,000	2.6	12.85	12.85	0	0	151.09	151.09	0
0+60,000	2.59	12.96	12.96	0	0	164.05	164.05	0
0+65,000	2.55	12.85	12.85	0	0	176.9	176.9	0
0+70,000	2.47	12.56	12.56	0	0	189.45	189.45	0
0+75,000	2.4	12.17	12.17	0	0	201.63	201.63	0
0+80,000	2.38	11.94	11.94	0	0	213.57	213.57	0
0+85,000	2.37	11.86	11.86	0	0	225.43	225.43	0
0+90,000	2.43	11.98	11.98	0	0	237.41	237.41	0
0+95,000	2.53	12.4	12.4	0	0	249.8	249.8	0
1+00,000	2.64	12.93	12.93	0	0	262.74	262.74	0
1+05,000	2.32	12.41	12.41	0	0	275.15	275.15	0
1+10,000	2.36	11.7	11.7	0	0	286.85	286.85	0
1+15,000	2.39	11.88	11.88	0	0	298.74	298.74	0

**EXCAVACION ALCANTARILLA**

Station	Cut Area (Sq.m.)	Cut Volume (Cu.m.)	Reusable Volume (Cu.m.)	Fill Area (Sq.m.)	Fill Volume (Cu.m.)	Cum. Cut Vol. (Cu.m.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.m.)	Cum. Fill Vol. (Cu.m.)
0+00,000	6.39	0	0	0	0	0	0	0
0+02,000	6.36	12.75	12.75	0	0	12.75	12.75	0
0+04,000	12.02	18.38	18.38	0	0	31.13	31.13	0
0+06,000	17.95	29.97	29.97	0	0	61.1	61.1	0
0+08,000	18.87	36.82	36.82	0	0	97.92	97.92	0
0+10,000	18.42	37.29	37.29	0	0	135.21	135.21	0

**Subtotal 1: 134.10**

**Subtotal 2: 298.74**

**Subtotal 3: 135.21**

**PLANILLADO: 568.05**

CONTRATADO	100.00
EJECUTADO ESTE PERIODO	568.05
EJECUTADO PLANILLAS ANTERIORES	-
<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>568.05</b>
<b>TOTAL ESTA PLANILLA=</b>	<b>568.05</b>

AFIRMADO NUEVO MILEÑO			
ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA			
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	<b>PERIODO:</b>	01/08/2025 - 31/08/2025
<b>ÍTEM</b>	<b>RUBRO</b>	<b>PLANILLA:</b>	N° 4 DE LIQUIDACION DE OBRA
56	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	<b>UNIDAD</b>	m³

Station	Cut Area (Sq.m.)	Cut Volume (Cu.m.)	Reusable Volume (Cu.m.)	Fill Area (Sq.m.)	Fill Volume (Cu.m.)	Cum. Cut Vol. (Cu.m.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.m.)	Cum. Fill Vol. (Cu.m.)
0+00,000	0	0	0	2.29	0	0	0	0
0+10,000	0	0	0	2.52	24.03	0	0	24.03
0+20,000	0	0	0	2.73	26.26	0	0	50.29
0+30,000	0	0	0	2.41	25.73	0	0	76.02
0+40,000	0	0	0	1.75	20.83	0	0	96.85
0+50,000	0	0	0	2.58	21.69	0	0	118.54
0+60,000	0	0	0	2.49	25.39	0	0	143.93
0+70,000	0	0	0	1.86	21.76	0	0	165.69
0+80,000	0	0	0	2.67	22.66	0	0	188.35
0+90,000	0	0	0	3.4	30.35	0	0	218.7
1+00,000	0	0	0	4.8	40.97	0	0	259.67
1+10,000	0	0	0	5.62	52.06	0	0	311.72
1+19,559	0	0	0	9.61	72.78	0	0	384.51
1+20,000	0	0	0	15.22	5.48	0	0	389.98
1+21,553	0	0	0	42.89	45.12	0	0	435.11
1+24,300	0	0	0	42.78	117.65	0	0	552.75
1+25,974	0	0	0	15.09	48.43	0	0	601.19
1+30,000	0	0	0	13.92	58.39	0	0	659.58
1+40,000	0	0	0	11.68	127.99	0	0	787.57
1+50,000	0	0	0	10.71	111.94	0	0	899.52
1+60,000	0	0	0	10.26	104.86	0	0	1004.38
1+70,000	0	0	0	8.81	95.34	0	0	1099.72
1+80,000	0	0	0	5.2	70.05	0	0	1169.78
1+90,000	0	0	0	3.95	45.78	0	0	1215.56
2+00,000	0	0	0	4.12	40.34	0	0	1255.9
2+10,000	0	0	0	4.29	42.04	0	0	1297.94
2+20,000	0	0	0	4.33	43.12	0	0	1341.05
2+30,000	0	0	0	4.25	42.89	0	0	1383.94
2+40,000	0	0	0	4.18	42.15	0	0	1426.1
2+50,000	0	0	0	3.99	40.85	0	0	1466.95
2+60,000	0	0	0	3.23	36.1	0	0	1503.05
2+70,000	0	0	0	3.19	32.12	0	0	1535.17
2+80,000	0	0	0	2.88	30.33	0	0	1565.5
2+90,000	0	0	0	3.61	32.43	0	0	1597.93
3+00,000	0	0	0	3.23	34.2	0	0	1632.13
3+10,000	0	0	0	2.58	29.04	0	0	1661.17
3+12,213	0	0	0	1.34	4.34	0	0	1665.51
<b>ALCANT.</b>	<b>1.77</b>	<b>17.67</b>						<b>1647.84</b>

**PLANILLADO: 1647.84**

CONTRATADO	1,400.00
EJECUTADO ESTE PERIODO	1,647.84
EJECUTADO PLANILLAS ANTERIORES	
<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>1,647.84</b>
<b>TOTAL ESTA PLANILLA=</b>	<b>1,647.84</b>

AFIRMADO NUEVO MILEÑO ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA			
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	<b>PERIODO:</b>	01/08/2025 - 31/08/2025
<b>ÍTEM</b>	<b>RUBRO</b>	<b>PLANILLA:</b>	N° 4 DE LIQUIDACION DE OBRA
57	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	<b>UNIDAD</b>	m³ - km

Station	Cut Area (Sq.m.)	Cut Volume (Cu.m.)	Reusable Volume (Cu.m.)	Fill Area (Sq.m.)	Fill Volume (Cu.m.)	Cum. Cut Vol. (Cu.m.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.m.)	Cum. Fill Vol. (Cu.m.)
0+00,000	0	0	0	2,29	0	0	0	0
0+10,000	0	0	0	2,52	24,03	0	0	24,03
0+20,000	0	0	0	2,73	26,26	0	0	50,29
0+30,000	0	0	0	2,41	25,73	0	0	76,02
0+40,000	0	0	0	1,75	20,83	0	0	96,85
0+50,000	0	0	0	2,58	21,69	0	0	118,54
0+60,000	0	0	0	2,49	25,39	0	0	143,93
0+70,000	0	0	0	1,86	21,76	0	0	165,69
0+80,000	0	0	0	2,67	22,66	0	0	188,35
0+90,000	0	0	0	3,4	30,35	0	0	218,7
1+00,000	0	0	0	4,8	40,97	0	0	259,67
1+10,000	0	0	0	5,62	52,06	0	0	311,72
1+19,559	0	0	0	9,61	72,78	0	0	384,51
1+20,000	0	0	0	15,22	5,48	0	0	389,98
1+21,553	0	0	0	42,89	45,12	0	0	435,11
1+24,300	0	0	0	42,78	117,65	0	0	552,75
1+25,974	0	0	0	15,09	48,43	0	0	601,19
1+30,000	0	0	0	13,92	58,39	0	0	659,58
1+40,000	0	0	0	11,68	127,99	0	0	787,57
1+50,000	0	0	0	10,71	111,94	0	0	899,52
1+60,000	0	0	0	10,26	104,86	0	0	1004,38
1+70,000	0	0	0	8,81	95,34	0	0	1099,72
1+80,000	0	0	0	5,2	70,05	0	0	1169,78
1+90,000	0	0	0	3,95	45,78	0	0	1215,56
2+00,000	0	0	0	4,12	40,34	0	0	1255,9
2+10,000	0	0	0	4,29	42,04	0	0	1297,94
2+20,000	0	0	0	4,33	43,12	0	0	1341,05
2+30,000	0	0	0	4,25	42,89	0	0	1383,94
2+40,000	0	0	0	4,18	42,15	0	0	1426,1
2+50,000	0	0	0	3,99	40,85	0	0	1466,95
2+60,000	0	0	0	3,23	36,1	0	0	1503,05
2+70,000	0	0	0	3,19	32,12	0	0	1535,17
2+80,000	0	0	0	2,88	30,33	0	0	1565,5
2+90,000	0	0	0	3,61	32,43	0	0	1597,93
3+00,000	0	0	0	3,23	34,2	0	0	1632,13
3+10,000	0	0	0	2,58	29,04	0	0	1661,17
3+12,213	0	0	0	1,34	4,34	0	0	1665,51
<b>ALCANT.</b>	1,77	17,67						1647,84

**SUBTOTAL:** 1647,84

**LONGITUD** 8,85

**PLANILLADO:** 14583,37

CONTRATADO	14,000.00
EJECUTADO ESTE PERIODO	14,583.37
EJECUTADO PLANILLAS ANTERIORES	-
<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>14,583.37</b>
<b>TOTAL ESTA PLANILLA=</b>	<b>14,583.37</b>

AFIRMADO NUEVO MILEÑO			
ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA			
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	<b>PERIODO:</b>	01/08/2025 - 31/08/2025
<b>ÍTEM</b>	<b>RUBRO</b>	<b>PLANILLA:</b>	N° 4 DE LIQUIDACION DE OBRA
58	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1.50 m, e=2.5 mm, PM-100	<b>UNIDAD</b>	m

ÍTEM	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL ( m )	OBSERVACIONES
<b>NUEVO MILEÑO</b>	10.00				1	10.00	

**PLANILLADO:** 10.00

CONTRATADO 10.00  
 EJECUTADO ESTE PERIODO 10.00  
 EJECUTADO PLANILLAS ANTERIORES -  
 TOTAL EJECUTADO 10.00  
 TOTAL ESTA PLANILLA= 10.00

AFIRMADO NUEVO MILEÑO			
ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA			
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	<b>PERIODO:</b>	01/08/2025 - 31/08/2025
<b>ÍTEM</b>	<b>RUBRO</b>	<b>PLANILLA:</b>	N° 4 DE LIQUIDACION DE OBRA
59	Limpieza de cunetas a máquina	<b>UNIDAD</b>	m

ÍTEM	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL ( m )	OBSERVACIONES
<b>NUEVO MILEÑO</b>	250.00				2	500.00	

**PLANILLADO:** 500.00

CONTRATADO 500.00  
 EJECUTADO ESTE PERIODO 500.00  
 EJECUTADO PLANILLAS ANTERIORES -  
 TOTAL EJECUTADO 500.00  
 TOTAL ESTA PLANILLA= 500.00

AFIRMADO NUEVO MILEÑO			
ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA			
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	<b>PERIODO:</b>	01/08/2025 - 31/08/2025
<b>ÍTEM</b>	<b>RUBRO</b>	<b>PLANILLA:</b>	N° 4 DE LIQUIDACION DE OBRA
60	Pancarta informativa de la obra (letrero)-con estructura con estructura	<b>UNIDAD</b>	u

ÍTEM	LARGO (Km)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL ( u )	OBSERVACIONES
<b>NUEVO MILEÑO</b>					1	1.00	

**PLANILLADO:** 1.00

CONTRATADO 1.00  
 EJECUTADO ESTE PERIODO 1.00  
 EJECUTADO PLANILLAS ANTERIORES -  
 TOTAL EJECUTADO 1.00  
 TOTAL ESTA PLANILLA= 1.00

AFIRMADO NUEVO MILEÑO			
ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA			
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	<b>PERIODO:</b>	01/08/2025 - 31/08/2025
<b>ÍTEM</b>	<b>RUBRO</b>	<b>PLANILLA:</b>	N° 4 DE LIQUIDACION DE OBRA
62	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno) polietileno)	<b>UNIDAD</b>	m

ÍTEM	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPEJOR (m)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL ( m)	OBSERVACIONES
NUEVO MILEÑO	100.00				1	100.00	
<b>PLANILLADO:</b>						<b>100.00</b>	

CONTRATADO 100.00  
 EJECUTADO ESTE PERIODO 100.00  
 EJECUTADO PLANILLAS ANTERIORES -  
 TOTAL EJECUTADO 100.00  
 TOTAL ESTA PLANILLA= 100.00

AFIRMADO NUEVO MILEÑO			
ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA			
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	<b>PERIODO:</b>	01/08/2025 - 31/08/2025
<b>ÍTEM</b>	<b>RUBRO</b>	<b>PLANILLA:</b>	N° 4 DE LIQUIDACION DE OBRA
63	Contenedores metálicos de 55 galones	<b>UNIDAD</b>	u

ÍTEM	LARGO (Km)	ANCHO (m)	ESPEJOR (m)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL ( u)	OBSERVACIONES
NUEVO MILEÑO					1	1.00	
<b>PLANILLADO:</b>						<b>1.00</b>	

CONTRATADO 1.00  
 EJECUTADO ESTE PERIODO 1.00  
 EJECUTADO PLANILLAS ANTERIORES -  
 TOTAL EJECUTADO 1.00  
 TOTAL ESTA PLANILLA= 1.00

AFIRMADO NUEVO MILEÑO			
ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA			
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	<b>PERIODO:</b>	01/08/2025 - 31/08/2025
<b>ÍTEM</b>	<b>RUBRO</b>	<b>PLANILLA:</b>	N° 4 DE LIQUIDACION DE OBRA
64	Kit antiderrames	<b>UNIDAD</b>	u

ÍTEM	LARGO (Km)	ANCHO (m)	ESPEJOR (m)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL ( u)	OBSERVACIONES
NUEVO MILEÑO					2	2.00	
<b>PLANILLADO:</b>						<b>2.00</b>	

CONTRATADO 2.00  
 EJECUTADO ESTE PERIODO 2.00  
 EJECUTADO PLANILLAS ANTERIORES -  
 TOTAL EJECUTADO 2.00  
 TOTAL ESTA PLANILLA= 2.00

AFIRMADO NUEVO MILEÑO			
ANEXO DE VOLUMEN DE OBRA			
<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	<b>PERIODO:</b>	01/08/2025 - 31/08/2025
<b>ÍTEM</b>	<b>RUBRO</b>	<b>PLANILLA:</b>	N° 4 DE LIQUIDACION DE OBRA
65	Charla Ambiental	<b>UNIDAD</b>	ho

ÍTEM	LARGO (Km)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL ( ho)	OBSERVACIONES
NUEVO MILEÑO					2	2.00	
						<b>PLANILLADO:</b>	2.00

CONTRATADO	4.00
EJECUTADO ESTE PERIODO	2.00
EJECUTADO PLANILLAS ANTERIORES	-
<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>2.00</b>
<b>TOTAL ESTA PLANILLA=</b>	<b>2.00</b>



Firmado electrónicamente por:  
**CLAUDIO FERMIN  
 CAYAMBE GUILCAPI**  
 Validar electrónicamente con FirmasEC


ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:  
**JORGE RODRIGO PICO  
 ANGULO**  
 Validar electrónicamente con FirmasEC


ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

821700.0000

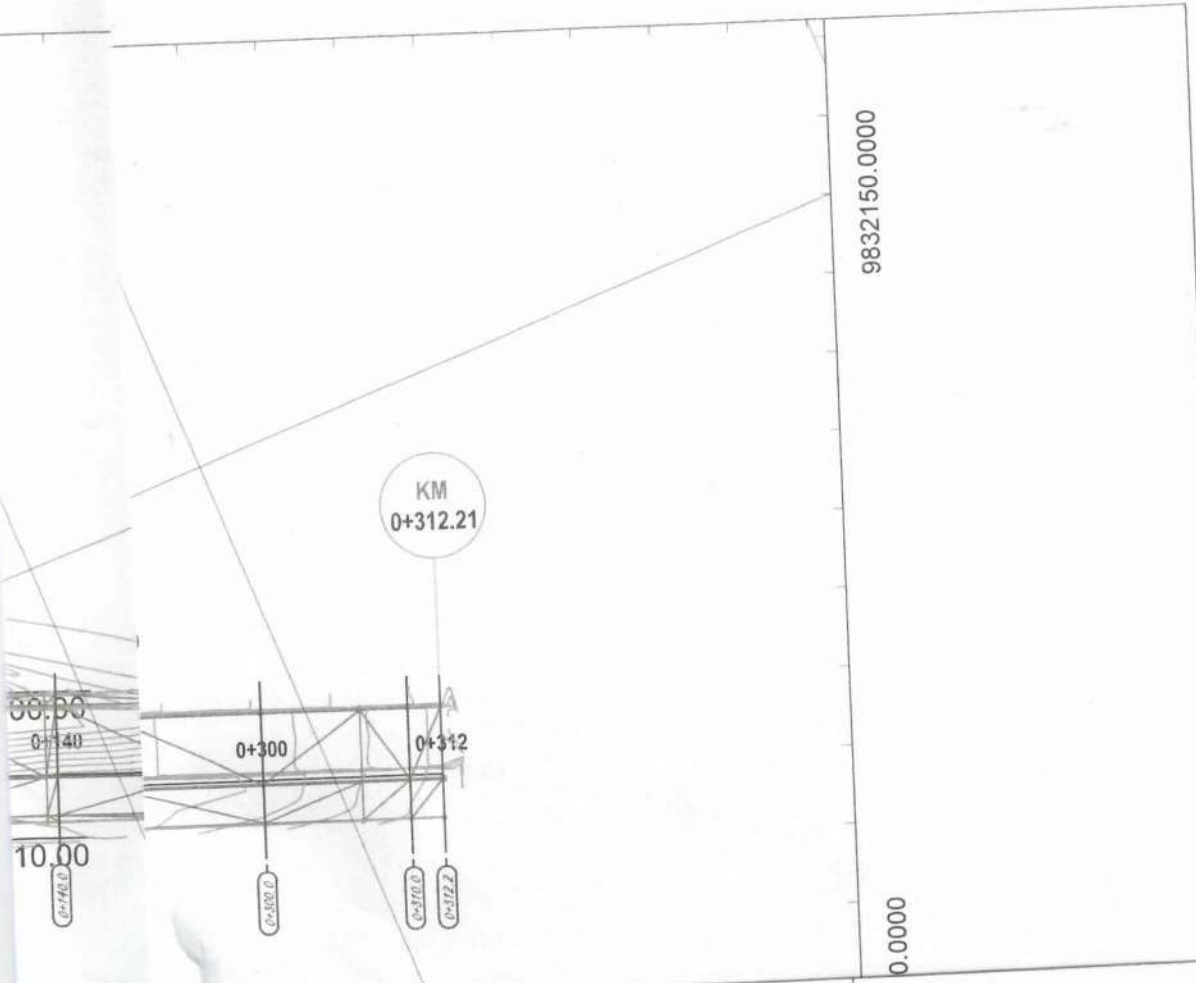

9832150.0000

0.0000

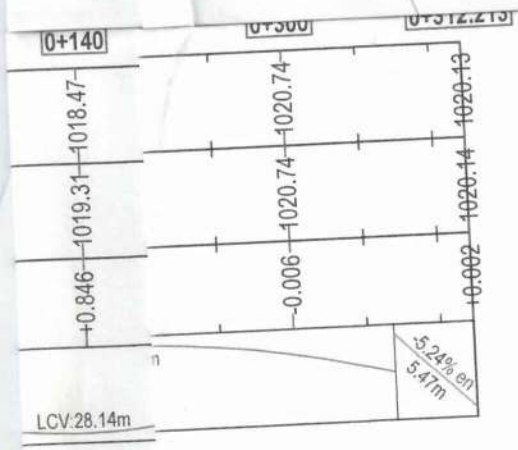

CONTIENE:  
 PLANTA Y PER  
 MEJORAMIENTOS




Firmado electrónicamente por:  
**JAIRO ALBERTO  
 NARVAEZ GUEVARA**  
 Validar únicamente con FICHAPEC

Ing. Jairo Narváez  
 Administrador de contrato


LÁMINA:

1 / 3

1.



11.

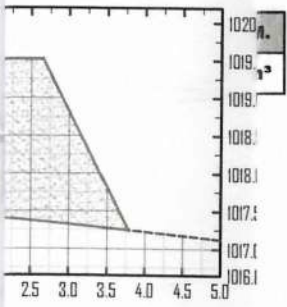

sales

UBIC  
• ○  
• \_\_\_\_\_  
• \_\_\_\_\_  
• \_\_\_\_\_




 Firmado electrónicamente por:  
**JAIRO ALBERTO  
NARVAEZ GUEVARA**  
Validar únicamente con FirmatC  
  
Ing. Jairo Narváez  
Administrador de contrato

LÁMINA:  
**2 / 3**



nsversales  
TO



Firmado electrónicamente por:  
**JAIRO ALBERTO  
NARVAEZ GUEVARA**


Validar únicamente con FirmatC

Ing. Jairo Narváez  
Administrador de contrato

LÁMINA:


3 / 3

**KM: 0+530.0**




CT: 1098.05  
CR: 1098.05

**KM: 0+535.0**




CT: 1098.09  
CR: 1098.12

**KM: 0+540.0**




CT: 1098.47  
CR: 1098.46

**KM: 0+575.0**



CT: 1098.51  
CR: 1098.49


**KM: 0+580.0**



CT: 1098.53  
CR: 1098.52

TRANSVERSALES

UBIC  
•  
•  
•  
•


  
Firmado electrónicamente por:  
**JAIRO ALBERTO  
NARVAEZ GUEVARA**  
Validar únicamente con FirmasDC  

---

Ing. Jairo Narváez  
Administrador de contrato


LÁMINA:  
**5 / 5**

**KM: 0+320.0**




CT: 1095.10  
CR: 1095.24

**KM: 0+325.0**




CT: 1094.94  
CR: 1095.10



CT: 1093.96  
CR: 1094.11

**KM: 0+365.0**



CT: 1093.80  
CR: 1093.99

TRANSVERSALES







Firmado electrónicamente por:  
**JAIRO ALBERTO  
NARVAEZ GUEVARA**  
Validar únicamente con FIRMAC

Ing. Jairo Narváez  
Administrador de contrato

LÁMINA:

4 / 5



VERSUALES





Firmado electrónicamente por:  
**JAIRO ALBERTO  
 NARVAEZ GUEVARA**  
 Validar únicamente con FirmasC

Ing. Jairo Narváez  
 Administrador de contrato

LÁMINA:

3 / 5

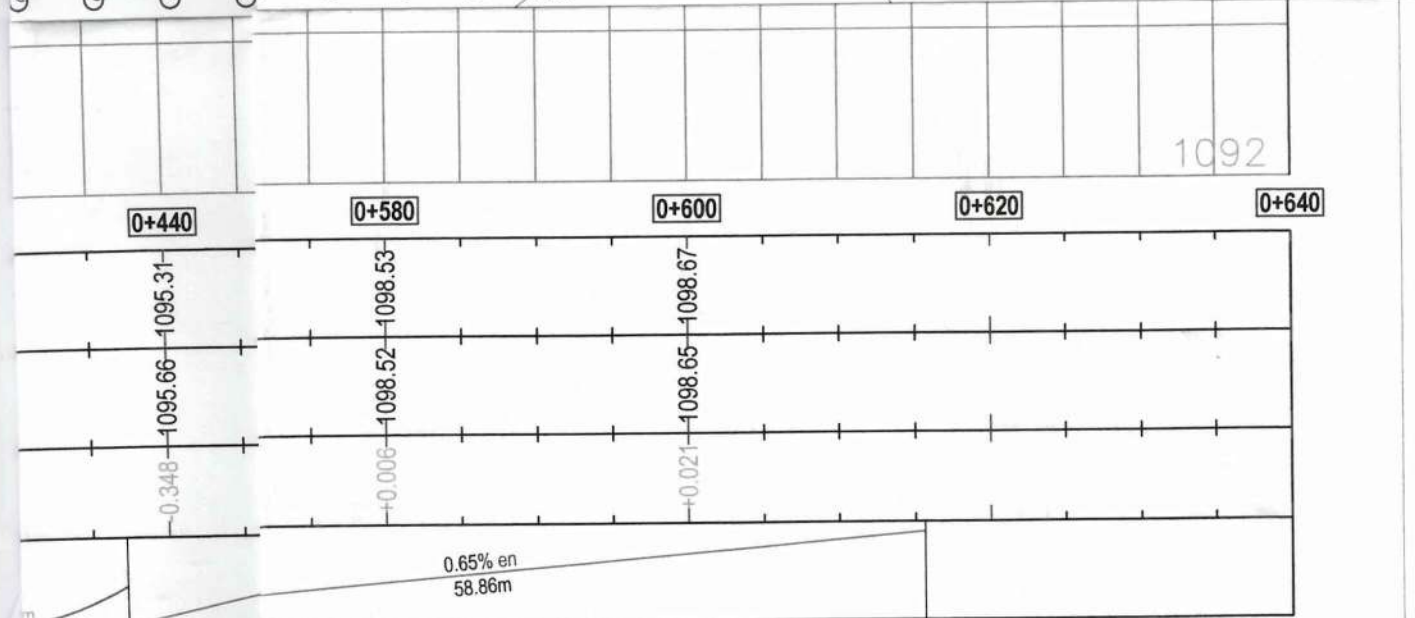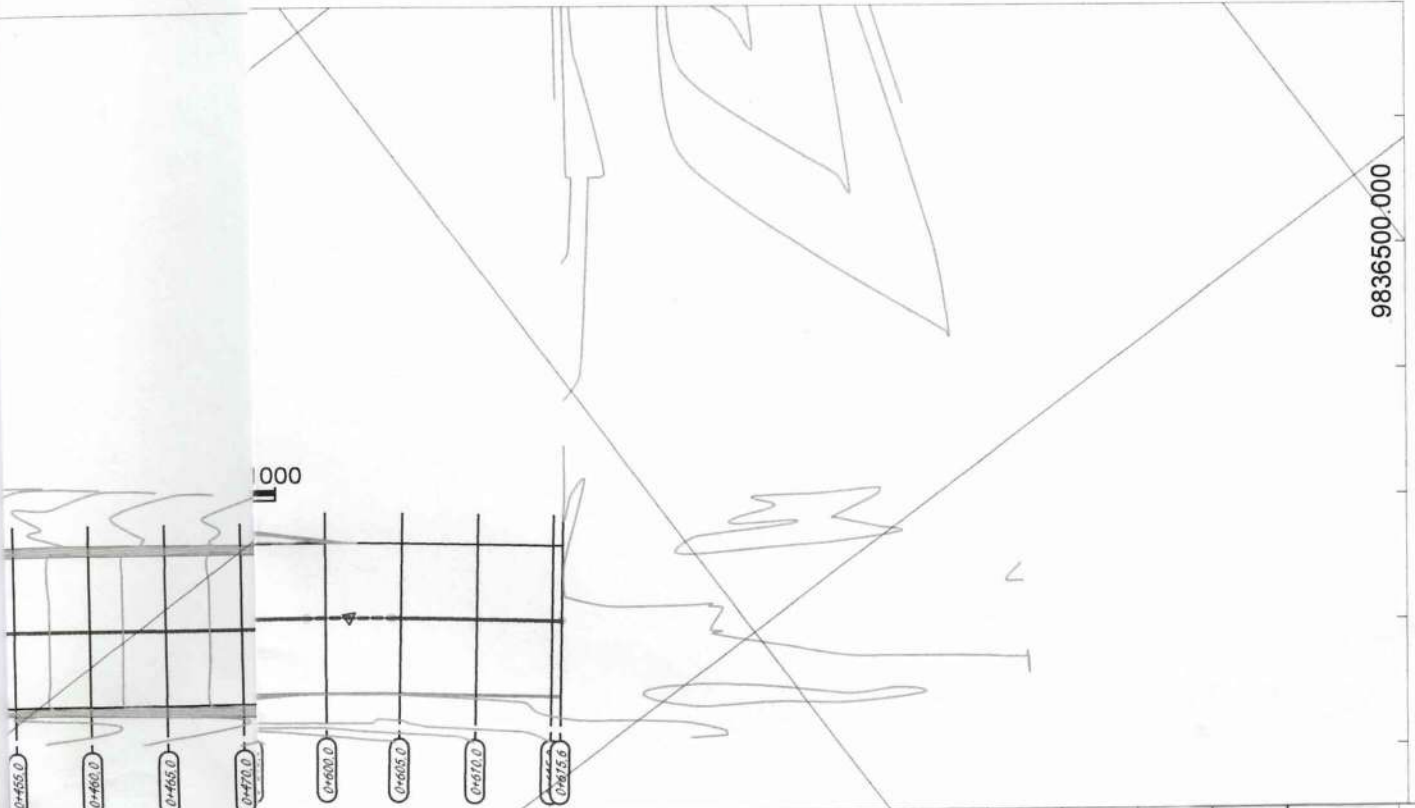

1092

0+440

0+580

0+600

0+620

0+640

1095.31  
1095.66  
1095.31

1098.53  
1098.52  
1098.67

1098.67  
1098.65  
1098.67

-0.348

+0.006

+0.021

0.65% en  
58.86m

DINALES

30




Firmado electrónicamente por:  
**JAIRO ALBERTO  
 NARVAEZ GUEVARA**  
 Validez Únicamente con FirmaDC

Ing. Jairo Narváez  
 Administrador de contrato


LÁMINA:

2 / 5

9837700.000



Mut.	AREA	VOLUMEN	VOL ACUM.
CORTE	0.00 m <sup>2</sup>	0.00 m <sup>3</sup>	0.00 m <sup>3</sup>
RELLENO	4.50 m <sup>2</sup>	47.63 m <sup>3</sup>	1979.98 m <sup>3</sup>



Mut.	AREA	VOLUMEN	VOL ACUM.
CORTE	0.00 m <sup>2</sup>	0.00 m <sup>3</sup>	0.00 m <sup>3</sup>
RELLENO	4.64 m <sup>2</sup>	45.78 m <sup>3</sup>	2025.78 m <sup>3</sup>

IGITUDINAL  
ENTO  
S TRANSVERSALES

UBIC/

- 
- 
- 
- 





Firmado electrónicamente por:  
**JAIRO ALBERTO  
NARVAEZ GUEVARA**

Validar únicamente con FirmatC

Ing. Jairo Narváez  
Administrador de contrato


LÁMINA:

2 / 2

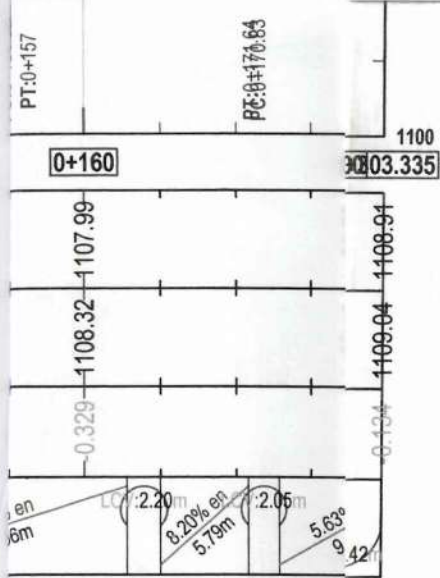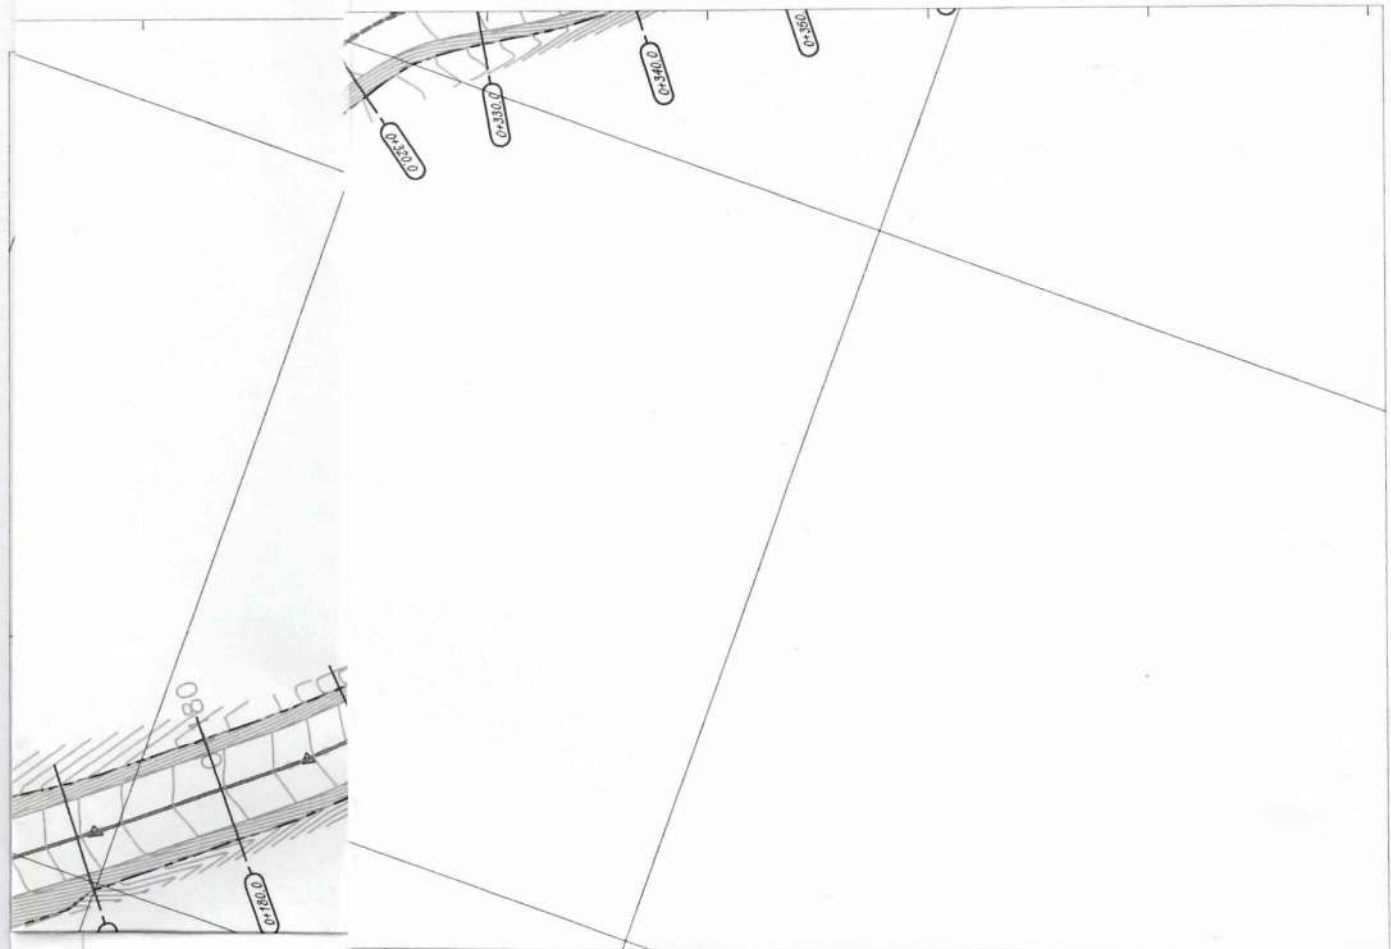

ORIGINAL

- UBICACIÓN:
- SEC
  - PARI
  - CAN
  - PRO


 Firmado electrónicamente por:  
**JAIRO ALBERTO NARVAEZ GUEVARA**  
Validar Únicamente con FirmaDC

---


Ing. Jairo Narváez  
Administrador de contrato

LÁMINA:


1 / 2

# SVERSALES EXCAVACION NRO 1

VOL ACUM.
102.75 m <sup>3</sup>
40.51 m <sup>3</sup>

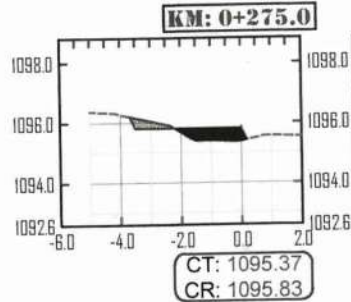

VOL ACUM.
103.34 m <sup>3</sup>
53.20 m <sup>3</sup>

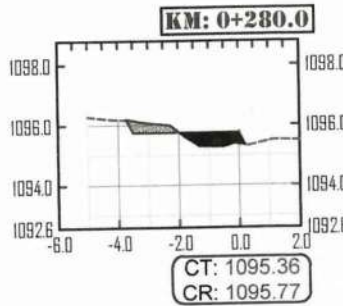

VOL ACUM.
117.56 m <sup>3</sup>
125.75 m <sup>3</sup>

**KM: 0+285.0**

VOL ACUM.
122.23 m <sup>3</sup>
131.57 m <sup>3</sup>

SVERSALES

UBICA

- 
- 
- 
- 



Firmado electrónicamente por:  
**JAIRO ALBERTO NARVAEZ GUEVARA**  
Validar electrónicamente con Firma®

Ing. Jairo Narváez  
Administrador de contrato

LÁMINA:

2 / 4

ACUM.

16 m<sup>3</sup>

1 m<sup>3</sup>

ALES

**UBICACIÓN:**

- SECTOR:
- PARROQUI
- CANTÓN: \_\_\_\_\_
- PROVINCIA/





Firmado electrónicamente por:  
**JAIRO ALBERTO  
NARVAEZ GUEVARA**  
Validar únicamente con FirmaBC

Ing. Jairo Narváez  
Administrador de contrato


**LÁMINA:**

2 / 4

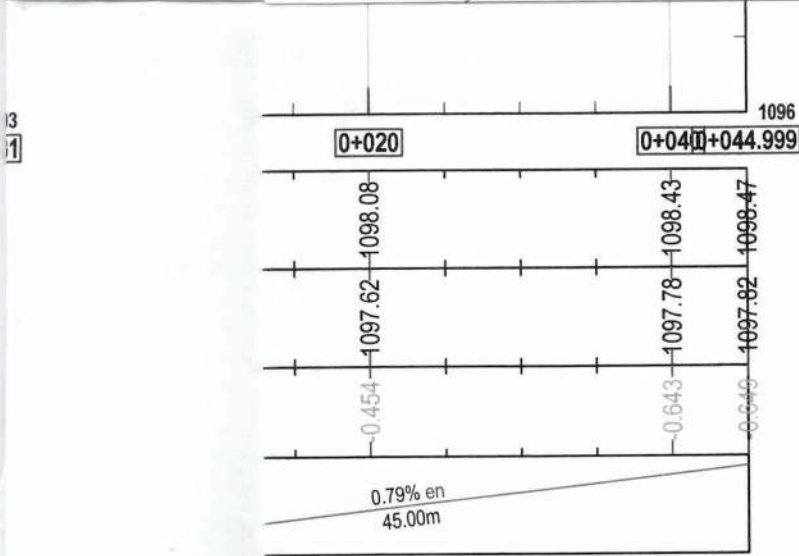

DINALES  
RELLENO

UB  
•  
•  
•  
•



 Firmado electrónicamente por:  
**JAIRO ALBERTO  
NARVAEZ GUEVARA**  
Validar electrónicamente con FirmaEC

Ing. Jairo Narváez  
Administrador de contrato

LÁMINA:  
2 / 4

824250.000

824350.000

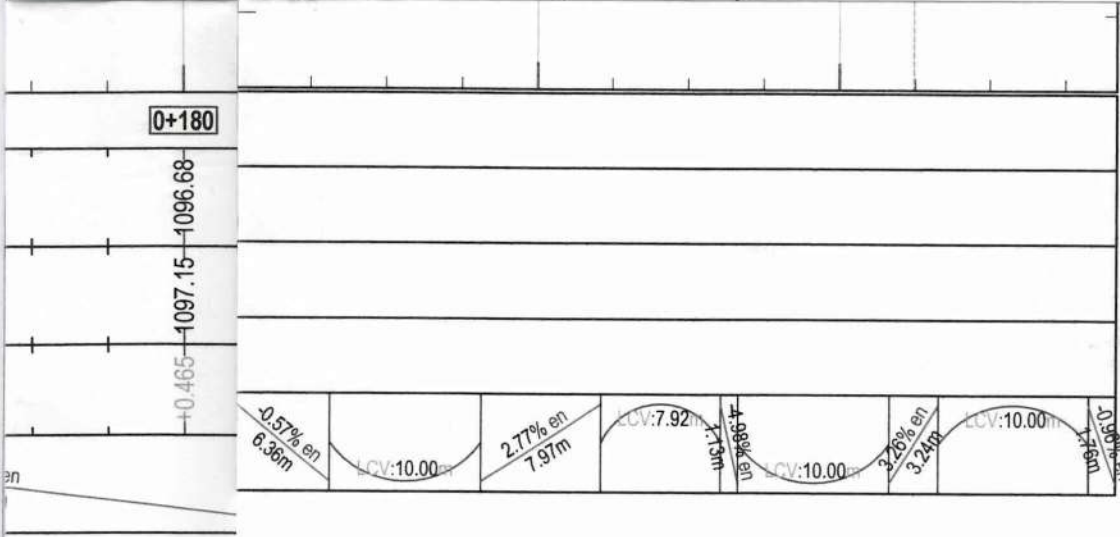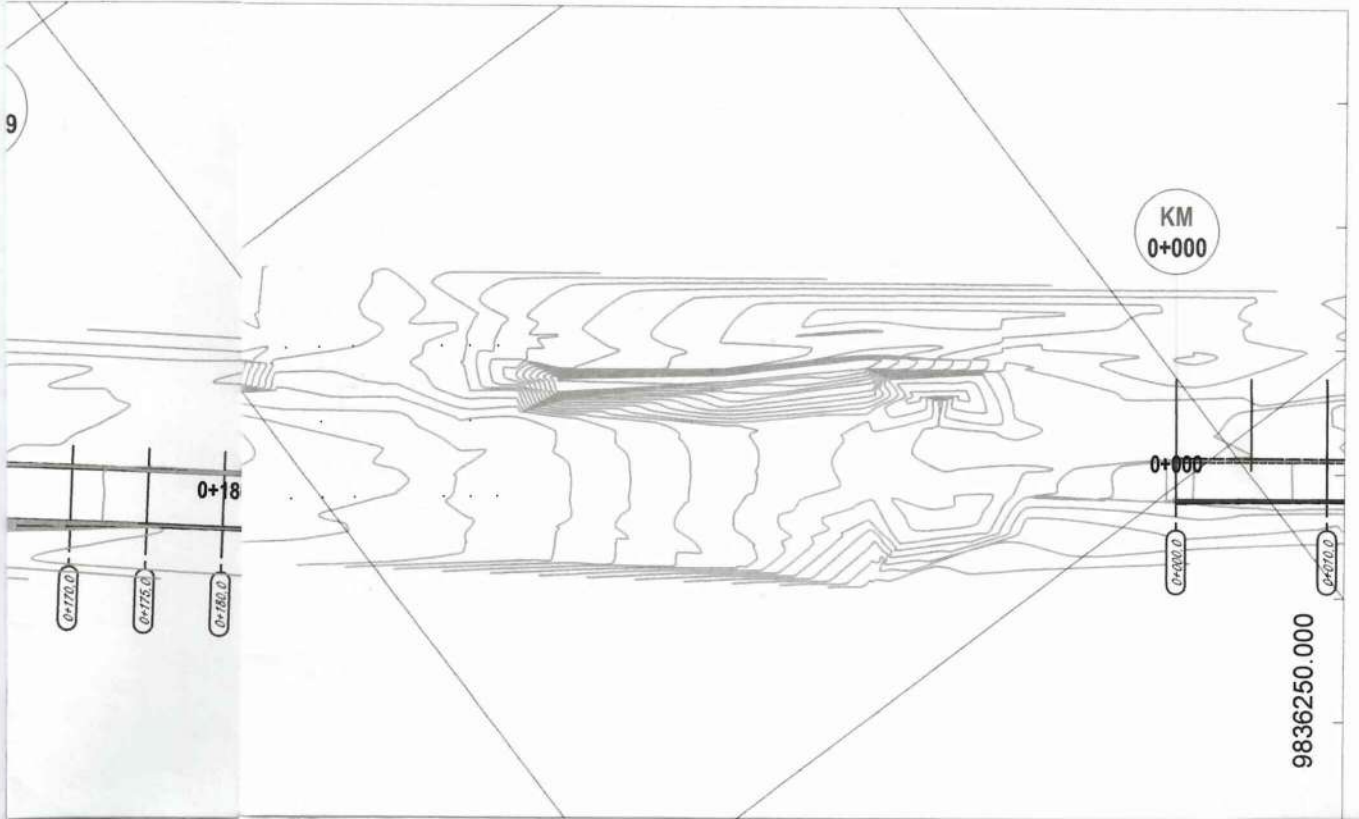

TRANSVERSALES




Firmado electrónicamente por:  
**JAIRO ALBERTO  
 NARVAEZ GUEVARA**  
 Validar únicamente con FirmasC

Ing. Jairo Narváez  
 Administrador de contrato

LÁMINA:

1 / 4

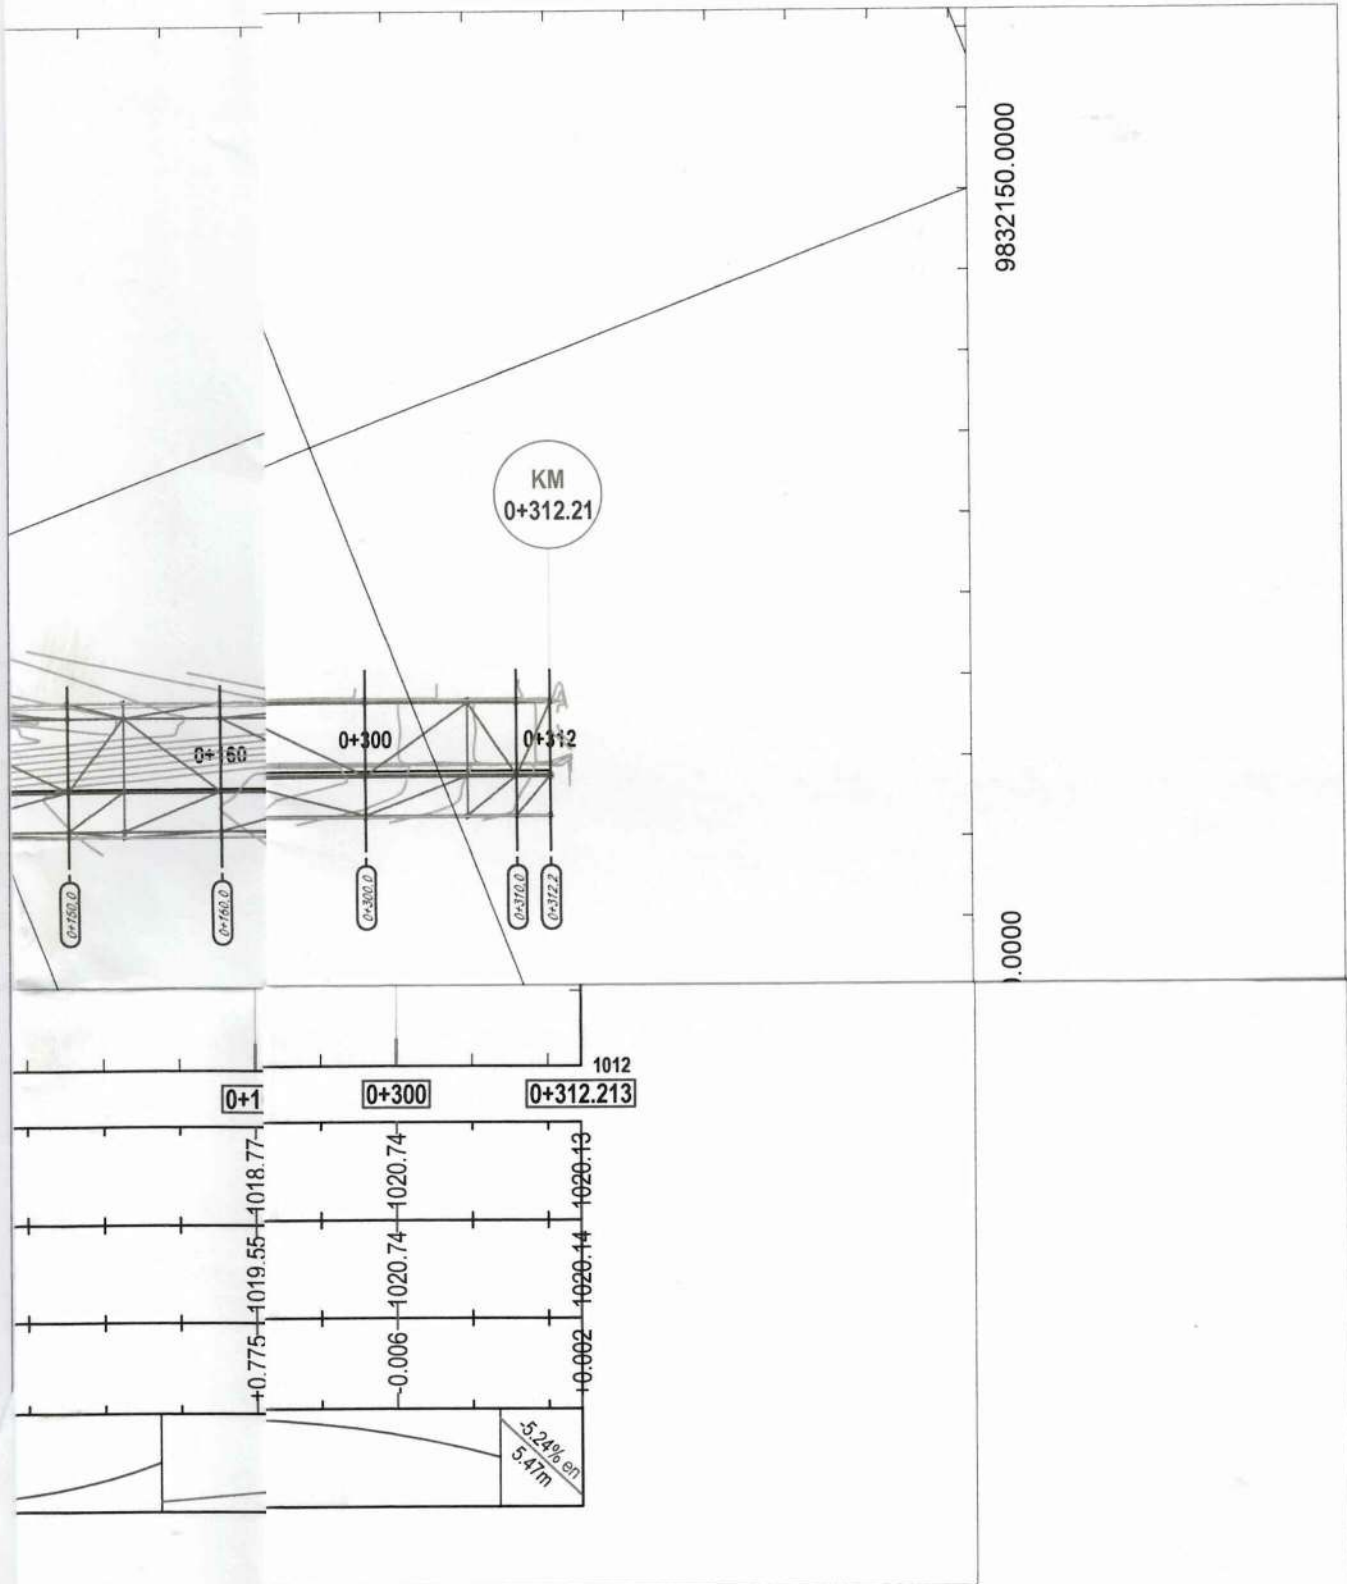

9832150.0000

.0000

RFIL  
ITO



Firmado eletronicamente por:  
**JAIRO ALBERTO  
 NARVAEZ GUEVARA**  
 Validar solamente con FirmADOC

Ing. Jairo Narváez  
 Administrador de contrato


LÁMINA:

1 / 3

# TRANSVERSALES EXCAVACION NRO 1


EN	VOL ACUM.
m <sup>3</sup>	102.75 m <sup>3</sup>
m <sup>3</sup>	40.51 m <sup>3</sup>

CUM.
m <sup>3</sup>
m <sup>3</sup>

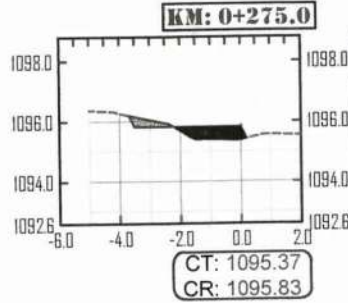

EN	VOL ACUM.
m <sup>3</sup>	103.34 m <sup>3</sup>
m <sup>3</sup>	53.20 m <sup>3</sup>

000
CUM.
m <sup>3</sup>
m <sup>3</sup>

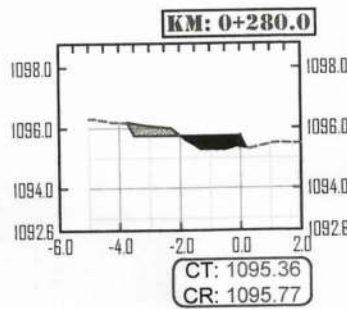

EN	VOL ACUM.
m <sup>3</sup>	117.56 m <sup>3</sup>
m <sup>3</sup>	125.75 m <sup>3</sup>

CUM.
m <sup>3</sup>
m <sup>3</sup>

EN	VOL ACUM.
m <sup>3</sup>	122.23 m <sup>3</sup>
m <sup>3</sup>	131.57 m <sup>3</sup>

CUM.
m <sup>3</sup>
m <sup>3</sup>

TRANSVERSALES



Firmado electrónicamente por:  
**JAIRO ALBERTO**  
**NARVAEZ GUEVARA**  
Validar Góticamente con Firmas2

Ing. Jairo Narváez  
Administrador de contrato

LÁMINA:

2 / 3

VOLUMEN	VOL ACUM.
0.03 m <sup>3</sup>	112.36 m <sup>3</sup>
0.00 m <sup>3</sup>	8.40 m <sup>3</sup>

10

TRANSVERSALES



Firmado electrónicamente por:  
**JAIRO ALBERTO  
NARVAEZ GUEVARA**  
Validar Únicamente con FirmAS!

Ing. Jairo Narváez  
Administrador de contrato

LÁMINA:

3 / 3



GOBIERNO DE  
**PASTAZA**  
*El Gobierno del Animo*

## ***4 INFORME DE FISCALIZACIÓN***

**PROYECTO:**

***“CONSTRUCCIÓN DE AFIRMADO DE VARIAS VÍAS UBICADA EN LA  
PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA”.***

***PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA***



**MEMORANDUM N° 003-FISCALIZACIÓN-2026**

**FECHA** : 25 de febrero de 2026  
**DE** : FISCALIZADOR  
**PARA** : ADMINISTRADOR DE CONTRATO  
**ASUNTO** : Solicitud Trámite de Pago

Solicito proceder con el trámite para cancelar a favor del Ing. Cayambe Guilcapi Claudio Fermín, contratista de la obra: CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA, el valor de \$50,753.19 conforme al siguiente detalle:

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	\$ 45,396.41 /
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	\$ 5,356.78 /
<b>Total</b>	<b>\$ 50,753.19 /</b>



SELECCIONADO AUTOMATICAMENTE POR:  
**JORGE RODRIGO PICO**  
ANGULO

VALIDAR ÚNICAMENTE CON FUSPANEL

Ing. Rodrigo Pico

**FISCALIZADOR**

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL,  
CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA**

**ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR**

**INFORME DE FISCALIZACIÓN PLANILLA DE LIQUIDACIÓN**

<b>PROYECTO :</b>	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA	
<b>CONTRATISTA :</b>	Ing. Cayambe Guilcapi Claudio Fermín	
<b>MONTO DEL CONTRATO :</b>	112,829.17 \$	
<b>PERIÓDO DEL INFORME :</b>	1 de agosto de 2025	1 de septiembre de 2025
<b>FECHA DE ELABORACIÓN :</b>	25 de febrero de 2026	



OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA
CÓDIGO DEL PROCESO	MCO - GADPPz - 098 - 2022
MONTO DEL CONTRATO	112,829.17 \$
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	8 de febrero de 2023
PLAZO CONTRACTUAL	75 DÍAS
MONTO DEL ANTICIPO	11,282.92 \$
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	
FECHA DE INICIO DE TRABAJO	22 de mayo de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	4 de agosto de 2025
SUSPENSIÓN DE TRABAJO	0 DÍAS
AMPLIACIÓN DE PLAZO	28 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIADA	1 de septiembre de 2025
CONTRATISTA	Ing. Cayambe Guilcapi Claudio Fermín

## 2. PERIODO DEL INFORME

Se ha realizado por parte de la fiscalización y la administración del contrato un permanente seguimiento de las actividades ejecutadas y la prevención de los trabajos con recomendaciones que posteriormente se refleja en la terminación del proyecto.

En la ejecución de cada rubro, se verifico que el contratista utilice el equipo ofertado y necesario para su realización, con las mejores prácticas constructivas, mantuvo en obra el personal capacitado y en número suficiente.

## 3. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE PERÍODO

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO		
			CANT.	EJECUT.	%
	AFIRMADO LOS ALTARES				
1	Transporte de maquinaria	glb	4.00	3.00	100.00%
	AFIRMADO CAMINO A2 (ALTARES)				
13	Transporte de maquinaria	glb	4.00	2.00	100.00%
	AFIRMADO MONTE SINAI (AMPLIACION DE VIA)				
25	Transporte de maquinaria	glb	4.00	4.00	100.00%
27	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m³	100.00	386.43	386.43%
28	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m³	2,880.00	2895.49	100.54%
29	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	m³-km	28,800.00	9584.07	33.28%
30	Limpieza de cunetas a máquina	m	600.00	600.00	100.00%
	SEÑALES AMBIENTALES				
31	Pancarta informativa de la obra (letrero)-con estructura	u	1.00	1.00	100.00%
33	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	m	100.00	100.00	100.00%
34	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1.00	1.00	100.00%
35	Kit antiderrames	u	2.00	2.00	100.00%
36	Charla Ambiental	hora	4.00	4.00	100.00%
	AFIRMADO PRAGA SACHA				
37	Transporte de maquinaria	glb	4.00	6.00	200.00%
38	Replanteo y nivelacion	km	0.60	0.40	166.67%
39	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m³	100.00	578.13	2197.59%
40	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m³	1,920.00	2202.70	248.14%
41	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	m³-km	19,200.00	23568.89	256.57%
46	Limpieza de cunetas a máquina	m	1000.00	800.00	80.00%

SENALES AMBIENTALES					
50	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1.00	1.00	200.00%
51	Kit antiderrames	u	2.00	2.00	200.00%
52	Charla Ambiental	hora	4.00	2.00	150.00%
AFIRMADO NUEVO MILEÑO (AMPLIACION)					
53	Transporte de maquinaria	glb	4.00	4.00	100.00%
54	Replanteo y nivelacion	km	0.50	0.31	62.00%
55	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m³	100.00	568.05	568.05%
56	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m³	1,400.00	1647.84	117.70%
57	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	m³-km	14,000.00	14583.37	104.17%
58	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1.50 m, e=2.5 mm, PM-100	m	10.00	10.00	100.00%
59	Limpieza de cunetas a máquina	m	500.00	500.00	100.00%
SENALES AMBIENTALES					
60	Pancarta informativa de la obra (letrero)-con estructura	u	1.00	1.00	100.00%
62	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	m	100.00	100.00	100.00%
63	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1.00	1.00	100.00%
64	Kit antiderrames	u	2.00	2.00	100.00%
65	Charla Ambiental	hora	4.00	2.00	50.00%

#### 4. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

El monto contractual del proyecto, alcanza la suma de US \$112,829.17 (SON: CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE DÓLARES, 17/100 CENTAVOS) para la obra: CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA.

VALOR TOTAL DEL PROYECTO	112,829.17 \$	100.00%
VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO	11,282.92 \$	10.00%

#### 5. PLANILLAS DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS

PLANILLAS	VALORES MONTO PROGRAMADO		MONTO PLANILLADO			% AVANCE PROGRAMADO		% AVANCE REAL	
	MES	ACUMUL.	ANTER.	ACTUAL	ACUMUL.	MES	ACUMUL.	MES	ACUMUL.
PLAN. 1	995.27 \$	995.27 \$	995.27 \$		995.27 \$	0.88%	0.88%	0.88%	0.88%
PLAN. 2	44,953.08 \$	45,948.35 \$	15,730.24 \$		16,725.51 \$	39.84%	40.72%	13.94%	14.82%
PLAN. 3	63,759.22 \$	109,707.57 \$	45,441.29 \$		62,166.80 \$	56.51%	97.23%	40.27%	55.10%
PLAN. 4	3,121.60 \$	112,829.17 \$		50,462.65 \$	112,629.45 \$	2.77%	100.00%	44.72%	99.82%
<b>TOTAL</b>	<b>112,829.17 \$</b>	<b>112,829.17 \$</b>	<b>62,166.80 \$</b>	<b>50,462.65 \$</b>	<b>112,629.45 \$</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.82%</b>	<b>99.82%</b>

DESCRIPCIÓN	Nº	PERÍODO		VALOR	PORCEN.
PLANILLA	1	22-may-25	31-may-25	995.27 \$	0.88%
PLANILLA	2	01-jun-25	30-jun-25	15,730.24 \$	13.94%
PLANILLA	3	01-jul-25	31-jul-25	45,441.29 \$	40.27%
PLANILLA	4	01-ago-25	01-sep-25	50,462.65 \$	44.72%
<b>TOTAL</b>				<b>112,629.45 \$</b>	<b>99.82%</b>

#### 6. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

AVANCE PROGRAMADO	100.00%
AVANCE EJECUTADO	99.82%
AVANCE CONTRATADO CONTRACTUAL	100.00%
AVANCE INCREMENTO	0.00%
AVANCE RUBROS NUEVOS	0.00%

El plazo contractual es de 103 días, desde la fecha de orden de inicio de los trabajos emitida por el Administrador del Contrato; el tiempo utilizado para la ejecución de los trabajos en este primer periodo comprendido entre el uno de agosto de 2025 y el uno de septiembre de 2025, es de 32 días.

<b>PLAZO TOTAL</b>	103 DÍAS	100%
<b>DÍAS UTILIZADOS</b>	103 DÍAS	100%

Se presenta a continuación el resumen de las inversiones programadas.

### 8. ACCIONES EFECTUADAS POR LA FISCALIZACIÓN

De conformidad con las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el fiscalizador contenidas en el proceso de contratación pública por menor cuantía de obras los parámetros de contratación, el personal que integra el equipo de fiscalización, de manera objetiva, permanente y en sitio ha realizado la supervisión constante de los trabajos ejecutados por el contratista relacionados con la ejecución de los 77 rubros constitutivos de la obra, para que estos se ejecuten con una metodología apropiada y con estricto apego a las especificaciones técnicas y realidad del lugar. La participación del personal técnico asignado al proyecto por parte del contratista ha sido la mínima necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. Así como el equipo y maquinaria en la obra ha sido la que corresponde. Esta fiscalización ha realizado la verificación y medición de las cantidades de obra ejecutadas. Finalmente, se han elaborado los anexos numéricos de cálculo para determinación de volúmenes, anexos fotográficos y se ha elaborado la planilla de liquidación para su correspondiente trámite y pago.

### 9. VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL TÉCNICO Y EQUIPO

<b>PERSONAL OFERTADO</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN</b>	<b>CHECK LIST</b>
RESIDENTE DE OBRA	100%	OK
TÉCNICO AMBIENTAL	100%	OK

<b>VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA</b>		
<b>EQUIPO Y MAQUINARIA OFERTADO</b>	<b>EQUIPO Y MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA</b>	<b>CHECK LIST</b>
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	1	OK
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	OK
TRACTOR REGADOR	1	OK
VOLQUETES	3	OK

### INCIDENCIAS PRODUCIDAS EN LA OBRA

Se ha trabajado en un tramo de vía de 400 metros en el sector de Praga Sacha, previa autorización de la máxima autoridad y de la administración de contrato.

### CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES

En cada uno de los 33 rubros ejecutados se constata la ejecución de las actividades antes mencionadas, verificando que se está cumpliendo con el objeto de contrato en un 44.72 % cumpliendo las especificaciones técnicas.

El contratista presenta un cronograma valorado de trabajos en periodos distribuidos mensualmente, en el cual consta su inversión, mismo que sirve para la verificación de su cabal cumplimiento, el que será detallado en el informe mensual de administración de contrato.

### VERIFICACIONES REALIZADAS

Durante la ejecución de los trabajos el contratista está utilizando métodos tradicionales de construcción

con el personal y materiales adecuados y suficientes que exigen las obras en ejecución, mismos que se ha verificado los rubros ejecutados por el contratista en el lugar del proyecto, procurando que cumpla con las normas técnicas y precautelando los recursos asignados al proyecto.

## **10. CONCLUSIONES**

Se ha encontrado algunas diferencias de cantidades en distintos rubros del proyecto, las mismas que no han afectado el cumplimiento del objeto del contrato.

En mi calidad de Fiscalizador, y de acuerdo a los Art. 408-18 de las **NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS**, he procedido a **APROBAR LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN**, del Contrato **CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA**.

## **11. RECOMENDACIONES**

Se recomienda que los volúmenes sean cuantificados con mas exactitud.

## **12. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME**

**NOMBRE :** JORGE RODRIGO PICO ANGULO  
**DIRECCIÓN :** BARRIO JUAN MONTALVO, CALLE GERMÁN VALVERDE  
**CIUDAD :** PUYO - PASTAZA  
**TELÉFONO CELULAR :** 0987285448  
**CORREO ELECTRÓNICO :** [rodrigopico\\_sinq@yahoo.es](mailto:rodrigopico_sinq@yahoo.es)



Ing. Rodrigo Pico  
**FISCALIZADOR**



GOBIERNO DE  
**PASTAZA**  
*El Gobierno del Añimo*

## **5 RECEPCIÓN DE OBRA**

**PROYECTO:**

***“CONSTRUCCIÓN DE AFIRMADO DE VARIAS VÍAS UBICADA EN LA  
PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA”.***

***PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA***



**DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL ING. CAYAMBE GUILCABI CLAUDIO FERMÍN MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA PARA: CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA.**

En la ciudad de Puyo el once de marzo del 2026, nos constituimos los señores: Ing. Jairo Narváez como administrador, Ing. Edison Andrés Paguay Córdova delegado, y el (la) Ing. Rodrigo Pico Fiscalizador, en calidad de observador, por el Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial De Pastaza; y el (la) Ing. Cayambe Guilcabi Claudio Fermín en calidad de contratista, con el objeto de celebrar la diligencia de recepción provisional de los trabajos.

**Cláusula Primera.- Antecedentes**

En la ciudad de Puyo el ocho de febrero de 2023 se celebra el contrato suscrito por el Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial De Pastaza, representado por el Señor Prefecto, y por otra parte el Ing. Cayambe Guilcabi Claudio Fermín en calidad de Contratista para la Construcción De Afirmado De Varias Vias Ubicada En La Parroquia Shell, Cantón Mera, Provincia De Pastaza, en la provincia de Pastaza.

El valor del contrato es \$112,829.17 de conformidad con el presupuesto elaborado por el Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial De Pastaza.

**Cláusula Segunda.- Plazo de Ejecución**

Del análisis realizado en la cláusula anterior, revisadas las planillas de obra se desprende lo siguiente:

Fecha de inicio:	22 de mayo de 2025
Plazo contractual:	75 Días
Fecha de terminación:	4 de agosto de 2025
Suspensión de plazo:	Ninguna
Ampliación de plazo:	28 Días
Fecha de terminación ampliada:	1 de septiembre de 2025
Mora:	Ninguna
Multa diaria:	Ninguna
Multa total:	Ninguna

**Cláusula Tercera.- Inspección de la Obra**

Previo al cumplimiento de los requisitos legales, la comisión de recepción se trasladó al lugar de los trabajos y efectuó la inspección de los mismos, comprobándose que la obra ha sido ejecutada en su totalidad de lo contratado, con sujeción a las especificaciones técnicas y cláusulas contractuales, con resultados satisfactorios, en consecuencia, la comisión recibe en forma provisional todos los trabajos realizados en la: Construcción De Afirmado De Varias Vias Ubicada En La Parroquia Shell, Cantón Mera, Provincia De Pastaza.

La comisión deja constancia expresa que será de cuenta del contratista la reparación o reposición de parte de la obra que se deba a defectos de la construcción.

**Cláusula Cuarta.- Cantidades de Obra Contratadas y Ejecutadas**

Es de estricta responsabilidad de la Fiscalización las cantidades de obra contratadas y ejecutadas en el contrato de Construcción De Afirmado De Varias Vias Ubicada En La Parroquia Shell, Cantón Mera, Provincia De Pastaza, que se detalla en el siguiente cuadro de la presente acta de entrega Recepción Provisional.

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL
	AFIRMADO LOS ALTARES				



1	Transporte de maquinaria	glb	4.00	\$ 547.44	100.00%
2	Replanteo y nivelacion	km	0.50	\$ 236.97	100.00%
3	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m <sup>3</sup>	943.16	\$ 980.89	943.16%
4	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m <sup>3</sup>	1831.02	\$ 5,309.96	114.44%
5	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	m <sup>3</sup> -km	18438.37	\$ 7,190.96	115.24%
6	Limpieza de cunetas a máquina	m	882.00	\$ 502.74	88.20%
SEÑALES AMBIENTALES					
7	Pancarta informativa de la obra (letrero)-con estructura	u	1.00	\$ 377.45	100.00%
8	Señales informativas y reglamentarias (1.30mx0.80m)	u	3.00	\$ 227.82	100.00%
9	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	m	100.00	\$ 33.00	100.00%
10	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1.00	\$ 18.11	100.00%
11	Kit antiderrames	u	2.00	\$ 325.00	100.00%
12	Charla Ambiental	hora	4.00	\$ 250.00	100.00%
AFIRMADO CAMINO A2 (ALTARES)					
13	Transporte de maquinaria	glb	4.00	\$ 547.44	100.00%
14	Replanteo y nivelacion	km	0.40	\$ 189.58	100.00%
15	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m <sup>3</sup>	884.69	\$ 920.08	884.69%
16	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m <sup>3</sup>	1545.99	\$ 4,483.37	120.78%
17	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	m <sup>3</sup> -km	16974.97	\$ 6,620.24	132.62%
18	Limpieza de cunetas a máquina	m	732.36	\$ 417.45	91.55%
SEÑALES AMBIENTALES					
19	Pancarta informativa de la obra (letrero)-con estructura	u	1.00	\$ 377.45	100.00%
20	Señales informativas y reglamentarias (1.30mx0.80m)	u	0.00	\$ 0.00	0.00%
21	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	m	100.00	\$ 33.00	100.00%
22	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1.00	\$ 18.11	100.00%
23	Kit antiderrames	u	2.00	\$ 325.00	100.00%
24	Charla Ambiental	hora	4.00	\$ 250.00	100.00%
AFIRMADO MONTE SINAI (AMPLIACION DE VIA)					
25	Transporte de maquinaria	glb	4.00	\$ 547.44	100.00%
26	Replanteo y nivelacion	km	0.60	\$ 284.36	100.00%
27	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m <sup>3</sup>	386.43	\$ 401.89	386.43%
28	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m <sup>3</sup>	2895.49	\$ 8,396.92	100.54%
29	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	m <sup>3</sup> -km	9584.07	\$ 3,737.79	33.28%
30	Limpieza de cunetas a máquina	m	600.00	\$ 342.00	100.00%
SEÑALES AMBIENTALES					
31	Pancarta informativa de la obra (letrero)-con estructura	u	1.00	\$ 377.45	100.00%
32	Señales informativas y reglamentarias (1.30mx0.80m)	u	0.00	\$ 0.00	0.00%
33	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	m	100.00	\$ 33.00	100.00%
34	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1.00	\$ 18.11	100.00%
35	Kit antiderrames	u	2.00	\$ 325.00	100.00%
36	Charla Ambiental	hora	4.00	\$ 250.00	100.00%
AFIRMADO PRAGA SACHA					
37	Transporte de maquinaria	glb	8.00	\$ 1,094.88	200.00%
38	Replanteo y nivelacion	km	1.00	\$ 473.94	166.67%
39	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m <sup>3</sup>	2197.59	\$ 2,285.50	2197.59%
40	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m <sup>3</sup>	4764.33	\$ 13,816.56	248.14%
41	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	m <sup>3</sup> -km	49262.04	\$ 19,212.20	256.57%
42	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m, e=2.5 mm, PM-	m	6.00	\$ 2,096.52	100.00%
43	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1.50 m, e=2.5 mm, PM-	m	12.00	\$ 5,181.60	100.00%
44	S.C. Tubería de acero corrugado D= 2.00 m .e=2.5 mm, PM-	m	6.00	\$ 3,447.78	100.00%
45	Relleno compactado/mejoramiento*capas=20cm	m <sup>3</sup>	28.80	\$ 325.44	96.00%
46	Limpieza de cunetas a máquina	m	1920.00	\$ 1,094.40	192.00%
SEÑALES AMBIENTALES					
47	Pancarta informativa de la obra (letrero)-con estructura	u	1.00	\$ 377.45	100.00%
48	Señales informativas y reglamentarias (1.30mx0.80m)	u	0.00	\$ 0.00	0.00%
49	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	m	100.00	\$ 33.00	100.00%
50	Contenedores metálicos de 55 galones	u	2.00	\$ 36.22	200.00%
51	Kit antiderrames	u	4.00	\$ 650.00	200.00%



52	Charla Ambiental	hora	6.00	\$ 375.00	150.00%
<b>AFIRMADO NUEVO MILENO (AMPLIACION)</b>					
53	Transporte de maquinaria	glb	4.00	\$ 547.44	100.00%
54	Replanteo y nivelacion	km	0.31	\$ 146.92	62.00%
55	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m <sup>3</sup>	568.05	\$ 590.77	568.05%
56	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m <sup>3</sup>	1647.84	\$ 4,778.74	117.70%
57	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	m <sup>3</sup> -km	14583.37	\$ 5,687.51	104.17%
58	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1.50 m, e=2.5 mm, PM-	m	10.00	\$ 4,318.00	100.00%
59	Limpieza de cunetas a máquina	m	500.00	\$ 285.00	100.00%
<b>SENALES AMBIENTALES</b>					
60	Pancarta informativa de la obra (letrero)-con estructura	u	1.00	\$ 377.45	100.00%
61	Señales informativas y reglamentarias (1.30mx0.80m)	u	0.00	\$ 0.00	0.00%
62	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	m	100.00	\$ 33.00	100.00%
63	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1.00	\$ 18.11	100.00%
64	Kit antiderrames	u	2.00	\$ 325.00	100.00%
65	Charla Ambiental	hora	2.00	\$ 125.00	50.00%
<b>PLATAFORMA NUEVO AMANECER</b>					
66	Transporte de maquinaria	glb	0.00	\$ 0.00	0.00%
67	Replanteo y nivelacion	m <sup>2</sup>	0.00	\$ 0.00	0.00%
68	Desbroce, desbosque y limpieza	ha	0.00	\$ 0.00	0.00%
69	Relleno compactado/ mejoramiento*capas=20cm (CANCHA)	m <sup>2</sup>	0.00	\$ 0.00	0.00%
70	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m <sup>3</sup>	0.00	\$ 0.00	0.00%
71	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	m <sup>3</sup> -km	0.00	\$ 0.00	0.00%
<b>SENALES AMBIENTALES</b>					
72	Pancarta informativa de la obra (letrero)-con estructura	u	0.00	\$ 0.00	0.00%
73	Señales informativas y reglamentarias (1.30mx0.80m)	u	0.00	\$ 0.00	0.00%
74	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	m	0.00	\$ 0.00	0.00%
75	Contenedores metálicos de 55 galones	u	0.00	\$ 0.00	0.00%
76	Kit antiderrames	u	0.00	\$ 0.00	0.00%
77	Charla Ambiental	hora	0.00	\$ 0.00	0.00%
<b>TOTAL PLANILLADO</b>				<b>\$ 112,629.45</b>	

#### Cláusula Quinta.- Liquidación Económica

Por los trabajos realizados el contratista presentó las planillas que a continuación se detalla y cuyo valor alcanza los ciento veinte y cinco mil trescientos ochenta y siete dólares, 44/ 100 centavos ( \$125,387.44 ).

PLANILLAS	MONTOS
PLANILLA DE AVANCE No. 1	\$ 995.27
PLANILLA DE AVANCE No. 2	\$ 15,730.24
PLANILLA DE AVANCE No. 3	\$ 45,441.29
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	\$ 50,462.65
REAJUSTE DEFINITIVO DEL ANTICIPO	\$ 1,173.42
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE AVANCE No. 1	\$ 93.16
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE AVANCE No. 2	\$ 1,472.35
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE AVANCE No. 3	\$ 4,662.28
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	\$ 5,356.78
<b>TOTAL PLANILLADO</b>	<b>\$ 125,387.44</b>

#### Cláusula Sexta.- Reajuste de Precios

Se han enviado las planillas de reajuste provisionales, quedando por calcularse los reajustes definitivos que se incluirán en el acta de entrega recepción definitiva.

#### Cláusula Séptima.- Recepción de la Obra

Habiéndose constatado que los trabajos ejecutados se han realizado de conformidad con las normas, Especificaciones Generales y cláusulas contractuales, la comisión procede a la recepción provisional de los trabajos



de Construcción De Ajujado De Varias Vias Ubicada En La Parroquia Shell, Cantón Mera, Provincia De Pastaza y en base a la información presentada por el Fiscalizador y avalada por el Administrador del Contrato; deja expresa constancia de lo siguiente:

1.- Que es de responsabilidad del Fiscalizador y Administrador del contrato:

- a) La liquidación técnica económica constante en el ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL.
- b) Liquidación de plazos.
- c) La verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales y de resultados de laboratorio de ensayo de materiales.
- d) El LIBRO DE OBRA, del proceso de ejecución de las obras, que está en custodia de la Dirección Financiera.

2.- Que recibe del contratista a entera satisfacción las obras objeto del contrato, por lo que no amerita la elaboración de informe de observaciones.

3.- Se acuerda con el Contratista que: "En cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, será obligación del contratista satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la contratante, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

4.- Las partes dejan constancia mediante la suscripción de la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL** que los trabajos han sido concluidos y que el contratista, **NO OBSTANTE**, la suscripción del **ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA**, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1936, 1937 y de conformidad con los artículos 1938, 1939, 1940 de la Codificación del Código Civil, y el inciso final de la Norma 408-29, esto es hasta por **diez (10) años, contados a partir de la fecha de celebrada la ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA** y para constancia firman en unidad de acto en original.



Ing. Jairo Narváez

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**



Ing. Edison Andrés Paguay Córdova  
**DELEGADO**



Ing. Cayambe Guilcapi Claudio Fermín  
**CONTRATISTA**

**Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2026-24597-M**

**Puyo, 06 de marzo de 2026**

**PARA:** Sr. Ing. Jairo Alberto Narváez Guevara  
**Jefe de Estudios y Proyectos**  
Sr. Ing. Jorge Rodrigo Pico Angulo  
**Fiscalizador 1**  
Sr. Ing. Edison Andres Paguay Córdova  
**Analista de Estudios y Proyectos 1**

**ASUNTO:** RECEPCIÓN PROVISIONAL: MCO-GADPPz-098-2022 "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA".

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2026-11998-M, de fecha 03 de marzo de 2026, suscrito por el Ing. Jairo Alberto Narváez Guevara, en calidad de Administrador de Contrato, documento en el cual solicita un designado para la Recepción Provisional de la obra: "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA", una vez concluido los trabajos del proyecto antes mencionado, informo el siguiente detalle:

**DATOS DEL PROYECTO:**

Proyecto:	"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"
Fiscalizador:	Ing. Jorge Rodrigo Pico Angulo
Administrador de Contrato:	Ing. Jairo Alberto Narváez Guevara
Contratista:	Ing. Claudio Cayambe
Estado del Proyecto:	Terminado.

**DESIGNACIÓN:**

Por lo expuesto, y de conformidad con lo determinado en la Resolución Administrativa Nro. GADPPZ-GADPPZ-2025-0754-R, de fecha 01 de octubre de 2025, TÍTULO V; DE LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES, ADMINISTRADORES Y FISCALIZADORES, en su Artículo 9.3; me permito designar a la Comisión de Recepción Provisional de la obra: MCO-GADPPz-098-2022 "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA", a los siguientes técnicos.

Técnico Designado:	Ing. Edison Andrés Paguay Córdova
Administrador de Contrato:	Ing. Jairo Alberto Narváez Guevara

**Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2026-24597-M**

**Puyo, 06 de marzo de 2026**

Será obligación de los designados excusarse en caso de conflicto de intereses, y velar por el cabal cumplimiento General a la ley Orgánica Nacional de Contratación Pública, las disposiciones, normativas y plazos legales, la Dirección solicitante deberá verificar y supervisar el cumplimiento del proceso y plazos de la recepción, y notificará la presente designación a los servidores públicos delegados.

Información que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Hector Vinicio Alarcon Yopez  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS (E)**

Referencias:

- GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2026-11998-M

Anexos:

- 37624-e.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Mgs. Flor Milena Miranda Vintimilla - Asistente Administrativo I



Oficio nro. CC-022-2025

Puyo, 1 de septiembre de 2025

**Asunto:** recepción provisional

Máster André Granda  
**PREFECTO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

Presente. -

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en las funciones que acertadamente desempeña al frente de la Institución.

Por medio de la presente una vez culminado los trabajos SOLICITO la recepción provisional de la obra: **"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"**

Sin otro particular, me suscribo atentamente.

Atentamente,



Ing. Claudio Fermin Cayambe Guilcapi  
**RUC: 1600462723001**  
**CONTRATISTA**

**Copia:** Ing. Jairo Narvaez



GOBIERNO DE  
**PASTAZA**  
*El Gobierno del Añimo*

# **6 SÁBANA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES**

**PROYECTO:**

***“CONSTRUCCIÓN DE AFIRMADO DE VARIAS VÍAS UBICADA EN LA  
PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA”.***

***PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA***



**GOBIERNO DE PASTAZA**

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

DPTO. FISCALIZACIÓN

**CUADRO DE DIFERENCIAS DE CANTIDADES DE OBRAS DE OBRA**

CANTON NERA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBRA : **CONSTRUCCIÓN DE AFERRADO DE VARELA 15x10 UBICADA EN LA PUERQUERA SHELL, CANTON NERA, PROVINCIA DE PASTAZA**  
 FECHA DE CONTRATO : 8 de febrero de 2023  
 CONTRATISTA : Ing. Cuyambe Oulacay Claudio Fernán  
 PLAZO : 74 Días  
 AMPLIACIONES : 0 Días  
 SUSPENSIÓN : 0 Días

V. CONTRATO : \$ 112.829,17  
 V. EJECUTADO : \$ 112.629,43  
 V. EXCEDENTES : \$ 31.373,10  
 V. DISMINUYEN : \$ 31.572,84  
 ORDENES DE TRABAJO : 0,00%

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CONTRATO	TOTAL	EJECUTADO		% TOTAL	DIFERENCIAS	
						CANTIDAD	VALOR		EXCEDENTES	DISMINUYEN
1	AFERRADO LOS ALTARES									
1	Transporte de maquinaria	glb	4,00	136,86	547,44	4,00	547,44	100,00%	-	-
2	Repoblación y siembras	km	0,50	473,94	236,97	0,50	236,97	100,00%	-	-
3	Ejecución sin clasificamiento de tierra	m <sup>3</sup>	100,00	1,04	104,00	943,16	943,16	943,16%	843,16	876,80
4	Materiales pte de movimiento minado, cargada y repajada	m <sup>3</sup>	1.600,00	2,90	4.640,00	1.831,07	5.309,96	114,44%	3.312,02	669,96
5	Transporte de material pte 110 a 20 km	m <sup>3</sup> km	16.000,00	0,39	6.240,00	18.438,37	7.190,96	118,54%	2.438,37	950,96
6	Limpieza de canchales o maquina	m	1.000,00	0,57	570,00	882,00	507,74	88,30%	-	118,00
7	SENALES AMBIENTALES	0	1,00	377,45	377,45	1,00	377,45	100,00%	-	-
8	Puncorta informativa de la obra (letero-con estructura	u	3,00	75,94	227,82	3,00	227,82	100,00%	-	-
9	Señales informativas y reglamentarias (1,30m x 0,80m)	m	100,00	0,33	33,00	100,00	33,00	100,00%	-	-
10	Cinta peligro colores intensos (mat. poliuretano)	u	1,00	18,11	18,11	1,00	18,11	100,00%	-	-
11	Rit anti-derrames	u	2,00	162,50	325,00	2,00	325,00	100,00%	-	-
12	Charita Ambiental	hora	4,00	62,50	250,00	4,00	250,00	100,00%	-	-
13	AFERRADO CAMINO A3 (ALTARES)									
13	Transporte de maquinaria	glb	4,00	136,86	547,44	4,00	547,44	100,00%	-	-
14	Repoblación y siembras	km	0,40	473,94	189,56	0,40	189,56	100,00%	-	-
15	Ejecución sin clasificamiento de tierra	m <sup>3</sup>	100,00	1,04	104,00	884,69	920,08	884,69%	816,08	816,08
16	Materiales pte de movimiento minado, cargada y repajada	m <sup>3</sup>	1.600,00	2,90	4.640,00	1.545,99	4.483,37	130,78%	265,99	771,37
17	Transporte de material pte 110 a 20 km	m <sup>3</sup> km	12.800,00	0,39	4.992,00	16.974,97	6.626,24	132,62%	4.174,97	1.629,24
18	Limpieza de canchales o maquina	m	800,00	0,57	456,00	732,36	417,45	91,55%	-	67,64
19	SENALES AMBIENTALES	0	1,00	377,45	377,45	1,00	377,45	100,00%	-	-
20	Puncorta informativa de la obra (letero-con estructura	u	3,00	75,94	227,82	3,00	227,82	100,00%	-	-
21	Señales informativas y reglamentarias (1,30m x 0,80m)	m	100,00	0,33	33,00	100,00	33,00	100,00%	-	-
22	Cinta peligro colores intensos (mat. poliuretano)	u	1,00	18,11	18,11	1,00	18,11	100,00%	-	-
23	Rit anti-derrames	u	2,00	162,50	325,00	2,00	325,00	100,00%	-	-
24	Charita Ambiental	hora	4,00	62,50	250,00	4,00	250,00	100,00%	-	-
25	AFERRADO MONTE SINAI (AMPLIACION DE VIA)									
25	Transporte de maquinaria	glb	4,00	136,86	547,44	4,00	547,44	100,00%	-	-
26	Repoblación y siembras	km	0,60	473,94	284,36	0,60	284,36	100,00%	-	-
27	Ejecución sin clasificamiento de tierra	m <sup>3</sup>	100,00	1,04	104,00	386,43	401,89	386,43%	266,43	297,89
28	Materiales pte de movimiento minado, cargada y repajada	m <sup>3</sup>	2.800,00	2,90	8.120,00	2.895,49	8.396,92	100,54%	15,49	44,92
29	Transporte de material pte 110 a 20 km	m <sup>3</sup> km	28.000,00	0,39	11.052,00	9.584,07	3.277,79	33,28%	-	7.494,21
30	Limpieza de canchales o maquina	m	600,00	0,57	342,00	600,00	342,00	100,00%	-	-
31	SENALES AMBIENTALES	0	1,00	377,45	377,45	1,00	377,45	100,00%	-	-
32	Puncorta informativa de la obra (letero-con estructura	u	3,00	75,94	227,82	3,00	227,82	100,00%	-	-
33	Señales informativas y reglamentarias (1,30m x 0,80m)	m	100,00	0,33	33,00	100,00	33,00	100,00%	-	-
34	Cinta peligro colores intensos (mat. poliuretano)	u	1,00	18,11	18,11	1,00	18,11	100,00%	-	-
35	Rit anti-derrames	u	2,00	162,50	325,00	2,00	325,00	100,00%	-	-
36	Charita Ambiental	hora	4,00	62,50	250,00	4,00	250,00	100,00%	-	-
37	AFERRADO PRAGA SACHA									
37	Transporte de maquinaria	glb	4,00	136,86	547,44	4,00	547,44	100,00%	-	-
38	Repoblación y siembras	km	0,60	473,94	284,36	0,60	284,36	100,00%	-	-
39	Ejecución sin clasificamiento de tierra	m <sup>3</sup>	100,00	1,04	104,00	2.197,59	2.355,49	2197,59%	0,40	159,58
40	Materiales pte de movimiento minado, cargada y repajada	m <sup>3</sup>	1.900,00	2,90	5.568,00	4.764,33	13.816,36	348,14%	2.844,33	3.248,56
41	Transporte de material pte 110 a 20 km	m <sup>3</sup> km	19.000,00	0,39	7.458,00	49.262,04	19.232,20	256,57%	30.062,04	11.724,20
42	S.C. Taberla de aceite cargada D= 1,20 m e= 2,5 mm, PM 11	m	6,00	349,42	2.096,52	6,00	2.096,52	100,00%	-	-
43	S.C. Taberla de acero cargada D= 1,50 m e= 2,5 mm, PM 11	m	12,00	431,80	5.181,60	12,00	5.181,60	100,00%	-	-
44	S.C. Taberla de acero cargada D= 2,00 m e= 3 mm, PM 11	m	6,00	574,63	3.447,78	6,00	3.447,78	100,00%	-	-
45	Relieno compocondo; mejoramiento; copusa=30cm	m <sup>2</sup>	30,00	11,80	354,00	38,50	375,44	96,00%	-	-
46	Limpieza de canchales o maquina	m	1.000,00	0,57	570,00	1.920,00	1.094,40	192,00%	920,00	524,40
47	SENALES AMBIENTALES	0	1,00	377,45	377,45	1,00	377,45	100,00%	-	-
48	Puncorta informativa de la obra (letero-con estructura	u	3,00	75,94	227,82	3,00	227,82	100,00%	-	-
49	Señales informativas y reglamentarias (1,30m x 0,80m)	m	100,00	0,33	33,00	100,00	33,00	100,00%	-	-
50	Cinta peligro colores intensos (mat. poliuretano)	u	1,00	18,11	18,11	2,00	36,22	200,00%	1,00	18,11
51	Rit anti-derrames	u	2,00	162,50	325,00	4,00	650,00	200,00%	3,00	325,00
52	Charita Ambiental	hora	4,00	62,50	250,00	6,00	375,00	150,00%	3,00	325,00



**GOBIERNO DE PASTAZA**

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

DPTO. \_\_\_\_\_ FISCALIZACIÓN

**CUADRO DE DIFERENCIAS DE CANTIDADES DE OBRA**

OBRA : **RECONSTRUCCIÓN DE ARRABAL DE PASADIZO TRAFICADA EN LA PARROQUIA SHEL CANTÓN SHEL, PROVINCIA DE PASTAZA**

FECHA DE CONTRATADO : 1 de febrero de 2012

CONTRATISTA : Ing. Cayambe Gutiérrez Claudio Ferrn

PLAZO : 75 Días

AMPLIACIONES : 25 Días

SUSPENSIÓN : 0 Días

INICIO DEL PLAZO : 22 de mayo de 2012

TERMINACIÓN DEL PLAZO : 1 de septiembre de 2012

PERÍODO : 25-ago-12 A 01-sep-12

ACUMULADO : \$ 112.829.17 PORCENTAJE : 99.63%

V. EJECUTADO : \$ 112.629.43 27.81%

V. ENDEBERES : \$ 31.373.10 27.88%

V. DISMINUYEN : \$ 31.572.84 0.00%

ORDENES DE TRABAJO : 0.00%

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CONTRACTO	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO VALOR	% TOTAL	EXCEDENTES	DIFERENCIAS	DISMINUYEN
<b>SERVALES ALBIENIALES</b>											
53	ARRABAL NUEVO AMPLIACIÓN	0	4.00	136.86	547.44	4.00	547.44	100.00%	-	-	-
54	Transporte de maquinaria	gib	0.50	473.94	236.97	0.31	146.92	62.00%	-	0.19	90.03
55	Reposición y mezcla	km	1.00	1.04	104.00	568.05	590.77	465.05%	-	456.72	-
56	Evacuación sin clasificación de tierra	m <sup>3</sup>	1.400.00	2.90	4.060.00	1.647.84	4.728.74	117.20%	-	347.84	-
57	Materiales para el movimiento de tierra, cargada y regada	m <sup>3</sup> km	14.000.00	0.30	4.200.00	5.687.51	104.17%	583.37	-	237.51	-
58	Transporte de material por carretera 10 a 30 km	m <sup>3</sup> km	10.00	431.80	4.318.00	4.318.00	100.00%	-	-	-	-
59	Limpieza de canchales a máquina	m <sup>2</sup>	500.00	0.57	285.00	285.00	100.00%	-	-	-	-
<b>SERVALES ALBIENIALES</b>											
60	Parquea informada de la obra (cheros) con estructura	u	1.00	377.45	377.45	1.00	377.45	100.00%	-	-	-
61	Señales informativas y reglamentarias (1.30m x 0.50m)	m	3.00	73.94	227.82	33.00	33.00	100.00%	-	3.00	297.82
62	Contra pedregales metálicos pint. poliéster	m	100.00	0.33	33.00	1.00	18.11	100.00%	-	-	-
63	Contra pedregales metálicos de 35 galones	u	1.00	18.11	18.11	2.00	37.22	100.00%	-	-	-
64	Rit anti-derriames	u	3.00	163.50	325.00	3.00	175.00	50.00%	-	2.00	175.00
65	Charita Ambiental	g	4.00	63.50	250.00	3.00	190.50	100.00%	-	-	-
<b>PLATAFORMA NUEVO AMANECER</b>											
66	Transporte de maquinaria	gib	4.00	136.86	547.44	4.00	547.44	100.00%	-	-	-
67	Reposición y mezcla	m <sup>2</sup>	1.960.00	1.12	2.195.20	1.12	1.12	100.00%	-	4.06	517.44
68	Derribose de limpieza y limpieza	ha	0.20	646.54	129.31	0.20	129.31	100.00%	-	1.960.00	2.195.30
69	Redes compactador, movimiento, topar, 30cm (CANCHA N)	m <sup>2</sup>	180.00	11.80	2.024.00	0.20	2.024.00	100.00%	-	180.00	2.024.00
70	Materiales para el movimiento de tierra, cargada y regada	m <sup>3</sup>	2.352.00	2.90	6.820.80	2.352.00	6.820.80	100.00%	-	-	-
71	Transporte de material por carretera 10 a 20 km	m <sup>3</sup> km	25.320.00	0.39	9.874.80	25.320.00	9.874.80	100.00%	-	-	-
<b>SERVALES ALBIENIALES</b>											
72	Parquea informada de la obra (cheros) con estructura	u	1.00	377.45	377.45	1.00	377.45	100.00%	-	-	-
73	Señales informativas y reglamentarias (1.30m x 0.50m)	m	3.00	73.94	227.82	3.00	227.82	100.00%	-	-	-
74	Contra pedregales metálicos pint. poliéster	m	100.00	0.33	33.00	1.00	18.11	100.00%	-	3.00	33.00
75	Contra pedregales metálicos de 35 galones	u	1.00	18.11	18.11	2.00	37.22	100.00%	-	-	-
76	Rit anti-derriames	u	3.00	163.50	325.00	3.00	325.00	100.00%	-	-	-
77	Señales informativas y reglamentarias (1.30m x 0.50m)	ha	4.00	63.50	250.00	4.00	250.00	100.00%	-	-	-
				<b>\$ 112.829.17</b>			<b>\$ 112.629.43</b>		<b>\$ 31.373.10</b>		<b>\$ 31.572.84</b>

**JORGE RODRIGO RICO**  
FISCALIZADOR

**JAIR ALBERTO NARVAEZ GUEVARA**  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

**CLAUDIO FERRIN CAYABE GUTIERREZ**  
CONTRATISTA



GOBIERNO DE  
**PASTAZA**  
*El Gobierno del Añono*

# **7 CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA VALOARADO DE TRABAJOS**

**PROYECTO:**

**“CONSTRUCCIÓN DE AFIRMADO DE VARIAS VÍAS UBICADA EN LA  
PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA”.**

**PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA**

**Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2025-10951-M**

**Puyo, 04 de agosto de 2025**

**PARA:** Sr. Ing. Jorge Rodrigo Pico Angulo  
**Fiscalizador 1**

**ASUNTO:** Reprogramación de trabajos N° 3 Proceso MCO-GADPPz-098-2022:  
"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA  
PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

Estimado ingeniero, mediante el presente pongo en su conocimiento que mediante Oficio nro. CC-016-2025 de fecha 04 de agosto de 2025, el Ing. Claudio Cayambe, contratista del Proceso MCO-GADPPz-098-2022 referente a la "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA", entrega la reprogramación de trabajos conforme lo solicitado, misma que hago llegar a usted para que se realice el análisis respectivo para su debida legalización.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Jairo Alberto Narváez Guevara  
**JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**

Anexos:

- reprogramacion\_nro\_3-signed.pdf
- oficio\_nro\_cc-016-2025-signed0508822001754341168.pdf



**Oficio nro. CC-016-2025**

Puyo, 4 de agosto de 2025

**Asunto:** Entrega de la Reprogramación nro. 3 del cronograma valorado de trabajo

Jairo Narváez Guevara

**INGENIERO CIVIL**

**ADMINISTRADOR DEL CONTRA**

Estimado Ing. Jairo Narváez Guevara,

En atención al Oficio N° JN-002-2025-SHELL, de fecha 04 de agosto de 2025, mediante el cual se notifica la resolución de prórroga de plazo de 28 días para el contrato signado con el código MCO-GADPPz-098-2022, cuyo objeto es la "Construcción de afirmado de varias vías ubicada en la parroquia Shell, cantón Mera, provincia de Pastaza", me permito presentar la Reprogramación N° 3 del Cronograma Valorado de Trabajos.

Dicha reprogramación ha sido elaborada considerando la ruta crítica del proyecto, ajustándose a la prórroga otorgada conforme a la Resolución de Ampliación de Plazo N° 01, emitida por el Ing. Jair Ledesma, Director de Fiscalización, y en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución N.º GADPPZ-GADPPZ-2025-0720-R.

Adjunto a este oficio, se entrega el documento correspondiente a la Reprogramación N° 3, detallando las actividades, plazos y costos actualizados, asegurando el cumplimiento de los objetivos del proyecto dentro del nuevo plazo establecido.

Agradezco de antemano su revisión y aprobación, quedando a su disposición para cualquier aclaración o coordinación adicional que se requiera.

Atentamente,



Ing. Claudio Fermin Cayambe Guilcapi

**RUC: 1600462723001**

**CONTRATISTA**

**Copia:** Ing. Rodrigo Pico - Fiscalizador

REPROGRAMACION NIRO 3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	71 + 26 (AMPLIACION)+ 4s103				
						MES 1 10 días MAYO	MES 2 30 días JUNIO	MES 3 31 días JULIO	MES 4 31 días AGOSTO	MES 5 1 días SEPTIEMBRE
<b>AFIRMADO LOS ALTARES</b>										
1	Transporte de maquinaria	glb	4.00	136.86	547.44000	547.44000				
2	Replanteo y nivelación	km	0.50	473.94	236.97000	236.97000				
3	Excavación sin clasificar (mov. de tierra)	m³	100.00	1.04	104.00000	104.00000				
4	Material pétreo de mejoramiento (minada)	m³	1,600.00	2.90	4,640.00000	4,640.00000				
5	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	m³-km	16,000.00	0.39	6,240.00000	6,240.00000				
6	Limpieza de cunetas a máquina	m	1,000.00	0.57	570.00000	570.00000				
<b>SEÑALES AMBIENTALES</b>										
7	Pancarta informativa de la obra (letrero)-	u	1.00	377.45	377.45000	377.45000				
8	Señales informativas y reglamentarias	u	3.00	75.94	227.82000	227.82000				
9	Cinta peligro colores intensos (mat.)	m	100.00	0.33	33.00000	33.00000				
10	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1.00	18.11	18.11000	18.11000				
11	Kit antiderrames	u	2.00	162.50	325.00000	325.00000				
12	Charla Ambiental	hora	4.00	62.50	250.00000	250.00000				
<b>AFIRMADO CAMINO A2 (ALTARES)</b>										
13	Transporte de maquinaria	glb	4.00	136.86	547.44000	547.44000				
14	Replanteo y nivelación	km	0.40	473.94	189.58000	189.58000				
15	Excavación sin clasificar (mov. de tierra)	m³	100.00	1.04	104.00000	104.00000				
16	Material pétreo de mejoramiento (minada)	m³	1,280.00	2.90	3,712.00000	3,712.00000				
17	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	m³-km	12,800.00	0.39	4,992.00000	4,992.00000				
18	Limpieza de cunetas a máquina	m	800.00	0.57	456.00000	456.00000				
<b>SEÑALES AMBIENTALES</b>										
19	Pancarta informativa de la obra (letrero)-	u	1.00	377.45	377.45000	377.45000				
20	Señales informativas y reglamentarias	u	3.00	75.94	227.82000	227.82000				
21	Cinta peligro colores intensos (mat.)	m	100.00	0.33	33.00000	33.00000				
22	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1.00	18.11	18.11000	18.11000				
23	Kit antiderrames	u	2.00	162.50	325.00000	325.00000				
24	Charla Ambiental	hora	4.00	62.50	250.00000	250.00000				
<b>AFIRMADO MONTE SINAI (AMPLIACION DE</b>										
25	Transporte de maquinaria	glb	4.00	136.86	547.44000	547.44000				
26	Replanteo y nivelación	km	0.60	473.94	284.36000	284.36000				
27	Excavación sin clasificar (mov. de tierra)	m³	100.00	1.04	104.00000	104.00000				
28	Material pétreo de mejoramiento (minada)	m³	2,880.00	2.90	8,352.00000	8,352.00000				
29	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	m³-km	28,800.00	0.39	11,232.00000	11,232.00000				
30	Limpieza de cunetas a máquina	m	600.00	0.57	342.00000	342.00000				
<b>SEÑALES AMBIENTALES</b>										
31	Pancarta informativa de la obra (letrero)-	u	1.00	377.45	377.45000	377.45000				
32	Señales informativas y reglamentarias	u	3.00	75.94	227.82000	227.82000				
33	Cinta peligro colores intensos (mat.)	m	100.00	0.33	33.00000	33.00000				
34	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1.00	18.11	18.11000	18.11000				
35	Kit antiderrames	u	2.00	162.50	325.00000	325.00000				
36	Charla Ambiental	hora	4.00	62.50	250.00000	250.00000				

AFIRMADO PRAGA SACHA									
37	Transporte de maquinaria	g/b	4.00	136.86	547.44000		547.44000		
38	Replanteo y nivelacion	km	0.60	473.94	284.36000	284.36000			
39	Excavacion sin clasificar(mov de tierra)	m³	100.00	1.04	104.00000		26.00000	78.00000	
40	Material pétreo de mejoramiento (finada)	m³	1,920.00	2.90	5,568.00000		1,392.00000	4,176.00000	
41	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	m³*km	19,200.00	0.39	7,488.00000		1,872.00000	5,616.00000	
42	S.C. Tuberia de acero corrugado Da 1,20 m, e=2.5 mm, PMA-100	m	6.00	349.42	2,096.52000			2,096.52000	
43	S.C. Tuberia de acero corrugado Da 1,50 m, e=2.5 mm, PMA-100	m	12.00	431.80	5,181.60000			5,181.60000	
44	S.C. Tuberia de acero corrugado Da 2,00 m, e=2.5 mm, PMA-100	m	6.00	574.63	3,447.78000			3,447.78000	
45	Relevo compactado/mejoramiento *capas=20cm	m³	30.00	11.30	339.00000		84.75000	254.25000	
46	Limpieza de cunetas a maquina	m	1,000.00	0.57	570.00000		142.50000	427.50000	
SERVALES AMBIENTALES									
47	Planchara informativa de la obra (letrero)-	u	1.00	377.45	377.45000		377.45000		
48	Señales informativas y reglamentarias	u	3.00	75.94	227.82000		227.82000		
49	Cinta peligro colores intensos (mat.	m	100.00	0.33	33.00000		33.00000		
50	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1.00	18.11	18.11000		18.11000		
51	Kit antiderrames	u	2.00	162.50	325.00000		325.00000		
52	Charla Ambiental	ho	4.00	62.50	250.00000		250.00000		
AFIRMADO NUEVO MILERO									
53	Transporte de maquinaria	g/b	4.00	136.86	547.44000		547.44000		
54	Replanteo y nivelacion	km	0.50	473.94	236.97000		236.97000		
55	Excavacion sin clasificar(mov de tierra)	m³	100.00	1.04	104.00000		104.00000		
56	Material pétreo de mejoramiento (finada, cargada y regada)	m³	1,400.00	2.90	4,060.00000		4,060.00000		
57	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	m³ * km	14,000.00	0.39	5,460.00000		5,460.00000		
58	S.C. Tuberia de acero corrugado Da 1,50 m, e=2.5 mm, PMA-100	m	10.00	431.80	4,318.00000		4,318.00000		
59	Limpieza de cunetas a maquina	m	500.00	0.57	285.00000		285.00000		
SERVALES AMBIENTALES									
60	Planchara informativa de la obra (letrero)-con estructura	u	1.00	377.45	377.45000		377.45000		
61	Señales informativas y reglamentarias	u	3.00	75.94	227.82000		227.82000		
62	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	m	100.00	0.33	33.00000		33.00000		
63	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1.00	18.11	18.11000		18.11000		
64	Kit antiderrames	u	2.00	162.50	325.00000		325.00000		
65	Charla Ambiental	ho	4.00	62.50	250.00000		250.00000		

PLATAFORMA NUEVO AMANECEER												
66	Transporte de maquinaria		4.00	136.86	547,44000						547,44000	
67	Replanteo y nivelación		1,960.00	1.12	2195,20000						2,195,20000	
68	Desbroce, desbosque y limpieza		0.20	646.54	129,31000						129,31000	
69	Relleno compactado/mejoramiento *capas=20cm (CANCHA NIVELACION)		180.00	11.40	2034,00000						2,034,00000	
70	Material pétreo de mejoramiento /minada.		2,352.00	2.90	6820,80000						6,820,80000	
71	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)		25,320.00	0.39	9874,80000						9,874,80000	
SEÑALES AMBIENTALES												
72	Pancarta informativa de la obra (letrero)-con	u	1.00	377.45	377,45000						377,45000	
73	Señales informativas y reglamentarias	u	3.00	75.94	227,82000						227,82000	
74	Cinta peligro colores intensos (mat.	m	100.00	0.33	33,00000						33,00000	
75	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1.00	18.11	18,11000						18,11000	
76	Kit antiderrames	u	2.00	162.50	325,00000						325,00000	
77	Charla Ambiental	hora	4.00	62.50	250,00000						187,50000	
TOTAL PRESUPUESTO					\$112,829,17000							62,50000
INVERSION MENSUAL (USD)					955,27000		13,312,82000		16,338,89000		82,059,69000	62,50000
PORCENTAJE PARCIAL (%)					0.85210%		11.81682%		14.48109%		72.76460%	0.05539%
INVERSION ACUMULADA (USD)					955,27000		14,328,09000		30,666,98000		112,766,67000	112,829,17000
PORCENTAJE ACUMULADO (%)					0.85%		12.69892%		27.18003%		99.94461%	100.00000%



ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA



ING. JAIRO NARVAEZ  
ADMINISTRADOR



ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR



GOBIERNO DE  
**PASTAZA**  
*El Gobierno del Añimo*

## **8 AMPLIACIÓN DE PLAZO**

**PROYECTO:**

***“CONSTRUCCIÓN DE AFIRMADO DE VARIAS VÍAS UBICADA EN LA  
PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA”.***

***PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA***

Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2025-10946-M

Puyo, 04 de agosto de 2025

**PARA:** Sr. Ing. Jorge Rodrigo Pico Angulo  
**Fiscalizador 1**  
Ing. Claudio Fermin Cayambe Guilcapi

**ASUNTO:** RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 1. MCO-GADPPz-098-2022  
"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA  
PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

Al 04 de agosto de 2025, en la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, en mi calidad de administrador del contrato, concerniente al procedimiento de contratación signado con el código Nro. **MCO-GADPPz-098-2022**, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA":

**NOTIFICO LA RESOLUCIÓN DE PRÓRROGA DE PLAZO DE 28 DÍAS**, conforme a la Resolución de Ampliación de Plazo N° 01, emitida por el Ing. Jair Ledesma, Director de Planificación, en virtud de la delegación otorgada por el Prefecto mediante Resolución N.º GADPPZ-GADPPZ-2025-0720-R, de fecha 4 de abril de 2025.

En función de lo señalado, se solicita la reprogramación de actividades, considerando la ruta crítica del proyecto.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Jairo Alberto Narváez Guevara  
**JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**

Referencias:

- GADPPZ-FISCALIZACION-2025-9400-M

Anexos:

- informe\_administrador\_prórroga\_de\_plazo-signed0057929001754073762.pdf
- r\_ampliación\_plazo\_01\_afirmado\_varias\_vias\_shell-signed.pdf
- oficio\_n°\_jn-002-2025-shell\_notificación\_de\_prórroga-signed.pdf



FIRMA ELECTRONICA DE:  
**JAIRO ALBERTO  
NARVAEZ GUEVARA**  
ALTAZ ULLAMITA 000 2025

**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2025-9400-M**

**Puyo, 04 de agosto de 2025**

**PARA:** Sr. Ing. Jairo Alberto Narváez Guevara  
**Jefe de Estudios y Proyectos**

**ASUNTO:** RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 1. MCO-GADPPz-098-2022  
"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA  
PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

En atención al Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2025-10936-M, una vez revisada la documentación técnica adjunta, se procede a emitir la RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 del proceso signado con código MCO-GADPPZ-098-2022, cuyo objeto de contratación es la "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA".

En tal virtud, se solicita realizar la notificación formal de dicha resolución al Fiscalizador y Contratista, a fin de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas  
**DIRECTOR DE FISCALIZACION**

**Referencias:**

- GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2025-10936-M

**Anexos:**

- expediente0140481001754073765.rar  
- informe\_administrador\_prórroga\_de\_plazo-signed0057929001754073762.pdf  
- r\_ampliación\_plazo\_01\_afirmado\_varias\_vias\_shell-signed.pdf

**Copia:**

Sr. Ing. Jorge Rodrigo Pico Angulo - **Fiscalizador 1** / Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - **Secretaria Ejecutiva 2** /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Ing. Grace Estefania Valdiviezo Quispe - Subdirectora de Fiscalización



## RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01

CONTRATO NRO. MCO 049 02-2023

PROCESO NRO. MCO-GADPPZ-098-2022

Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas  
**DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN**  
**DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD**

### CONSIDERANDO:

**Que**, el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia según el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador; por lo tanto, las compras gubernamentales que realicen las entidades que integran el sector público deben tener respaldo constitucional;

**Que**, el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que, *"las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas"*;

**Que**, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece el principio de legalidad y la obligatoriedad de sujeción al universo jurídico que regula la Administración Pública, *"las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución"*;

**Que**, el artículo 252 de la Constitución de la República del Ecuador señala que la prefecta o prefecto será la máxima autoridad administrativa de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales; y que, mediante Acción de Personal Nro. 001-DATH-GADPPz-2023 de 14 de mayo de 2023, se registra el ingreso a las funciones de Prefecto de Pastaza al Lic. André Granda Garrido, por el periodo comprendido entre el 14 de mayo de 2023 al 13 de mayo de 2027;

**Que**, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana;

**Que**, la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado Nro. 408-26.- Prórrogas de plazo, establece, *"Se concederán prórrogas de plazo cuando por razones no imputables al contratista se produzcan desfases en actividades críticas o en actividades cuya holgura total sea sobrepasada, tornándolas críticas y de conformidad con las estipulaciones contractuales y con la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública"*;

**Que**, el plazo, sus prórrogas y suspensiones en el contrato de obra pública están



regulados por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCOP), su Reglamento General, la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el órgano rector, el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP);

**Que**, el artículo 70 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina: *"Los contratos contendrán estipulaciones específicas relacionadas con las funciones y deberes de los administradores del contrato, así como de quienes ejercerán la supervisión o fiscalización. En el expediente se hará constar todo hecho relevante que se presente en la ejecución del contrato, de conformidad a lo que se determine en el Reglamento. Especialmente se referirán a los hechos, actuaciones y documentación relacionados con pagos; contratos complementarios; terminación del contrato; ejecución de garantías; aplicación de multas y sanciones; y, recepciones";*

**Que**, el artículo 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece para el Administrador del contrato: *"Responsable de la administración del contrato. - El supervisor y el fiscalizador del contrato son responsables de tomar todas las medidas necesarias para su adecuada ejecución, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, plazos y costos previstos. Esta responsabilidad es administrativa, civil y penal según corresponda";*

**Que**, el artículo 102 del Código Orgánico Administrativo prevé: *"Retroactividad del acto administrativo favorable. La administración pública puede expedir, con efecto retroactivo, un acto administrativo, solo cuando produzca efectos favorables a la persona y no se lesionen derechos o intereses legítimos de otra. Los supuestos de hecho para la eficacia retroactiva deben existir en la fecha a la que el acto se retrotraiga.";*

**Que**, el artículo 289 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prevé, *"las Prórrogas y suspensiones del plazo contractual. - En todos los contratos sometidos a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se estipulará una cláusula referente a prórrogas y suspensiones del plazo contractual. Las prórrogas de plazo proceden únicamente a pedido motivado y justificado del contratista, alegando que se trata de circunstancias objetivas ajenas a su voluntad, las cuales no pudieron ser previstas al momento de la suscripción del contrato. La suspensión del plazo se da por iniciativa unilateral de la entidad contratante y procede sólo cuando de manera razonada y motivada no sea conveniente para los intereses institucionales continuar la ejecución de los trabajos";*

**Que**, el artículo 291 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece el Procedimiento para suspensión del plazo contractual, *"En todos los casos de suspensión del plazo contractual por iniciativa de la entidad contratante se observará el siguiente procedimiento: 1. Informe motivado del administrador del contrato que justifique las causas de suspensión del plazo contractual. En caso de obras, se necesitará adicionalmente el respectivo informe motivado del fiscalizador; 2. Resolución motivada de la máxima autoridad ordenando la suspensión del plazo contractual, la cual será notificada al contratista, con copia al administrador del contrato y fiscalizador si es que hubiere";*

**Que**, el artículo 303 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública contempla las atribuciones del administrador del contrato, *"Son funciones del administrador del contrato u orden de compra las siguientes: 1. Coordinar todas las acciones necesarias para garantizar la debida ejecución del contrato; 2. Cumplir y hacer cumplir todas las obligaciones derivadas del contrato y los documentos que lo comprometen; 3. Adoptar las acciones para evitar retrasos injustificados en la ejecución del contrato; (...) 6. Reportar a la máxima autoridad de la entidad contratante,*



cualquier aspecto operativo, técnico, económico y de otra naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del contrato”;

Que, mediante **Resolución Nro. GADPPZ-GADPPZ-2025-0720-R**, de 04 de abril de 2025, en la cual la máxima autoridad del GADPPZ, Mgs. André Mauricio Granda Garrido, Prefecto Provincial de Pastaza, resuelve conforme el “(...) **TÍTULO V DE LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES, ADMINISTRADORES Y FISCALIZADORES.- Artículo 9.- Delegación a los Directores competencias en materia de Contratación Pública. - Se delega a los Directores en materia de contratación pública: ... 9.2 Se delega al Director del área requirente, suscribir las Resoluciones de ampliaciones y/o prórrogas de plazo, suspensión y/o paralización de los trabajos y plazos, por decisión del Contratante o solicitud fundamentada del contratista. En los casos de contratos de obra y fiscalización, se delega esta competencia al Director de Fiscalización. (...)”;**

Que, con fecha 08 de febrero de 2023, se suscribió el **contrato Nro. MCO 049 02-2023**, correspondiente al proceso signado con código **MCO-GADPPZ-098-2022** para la **“CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA”**, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza; y, por otra parte, el ING. CAYAMBE GUILCAPI CLAUDIO FERMÍN con Ruc: 1600462723001; por un monto total de USD 112.829,17 (CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 17/100) Dólares de los Estados Unidos de América sin incluir IVA y con un plazo de ejecución del contrato de SETENTA Y CINCO (75) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO DE TRABAJOS EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, la misma que suscitó mediante Acta suscrita el 21 de mayo de 2025;

Que, la **CLÁUSULA NOVENA: PRÓRROGAS DE PLAZO** del contrato **Nro. MCO 049 02-2023** estipula **“9.1. El Contratante, prorrogará el plazo total o los plazos parciales solo en los siguientes casos, y siempre que el Contratista así lo solicite, por escrito justificando los fundamentos de la solicitud, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud: .- a) Cuando el contratista así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre que este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista está obligado a continuar con la ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato para reanudarlo. - b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la contratante u ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables al contratista. c) Si la contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos- contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución del trabajo. - 9.2. En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que, suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la contratante, previo informe del administrador del contrato.”;**

Que, con fecha 05 de abril de 2023 de diciembre del 2024, se suscribe el **CONTRATO MODIFICATORIO CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL ING. JAIME PATRICIO GUEVARA BLASCHKE, PREFECTO PROVINCIAL Y EL ING. CAYAMBE GUILCAPI CLAUDIO FERMÍN. PARA LA CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA,**



PROVINCIA DE PASTAZA, a fin de modificar la CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO en vista que se evidencia un error de transcripción;

**Que**, con fecha 08 de mayo de 2025, se suscribe la **ADENDA MODIFICATORIA AL CONTRATO** Nro. MCO-049-02-2023 CUYO PROCESO ES MENOR CUANTÍA OBRAS MCO-GADPPz-098-2022, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA Y EL ING. CAYAMBE GUILCAPI CLAUDIO FERMÍN PARA LA CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA, a fin de establecer el nuevo número de póliza y la vigencia de la misma;

Mediante **Oficio nro. CC-015-2025** de 28 de julio de 2025, suscrito por el Ing. Claudio Cayambe, CONTRATISTA, para el Ing. Jairo Narváez, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, en el cual manifiesta lo siguiente: "(...) 1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y OBJETIVA Durante el período de ejecución, las condiciones climáticas adversas han interferido con el cronograma, impactando específicamente las siguientes actividades:

- Excavación sin clasificar (mov.de tierra)
- Material pétreo de mejoramiento (minada,
- Transporte de material pétreo (10 a 20 km)...

**2 CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL** Esta solicitud se presenta en estricto cumplimiento del procedimiento estipulado en el Art. 290 del Reglamento a la LOSNCP, dentro del plazo previsto de 15 días contados a partir del conocimiento fecha(sic) del impacto de las lluvias acumuladas hasta la fecha, Se adjuntan como medios de prueba:

- Libro de obra
- fotografías evidenciando incidencia de lluvias, creciente de ríos de paso y suelos saturados.
- REGISTRO INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA AERONÁUTICA PRECIPITACIÓN AEROPUERTO: "Río Amazonas" - SHELL MERA...

**3 SOLICITUD** En virtud de lo expuesto y con fundamento en el principio de razonabilidad, solicitamos una prórroga del plazo contractual por un total de 37 días calendario. Este período comprende 28 días calendario...";

Mediante **Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2025-9387-M** de 01 de agosto de 2025, el Ing. Rodrigo Pico, FISCALIZADOR indicó al ADMINISTRADOR DE CONTRATO lo siguiente: "(...) **2. Justificación técnica de la prórroga solicitada.**- Luego de analizar la información proporcionada por el contratista y constatarla mediante visitas técnicas en el lugar de ejecución, se confirma que las condiciones climáticas adversas han impedido el normal desarrollo de los trabajos. Particularmente, las constantes precipitaciones han ocasionado sobresaturación del suelo, volviéndolo inmanejable para actividades de excavación. El equipo destinado a la conformación de subrasante se entierra con facilidad, imposibilitando avanzar con la estructura de la vía. Cuando se ha intentado trabajar bajo estas condiciones, el material pétreo de mejoramiento se ha contaminado por el suelo blando, comprometiendo la calidad del afirmado. Dado que la secuencia constructiva exige la ejecución de la subrasante como etapa inicial, no ha sido factible adelantar otras actividades del contrato...

**6. Recomendación técnica.**- Con base en la Cláusula Novena del contrato, literal a), y el Artículo 290 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se recomienda: Conceder una ampliación de plazo de 28 días calendario, en función del análisis técnico realizado y de las condiciones climáticas constatadas en el sitio de obra, a fin de precautelar la correcta ejecución y calidad de los trabajos contratados. – Conclusión.- La solicitud de ampliación de plazo presenta una justificación técnica válida, conforme a lo expuesto y verificado en sitio. La medida recomendada garantizará el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad previstos contractualmente.";

Mediante **Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2025-10936-M** de 01 de agosto de 2025, el Ing. Jairo Narváez, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, manifiesta lo siguiente: "(...) De acuerdo con lo expuesto, el Administrador del Contrato recomienda otorgar una prórroga de 28 días calendario, tiempo necesario para



reorganizar logísticamente las actividades afectadas y garantizar la continuidad técnica adecuada del proyecto..."; y, remite el **INFORME TÉCNICO DE ADMINISTRADOR N° 001-VIASSHELL-JN** en el cual señala en la parte pertinente lo siguiente: "(...) 6. **CRITERIO TÉCNICO.-** De acuerdo con el Informe Técnico de Fiscalización Nro. GADPPZ-FISCALIZACIÓN-2025-9387-M, se concluye lo siguiente: • Las condiciones climáticas adversas, principalmente las precipitaciones constantes, han generado sobresaturación del suelo, imposibilitando la ejecución de actividades de excavación y conformación de subrasante, lo que ha detenido el avance general de la obra debido a la secuencia técnica del proyecto. • El contratista ha cumplido con el cronograma aprobado hasta antes de presentarse estas afectaciones, siendo la causa del retraso externa y debidamente verificada mediante inspecciones en sitio y reportes climáticos tanto del libro de obra, como del registro información climatológica aeronáutica de la DAC, por lo que no le es imputable... 8. **SOLICITUD EXPRESA.-** En virtud de lo anterior se solicita la autorización del Prefecto Provincial para otorgar una prórroga de plazo de 28 días calendario...";

**Que,** el presente documento se sustenta en la justificación técnica debidamente motivada en los considerandos previos; y,

Por las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo, y en uso de mis atribuciones delegadas en la **Resolución Nro. GADPPZ-GADPPZ-2025-0720-R** por parte del Sr. Prefecto, esta Autoridad;

#### RESUELVE:

**Artículo 1.- ORDENAR** la ampliación de plazo del contrato Nro. **MCO 049 02-2023** dentro del proceso signado con el código Nro. **MCO-GADPPZ-098-2022**, cuyo objeto de contratación es la: "**CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA**", en virtud del **Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2025-9387-M** de 01 de agosto de 2025, suscrito por el Ing. Rodrigo Pico, Fiscalizador, y del **Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2025-10936-M** de 01 de agosto de 2025 e **INFORME TÉCNICO DE ADMINISTRADOR N° 001-VIASSHELL-JN** suscrito por el Ing. Jairo Narváez, Administrador del contrato; **la presente otorga una ampliación de plazo de 28 días**, según los informes antes mencionados.

**Artículo 2.- ENCARGAR** a la Jefatura de Compras Públicas la notificación de la presente Resolución al administrador del contrato y fiscalizador de la obra, quienes de conformidad con sus atribuciones notificarán al contratista, y registrarán el particular en el expediente de contratación.

**Artículo 3.- DISPONER** al Administrador del Contrato publique la presente resolución en el Portal de Compras Públicas, quien deberá realizar el seguimiento correspondiente del Contrato en cumplimiento de sus responsabilidades previstas en la LOSNCP y su Reglamento General.

Notifíquese y Cúmplase. –



Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas  
**DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN**  
**DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD**

## INFORME TÉCNICO DE ADMINISTRADOR N° 001-VIASSHELL-JN

PROCESO MCO-GADPPz-098-2022

SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO

DATOS GENERALES	
Código del proceso de contratación	MCO-GADPPz-098-2022
Objeto del contrato	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA
Monto del contrato	USD \$ 112.829,17 sin incluir IVA
Fecha de suscripción	08 de febrero de 2023
Monto del anticipo	USD \$ 11,282.92 sin IVA
Plazo	75 días
Fecha de inicio de plazo	22 de mayo de 2025
Fecha de terminación contractual	04 de agosto de 2025
Contratista	Ing. Claudio Fermín Cayambe Guilcapi
Fiscalizador	Ing. Jorge rodrigo Pico Angulo
Administrador de Contrato	Ing. Jairo Alberto Narváez Guevara

### 1. ANTECEDENTES:

- Con fecha 08 de febrero de 2023, se suscribió el contrato entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza (GADPPz) y el Ing. Claudio Fermín Cayambe Guilcapi, cuyo objeto de contratación es la **“CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA”**. Los trabajos que se ejecutarán deberán estar sujetos a diseños, especificaciones y más documentos contractuales, por un monto de USD \$ 112.829,17 (Ciento doce mil ochocientos veintinueve dólares con diecisiete centavos) sin incluir el IVA, a ejecutarse en un plazo de 75 días.
- Mediante NOTIFICACIÓN DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 047-2023, de fecha 9 de febrero de 2023, se notifica al Ing. Fabián Salazar, como Administrador de Contrato del proceso MCO-GADPPz-098-2022 para la CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA.
- Mediante Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4610-M de fecha 27 de febrero de 2023, se designa como Fiscalizador del Contrato al Ing. Rodrigo Pico para el proceso MCO-GADPPz-098-2022 para la CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA.
- Mediante Memorando Nro. GADPPZ-COMPRAS-PUBLICAS-2023-9830-M, de fecha 31 de mayo de 2023 se designa al Ing. Jairo Narváez como nuevo Administrador del Contrato.
- Con fecha 8 de mayo de 2025 se realiza una adenda modificatoria al contrato a fin de establecer el nuevo número de póliza y la vigencia de la misma.

- Mediante Oficio N.º GADPPz - JN - ADM SHELL - 002, suscrito por el Administrador, se solicita la entrega de personal técnico, equipo y metodología de trabajo a ser empleados en la ejecución del contrato para verificar el cumplimiento de lo requerido en el contrato.
- Mediante Oficio N.º CC-001-2025, el contratista entrega la documentación solicitada.
- Mediante Oficio N.º Oficio N.º JN-001-2025-SHELL, de fecha 21 de mayo de 2025, se notifica al contratista la disponibilidad del anticipo, conforme a lo estipulado en la cláusula sexta del contrato.
- Con fecha 21 de mayo de 2025 se da la orden de inicio de trabajos mediante acta de inicio, terminándose el plazo contractual original el 04 de agosto de 2025
- Mediante Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2025-10536-M, se solicita la designación de un técnico de seguimiento y control ambiental, designándose a la Ing. Teresa Jácome – Analista de Calidad Ambiental.
- El contratista, mediante el Oficio Nro. CC-004-2025 del 2 de junio de 2025, remite la reprogramación de trabajos. Esta reprogramación es respaldada técnicamente por el Fiscalizador a través del Informe Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2025-9102-M. En base a dicho informe, el Administrador del contrato aprueba formalmente la reprogramación N.º 1 mediante el Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2025-10591-M del 4 de junio de 2025.
- El contratista, mediante el Oficio Nro. CC-009-2025 del 30 de junio de 2025, remite la solicitud de reprogramación de trabajos fundamentada en las condiciones meteorológicas y encallamiento de la excavadora por las condiciones del terreno. Esta reprogramación es respaldada técnicamente por el Fiscalizador a través del Informe Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2025-9232-M. En base a dicho informe, el Administrador del contrato aprueba formalmente la reprogramación N.º 2 el 1 de julio de 2025.
- Mediante Oficio nro. CC-015-2025, el contratista realiza una solicitud de reprogramación y prórroga del plazo contractual por un total de 37 días, lo cual se remite al Fiscalizador para análisis e informe técnico correspondiente.
- Mediante Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2025-9387-M del 1 de agosto de 2025, el fiscalizador remite la respuesta sobre el pedido de prórroga de plazo.

## 2. BASE LEGAL

### Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

- **Art. 289. Prórrogas y suspensiones del plazo contractual.** *“En todos los contratos sometidos a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se estipulará una cláusula referente a prórrogas y suspensiones del plazo contractual.  
Las prórrogas de plazo proceden únicamente a pedido motivado y justificado del contratista, alegando que se trata de circunstancias objetivas ajenas a su voluntad, las cuales no pudieron ser previstas al momento de la suscripción del contrato.”*
- **Artículo 290.- Procedimiento para otorgar una prórroga del plazo contractual.-** *“En todos los casos de prórroga de plazo se observará el siguiente procedimiento:*



1. *El contratista solicitará por escrito y de manera motivada la petición de prórroga de plazo, la cual versará exclusivamente por circunstancias ajenas a su voluntad, debidamente comprobadas con cualquier medio de prueba que le permita demostrar tales circunstancias y que las mismas afectan directamente a la ejecución contractual.  
Adicionalmente deberá justificar que no existen otros medios alternativos para cumplir el objeto de contratación en el tiempo estipulado en el contrato.*
2. *Toda petición de prórroga de plazo será dirigida al administrador del contrato, con copia al fiscalizador si es que lo hubiere, dentro del término de quince (15) días de suscitados los hechos que motivan la petición.*
3. *El administrador del contrato tiene la obligación de comprobar la autenticidad de los hechos alegados por el contratista y el nexo causal entre estos y su afectación al cumplimiento del plazo contractual.*

*En caso de ser ciertos los hechos que motivan la petición, el administrador del contrato autorizará la prórroga de plazo, siempre que no se afecte el plazo total estipulado en la cláusula del contrato, en caso de afectar el plazo total del contrato, emitirá informe favorable y se requerirá de autorización por parte de la máxima autoridad o su delegado mediante resolución motivada.*

*La prórroga de plazo se concederá por un tiempo igual al período que dure la circunstancia que motivó la petición, en todo caso, el contratista tiene la obligación en coadyuvar a que se superen tales circunstancias, si es que las mismas están a su alcance, o de buscar alternativas para retomar cuanto antes la ejecución del contrato, temas que serán coordinados con el administrador del contrato. La prórroga podrá emitirse con efecto retroactivo de conformidad con el artículo 102 del Código Orgánico Administrativo.*

*En caso no lograrse demostrar que por circunstancias ajenas a la voluntad del contratista, o que estas no tengan un nivel de afectación directa al objeto de contratación, o que se demuestre que existen medios alternativos para el cumplimiento del objeto del contrato en el plazo convenido, o que la petición hubiere sido presentada fuera del término de quince (15) días contados a partir de los hechos que motivan la petición, el administrador del contrato o la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, rechazarán la prórroga de plazo de manera motivada..."*

#### **Cláusula Novena del contrato**

En la que se establece que el contratista puede solicitar prórrogas por causas justificadas, presentando la solicitud por escrito dentro de los quince (15) días siguientes a la ocurrencia del hecho que motiva la prórroga. Además, debe sustentarse técnicamente la imposibilidad de ejecutar los trabajos conforme al cronograma contractual original.

### **3. PLAZOS Y AVANCE**

#### **3.1. PLAZO DEL CONTRATO**

Plazo total inicial: 75 días

### 3.2. REPROGRAMACIONES

A la fecha se tiene:

N°	FECHA	MOTIVACIÓN
1	04 de junio de 2025	Reprogramación por anticipo y orden de inicio
2	01 de julio de 2025	Reprogramación por condiciones climáticas y encallamiento de excavadora.

### 3.3. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

A la fecha se tiene:

DETALLE	VALOR/FECHA
Fecha de inicio	22 de mayo de 2025
Plazo	75 días
Fecha de terminación original	04 de agosto de 2025
Total de días aprobados de ampliación	0 días
Total de días paralizados	0 días
Fecha de terminación final	04 de agosto de 2025

## 4. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZO CONTRACTUALES

PERIODO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE EJECUTADO

No se han presentado planillas para aprobación del Administrador hasta la fecha del presente informe.

## 5. JUSTIFICACIÓN DEL PEDIDO DE PRÓRROGA

De acuerdo con lo señalado en el Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACIÓN-2025-9387-M, y con base en el análisis técnico efectuado por la fiscalización, se concluye que las condiciones climáticas adversas registradas durante el período de ejecución han imposibilitado el desarrollo normal de los trabajos contratados. En particular, las precipitaciones constantes han provocado una sobresaturación del suelo, condición que ha vuelto el terreno inadecuado para las labores de excavación, ya que el equipo destinado a la conformación de subrasante se entierra con facilidad, interrumpiendo el avance de los trabajos.

Adicionalmente, el fiscalizador ha verificado que los intentos de continuar los trabajos bajo dichas condiciones derivaron en la contaminación del material pétreo de mejoramiento, debido al contacto con el suelo arcilloso saturado, afectando negativamente la calidad y estabilidad del afirmado. Cabe destacar que, por la propia lógica de la secuencia constructiva, la conformación de la subrasante

constituye la fase inicial indispensable para habilitar el resto de las actividades contractuales. En consecuencia, no ha sido técnicamente viable adelantar otras actividades, lo cual justifica la necesidad de ampliar el plazo contractual mediante la correspondiente prórroga.

## 6. CRITERIO TÉCNICO

De acuerdo con el Informe Técnico de Fiscalización Nro. GADPPZ-FISCALIZACIÓN-2025-9387-M, se concluye lo siguiente:

- Las condiciones climáticas adversas, principalmente las precipitaciones constantes, han generado sobresaturación del suelo, imposibilitando la ejecución de actividades de excavación y conformación de subrasante, lo que ha detenido el avance general de la obra debido a la secuencia técnica del proyecto.
- El contratista ha cumplido con el cronograma aprobado hasta antes de presentarse estas afectaciones, siendo la causa del retraso externa y debidamente verificada mediante inspecciones en sitio y reportes climáticos tanto del libro de obra, como del registro información climatológica aeronáutica de la DAC, por lo que no le es imputable.

## 7. RECOMENDACIÓN

Conforme a este análisis y en acuerdo con criterio de la fiscalización externa, **se considera procedente la solicitud del contratista y se recomienda otorgar una prórroga de 28 días calendario**, tiempo estimado para la reorganización logística de los trabajos afectados.

## 8. SOLICITUD EXPRESA

En virtud de lo anterior se solicita la autorización del Prefecto Provincial para otorgar una prórroga de plazo de 28 días calendario para el Proyecto "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA.

Atentamente,



---

Jairo A. Narváez Guevara  
*INGENIERO CIVIL*  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**

**Puyo, 01 de agosto de 2025**

**PARA:** Sr. Ing. Jairo Alberto Narváez Guevara  
**Jefe de Estudios y Proyectos**

**ASUNTO:** Solicitud de análisis técnico sobre prórroga de plazo proceso  
MCO-GADPPz-098-2022: "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS  
UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE  
PASTAZA"

*En respuesta al Documento No. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2025-10922-M, en el cual solicita se realice el análisis técnico correspondiente de la documentación adjunta y se emita un informe detallado sobre la necesidad y viabilidad de conceder dicha ampliación.*

### **1. Objeto del informe**

*El presente informe tiene por finalidad poner en su conocimiento que el Ing. Claudio Cayambe, contratista de la obra referida, ha solicitado una **ampliación de plazo de 37 días** mediante Oficio Nro. CC-015-2025 de fecha 28 de julio de 2025, el mismo que fue recibido por mi persona el 30 de julio de 2025. En atención a dicha solicitud, se ha realizado el análisis técnico correspondiente, con base en los antecedentes de la obra, inspecciones en sitio y revisión de la normativa vigente, determinándose lo siguiente:*

### **2. Justificación técnica de la prórroga solicitada**

*Luego de analizar la información proporcionada por el contratista y constatarla mediante visitas técnicas en el lugar de ejecución, se confirma que las condiciones climáticas adversas han impedido el normal desarrollo de los trabajos.*

*Particularmente, **las constantes precipitaciones** han ocasionado sobresaturación del suelo, volviéndolo **inmanejable para actividades de excavación**. El equipo destinado a la conformación de subrasante se entierra con facilidad, imposibilitando avanzar con la estructura de la vía.*

*Cuando se ha intentado trabajar bajo estas condiciones, el material pétreo de mejoramiento se ha contaminado por el suelo blando, comprometiendo la calidad del afirmado.*

*Dado que la **secuencia constructiva exige la ejecución de la subrasante como etapa inicial**, no ha sido factible adelantar otras actividades del contrato.*

### **3. Evaluación del cumplimiento del cronograma vigente**

*De la revisión del cronograma aprobado hasta la fecha, se concluye que el contratista ha venido **cumpliendo con los plazos establecidos**, salvo las actividades afectadas por causas ajenas a su voluntad, como se detalla en el presente informe.*

### **4. Identificación de las causas del retraso**

*La **única causa del retraso en la ejecución del contrato es atribuible a la alta pluviosidad en la zona de intervención**, situación comprobada en sitio y sustentada en reportes climáticos de la región.*

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2025-9387-M

Puyo, 01 de agosto de 2025

### 5. Análisis de afectaciones por aprobación o no de la prórroga

Otorgar la ampliación solicitada permitiría que los trabajos se desarrollen en condiciones adecuadas, preservando la calidad técnica de la obra.

En caso de **no otorgarse la prórroga**, se corre el riesgo de que, por la premura en el cumplimiento del plazo, se comprometa la resistencia y funcionalidad del afirmado, al colocarse material pétreo sobre una subrasante inestable o contaminada.

### 6. Recomendación técnica

Con base en la **Cláusula Novena del contrato**, literal a), y el **Artículo 290 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública**, se recomienda: **Conceder una ampliación de plazo de 28 días calendario**, en función del análisis técnico realizado y de las condiciones climáticas constatadas en el sitio de obra, a fin de precautelar la correcta ejecución y calidad de los trabajos contratados.

### Conclusión

La solicitud de ampliación de plazo presenta una **justificación técnica válida**, conforme a lo expuesto y verificado en sitio. La medida recomendada garantizará el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad previstos contractualmente.

Atentamente,

### Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Rodrigo Pico Angulo  
**FISCALIZADOR 1**

#### Referencias:

- GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2025-10922-M

#### Anexos:

- 1.07\_ptn-sesm-may-jun-jul-2025\_removed-signed.pdf
- 1.06\_registro\_de\_incidencia\_del\_clima\_julio-signed.pdf
- 1.05\_registro\_de\_incidencia\_del\_clima\_junio-signed.pdf
- 1.04\_00\_registro\_de\_incidencia\_de\_l\_clima\_mayo.pdf
- 1.03\_libro\_de\_obra\_julio-signed.pdf
- 1.02\_libro\_de\_obra\_junio-signed.pdf
- 1.00\_oficio\_nro.\_cc-015-2025-signed.pdf



**Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2025-10922-M**

**Puyo, 30 de julio de 2025**

**PARA:** Sr. Ing. Jorge Rodrigo Pico Angulo  
**Fiscalizador 1**

**ASUNTO:** Solicitud de análisis técnico sobre prórroga de plazo proceso  
MCO-GADPPz-098-2022: "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS  
UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE  
PASTAZA"

Por medio de la presente, en atención a la solicitud de prórroga de plazo presentada mediante Oficio Nro. CC-015-2025, referente a la ejecución de la obra "Construcción de afirmado de varias vías ubicadas en la parroquia Shell, cantón Mera, provincia de Pastaza", solicito se realice el análisis técnico correspondiente de la documentación adjunta y se emita un informe detallado sobre la necesidad y viabilidad de conceder dicha ampliación.

El informe deberá incluir los siguientes puntos:

- Justificación técnica de la prórroga solicitada.
- Evaluación del cumplimiento de los plazos contractuales hasta la fecha.
- Identificación de las causas que han ocasionado el retraso en la ejecución.
- Análisis de las posibles afectaciones a la calidad, seguridad y funcionalidad de la obra en caso de otorgarse o no la prórroga.
- Recomendaciones técnicas basadas en el contrato y la normativa vigente.

Agradezco su pronta atención y quedo a la espera del informe para proceder con las acciones administrativas correspondientes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Jairo Alberto Narváez Guevara  
**JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**

Anexos:

- 1.00\_oficio\_nro.\_cc-015-2025-signed.pdf
- 1.02\_libro\_de\_obra\_junio-signed.pdf
- 1.03\_libro\_de\_obra\_julio-signed.pdf
- 1.04\_00\_registro\_de\_incidencia\_del\_clima\_mayo.pdf
- 1.05\_registro\_de\_incidencia\_del\_clima\_junio-signed.pdf
- 1.06\_registro\_de\_incidencia\_del\_clima\_julio-signed.pdf
- 1.07\_ptn-sesm-may-jun-jul-2025\_removed-signed.pdf

Copia:

Sr. Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas - **Director de Fiscalización** /



**Asunto:** Solicitud de ampliación de plazo contractual por condiciones climáticas adversas

**Oficio nro. CC-015-2025**

Puyo, 28 de julio de 2025

Ing. Jairo Narváez

**ADMINISTRADOR**

Presente

**Asunto:** Solicitud de ampliación de plazo contractual por condiciones climáticas adversas

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 289 y 290 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), me permito presentar ante usted la solicitud de ampliación de plazo contractual del proyecto "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA", Esta se fundamenta en condiciones climáticas adversas (lluvias intensas) que han afectado directamente la ejecución de las actividades, constituyendo hechos objetivos, imprevisibles y ajenos a la voluntad del contratista, no previsibles al momento de la suscripción del contrato.

## **1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y OBJETIVA**



Durante el período de ejecución, las condiciones climáticas adversas han interferido con el cronograma, impactando específicamente las siguientes actividades:

- Excavación sin clasificar (mov.de tierra)
- Material pétreo de mejoramiento (minada,
- Transporte de material pétreo (10 a 20 km)


Entre el 15 de mayo y el 28 de julio de 2025, un período de 68 días, el clima en la ciudad de Mera, provincia de Pastaza, estuvo caracterizado por una predominancia de condiciones lluviosas, influenciadas por el clima tropical húmedo típico de la región Amazónica ecuatoriana.

Según el análisis de datos climáticos recopilados hasta la fecha, se tiene la siguiente distribución:

### 1.1 Mayo

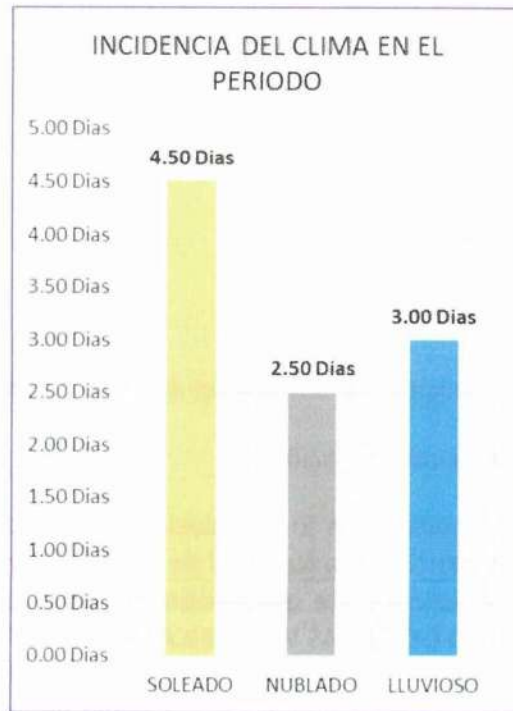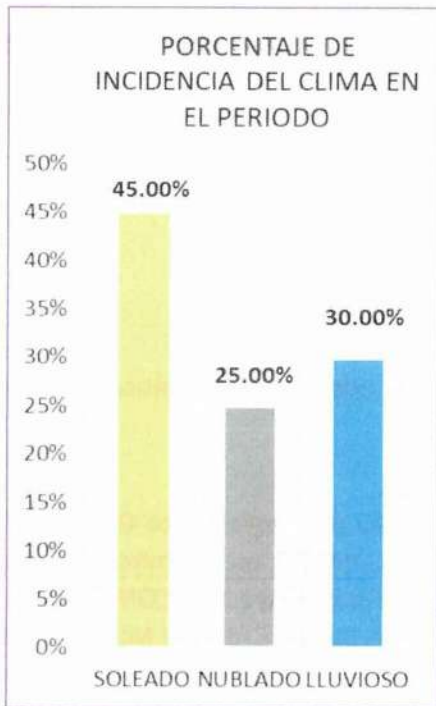

### 1.2 Junio

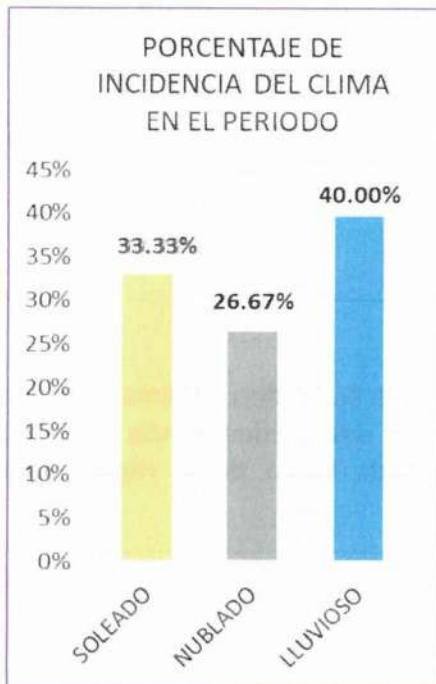

### 1.3 julio

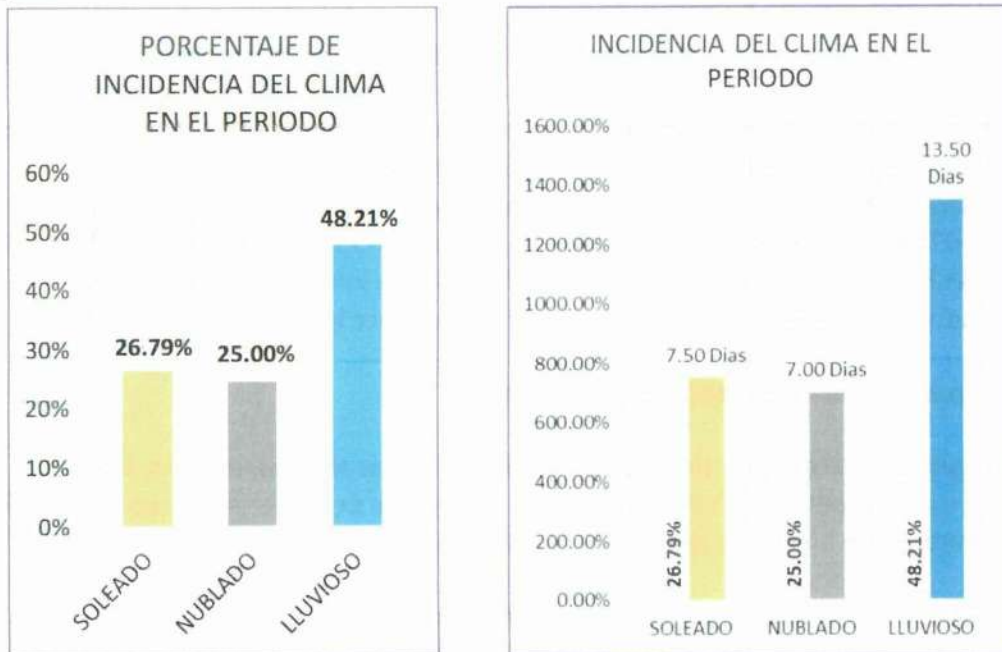


Tabla 1 Resumen de Condiciones Climáticas en Mera, Pastaza (15 de mayo - 28 de julio de 2025)

Condición Climática	Porcentaje (%)	Días Equivalentes
Soleado	32.35%	22 días
Nublado	25.74%	17.5 días
Lluvioso	41.91%	28.5 días
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>68 días</b>

Fuente: equipo contratista

Los 28.5 días lluviosos confirmaron una alta incidencia de precipitaciones, especialmente en mayo, junio y julio, parte de la temporada lluviosa regional. Los 22 días soleados permitieron avances limitados, mientras que los 17.5 días nublados contribuyeron a un ambiente húmedo con riesgos de lluvias intermitentes. Estas condiciones generaron desafíos logísticos, como suelos saturados y dificultades en el transporte de materiales, retrasando significativamente las actividades mencionadas.

### 1.4 REGISTRO INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA AERONÁUTICA PRECIPITACIÓN ESTACION METEOROLOGICA: AEROPUERTO: "Río Amazonas" - SHELL MERA

VER ANEXO: PTN-SESM-MAY-JUN-JUL-2025.PDF, Descripción de los Datos de Precipitación

Del anexo se puede observar que para el período del 15 de mayo al 27 de julio de 2025, muestran las precipitaciones diarias medidas en milímetros (mm) en tres franjas horarias (01-07, 07-13, 13-19) con un total acumulado diario. A continuación, se resumen los hallazgos clave:

- **Total de Precipitación:** Durante los 68 días analizados, se acumularon 810.1 mm de lluvia, con un promedio diario de aproximadamente 11.91 mm.
- **Días con Precipitación Significativa:** De los 68 días, 51 días registraron precipitación igual o mayor a 1 mm, lo que equivale al 75% del período. Esto confirma la alta

incidencia de lluvias en la región Amazónica, especialmente en mayo, junio y julio, meses típicamente lluviosos.

- **Días con Precipitación Mínima o Nula:** Solo 17 días tuvieron precipitación menor a 1 mm o ninguna lluvia (25% del período).
- **Precipitación Máxima:** El día con mayor acumulado fue el 24 de julio de 2025, con 39.6 mm, destacando eventos de lluvias intensas.
- **Distribución por Franjas Horarias:** La mayor cantidad de lluvia se registró en la franja 01-07 (458.4 mm, 56.6% del total), seguida por 07-13 (215.9 mm, 26.6%) y 13-19 (135.8 mm, 16.8%). Esto indica que las lluvias más intensas ocurrieron en la madrugada y mañana, afectando significativamente las horas laborales típicas.

#### 1.4.1 Impacto en la Paralización de Actividades

Las actividades de excavación sin clasificar (movimiento de tierras), minado, cargado y regado de material pétreo de mejoramiento, y transporte de material pétreo (10 a 20 km) se vieron severamente afectadas por las precipitaciones, debido a las siguientes razones:

##### 1. Excavación sin Clasificar (Movimiento de Tierras):

- **Impacto:** Las lluvias intensas, especialmente en días con acumulados altos (ej. 25 de mayo: 29.8 mm; 10 de junio: 43.9 mm; 25 de junio: 62.4 mm; 24 de julio: 39.6 mm), saturaron el suelo, aumentando su plasticidad y dificultando el uso de maquinaria pesada (excavadoras, retroexcavadoras). Esto generó condiciones inseguras y baja productividad, forzando la paralización en al menos 51 días con lluvia significativa.

##### 2. Minado, Cargado y Regado de Material Pétreo de Mejoramiento:

- **Impacto:** Las actividades de minado y cargado de material pétreo fueron interrumpidas en días lluviosos debido a la dificultad de operar en canteras inundadas o con acceso limitado. El regado del material se vio afectado por la imposibilidad de lograr una compactación adecuada en superficies húmedas, lo que compromete la calidad del afirmado vial.

## 2 CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL

Esta solicitud se presenta en estricto cumplimiento del procedimiento estipulado en el Art. 290 del Reglamento a la LOSNCP, dentro del plazo previsto de 15 días contados a partir del conocimiento fehaciente del impacto de las lluvias acumuladas hasta la fecha, Se adjuntan como medios de prueba:

- Libro de obra
- fotografías evidenciando incidencia de lluvias, creciente de ríos de paso y suelos saturados.
- REGISTRO INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA AERONÁUTICA PRECIPITACIÓN AEROPUERTO: "Río Amazonas" - SHELL MERA

Asimismo, se deja constancia que se ha venido cumpliendo con los cronogramas pero que sin incurrir en incumplimientos técnicos ni comprometer la calidad de la obra, sin embargo, si a afectado la ejecución las actividades afectadas durante los días lluviosos

De conformidad con el artículo 408-25 Incidencia de la lluvia, se registra que, entre el 15 de mayo y el 28 de julio de 2025, las labores de Excavación sin clasificar (movimiento de tierras), Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada) y Transporte de material pétreo (10 a 20 km) se suspendieron durante 28.5 días debido a condiciones lluviosas en Mera, Pastaza, según el Resumen de Condiciones Climáticas (41.91% de días lluviosos). Las lluvias, iniciadas frecuentemente a partir de las 08:00 y con duración promedio de 6-8 horas diarias, saturaron el terreno e impidieron el uso seguro de maquinaria y transporte, afectando significativamente el avance programado, justificando la prórroga de plazo correspondiente.

Los datos del REGISTRO INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA AERONÁUTICA PRECIPITACIÓN AEROPUERTO: "Río Amazonas" - SHELL MERA reflejan un período de alta pluviosidad, con 51 días de lluvia significativa (75% del tiempo), lo que justifica la paralización de las actividades mencionadas durante al menos 37 días.

### 3 SOLICITUD

En virtud de lo expuesto y con fundamento en el principio de razonabilidad, **solicitamos una prórroga del plazo contractual por un total de 37 días calendario**. Este período comprende 28 días calendario (redondeando los 28.5 días registrados) por las afectaciones derivadas de lluvias, más 9 días adicionales por los arreglos de paso en el río Pindo y los desbordamientos del río Pastaza (mina), que imposibilitaron la extracción de material, conforme a la normativa citada. Esta solicitud tiene como propósito garantizar la integridad técnica del proyecto y evitar incumplimientos por causas de fuerza mayor, respetando los principios de eficiencia, eficacia y legalidad en la contratación pública.

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención y quedo atento a cualquier requerimiento adicional para el trámite correspondiente.

Atentamente;



Ing. Claudio Cayambe

**Contratista**

**FOTOGRAFÍAS**







**CUADRO DE INCIDENCIA DE CLIMA**

**PROYECTO:** PROYECTO: CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CAITÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA  
**UBICACIÓN:** CANTON MERA  
**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. ANIBAL CARDENAS  
**MONTO DEL CONTRATO:** 112.829.17  
**PLANILLA DE AVANCE NRO:** 1  
**PERIODO DE EJECUCIÓN:** 22-may-25 al 31-may-25

N°	FECHA ESTADO DEL CLIMA	JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE			TOTAL	OBSERVACIONES
		SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO		
1	jueves, 22 de mayo de 2025	0.5			0.5			1.00	
2	viernes, 23 de mayo de 2025			0.5			0.5	1.00	
3	sábado, 24 de mayo de 2025			0.5		0.5		1.00	
4	domingo, 25 de mayo de 2025	0.5				0.5		1.00	
5	lunes, 26 de mayo de 2025	0.5			0.5			1.00	
6	martes, 27 de mayo de 2025			0.5			0.5	1.00	
7	miércoles, 28 de mayo de 2025		0.5				0.5	1.00	
8	jueves, 29 de mayo de 2025	0.5			0.5			1.00	
9	viernes, 30 de mayo de 2025		0.5		0.5			1.00	
10	sábado, 31 de mayo de 2025	0.5				0.5		1.00	
11									
12									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

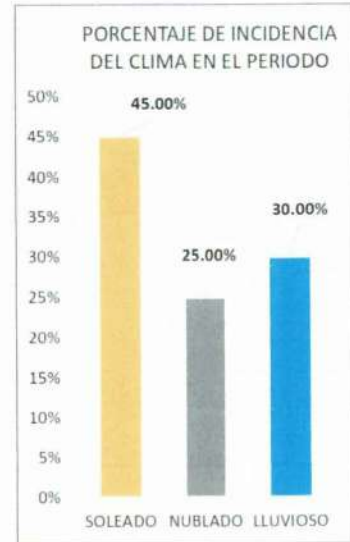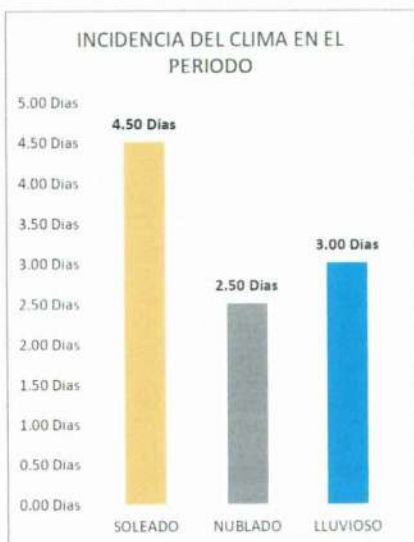

**ING. CLAUDIO CAYAMBE**  
**CONTRATISTA**





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA



CUADRO DE INCIDENCIA DE CLIMA

**PROYECTO:** PROYECTO CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA  
**UBICACIÓN:** CANTÓN MERA **PLANILLA DE AVANCE NRO:** 2  
**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE **PERIODO DE EJECUCIÓN:** 01-jun-25 al 30-jun-25  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**MONTO DEL CONTRATO:** 112,829.17

N°	FECHA	JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE			TOTAL	OBSERVACIONES
		SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO		
1	domingo, 1 de junio de 2025		X				X	1.00	
2	lunes, 2 de junio de 2025			X			X	1.00	
3	martes, 3 de junio de 2025			X		X		1.00	
4	miércoles, 4 de junio de 2025		X		X			1.00	
5	jueves, 5 de junio de 2025		X		X			1.00	
6	viernes, 6 de junio de 2025	X			X			1.00	
7	sábado, 7 de junio de 2025			X			X	1.00	
8	domingo, 8 de junio de 2025			X			X	1.00	
9	lunes, 9 de junio de 2025			X	X			1.00	
10	martes, 10 de junio de 2025	X			X			1.00	
11	miércoles, 11 de junio de 2025		X			X		1.00	
12	jueves, 12 de junio de 2025			X	X			1.00	
13	viernes, 13 de junio de 2025	X				X		1.00	
14	sábado, 14 de junio de 2025	X			X			1.00	
15	domingo, 15 de junio de 2025			X			X	1.00	
16	lunes, 16 de junio de 2025	X			X			1.00	
17	martes, 17 de junio de 2025	X			X			1.00	
18	miércoles, 18 de junio de 2025		X				X	1.00	
19	jueves, 19 de junio de 2025			X			X	1.00	
20	viernes, 20 de junio de 2025	X			X			1.00	
21	sábado, 21 de junio de 2025	X			X			1.00	
22	domingo, 22 de junio de 2025		X			X		1.00	
23	lunes, 23 de junio de 2025			X		X		1.00	
24	martes, 24 de junio de 2025			X			X	1.00	
25	miércoles, 25 de junio de 2025		X		X			1.00	
26	jueves, 26 de junio de 2025		X			X		1.00	
27	viernes, 27 de junio de 2025			X			X	1.00	
28	sábado, 28 de junio de 2025		X				X	1.00	
29	domingo, 29 de junio de 2025		X				X	1.00	
30	lunes, 30 de junio de 2025			X			X	1.00	
31									

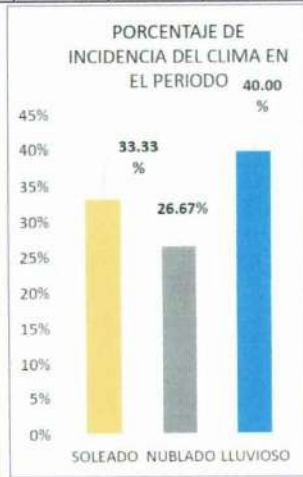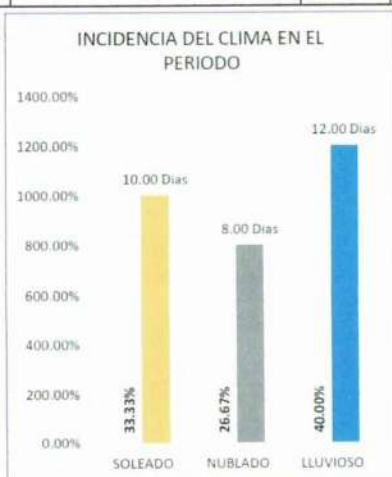

CLAUDIO FERMIN  
 CAYAMBE GUILCAPI

**ING. CLAUDIO CAYAMBE**  
**CONTRATISTA**

CUADRO DE INCIDENCIA DE CLIMA

**PROYECTO:** PROYECTO: CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA

**UBICACIÓN:** CANTON MERA

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE


**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO

**MONTO DEL CONTRATO:** 112,829.17

**PLANILLA DE AVANCE NRO:** 3

**PERIODO DE EJECUCIÓN:** 01-jul-25 al 31-jul-25

N°	FECHA	JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE			TOTAL	OBSERVACIONES
		SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO		
1	martes, 1 de julio de 2025		X				X	1.00	
2	miércoles, 2 de julio de 2025			X			X	1.00	
3	jueves, 3 de julio de 2025		X				X	1.00	
4	viernes, 4 de julio de 2025			X			X	1.00	
5	sábado, 5 de julio de 2025	X				X		1.00	
6	domingo, 6 de julio de 2025	X			X			1.00	
7	lunes, 7 de julio de 2025		X				X	1.00	
8	martes, 8 de julio de 2025			X			X	1.00	
9	miércoles, 9 de julio de 2025	X			X			1.00	
10	jueves, 10 de julio de 2025			X			X	1.00	
11	viernes, 11 de julio de 2025	X			X			1.00	
12	sábado, 12 de julio de 2025			X			X	1.00	
13	domingo, 13 de julio de 2025	X					X	1.00	
14	lunes, 14 de julio de 2025		X			X		1.00	
15	martes, 15 de julio de 2025	X				X		1.00	
16	miércoles, 16 de julio de 2025		X		X			1.00	
17	jueves, 17 de julio de 2025			X			X	1.00	
18	viernes, 18 de julio de 2025			X			X	1.00	
19	sábado, 19 de julio de 2025			X			X	1.00	
20	domingo, 20 de julio de 2025	X				X		1.00	
21	lunes, 21 de julio de 2025		X			X		1.00	
22	martes, 22 de julio de 2025		X		X			1.00	
23	miércoles, 23 de julio de 2025			X			X	1.00	
24	jueves, 24 de julio de 2025		X				X	1.00	
25	viernes, 25 de julio de 2025			X			X	1.00	
26	sábado, 26 de julio de 2025	X				X		1.00	
27	domingo, 27 de julio de 2025	X			X			1.00	
28	lunes, 28 de julio de 2025			X			X	1.00	
29	martes, 29 de julio de 2025							0.00	
30	miércoles, 30 de julio de 2025							0.00	
31									

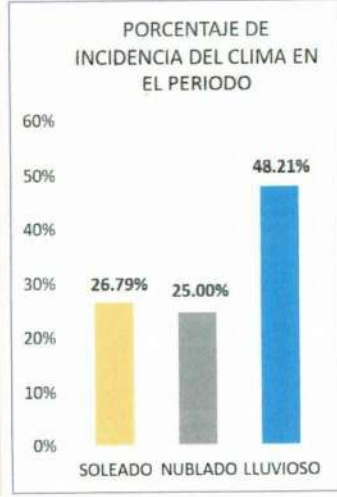

CLAUDIO FERMIN  
CAYAMBE GUILCAPI

**ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA**



 <b>Dirección General de Aviación Civil</b>	<b>PROCEDIMIENTO DE CLIMATOLOGÍA</b>	
	REGISTRO INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA AERONÁUTICA PRECIPITACIÓN	Código: GMET-PR-001-RG-005 Versión: 1.0 Página 1 de 1

AEROPUERTO "Río Amazonas" - SHELL MERA

JULIO - 2025

Día/Hora	01 - 07	07 - 13	13 - 19	19 - 01	Suma Diaria
1	16.7	21.4	0.0	-	38.1
2	3.9	17.1	7.0	-	28.0
3	1.4	0.0	0.0	-	1.4
4	0,2	0.0	0.0	-	0.0
5	0.2	0.0	0.0	-	0.2
6	0.0	0.0	0.0	-	0.0
7	0.0	0.3	0.0	-	0.3
8	14.7	11.2	0.2	-	26.1
9	13.1	1.3	2.7	-	17.1
10	3.0	0.4	10.6	-	14.0
11	0.6	4.1	1.2	-	5.9
12	11.6	4.5	4.2	-	20.3
13	6.3	0.0	0.0	-	6.3
14	0.0	0.0	0.0	-	0.0
15	0.0	0.0	0.0	-	0.0
16	4.0	0.0	0.0	-	4.0
17	11.4	4.0	7.5	-	22.9
18	19.1	3.4	2.4	-	24.9
19	10.3	8.4	11.0	-	29.7
20	21.5	0.0	9.4	-	30.9
21	0.0	0.0	0.0	-	0.0
22	2,7	0.0	6.1	-	6.1
23	0.0	0.0	0.0	-	0.0
24	34.3	5.3	0.0	-	39.6
25	0.0	0.0	0.0	-	0.0
26	9.5	0.0	0.0	-	9.5
27	25.7	2.5	0.3	-	28.5
28	-	-	-	-	NIL
29	-	-	-	-	NIL
30	-	-	-	-	NIL
31	-	-	-	-	NIL
<b>TOTAL</b>	<b>207.3</b>	<b>83.9</b>	<b>62.6</b>	<b>0.0</b>	<b>353.8</b>

**RESUMEN**

PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS	39.6
FECHA MÁXIMA PRECIPITACIÓN	24 - JULIO - 2025
No. de días con PRECIPITACIÓN	20
No. de días con PRECIPITACIÓN menor que 1 mm	2
No. de días con PRECIPITACIÓN igual o mayor que 1 mm	18

TRZ = Trazas de precipitación ( valores inferiores a 0,1 mm)

**NOTA:** ES FIEL COPIA DE LOS REGISTROS DIARIOS DE OBSERVACIONES DE SUPERFICIE QUE REPOSAN EN LA OFICINA DE CLIMATOLOGÍA DE LA DGAC.

PREPARADO POR:

Lic. Jefferson Rosero V.- Climatología DGAC

Información solicitada por SR CLAUDIO CAYAMBE RUC 1600462723001. Prohibida su rep



JEFFERSON ROSERO VILLARREAL  
Ingeniero en Meteorología



 <b>Dirección General de Aviación Civil</b>	<b>PROCEDIMIENTO DE CLIMATOLOGÍA</b>	
	REGISTRO INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA AERONÁUTICA PRECIPITACIÓN	Código: GMET-PR-001-RG-005 Versión: 1.0 Página 1 de 1

AEROPUERTO "Río Amazonas" - SHELL MERA

MAYO - 2025

Día/Hora	01 - 07	07 - 13	13 - 19	19 - 01	Suma Diaria
1	0.0	0.0	0.6	-	0.6
2	0.0	0.9	0.0	-	0.9
3	3.3	28.7	0.0	-	32.0
4	0.0	0.0	4.2	-	4.2
5	7.2	14.1	0.3	-	21.6
6	6.2	0.0	0.0	-	6.2
7	0.0	0.0	0.0	-	0.0
8	10.0	9.0	0.0	-	19.0
9	0.0	0.0	0.0	-	0.0
10	4.3	6.3	0.0	-	10.6
11	3.2	2.1	3.1	-	8.4
12	46.0	20.0	3.8	-	69.8
13	30.0	1.0	0.0	-	31.0
14	8.4	0.0	0.0	-	8.4
15	7.3	0.0	0.0	-	7.3
16	0.0	0.0	0.4	-	0.4
17	1.3	0.0	0.3	-	1.6
18	22.3	0.0	0.0	-	22.3
19	18.3	17.2	6.6	-	42.1
20	1.2	0.0	0.0	-	1.2
21	8.3	26.7	8.5	-	43.5
22	0.7	1.1	0.0	-	1.8
23	0.9	1.3	3.2	-	5.4
24	1.5	0.6	0.0	-	2.1
25	21.6	5.2	3.0	-	29.8
26	3.5	0.0	0.0	-	3.5
27	0.0	0.0	0.0	-	0.0
28	3.6	6.1	0.0	-	9.7
29	0.8	24.2	2.1	-	27.1
30	0.0	0.3	0.0	-	0.3
31	15.1	0.0	0.0	-	15.1
<b>TOTAL</b>	<b>225.0</b>	<b>164.8</b>	<b>36.1</b>	<b>0.0</b>	<b>425.9</b>

**RESUMEN**

PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS	69.8
FECHA MÁXIMA PRECIPITACIÓN	12 - MAYO - 2025
No. de días con PRECIPITACIÓN	28
No. de días con PRECIPITACIÓN menor que 1 mm	4
No. de días con PRECIPITACIÓN igual o mayor que 1 mm	24

**TRZ** = Trazas de precipitación (valores inferiores a 0,1 mm)

**NOTA:** ES FIEL COPIA DE LOS REGISTROS DIARIOS DE OBSERVACIONES DE SUPERFICIE QUE REPOSAN EN LA OFICINA DE CLIMATOLOGÍA DE LA DGAC.

**PREPARADO POR:**

**Lic. Jefferson Rosero V. Climatología DGAC**

Información solicitada SR.CLAUDIO CAYAMBE RUC 1600462723001.-Prohibida su reproducción

 <b>Dirección General de Aviación Civil</b>	<b>PROCEDIMIENTO DE CLIMATOLOGÍA</b>	
	REGISTRO INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA AERONÁUTICA PRECIPITACIÓN	Código: GMET-PR-001-RG-005 Versión: 1.0 Página 1 de 1

AEROPUERTO "Río Amazonas" - SHELL MERA

JUNIO - 2025

Día/Hora	01 - 07	07 - 13	13 - 19	19 - 01	Suma Diaria
1	2.0	1.8	6.0	-	9.8
2	6.0	0.0	0.0	-	6.0
3	21.8	0.7	0.3	-	22.8
4	1.3	6.4	0.1	-	7.8
5	7.6	3.2	2.9	-	13.7
6	0.0	2.1	8.3	-	10.4
7	24.0	0.0	0.0	-	24.0
8	0.0	1.8	0.0	-	1.8
9	4.9	0.0	9.1	-	14.0
10	22.6	18.2	3.1	-	43.9
11	0.0	0.0	0.0	-	0.0
12	0.1	0.0	0.0	-	0.1
13	0.0	0.0	0.0	-	0.0
14	0.0	0.0	5.5	-	5.5
15	7.2	2.2	0.6	-	10.0
16	1.4	1.7	0.9	-	4.0
17	2.3	0.2	0.0	-	2.5
18	31.2	12.2	0.0	-	43.4
19	0.0	0.0	10.0	-	10.0
20	6.3	3.4	3.5	-	13.2
21	2.7	0.0	0.0	-	2.7
22	0.0	0.0	0.0	-	0.0
23	0.0	0.0	3.8	-	3.8
24	11.9	0.6	1.0	-	13.5
25	29.5	32.9	0.0	-	62.4
26	0.0	0.0	3.5	-	3.5
27	1.7	2.4	1.2	-	5.3
28	4.4	0.0	0.6	-	5.0
29	0.7	0.0	0.2	-	0.9
30	13.8	3.4	4.3	-	21.5
31	-	-	-	-	NIL
<b>TOTAL</b>	<b>203.4</b>	<b>93.2</b>	<b>64.9</b>	<b>0.0</b>	<b>361.5</b>

**RESUMEN**

PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS	62.4
FECHA MÁXIMA PRECIPITACIÓN	25 - JUNIO - 2025
No. de días con PRECIPITACIÓN	27
No. de días con PRECIPITACIÓN menor que 1 mm	2
No. de días con PRECIPITACIÓN igual o mayor que 1 mm	25

**TRZ** = Trazas de precipitación ( valores inferiores a 0,1 mm)

**NOTA:** ES FIEL COPIA DE LOS REGISTROS DIARIOS DE OBSERVACIONES DE SUPERFICIE QUE REPOSAN EN LA OFICINA DE CLIMATOLOGÍA DE LA DGAC.

**PREPARADO POR:**

Lic. Jefferson Rosero V.- Climatología DGAC

Información solicitada SR.CLAUDIO CAYAMBE RUC 1600462723001. Prohibida su reproducción

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

<b>LIBRO DE OBRA</b>		No. HOJA: <b>11 /</b>
<b>PROYECTO:</b>	"CONSTRUCCION DE AFIRMACO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"	
<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE	<b>UBICACIÓN:</b> CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FISCALIZADOR:</b>	ING. RODRIGO PICO	<b>FECHA:</b> 1 Junio de 2025
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ	

CLIMA					
JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	X				X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor			
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera			
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	9	Volqueta	3		
Topografo	1	CHOFER	3	Excavadora	2		
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	X		
		SOLDADOR					
		AYUDANTE DE SUELDA					

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
- Transporte de maquinaria	
- Adecuación del punto sobre el río (Pinto)	
- Revisión de trazado vial (Estación Total)	
- Presencia de lluvia desde las 13:00 hasta las 18 horas, se suspenden los trabajos de excavación sin clasificación (mano diestra) por condiciones climáticas adversas	
- Colocación de señales intermedias y reglamentarias	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	
<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

LIBRO DE OBRA

No. HOJA: 12 /

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTRATISTA: ING. CLAUDIO CAYAMBE  
FISCALIZADOR: ING. RODRIGO PICO  
ADMINISTRADOR: ING. JAIRO NARVAEZ

UBICACIÓN: CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
FECHA: 2 Junio 2025

CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X			X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		

TRABAJOS REALIZADOS

GRÁFICOS

-Presencia de lluvias desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:15 de la tarde se suspende los trabajos por condiciones climáticas adversas

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

DEL CONTRATISTA:

DEL FISCALIZADOR:

DEL ADMINISTRADOR:



ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA



ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 13 /

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE	<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FISCALIZADOR:</b>	ING. RODRIGO PICO	<b>FECHA:</b>	<u>3 Julio 2025</u>
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ		

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X		X	

PERSONAL TÉCNICO	MANO DE OBRA	MAQUINAR./HERRAMIENT.	MAQUINAR./HERRAMIENT.
SUPERINTENDENTE	MAESTRO MAYOR	Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	ALBAÑIL	Concretera	
TECNICO AMBIENTAL	PEON	Volqueta	3
	CHOFER	Excavadora	2
	OPERADOR	Equipo de Topografía	
	SOLDADOR		
	AYUDANTE DE SUELDA		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
<p>- Presencia de lluvias desde las 7:00 am hasta las 11:00 am, se decide suspender los trabajos hasta que mejore el clima.</p> <p>- Se reanuda los trabajos cuando se puede cruzar el río pinto con las Volquetas, el río se encuentra crecido.</p> <p>- Colocación de cintos de peligro.</p>	

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

LIBRO DE OBRA

No. HOJA: 4 / 1

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTRATISTA:	ING. CLAUDIO CAYAMBE	UBICACIÓN:	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
FISCALIZADOR:	ING. RODRIGO PICO	FECHA:	4 Junio 2025
ADMINISTRADOR:	ING. JAIRO NARVAEZ		

CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	Y		Y		

PERSONAL TÉCNICO	MANO DE OBRA	MAQUINAR./HERRAMIENT.	MAQUINAR./HERRAMIENT.
SUPERINTENDENTE	MAESTRO MAYOR	Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	ALBAÑIL	Concreteira	
TECNICO AMBIENTAL	PEON	Volqueta	3
	CHOFER	Excavadora	2
	OPERADOR	Equipo de Topografía	
	SOLDADOR		
	AYUDANTE DE SUELDA		

TRABAJOS REALIZADOS

GRÁFICOS

- Excavacion sin clasificaci (mov tierra)
- Material petreo de mejoramiento (minada cargado y regado)
- Transporte de material petreo
- Colocacion de 3 Panchos las instructivos de la obra (Letrero con estructura)

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

DEL CONTRATISTA:	
DEL FISCALIZADOR:	
DEL ADMINISTRADOR:	



ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA



ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

LIBRO DE OBRA

No. HOJA: 15 /

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTRATISTA:	ING. CLAUDIO CAYAMBE	UBICACIÓN:	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
FISCALIZADOR:	ING. RODRIGO PICO	FECHA:	3 Junio 2025
ADMINISTRADOR:	ING. JAIRO NARVAEZ		

CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	Y		X		

PERSONAL TÉCNICO	MANO DE OBRA	MAQUINAR./HERRAMIENT.	MAQUINAR./HERRAMIENT.
SUPERINTENDENTE	MAESTRO MAYOR	Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	ALBAÑIL	Concreteira	
TECNICO AMBIENTAL	PEON	Volqueta	3
	CHOFER	Excavadora	2
	OPERADOR	Equipo de Topografia	
	SOLDADOR		
	AYUDANTE DE SUELDA		

TRABAJOS REALIZADOS

GRÁFICOS

- Excavacion sin clasificar (mas tierras)  
 - Material Petreo de mejoramiento (minado, cargado y segado)  
 - Transporte de material petreo  
 - Charca ambiental  
 - Colocacion de cintas de peligro

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

DEL CONTRATISTA:	
DEL FISCALIZADOR:	
DEL ADMINISTRADOR:	

6  
  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

LIBRO DE OBRA

No. HOJA: *161*

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE AFIRMACION DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTRATISTA:	ING. CLAUDIO CAYAMBE
FISCALIZADOR:	ING. RODRIGO PICO
ADMINISTRADOR:	ING. JAIRO NARVAEZ

UBICACIÓN:	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
FECHA:	<i>6 Junio 2025</i>

CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
<i>Y</i>			<i>X</i>		

PERSONAL TÉCNICO	MANO DE OBRA	MAQUINAR./HERRAMIENT.	MAQUINAR./HERRAMIENT.
SUPERINTENDENTE	MAESTRO MAYOR	Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	ALBAÑIL	Concreteira	
TECNICO AMBIENTAL	PEON <i>2</i>	Volqueta	<i>3</i>
	CHOFER <i>3</i>	Excavadora	<i>2</i>
	OPERADOR <i>2</i>	Equipo de Topografía	
	SOLDADOR		
	AYUDANTE DE SUELDA		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
<i>- Excavacion sin clasificar (mov tierra)</i>	
<i>- Limpieza, cargada y reparto de material pedico de mejoramiento</i>	
<i>- Transporte de material pedico</i>	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

DEL CONTRATISTA:	
DEL FISCALIZADOR:	
DEL ADMINISTRADOR:	

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

LIBRO DE OBRA

No. HOJA: 17 /

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTRATISTA:	ING. CLAUDIO CAYAMBE	UBICACIÓN:	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
FISCALIZADOR:	ING. RODRIGO PICO	FECHA:	7 Junio 2025
ADMINISTRADOR:	ING. JAIRO NARVAEZ		

CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X			X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL	2	Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	3	Volqueta	.	3	
		CHOFER	2	Excavadora	.	2	
		OPERADOR		Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		
					.		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
- Excavacion sin clasificar (mou tierra)	
- A las 10am se suspende las labores debido a lluvias hasta las 16:00pm	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

DEL CONTRATISTA:	
DEL FISCALIZADOR:	
DEL ADMINISTRADOR:	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

LIBRO DE OBRA

No. HOJA: 181

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTRATISTA: ING. CLAUDIO CAYAMBE  
FISCALIZADOR: ING. RODRIGO PICO  
ADMINISTRADOR: ING. JAIRO NARVAEZ

UBICACIÓN: CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
FECHA: 8 Junio 2025

CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X			X

PERSONAL TÉCNICO	MANO DE OBRA	MAQUINAR./HERRAMIENT.	MAQUINAR./HERRAMIENT.
SUPERINTENDENTE	MAESTRO MAYOR	Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	ALBAÑIL	Concreteira	
TECNICO AMBIENTAL	PEON	Volqueta	3
	CHOFER	Excavadora	2
	OPERADOR	Equipo de Topografía	
	SOLDADOR		
	AYUDANTE DE SUELDA		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
-Módulo cargado y segado de material petreo de mejoramiento	
-Transporte de material petreo	
-Presencia de lluvia desde las 9:00am hasta las 15:00pm por lo que se suspende trabajos por condiciones climaticas adversas	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

DEL CONTRATISTA:	
DEL FISCALIZADOR:	
DEL ADMINISTRADOR:	

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 14 /

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 9 Junio 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		Y	X		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		
					.		

**TRABAJS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- Presencia de lluvia desde las 6:00am hasta las 11:00 am de la mañana se suspenden los trabajos hasta que el clima mejore
- Se labora desde las 14:00 luego de que el clima mejore
- Ejecución en suelo sin clasificar
- Muestreo, carga y reparto de material para de mejoramiento
- Transporte de material peleo

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

**DEL CONTRATISTA:**

**DEL FISCALIZADOR:**

**DEL ADMINISTRADOR:**



ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA



ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

LIBRO DE OBRA

No. HOJA: 201

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTRATISTA:	ING. CLAUDIO CAYAMBE
FISCALIZADOR:	ING. RODRIGO PICO
ADMINISTRADOR:	ING. JAIRO NARVAEZ

UBICACIÓN:	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
FECHA:	10 Junio 2025

CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
X			X		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografia	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		

TRABAJOS REALIZADOS

GRÁFICOS

- Excavación sin clasificar
- Muestreo, cargado y reparto de material pedregoso de mejoramiento
- Transporte de material pedregoso



OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

DEL CONTRATISTA:	
DEL FISCALIZADOR:	
DEL ADMINISTRADOR:	

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

<b>LIBRO DE OBRA</b>		No. HOJA: <b>21 /</b>
<b>PROYECTO:</b>	"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"	
<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE	<b>UBICACIÓN:</b> CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FISCALIZADOR:</b>	ING. RODRIGO PICO	<b>FECHA:</b> <b>11 Junio de 2015</b>
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ	
<b>CLIMA</b>		
JORNADA : MAÑANA		JORNADA : TARDE
<b>SOLEADO</b>	<b>NUBLADO</b>	<b>LLUVIOSO</b>
<b>PERSONAL TÉCNICO</b>		
SUPERINTENDENTE		
RESIDENTE DE OBRA	1	
TECNICO AMBIENTAL	1	
<b>MANO DE OBRA</b>		
MAESTRO MAYOR		
ALBAÑIL		
PEON	2	
CHOFER	3	
OPERADOR	2	
SOLDADOR		
AYUDANTE DE SUELDA		
<b>MAQUINAR./HERRAMIENT.</b>		
Herramienta menor		
Concreteira		
Volqueta	3	
Excavadora	2	
Equipo de Topografia		
<b>TRABAJOS REALIZADOS</b>		
- Excavación sin clasificar		<b>GRÁFICOS</b>
- Mande, cargada y reparto de material petreo de mejoramiento		
- Transporte de material de mejoramiento		
<b>OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES</b>		
<b>DEL CONTRATISTA:</b>		
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>		
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>		
 ING. CLAUDIO CAYAMBE CONTRATISTA	 ING. RODRIGO PICO FISCALIZADOR	

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: **221**

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTRATISTA:	ING. CLAUDIO CAYAMBE
FISCALIZADOR:	ING. RODRIGO PICO
ADMINISTRADOR:	ING. JAIRO NARVAEZ

UBICACIÓN:	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
FECHA:	<b>12 Junio 2025</b>

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		x	x		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor			
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira			
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	3		
		CHOFER	3	Excavadora	2		
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía			
		SOLDADOR					
		AYUDANTE DE SUELDA					

**TRABAJOS REALIZADOS**

- Presencia de lluvias desde las 7:00 am hasta las 11:00 am, durante ese tiempo se suspenden los trabajos debido a que el suelo está saturado, se trabaja a partir de las 1:30 pm
- Excavacion sin clasificar
- Limpieza, reparación y requesta de material petreo de mejoramiento
- Transporte de material petreo
- Cierre Ambiental

**GRÁFICOS**

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

DEL CONTRATISTA:	
DEL FISCALIZADOR:	
DEL ADMINISTRADOR:	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: **93 /**

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** **13 Junio 2025**

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
✓					✗

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		
					.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**


- Excursión sin clasificar (mañ. tierra)  
- Mando, carga y descarga de material  
peteo de mejoramiento  
- Transporte de material de mejoramiento

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

**DEL CONTRATISTA:**

**DEL FISCALIZADOR:**

**DEL ADMINISTRADOR:**

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR



## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

**LIBRO DE OBRA** No. HOJA: 241

<b>PROYECTO:</b>	"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"		
<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE	<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FISCALIZADOR:</b>	ING. RODRIGO PICO	<b>FECHA:</b>	<u>14 Junio 2025</u>
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ		

CLIMA					
JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
✓			✓		

PERSONAL TÉCNICO	MANO DE OBRA	MAQUINAR./HERRAMIENT.	MAQUINAR./HERRAMIENT.
SUPERINTENDENTE	MAESTRO MAYOR	Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	ALBAÑIL	Concretera	
TECNICO AMBIENTAL	PEON	Volqueta	3
	CHOFER	Excavadora	2
	OPERADOR	Equipo de Topografía	
	SOLDADOR		
	AYUDANTE DE SUELDA		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
- Ejecución sin clasificar (nuevo terreno)	
- Mida, carga y reparto de material p/ten de mejoramiento	
- Transporte de material p/ten de mejoramiento	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	
<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**CONTRATISTA**

ING. RODRIGO PICO  
**FISCALIZADOR**

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: **95 /**

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** **15 Junio 2025**

**CLIMA**


JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		x			x

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor			
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira			
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	9	Volqueta	3		
		CHOFER	3	Excavadora	2		
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía			
		SOLDADOR					
		AYUDANTE DE SUELDA					

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
Excavación sin justificar (mov tierra)	
- Manda, carga y relleno de material petreo de mejoramiento	
- Transporte de material petreo de mejoramiento	
- Se presenta lluvias desde las 10:00am hasta las 15:00 pm, mientras dura la lluvia se suspende los trabajos por suelo saturado	

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 26 /

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTRATISTA: ING. CLAUDIO CAYAMBE  
FISCALIZADOR: ING. RODRIGO PICO  
ADMINISTRADOR: ING. JAIRO NARVAEZ

UBICACIÓN: CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
FECHA: 16 Junio 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
<u>X</u>			<u>X</u>		

PERSONAL TÉCNICO	MANO DE OBRA	MAQUINAR./HERRAMIENT.	MAQUINAR./HERRAMIENT.
SUPERINTENDENTE	MAESTRO MAYOR	Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA <u>1</u>	ALBAÑIL	Concreteira	
TECNICO AMBIENTAL	PEON <u>2</u>	Volqueta	<u>3</u>
	CHOFER <u>3</u>	Excavadora	<u>2</u>
	OPERADOR <u>2</u>	Equipo de Topografía	
	SOLDADOR		
	AYUDANTE DE SUELDA		


TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
<u>Excavacion sin clasifica. (mas tierras)</u>	
<u>Minado cargado y regado de material pedregoso de mejoramiento</u>	
<u>- Transporte de material de mejoramiento</u>	

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

DEL CONTRATISTA:

DEL FISCALIZADOR:

DEL ADMINISTRADOR:



ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA



ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 27 /

<b>PROYECTO:</b>	"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"		
<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE	<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FISCALIZADOR:</b>	ING. RODRIGO PICO	<b>FECHA:</b>	17 Junio 2025
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ		

**CLIMA**


JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
X			X		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor			
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira			
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	3		
		CHOFER	3	Excavadora	2		
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía			
		SOLDADOR					
		AYUDANTE DE SUELDA					

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
- Excavacion sin clasificar (mu. Tierras)	
- Minuto cargado y regado de material pedregoso de mejoramiento.	
- Transporte de material pedregoso de mejoramiento.	

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: *28 /*

<b>PROYECTO:</b>	"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"		
<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE	<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FISCALIZADOR:</b>	ING. RODRIGO PICO	<b>FECHA:</b>	<i>18 Junio 2025</i>
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ		

**CLIMA**


JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	<i>X</i>				<i>X</i>

PERSONAL TÉCNICO	MANO DE OBRA	MAQUINAR./HERRAMIENT.	MAQUINAR./HERRAMIENT.
SUPERINTENDENTE	MAESTRO MAYOR	Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	ALBAÑIL	Concreteira	
TECNICO AMBIENTAL	PEON	Volqueta	<i>3</i>
	CHOFER	Excavadora	<i>2</i>
	OPERADOR	Equipo de Topografía	
	SOLDADOR		
	AYUDANTE DE SUELDA		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
<i>- Excavación sin clasificar (con Tierra)</i>	
<i>- Minado, cargado y minado de material pedregoso</i>	
<i>- Transporte de material pedregoso de mejoramiento.</i>	

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	



ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA



ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 29 / 1

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE
<b>FISCALIZADOR:</b>	ING. RODRIGO PICO
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ

<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FECHA:</b>	19 Julio 2025

**CLIMA**


JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X			X

PERSONAL TÉCNICO		MAÑO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
- Excavación sin clasificor (nuev. Tierras)	
- Minado, cargado y segado de material pedregoso de mejoramiento	
- Transporte de material pedregoso de mejoramiento	
- Presencia de lluvias desde las 9:30 AM hasta las 19:00 PM	
- Se suspenden los trabajos desde las 9:30 AM por que la maquinaria se emboraca, encalla o atasca en el suelo sabroso saturado.	

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	



ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**CONTRATISTA**



ING. RODRIGO PICO  
**FISCALIZADOR**

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: **30 /**

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE
<b>FISCALIZADOR:</b>	ING. RODRIGO PICO
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ

<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FECHA:</b>	<b>20 Julio 2025</b>

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
X			X		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor			
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira			
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta			
		CHOFER		Excavadora	2		
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía			
		SOLDADOR					
		AYUDANTE DE SUELDA					

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- Transporte de maquinaria (Excavadora para sacar a la excavadora que se encuentra subterránea en el suelo natural solidado.

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

<b>LIBRO DE OBRA</b>		No. HOJA: 31 /
<b>PROYECTO:</b>	"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"	
<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE	<b>UBICACIÓN:</b> CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FISCALIZADOR:</b>	ING. RODRIGO PICO	<b>FECHA:</b> 21 Junio 2025
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ	

CLIMA					
JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
X			X		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografia	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		
					.		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
- Excavacion sin clasificar (mov. Tierra)	
Minado cargado y regado de material pedregoso	
- Transporte de material pedregoso de mejoramiento	
- Colocacion de señales informativas y reglamentos	
- faros, Perforacion.	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	
<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

LIBRO DE OBRA

No. HOJA: 32 /

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTRATISTA: ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 FISCALIZADOR: ING. RODRIGO PICO  
 ADMINISTRADOR: ING. JAIRO NARVAEZ

UBICACIÓN: CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
 FECHA: 22 JUNIO de 2025

CLIMA

JORNADA: MAÑANA			JORNADA: TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	X			X	

PERSONAL TÉCNICO	MANO DE OBRA	MAQUINAR./HERRAMIENT.	MAQUINAR./HERRAMIENT.
SUPERINTENDENTE	MAESTRO MAYOR	Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	ALBAÑIL	Concretera	
TECNICO AMBIENTAL	PEON	Volqueta	3
	CHOFER	Excavadora	2
	OPERADOR	Equipo de Topografía	
	SOLDADOR		
	AYUDANTE DE SUELDA		

TRABAJOS REALIZADOS

GRÁFICOS


- Excavacion en clasificac. (mas. Tierra)  
 - Minado, compacto y regado de material petreo de mejoramiento  
 - Transporte de material petreo de mejoramiento  
 - Charlas ambientales

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

DEL CONTRATISTA:

DEL FISCALIZADOR:

DEL ADMINISTRADOR:



ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA



ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 33 /

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 23 Junio 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X		X	

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor			
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera			
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	3		
		CHOFER	3	Excavadora	2		
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía			
		SOLDADOR					
		AYUDANTE DE SUELDA					

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
- Excavacion en clasificas (mas fierros)	
- Mirado, cargado y regado de material petico de mejoramiento	
- Transporte de material petico de mejoramiento	

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

LIBRO DE OBRA

No. HOJA: 34 /

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTRATISTA: ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 FISCALIZADOR: ING. RODRIGO PICO  
 ADMINISTRADOR: ING. JAIRO NARVAEZ

UBICACIÓN: CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
 FECHA: 24 Junio de 2025

CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X			X

PERSONAL TÉCNICO	MANO DE OBRA	MAQUINAR./HERRAMIENT.	MAQUINAR./HERRAMIENT.
SUPERINTENDENTE	MAESTRO MAYOR	Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	ALBAÑIL	Concretera	
TECNICO AMBIENTAL	PEON	Volqueta	3
	CHOFER	Excavadora	2
	OPERADOR	Equipo de Topografía	
	SOLDADOR		
	AYUDANTE DE SUELDA		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
- frecuencia sin clasificar (mov. Tierras)	
- Mizado, cargado y cegado de material pedregoso de mejoramiento.	
- Transporte de material pedregoso de mejoramiento.	
- Presencia de lluvia desde las 10:45 AM hasta las 18:00 PM, se suspenden los trabajos por condiciones climáticas adversas.	
- Visita técnica Ambiental del augejo provincial.	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

DEL CONTRATISTA:	
DEL FISCALIZADOR:	
DEL ADMINISTRADOR:	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR



# GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

<b>LIBRO DE OBRA</b>		No. HOJA: <u>35 /</u>
<b>PROYECTO:</b>	"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"	
<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE	<b>UBICACIÓN:</b> CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FISCALIZADOR:</b>	ING. RODRIGO PICO	<b>FECHA:</b> <u>25 Junio de 2025</u>
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ	


CLIMA					
JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	<u>X</u>		<u>X</u>		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	<u>1</u>	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	<u>2</u>	Volqueta	.	<u>3</u>	
		CHOFER	<u>3</u>	Excavadora	.	<u>2</u>	
		OPERADOR	<u>2</u>	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
<u>- Excavacion sin clasificar (mas tierras)</u>	
<u>- minado, cargado, y regado de material petreo de mejoramiento</u>	
<u>- Transporte de material petreo de mejoramiento</u>	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	
<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 36 /

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 26 Junio 2025

**CLIMA**


JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	

PERSONAL TÉCNICO	MANO DE OBRA	MAQUINAR./HERRAMIENT.	MAQUINAR./HERRAMIENT.
SUPERINTENDENTE	MAESTRO MAYOR	Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	ALBAÑIL	Concreteira	
TECNICO AMBIENTAL	PEON	Volqueta	
	CHOFER	Excavadora	
	OPERADOR	Equipo de Topografía	
	SOLDADOR		
	AYUDANTE DE SUELDA		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
- Excavación en zanficar (una Tiedra)	
- Minado, cargado y regado de material pedregoso de mejoramiento	
- Transporte de material pedregoso de mejoramiento	

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: **371**

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTRATISTA: ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 FISCALIZADOR: ING. RODRIGO PICO  
 ADMINISTRADOR: ING. JAIRO NARVAEZ

UBICACIÓN: CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
 FECHA: **27 Junio 2025**

**CLIMA**


JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X			X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
- <i>Extracción sin clasificar (mov. Tierras)</i>	
- <i>Transporte de material pétreo de mejoramiento</i>	
- <i>Minado carga de y regado de material pétreo de mejoramiento.</i>	
- <i>Ubicación de letreros informativos y regulatorios.</i>	
- <i>Parada de luvos de las 10:30AM hasta las 15:00, no se puede continuar los trabajos debido al mal clima</i>	

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

DEL CONTRATISTA:	
DEL FISCALIZADOR:	
DEL ADMINISTRADOR:	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 38 /

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 28 Junio 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	X				X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor			
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira			
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	3		
		CHOFER	3	Excavadora	2		
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía			
		SOLDADOR					
		AYUDANTE DE SUELDA					

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- Ejecución de clasificación Mov. Tierras!
- Muestra, cargo y registro de material pedregoso de mejoramiento
- Transporte de material pedregoso
- Se suspenden los trabajos a partir de las 14:00 PM por condiciones climáticas adversas.

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

**LIBRO DE OBRA** No. HOJA: 391

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE	<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FISCALIZADOR:</b>	ING. RODRIGO PICO	<b>FECHA:</b>	<u>29 Junio 2025</u>
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ		

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	X				X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
- Excavacion sin clasificar	
- Mueudo agrario y regado de material petreo de mejoramiento	
- Transporte de material petreo de mejoramiento	
- Presencia de lluvias desde las 14:00 P.M. se suspenden los trabajos por condiciones climaticas adversas	

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: *40 / 1*

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** *30 Junio 2025*

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		<i>X</i>			<i>X</i>

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor			
RESIDENTE DE OBRA	<i>1</i>	ALBAÑIL		Concretera			
TECNICO AMBIENTAL	<i>1</i>	PEON	<i>2</i>	Volqueta	<i>3</i>		
		CHOFER	<i>3</i>	Excavadora	<i>2</i>		
		OPERADOR	<i>2</i>	Equipo de Topografía			
		SOLDADOR					
		AYUDANTE DE SUELDA					

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

*- Excavacion manual sin clasificas*  
*- Muro de concreto y regado de concreto*  
*- Transporte de material por medio de equipo*  
*- Presencia de lluvias desde las 8:00 AM hasta las 14:00 PM. se suspenden los trabajos con condiciones climaticas adversas*

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

LIBRO DE OBRA

No. HOJA: 411

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTRATISTA:	ING. CLAUDIO CAYAMBE
FISCALIZADOR:	ING. RODRIGO PICO
ADMINISTRADOR:	ING. JAIRO NARVAEZ

UBICACIÓN:	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
FECHA:	1 de Julio de 2025

CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLEUVADO	SOLEADO	NUBLADO	LLEUVADO
	X				X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor			
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera			
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	3		
Topografo	1	CHOFER	3	Excavadora	2		
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	1		
		SOLDADOR					
		AYUDANTE DE SUELDA					

TRABAJOS REALIZADOS

GRÁFICOS

- Transporte de maquinaria.
- Revisión de replanteo y nivelación, se usa estación total.
- Colocación de señales informativas y reglamos forjas.
- Excavación sin clasificar.
- minado, cargado y regado de material petreo de mejoramiento.
- Transporte de material petreo.

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

DEL CONTRATISTA:	Presencia de lluvia desde las 13:00 hasta las 17:30, se suspenden los trabajos, desde la hora antes mencionada por con dición climática adversa.
DEL FISCALIZADOR:	
DEL ADMINISTRADOR:	

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: *42 /*

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTRATISTA: ING. CLAUDIO CAYAMBE  
FISCALIZADOR: ING. RODRIGO PICO  
ADMINISTRADOR: ING. JAIRO NARVAEZ

UBICACIÓN: CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
FECHA: *2 de Julio de 2025*

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA
		<i>X</i>			<i>X</i>

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	<i>1</i>	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL	<i>1</i>	PEON	<i>2</i>	Volqueta	.	<i>3</i>	
		CHOFER	<i>3</i>	Excavadora	.	<i>2</i>	
		OPERADOR	<i>2</i>	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**


- Charla de concientización ambiental
- Colocación de contenedores metálicos
- Sesión informativa y reglamentarias
- Mipada, cargada, trabajos y registro de material por lo de mejoramiento
- Presencia de lluvias desde las 10:00 AM hasta las 16:00, suspeniendo las labores por condiciones climáticas adversas.

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

DEL CONTRATISTA:

DEL FISCALIZADOR:

DEL ADMINISTRADOR:



ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA



ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

LIBRO DE OBRA

Nº. HOJA: 43 /

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTRATISTA:	ING. CLAUDIO CAYAMBE
FISCALIZADOR:	ING. RODRIGO PICO
ADMINISTRADOR:	ING. JAIRÓ NARVAEZ

UBICACIÓN:	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
FECHA:	3 de Julio 2025

CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	X				X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		

TRABAIOS REALIZADOS

GRÁFICOS

- Excavacion sin clasifica  
 - Mopada, cargada, transporte y regacha de material  
 peques de mejoramiento  
 - Presencia de lluvia desde las 11:30 AM hasta las  
 12:00 PM. se suspenden los trabajos por condiciones  
 climaticas adversas

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

DEL CONTRATISTA:

DEL FISCALIZADOR:

DEL ADMINISTRADOR:

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 44 / 1

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE
<b>FISCALIZADOR:</b>	ING. RODRIGO PICO
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ

<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FECHA:</b>	4 de Julio 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	GRANIZO	SOLEADO	NUBLADO	GRANIZO
		✓			✓

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor			
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira			
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	2		
		CHOFER	3	Excavadora	3		
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía			
		SOLDADOR					
		AYUDANTE DE SUELDA					

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- Charlas de concientización ambiental  
 - Excavacion sin clasificar  
 - Minada, cargado, transporte y regada de material  
 petro de mejoramiento.  
 - Presencia de lluvias desde las 08:30 AM hasta las 15:45  
 se suspenden los trabajos por condiciones climáticas  
 adversas.

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: *451*

<b>PROYECTO:</b>	"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"			
<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE		<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FISCALIZADOR:</b>	ING. RODRIGO PICO		<b>FECHA:</b>	<i>5 Julio 2025</i>
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ			

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
<i>X</i>				<i>X</i>	

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	<i>1</i>	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	<i>2</i>	Volqueta	.	<i>3</i>	
		CHOFER	<i>3</i>	Excavadora	.	<i>2</i>	
		OPERADOR	<i>2</i>	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUelda			.		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
<p><i>- Excavacion sin clasificar</i></p> <p><i>- Minada, cargada, transporte y reparto de material</i></p> <p><i>pebro de mejoramiento</i></p> <p><i>- Limpieza de wheelas y maquina.</i></p>	

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

*[Signature]*

ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

*[Signature]*

ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 46 / 1

**PROYECTO:**

"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTRATISTA:	ING. CLAUDIO CAYAMBE
FISCALIZADOR:	ING. RODRIGO PICO
ADMINISTRADOR:	ING. IAIRO NARVAEZ

UBICACIÓN:	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
FECHA:	6 Julio 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
X			X		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	*		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	*		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	*	3	
		CHOFER	3	Excavadora	*	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	*		
		SOLDADOR			*		
		AYUDANTE DE SUELDA			*		
					*		
					*		


**TRABAJOS REALIZADOS**

- Excavacion sin clasificaci  
- minada, cargada y regada de material petreo de mejoria mixto  
- colocacion de cinta de peligro alrededor del letero de informacion de agua potable.

**GRÁFICOS**

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

DEL CONTRATISTA:	
DEL FISCALIZADOR:	
DEL ADMINISTRADOR:	

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 471

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE
<b>FISCALIZADOR:</b>	ING. RODRIGO PICO
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ

<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FECHA:</b>	7 Julio 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA
	X				X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	.	2	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- Excavacion sin clasificar
- Mirador, cerrado, transporte y regado de material pedregoso de mejoramiento
- Limpieza de ventanas
- Presencia de lluvias desde las 12:10 hasta las 17:15, se suspenden los trabajos por condiciones climaticas adversas.

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: **48 /**

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** **8 Julio 2025**

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIA
		X			X

PERSONAL TÉCNICO	MANO DE OBRA	MAQUINAR./HERRAMIENT.	MAQUINAR./HERRAMIENT.
SUPERINTENDENTE	MAESTRO MAYOR	Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	ALBAÑIL	Concreteira	
TECNICO AMBIENTAL	PEON	Volqueta	
	CHOFER	Excavadora	
	OPERADOR	Equipo de Topografía	
	SOLDADOR		
	AYUDANTE DE SUELDA		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
<p>- Excavacion sin clasificar                      - Minado, cargado y regado de material pabeo de mejoramiento                      - Transporte de material pabeo de mejoramiento</p> <p>Presencia de lluvias desde las 9:00 hasta las 17:00, se suspenden los trabajos por condiciones climaticas adversas.</p>	

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: *49 /*

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** *9 Julio 2025*

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
<i>x</i>			<i>x</i>		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	<i>1</i>	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	<i>2</i>	Volqueta	.	<i>3</i>	
		CHOFER	<i>3</i>	Excavadora	.	<i>2</i>	
		OPERADOR	<i>2</i>	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
<i>- Excavacion sin clasificar</i>	
<i>- Minado, cargado, transporte y regado de material</i>	
<i>poroso de mejoramiento</i>	

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 50 /

<b>PROYECTO:</b>	"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"		
<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE	<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FISCALIZADOR:</b>	ING. RODRIGO PICO	<b>FECHA:</b>	10 Julio 2025
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ		

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X			X

PERSONAL TÉCNICO	MANO DE OBRA	MAQUINAR./HERRAMIENT.	MAQUINAR./HERRAMIENT.
SUPERINTENDENTE	MAESTRO MAYOR	Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	ALBAÑIL	Concreteira	
TECNICO AMBIENTAL	PEON	Volqueta	3
	CHOFER	Excavadora	2
	OPERADOR	Equipo de Topografía	
	SOLDADOR		
	AYUDANTE DE SUELDA		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
- Presencias de lluvias desde las 6:00 AM y continúan hasta las 12:00, se frena de trabajos por lo que se suspenden los trabajos por que el suelo está muy saturado y dificultando el transporte de material por lo de mejoramiento.	

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR



# GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

## LIBRO DE OBRA

No. HOJA: *51 /*

<b>PROYECTO:</b>	"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"		
<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE	<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FISCALIZADOR:</b>	ING. RODRIGO PICO	<b>FECHA:</b>	<i>11 Julio 2025</i>
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ		

### CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIAS	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIAS
<i>X</i>			<i>X</i>		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor			
RESIDENTE DE OBRA	<i>1</i>	ALBAÑIL		Concretera			
TECNICO AMBIENTAL		PEON	<i>2</i>	Volqueta	<i>3</i>		
		CHOFER	<i>2</i>	Excavadora	<i>2</i>		
		OPERADOR	<i>2</i>	Equipo de Topografía			
		SOLDADOR					
		AYUDANTE DE SUELDA					

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
<i>-Excavacion sin clasificar</i>	
<i>- minado, cargado, transporte y regado de material por medio de mejoramiento.</i>	

### OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

*Claudio Cayambe*  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

*Rodrigo Pico*  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: *52 /*

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTRATISTA:	ING. CLAUDIO CAYAMBE
FISCALIZADOR:	ING. RODRIGO PICO
ADMINISTRADOR:	ING. JAIRO NARVAEZ

UBICACIÓN:	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
FECHA:	<i>12 Julio 2025</i>

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		<i>X</i>			<i>X</i>

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	<i>1</i>	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	<i>2</i>	Volqueta	.	<i>3</i>	
		CHOFER	<i>2</i>	Excavadora	.	<i>2</i>	
		OPERADOR	<i>2</i>	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

*Amanece lloviendo, se intento trabajar pero las condiciones climaticas nos obligu a suspender los trabajos, las lluvias continuan todo el dia.*

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

DEL CONTRATISTA:	
DEL FISCALIZADOR:	
DEL ADMINISTRADOR:	

*Claudio Cayambe*  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

*Rodrigo Pico*  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 53 /

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 13 Julio 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
X					X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor			
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira			
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	3		
		CHOFER	3	Excavadora	2		
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía			
		SOLDADOR					
		AYUDANTE DE SUELDA					

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
- Excavacion sin clasificar.	
- Mipado, cargado, transporte y legado de material pebro.	
- Presencia de lluvia desde las 13:00 hasta las 18:50, se suspenden los trabajos por condiciones climaticas adversas.	

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

LIBRO DE OBRA

No. HOJA: 54 / 1

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTRATISTA:	ING. CLAUDIO CAYAMBE
FISCALIZADOR :	ING. RODRIGO PICO
ADMINISTRADOR:	ING. JAIRO NARVAEZ

UBICACIÓN:	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
FECHA:	14 Julio 2025

CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	X			X	

PERSONAL TÉCNICO	MANO DE OBRA	MAQUINAR./HERRAMIENT.	MAQUINAR./HERRAMIENT.
SUPERINTENDENTE	MAESTRO MAYOR	Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	ALBAÑIL	Concreteira	
TECNICO AMBIENTAL	PEON	Volqueta	2
	CHOFER	Excavadora	3
	OPERADOR	Equipo de Topografía	
	SOLDADOR		
	AYUDANTE DE SUELDA		

TRABAJOS REALIZADOS

- Excavacion sin clasificar  
 - Mierda cargada, transporte y reguete de material perfo.

GRÁFICOS

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

DEL CONTRATISTA:	
DEL FISCALIZADOR:	
DEL ADMINISTRADOR:	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

LIBRO DE OBRA

No. HOJA: 55 /

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTRATISTA: ING. CLAUDIO CAYAMBE  
FISCALIZADOR: ING. RODRIGO PICO  
ADMINISTRADOR: ING. JAIRO NARVAEZ

UBICACIÓN: CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
FECHA: 15 Julio 2025

CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
X				X	

PERSONAL TÉCNICO	MANO DE OBRA	MAQUINAR./HERRAMIENT.	MAQUINAR./HERRAMIENT.
SUPERINTENDENTE	MAESTRO MAYOR	Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	ALBAÑIL	Concreteira	
TECNICO AMBIENTAL	PEON	Volqueta	3
	CHOFER	Excavadora	2
	OPERADOR	Equipo de Topografía	
	SOLDADOR		
	AYUDANTE DE SUELDA		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
- Excavacion sin clasificar	
- Mizada, cargada, transporte, y llegada de material por medio de mejoramiento.	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

DEL CONTRATISTA:	
DEL FISCALIZADOR:	
DEL ADMINISTRADOR:	



ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA



ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: **56 /**

<b>PROYECTO:</b>	"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"		
<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE	<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FISCALIZADOR:</b>	ING. RODRIGO PICO	<b>FECHA:</b>	<b>16 Julio 2025</b>
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ		

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	X		X		

PERSONAL TÉCNICO	MANO DE OBRA	MAQUINAR./HERRAMIENT.	MAQUINAR./HERRAMIENT.
SUPERINTENDENTE	MAESTRO MAYOR	Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	ALBAÑIL	Concretera	
TECNICO AMBIENTAL	PEON	Volqueta	
	CHOFER	Excavadora	
	OPERADOR	Equipo de Topografía	
	SOLDADOR		
	AYUDANTE DE SUELDA		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
<p><i>- Excavacion sin clasificar</i>  <i>- Mizado, cargado, transporte y regada de material petreo de mejoramiento.</i></p>	

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 57 /

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 17 Julio 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO

PERSONAL TÉCNICO	MANO DE OBRA	MAQUINAR./HERRAMIENT.	MAQUINAR./HERRAMIENT.
SUPERINTENDENTE	MAESTRO MAYOR	Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	ALBAÑIL	Concreteira	
TECNICO AMBIENTAL	PEON	Volqueta	
	CHOFER	Excavadora	
	OPERADOR	Equipo de Topografia	
	SOLDADOR		
	AYUDANTE DE SUELDA		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
- Excavacion sin clasificar	
- Minada, cargada, transporte y regada de material petreo.	
- Prevision de lluvias desde las 8:30 AM hasta las Noche, se suspenden los trabajos por condiciones climaticas adversas	

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR



# GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

## LIBRO DE OBRA

No. HOJA: 58 /

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTRATISTA:	ING. CLAUDIO CAYAMBE
FISCALIZADOR:	ING. RODRIGO PICO
ADMINISTRADOR:	ING. JAIRO NARVAEZ

UBICACIÓN:	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
FECHA:	18 Julio 2025

### CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X			X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	*		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	*		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	*	MAN	
		CHOFER	3	Excavadora	*		
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	*		
		SOLDADOR			*		
		AYUDANTE DE SUELDA			*		
					*		
					*		

### TRABAJS REALIZADOS

### GRÁFICOS

- Se espera en obra que las lluvias prosigan pero llueve todo el día, suspendiendo los trabajos por condiciones climáticas adversas

### OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

DEL CONTRATISTA:

DEL FISCALIZADOR:

DEL ADMINISTRADOR:

ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: *391*

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTRATISTA:	ING. CLAUDIO CAYAMBE
FISCALIZADOR :	ING. RODRIGO PICO
ADMINISTRADOR:	ING. JAIRO NARVAEZ

UBICACIÓN:	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
FECHA:	<i>19 Julio 2023</i>

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LUVIOSO
		<i>X</i>			<i>X</i>

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	<i>1</i>	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL	<i>1</i>	PEON	<i>2</i>	Volqueta	.	<i>3</i>	
		CHOFER	<i>3</i>	Excavadora	.	<i>2</i>	
		OPERADOR	<i>2</i>	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		


**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

*- Se presenta en obra, pero por condiciones climáticas adversas se suspenden los trabajos.*

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

DEL CONTRATISTA:	
DEL FISCALIZADOR:	
DEL ADMINISTRADOR:	

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: **601**

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTRATISTA: ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 FISCALIZADOR: ING. RODRIGO PICO  
 ADMINISTRADOR: ING. JAIRO NARVAEZ

UBICACIÓN: CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
 FECHA: **20 Julio 2025**

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
X				X	

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor			
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira			
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	3		
		CHOFER	3	Excavadora	2		
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía			
		SOLDADOR					
		AYUDANTE DE SUELDA					

**TRABAJO REALIZADOS**

**GRÁFICOS**


- Excavacion sin clasificar  
 - Minada, carga, transporte y regada de material  
 pubeo de mejoramiento

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

DEL CONTRATISTA:

DEL FISCALIZADOR:

DEL ADMINISTRADOR:

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 61 /

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 21 Julio 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LUVIOSO
	X			X	

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	<u>1</u>	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL	<u>1</u>	PEON	<u>2</u>	Volqueta	.	<u>3</u>	
		CHOFER	<u>3</u>	Excavadora	.	<u>2</u>	
		OPERADOR	<u>2</u>	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

-Excavacion sin clasifica.  
-Minado, cargado y transporte de material  
fibra de mejoramielito

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

**DEL CONTRATISTA:**

**DEL FISCALIZADOR:**

**DEL ADMINISTRADOR:**

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 62 /

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE
<b>FISCALIZADOR:</b>	ING. RODRIGO PICO
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ

<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FECHA:</b>	<u>22 Julio 2025</u>

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LUVIZO	SOLEADO	NUBLADO	LUVIZO
	X		X		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- Excavacion sin clasificar  
 - Mizado, cargado, transporte y regado de material  
 porzo de mejoramiento

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: *63 /*

<b>PROYECTO:</b>	"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"		
<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE	<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FISCALIZADOR:</b>	ING. RODRIGO PICO	<b>FECHA:</b>	<i>23 Julio 2025</i>
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ		

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		<i>X</i>			<i>X</i>

PERSONAL TÉCNICO	MANO DE OBRA	MAQUINAR./HERRAMIENT.	MAQUINAR./HERRAMIENT.
SUPERINTENDENTE	MAESTRO MAYOR	Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA <i>1</i>	ALBAÑIL	Concreteira	
TECNICO AMBIENTAL	PEON <i>2</i>	Volqueta	<i>3</i>
	CHOFER <i>3</i>	Excavadora	<i>2</i>
	OPERADOR <i>2</i>	Equipo de Topografía	
	SOLDADOR		
	AYUDANTE DE SUELDA		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
<i>- Transporte de maquinaria.</i> <i>- Presencia de lluvia durante todo el día, no se pudo trabajar debido a condiciones climáticas adversas.</i> <i>- Señales informativas y reglamentarias.</i>	

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

*[Firma]*  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

*[Firma]*  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: *641*

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** *24 Julio 2025*

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LUBRADO	SOLEADO	NUBLADO	LUBRADO
	<i>X</i>				<i>X</i>

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	<i>1</i>	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL	<i>1</i>	PEON	<i>2</i>	Volqueta	.	<i>3</i>	
		CHOFER	<i>3</i>	Excavadora	.	<i>2</i>	
		OPERADOR	<i>2</i>	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
<i>Excavacion sin clasificar.</i>	
<i>Minado, cargado, transporte y regado de material por medio de mejoramiento</i>	
<i>- Presencia de lluvias desde las 11:40 hasta las 19:45, se suspenden los trabajos por condiciones climáticas adversas.</i>	

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

*[Signature]*  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

*[Signature]*  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

LIBRO DE OBRA

No. HOJA: 65 /

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTRATISTA:	ING. CLAUDIO CAYAMBE
FISCALIZADOR:	ING. RODRIGO PICO
ADMINISTRADOR:	ING. JAIRO NARVAEZ

UBICACIÓN:	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
FECHA:	25 Julio 2025

CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIAS	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIAS
		X			X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteza	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografia	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		
					.		
					.		

TRABAJOS REALIZADOS

GRÁFICOS

*Presencia de lluvias todo el día, se suspenden los trabajos por condiciones climáticas adversas*

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

DEL CONTRATISTA:

DEL FISCALIZADOR:

DEL ADMINISTRADOR:

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR



GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

LIBRO DE OBRA

No. HOJA: 66 /

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

Table with contractor, supervisor, and administrator names: ING. CLAUDIO CAYAMBE, ING. RODRIGO PICO, ING. JAIRO NARVAEZ

Table with location and date: CANTON MERA, PARROQUIA SHELL, 26 Julio 2025

CLIMA

Weather log table with columns for Morning and Afternoon, and sub-columns for Sunny, Cloudy, and Rainy.

Personnel and equipment table with columns for Technical Personnel, Labor, and Machinery/Tools.

Work performed and graphics table with columns for 'TRABAJOS REALIZADOS' and 'GRÁFICOS'.

Observations and recommendations table with rows for Contractor, Supervisor, and Administrator.

Signature and stamp of the Contractor: ING. CLAUDIO CAYAMBE

Signature and stamp of the Supervisor: ING. RODRIGO PICO

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: **67 /**

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** **27 Julio de 2025**

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LUBRADO	SOLEADO	NUBLADO	LUBRADO
X			X		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor			
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera			
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	3		
		CHOFER	3	Excavadora	2		
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía			
		SOLDADOR					
		AYUDANTE DE SUELDA					

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
- Excavacion sin clasificadores	
- Minado, cargado, regado y transporte de material petreo.	

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: *681*

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTRATISTA:	ING. CLAUDIO CAYAMBE
FISCALIZADOR:	ING. RODRIGO PICO
ADMINISTRADOR:	ING. JAIRO NARVAEZ

UBICACIÓN:	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
FECHA:	<i>28 Julio 2025</i>

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		<i>X</i>			<i>X</i>

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor			
RESIDENTE DE OBRA	<i>1</i>	ALBAÑIL		Concreteira			
TECNICO AMBIENTAL	<i>1</i>	PEON	<i>2</i>	Volqueta	<i>3</i>		
		CHOFER	<i>3</i>	Excavadora	<i>2</i>		
		OPERADOR	<i>2</i>	Equipo de Topografía			
		SOLDADOR					
		AYUDANTE DE SUELDA					

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

*- Excavaciona maquina sin clasifica.*  
*- Mipacto, cargado, transporte y reparto de material por e.c.*  
*- Presencia de lluvia desde las 9:50 AM hasta las 16:45, se suspenden los trabajos por condiciones climaticas adversas.*

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

DEL CONTRATISTA:	
DEL FISCALIZADOR:	
DEL ADMINISTRADOR:	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR



GOBIERNO DE  
**PASTAZA**  
*El Gobierno del Animo*

## **9 LIBRO DE OBRA**

**PROYECTO:**

***“CONSTRUCCIÓN DE AFIRMADO DE VARIAS VÍAS UBICADA EN LA  
PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA”.***

***PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA***

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

### LIBRO DE OBRA

No. HOJA: 1 / 1

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR :** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 22 de mayo de 2025

#### CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
X			X		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	*		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	*		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	*		
Topografo	1	CHOFER		Excavadora	*		
		OPERADOR		Equipo de Topografía	*	1	
		SOLDADOR			*		
		AYUDANTE DE SUELDA			*		
					*		
					*		
					*		

#### TRABAJOS REALIZADOS

#### GRÁFICOS

- Limpieza y desbroce del area a intervenir.
- Recoleccion de Puntos topograficas con estacion total.

#### OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

DEL CONTRATISTA:

DEL FISCALIZADOR:

DEL ADMINISTRADOR:

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 2 / 1

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR :** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 23 Mayo de 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X			X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	.		
		CHOFER		Excavadora	.		
		OPERADOR		Equipo de Topografía	.	1	
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		


**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- Limpieza y desbroce del area a intervenir
- Levantamiento topografico con estacion total.
- Se labora solo 2 horas y media debido a mal clima.
- Presencia de lluvias desde las 8:00 AM - hasta las 11:30 AM y presencia de lluvias desde las 12:30 hasta las 1:00 PM.

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

<b>LIBRO DE OBRA</b>		No. HOJA: <u>3 /</u>
<b>PROYECTO:</b>	"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"	
<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE	<b>UBICACIÓN:</b> CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO	<b>FECHA:</b> <u>24 Mayo de 2025</u>
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ	

CLIMA					
JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X		X	

PERSONAL TÉCNICO	MANO DE OBRA	MAQUINAR./HERRAMIENT.	MAQUINAR./HERRAMIENT.
SUPERINTENDENTE	MAESTRO MAYOR	Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA <u>1</u>	ALBAÑIL	Concreteira	
TECNICO AMBIENTAL <u>1</u>	PEON <u>2</u>	Volqueta	
	CHOFER	Excavadora	
	OPERADOR	Equipo de Topografía	<u>1</u>
	SOLDADOR		
	AYUDANTE DE SUELDA		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limpieza y desbroce del Area a intervenir.</li> <li>- Levanta miento topografico del area a intervenir con estacion total.</li> </ul>	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	
<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

**LIBRO DE OBRA** No. HOJA: 4 / 1

<b>PROYECTO:</b>	"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"			
<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE	<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL	
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO	<b>FECHA:</b>	<u>25 Mayo de 2025</u>	
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ			

CLIMA					
JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
X				X	

PERSONAL TÉCNICO	MANO DE OBRA	MAQUINAR./HERRAMIENT.	MAQUINAR./HERRAMIENT.
SUPERINTENDENTE	MAESTRO MAYOR	Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	ALBAÑIL	Concretera	
TECNICO AMBIENTAL	PEON	Volqueta	
	CHOFER	Excavadora	
	OPERADOR	Equipo de Topografía	1
	SOLDADOR		
	AYUDANTE DE SUELDA		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
- Limpieza y desbroce de las areas a intervenir.	
- Levantamiento topografico con estacion total	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	
<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

<b>LIBRO DE OBRA</b>		No. HOJA: <u>51</u>
<b>PROYECTO:</b>	"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"	
<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE	<b>UBICACIÓN:</b> CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FISCALIZADOR:</b>	ING. RODRIGO PICO	<b>FECHA:</b> <u>26 de mayo de 2025</u>
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ	

CLIMA					
JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
X			X		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	.		
		CHOFER		Excavadora	.		
		OPERADOR		Equipo de Topografía	.	1	
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		



TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
<p>- Limpieza y desbroce del area a intervenir</p> <p>- Levantamiento topografico del area a intervenir con estacion total.</p>	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	
<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

LIBRO DE OBRA				No. HOJA: 61	
<b>PROYECTO:</b>		"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"			
<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE	<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL		
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO	<b>FECHA:</b>	27 Mayo de 2025		
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ				
CLIMA					
JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	
		X		X	
PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	
		CHOFER		Excavadora	
		OPERADOR		Equipo de Topografía	1
		SOLDADOR			
		AYUDANTE DE SUELDA			
TRABAJOS REALIZADOS			GRÁFICOS		
<p>- Presencia de lluvias intensas en el area de trabajo.</p> <p>- Se suspenden las labores de replanteo y nivelacion.</p>					
<b>OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES</b>					
<b>DEL CONTRATISTA:</b>					
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>					
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">               ING. CLAUDIO CAYAMBE              CONTRATISTA           </div> <div style="text-align: center;">               ING. RODRIGO PICO              FISCALIZADOR           </div> </div>					

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 7 /

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ

<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FECHA:</b>	<u>28 de mayo de 2025</u>

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	X				X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	.		
		CHOFER		Excavadora	.		
		OPERADOR		Equipo de Topografia	.	1	
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- Doplanteo y nivelacion del area a intervenir.  
 - Presencia de lluvias desde las 12:30 hasta las 16:00, se suspenden los trabajos de replanteo y nivelacion.

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

### GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 8 /

<b>PROYECTO:</b>	"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"		
<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE	<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO	<b>FECHA:</b>	29 de mayo de 2025
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ		

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
X			X		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	.		
		CHOFER		Excavadora	.		
		OPERADOR		Equipo de Topografía	.	1	
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		
					.		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
<p>- Replanteo y nivelacion del area a intervenir.</p> <p>- Presencia de vehiculos particulares, se procede a colocar conos de advertencia.</p>	

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

### LIBRO DE OBRA

No. HOJA: 9 / 1

**PROYECTO:**

"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTRATISTA:	ING. CLAUDIO CAYAMBE
FISCALIZADOR :	ING. RODRIGO PICO
ADMINISTRADOR:	ING. JAIRO NARVAEZ

UBICACIÓN:	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
FECHA:	30 de mayo 2025

#### CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	X		X		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	*		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	*		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	*		
		CHOFER		Excavadora	*		
		OPERADOR		Equipo de Topografía	*	1	
		SOLDADOR			*		
		AYUDANTE DE SUELDA			*		
					*		

#### TRABAJS REALIZADOS

#### GRÁFICOS

- Replanteo y nivelacion del area a intervenir

#### OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

DEL CONTRATISTA:	
DEL FISCALIZADOR:	
DEL ADMINISTRADOR:	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 11 / 1

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 1 Junio de 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA

JORNADA : TARDE

SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	X				X

PERSONAL TÉCNICO	
SUPERINTENDENTE	
RESIDENTE DE OBRA	1
TECNICO AMBIENTAL	1
Topógrafo	1

MANO DE OBRA	
MAESTRO MAYOR	
ALBAÑIL	
PEON	9
CHOFER	3
OPERADOR	2
SOLDADOR	
AYUDANTE DE SUELDA	

MAQUINAR./HERRAMIENT.	
Herramienta menor	.
Concretera	.
Volqueta	3
Excavadora	2
Equipo de Topografía	X
	.
	.
	.
	.

MAQUINAR./HERRAMIENT.	

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- Transporte de maquinaria  
- Adecuación del paso sobre el río (Pindo)  
- Revisión de trazado vial (Estación Total)  
- Presencia de lluvia desde las 13:00 hasta las 18 horas, se suspenden los trabajos de excavación sin clasificación (mano fierral por condiciones climáticas adversas)  
- Colocación de señales informativas y reglamentarias

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

**DEL CONTRATISTA:**

**DEL FISCALIZADOR:**

**DEL ADMINISTRADOR:**

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

### LIBRO DE OBRA

No. HOJA: 12 / 1

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 2 Junio 2025

#### CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		x			x

PERSONAL TÉCNICO	MANO DE OBRA	MAQUINAR./HERRAMIENT.	MAQUINAR./HERRAMIENT.
SUPERINTENDENTE	MAESTRO MAYOR	Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	ALBAÑIL	Concretera	
TECNICO AMBIENTAL	PEON	Volqueta	3
	CHOFER	Excavadora	2
	OPERADOR	Equipo de Topografía	
	SOLDADOR		
	AYUDANTE DE SUELDA		

#### TRABAJOS REALIZADOS

#### GRÁFICOS

*-Presencia de lluvias desde las 8:00 de la mañana hasta las 17:15 de la tarde se suspende los trabajos por condiciones climáticas adversas*

#### OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

**DEL CONTRATISTA:**

**DEL FISCALIZADOR:**

**DEL ADMINISTRADOR:**

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

### LIBRO DE OBRA

No. HOJA: **13 /**

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** **3 Julio 2025**

#### CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X		X	

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		

#### TRABAJOS REALIZADOS

#### GRÁFICOS

- Presencia de lluvias desde las 7:00 am hasta las 11:00 am se pide suspender los trabajos hasta que mejore el clima.  
 - Se reanuda los trabajos cuando se puede cruzar el río pinto con las Volquetas, el río se encuentra crecido.  
 - Colocación de cintos de peligro

#### OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

**DEL CONTRATISTA:**

**DEL FISCALIZADOR:**

**DEL ADMINISTRADOR:**

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

### LIBRO DE OBRA

No. HOJA: 4 / 1

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 4 Junio 2025

#### CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	x		x		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
-Excavacion sin clasificaci (mov. tierra)	
-Material petreo de mejoramiento (minado, cargado y regado)	
-Transporte de material petreo	
-Colocacion de 3 Puntos de Inspeccion de la obra (Letrero con estructura)	

#### OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: **15 /**

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** **3 Junio 2025**

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	✓		✓		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL	2	Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	3	Volqueta	.	3	
		CHOFER	2	Excavadora	.	2	
		OPERADOR		Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- Excavacion sin clasificas (mca. fensas)
- Material Pteco de mejoramiento (mirada, cargada y regada)
- Transporte de material pteco
- Charca ambiental
- Colocacion de cintas de peligro

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: **161**

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** **6 Junio 2025**

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
Y			X		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		
					.		
					.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- Excavacion sin clasificar (mov. tierra)  
- Minada, cargada y regado de material petro de mejoramiento  
- Transporte de material petro

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

**DEL CONTRATISTA:**

**DEL FISCALIZADOR:**

**DEL ADMINISTRADOR:**

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 171

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 7 Junio 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X			X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL	2	Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	3	Volqueta	.	3	
		CHOFER	2	Excavadora	.	2	
		OPERADOR		Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- Excavacion sin clasificar (mov. tierra)  
- A las 10am se suspende las labores debido a lluvias hasta las 16:00pm

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

**DEL CONTRATISTA:**

**DEL FISCALIZADOR:**

**DEL ADMINISTRADOR:**

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: **181**

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** **8 Junio 2025**

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X			X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		
					.		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
-Manguera cargada y recogida de material petreo de mejoramiento	
-Transporte de material petreo	
-Presencia de lluvia desde las 9:00am hasta las 15:00pm por lo que se suspende trabajos por condiciones climaticas adversas	

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 14 / 1

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 9 Junio 2023

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		✓	✗		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		
					.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**


- Presencia de lluvia desde las 6:00am hasta las 11:00 am de la mañana se suspenden los trabajos hasta que el clima mejore  
 - Se labora desde las 14:00 luego de que el clima mejore  
 - Excavación en suelo sin clasificar  
 - Muestreo, cargando y registro de material pedregoso de mejoramiento  
 - Transporte de material pedregoso

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

**DEL CONTRATISTA:**

**DEL FISCALIZADOR:**

**DEL ADMINISTRADOR:**

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: **201**

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** **10 Junio 2025**

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
X			X		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
- Excavación sin clasificar	
- Mpicado, cargado y reparto de material pedregoso de mejoramiento	
- Transporte de material pedregoso	

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 01 / 1

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 11 Junio de 2015

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	✓			✓	

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

- Excavación sin clasificar  
- Minado, cargado y regado de material petreo de mejoramiento  
- Transporte de material de mejoramiento

**GRÁFICOS**

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: **221**

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** **12 Junio 2025**

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		x	x		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografia	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- Presencia de lluvias desde las 7:00 am hasta las 11:00 am, durante ese tiempo se suspenden los trabajos debido a que el suelo esta saturado, se labora a partir de las 15:30 PM

- Ejecucion sin clasificar

- Murgido, cargado y resaca de material petreo de mejoramiento

- Transporte de material petreo

- Charla Ambiental

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: **93 /**

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 13 Junio 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
✓				X	

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

-Excavación sin clasificar (mov. tierra)  
 -Héncida, cargada y regada de material  
 peteo de mejoramiento  
 -Transporte de material de mejoramiento

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

**DEL CONTRATISTA:**

**DEL FISCALIZADOR:**

**DEL ADMINISTRADOR:**

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 24 /

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 14 Junio 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
1			x		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		
					.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

-Excavación sin clasificas (mov. tierra)  
-Migada, cargada y reparto de material petreo de mejoramiento  
-Transporte de material petreo de mejoramiento

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

**DEL CONTRATISTA:**

**DEL FISCALIZADOR:**

**DEL ADMINISTRADOR:**

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

### LIBRO DE OBRA

No. HOJA: 951

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 15 Junio 2025

#### CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		x			x

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor			
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira			
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	9	Volqueta	3		
		CHOFER	3	Excavadora	2		
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía			
		SOLDADOR					
		AYUDANTE DE SUELDA					

#### TRABAJOS REALIZADOS

*Excavación sin clasificar (mov. tierra)*  
 - Minado, cargado y requeb de material petreo de mejoramiento  
 - Transporte de material petreo de mejoramiento  
 - Se presenta lluvias desde las 10:00am hasta las 15:00 pm, mientras dura la lluvia se suspende los trabajos por suelo saturado

#### GRÁFICOS

#### OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

**DEL CONTRATISTA:**

**DEL FISCALIZADOR:**

**DEL ADMINISTRADOR:**

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 26 / 1

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 16 Junio 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
<u>X</u>			<u>X</u>		

PERSONAL TÉCNICO	MANO DE OBRA	MAQUINAR./HERRAMIENT.	MAQUINAR./HERRAMIENT.
SUPERINTENDENTE	MAESTRO MAYOR	Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	ALBAÑIL	Concretera	
TECNICO AMBIENTAL	PEON	Volqueta	<u>3</u>
	CHOFER	Excavadora	<u>2</u>
	OPERADOR	Equipo de Topografía	
	SOLDADOR		
	AYUDANTE DE SUELDA		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
<u>Excavacion sin clasificar (mov. Tierras)</u>	
<u>Minado cargado y regado de material petreo de mejoramiento</u>	
<u>Transporte de material de mejoramiento</u>	

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 27 / 1

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ

<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FECHA:</b>	17 Junio 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
X			X		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		
					.		


**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- Excavacion sin clasificar (www. Tierras)
- Minado cargado y regado de material petreo de mejora miento.
- Transporte de material petreo de mejoramientos.

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**CONTRATISTA**

  
 ING. RODRIGO PICO  
**FISCALIZADOR**

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 28 1

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 18 Junio 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	X				X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
- Excavacion sin clasificar (cu. Tierras)	
- Minado, cargado y minado de material pedreo de mejoramiento	
- Transporte de material pedreo de mejoramiento.	

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	



ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA



ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 29 / 1

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 19 Junio 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X			X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		


**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- Excavación sin clasificar (mov. Tierras)  
 - Minado, cargado y regado de material petreo de mejoramiento.  
 - Transporte de material petreo de mejoramiento.  
 - Presencia de lluvias desde las 9:30 AM hasta las 1:00 PM.  
 Se suspenden los trabajos desde las 9:50 AM por que la maquina se embasca, eucally o atasca en el suelo natural saturado.

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 30 / 1

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 20 Junio 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA

JORNADA : TARDE

SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
X			X		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	.		
		CHOFER		Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		
					.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- Transporte de maquinaria (Excavadora) para sacar a la excavadora que se encuentra subancada en el suelo natural saturado.

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

**DEL CONTRATISTA:**

**DEL FISCALIZADOR:**

**DEL ADMINISTRADOR:**



ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA



ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

### LIBRO DE OBRA

No. HOJA: 31 / 1

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 21 Junio 2025

#### CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
X			X		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor			
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira			
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	3		
		CHOFER	3	Excavadora	2		
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía			
		SOLDADOR					
		AYUDANTE DE SUELDA					

#### TRABAJOS REALIZADOS

- Excavacion sin clasificar (mov. Tierra)  
 Minado cargado y regado de material petreo  
 - Transporte de material petreo de mejoramiento  
 - Colocacion de señales informativas y reglauer  
 - faros, Reubicacion.

#### GRÁFICOS

#### OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 32 /

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 22 Junio de 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	X			X	

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		
					.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**


- Excavacion sin clasificar. (mov. Tierra)
- Minado, cargado y regado de material pedregoso de mejoramiento.
- Transporte de material pedregoso de mejoramiento
- Charlas ambientales

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

**DEL CONTRATISTA:**

**DEL FISCALIZADOR:**

**DEL ADMINISTRADOR:**



ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA



ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: **33 /**

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 23 junio 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X		X	

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- Excavacion sin clasificar (mov. tierras)
- Mizado, cargado y regada de material petreo de mejoramiento
- Transporte de material petreo de mejoramiento

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

**DEL CONTRATISTA:**

**DEL FISCALIZADOR:**

**DEL ADMINISTRADOR:**

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 341

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 24 Junio de 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X			X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- Excavaciones sin clasificor. (mov. Tierras)
- Minado, cargado y regado de material pedregoso de mejoramiento.
- Transporte de material pedregoso de mejoramiento.
- Presencia de lluvia desde las 10:45 AM hasta las 12:00 PM, se suspenden los trabajos por condiciones climáticas adversas.
- Visita técnica Ambiental del concejo provincial.

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 35 / 1

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 25 Junio de 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	X		X		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- Excavacion sin clasificar (mov. tierras)  
- minado, cargado, y regado de material petreo de mejoramiento.  
- Transporte de material petreo de mejoramiento

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

**DEL CONTRATISTA:**

**DEL FISCALIZADOR:**

**DEL ADMINISTRADOR:**

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

### LIBRO DE OBRA

No. HOJA: 36 / 1

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 26 Junio 2025

#### CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	X			X	

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		
					.		

#### TRABAJOS REALIZADOS

- Excavación sin descompactar (cuor. Tierras)
- Minado, cargado y regado de material pedreo de mejoramiento
- Transporte de material pedreo de mejoramiento


#### GRÁFICOS

#### OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

DEL CONTRATISTA:

DEL FISCALIZADOR:

DEL ADMINISTRADOR:

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 371

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 27 Junio 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X			X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		


**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- Excavacion sin clasificar (mov. Tierras)  
- Transporte de material petreo de mejoramiento  
- Minado cargado y regado de material petreo de mejoramiento.  
- Ubicacion de letreros informativos y regulatorios.  
- Presencia de lluvias des las 10:30AM hasta las 15:00 no se puede continuar los trabajos debido al mal clima

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: **38 /**

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** **28 Junio 2025**

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	X				X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	.	2	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- Excavacion sin clasificar Mov. Tierra's
- Minado, cargado y regado de material pedreo de mejoramiento.
- Transporte de material pedreo.
- Se suspenden los trabajos a partir de la 14:00 PM por condiciones climaticas adversas.

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

**DEL CONTRATISTA:**

**DEL FISCALIZADOR:**

**DEL ADMINISTRADOR:**

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 39 /

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 29 Junio 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	X				X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
- Excavacion sin clasificar	
- Mizado ocrado y regado de material petreo de mejoramiento	
- Transporte de material petreo de me joramiento	
- Presencia de lluvias desde las 14:00 PM se suspenden lo trabajos por condiciones clima tica, adversas	

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: **40 1**

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** **30 Junio 2025**

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X			X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		
					.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- Excavacion manual sin clasificas
- Mizado cargado y reparto de material pedregoso de mejoramiento
- Transporte de material pedregoso de mejoramiento
- Presencia de lluvias desde las 8:00 PM hasta las 14:00 PM. se suspenden los trabajos con condiciones climaticas adversas

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

**DEL CONTRATISTA:**

**DEL FISCALIZADOR:**

**DEL ADMINISTRADOR:**

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 411

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ

<b>UBICACIÓN:</b>	CANTÓN MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FECHA:</b>	<u>1 Julio 2025</u>

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA

JORNADA : TARDE

SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	X				X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	.	3	
<u>Topógrafo</u>	1	CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.	1	
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		
					.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**


Transporte de Maquinaria  
- Revisión de replanteo y nivelación, se usa estación Total  
- Colocación de señales informativas y reglamentarias  
- Excavación sin clasificas.  
- Plinado, cargado y regado de material pedregoso de mejoramiento  
- Transporte de material pedregoso

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

**DEL CONTRATISTA:** Presencia de lluvias desde las 13:00 hasta las 17:30. Se suspenden los trabajos por condiciones climáticas adversas.

**DEL FISCALIZADOR:**

**DEL ADMINISTRADOR:**

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 421

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ

<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FECHA:</b>	2 Julio de 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X			X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	.	2	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		
					.		


**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- Charla de concientización ambiental.
- Colocacion de ganteredre metálicos
- Pláticas informativas y reglamentarias
- Miquela, cargada y transporte y regada de material porro de mejoramiento.
- Presencia de lluvia desde las 10:00AM hasta las 16:00 se suspenden las labores por condiciones climáticas adversas.

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 43 / 1

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ

<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FECHA:</b>	<u>3 Julio 2025</u>

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	X				X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		
					.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- Excavacion sin clasificar  
 - Minada, cargada, transporte y regado de material petreo de mejoramiento.  
 - Presencia de lluvia desde las 11:30 AM hasta las 12:00 PM, se suspenden los trabajos por condiciones climáticas adversas.

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: *441*

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ

<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FECHA:</b>	<i>4 Julio 2025</i>

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		<i>X</i>			<i>X</i>

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	*		
RESIDENTE DE OBRA	<i>1</i>	ALBAÑIL		Concretera	*		
TECNICO AMBIENTAL	<i>1</i>	PEON	<i>2</i>	Volqueta	*	<i>2</i>	
		CHOFER	<i>3</i>	Excavadora	*	<i>3</i>	
		OPERADOR	<i>2</i>	Equipo de Topografía	*		
		SOLDADOR			*		
		AYUDANTE DE SUELDA			*		
					*		
					*		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

*- Charla de concientización ambiental.*  
*- Excavación sin clasificación.*  
*- Mirada, cargada, transporte y regada de material poroso de mejoramiento.*  
  
*- Presencia de lluvias desde las 8:30AM hasta las 15:45, se suspenden los trabajos por condiciones climáticas adversas*

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

*[Signature]*  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

*[Signature]*  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: **451**

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ

<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FECHA:</b>	<b>5 Julio 2023</b>

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA

JORNADA : TARDE

SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
X				X	

PERSONAL TÉCNICO	MANO DE OBRA	MAQUINAR./HERRAMIENT.	MAQUINAR./HERRAMIENT.
SUPERINTENDENTE	MAESTRO MAYOR	Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	ALBAÑIL	Concreteira	
TECNICO AMBIENTAL	PEON	Volqueta	3
	CHOFER	Excavadora	2
	OPERADOR	Equipo de Topografía	
	SOLDADOR		
	AYUDANTE DE SUELDA		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- Excavacion sin clasificar.  
 - Dinado, cargado, transporte y regada de material  
 pedreg de mejoramiento.  
 - Limpieza de coetas y maquina.

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

### LIBRO DE OBRA

No. HOJA: 461

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ

<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FECHA:</b>	<u>6 Julio 2025</u>

#### CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
X			X		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	..		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	..		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	..	3	
		CHOFER	3	Excavadora	..	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	..		
		SOLDADOR			..		
		AYUDANTE DE SUELDA			..		
					..		
					..		
					..		
					..		

#### TRABAJOS REALIZADOS

- Excavacion sin clasificar.
- Minada cegada y regada de material pedreo de mejoramiento.
- Colocacion de cinta de peligro alrededor del pedreo de informacion de agua potable.

#### GRÁFICOS

#### OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

**DEL CONTRATISTA:**

**DEL FISCALIZADOR:**

**DEL ADMINISTRADOR:**

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 471

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR :** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 7 Julio 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	X				X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	.	2	
		CHOFER	3	Excavadora	.	3	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		


**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- Excavacion sin clasificas  
 - Limpieza, cargado, transporte, y regado de material pedreg de mejoramiento.  
 - Limpieza de una las  
  
 - Presencia de lluvia donde los 12:10 hasta las 17:15, se suspenden los trabajos por condiciones climaticas adversas

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: **481**

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ

<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FECHA:</b>	8 Julio 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X			X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	.	2	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		
					.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- Excavacion sin clasificar.  
 - Plinado, cargado, transporte y reyesada de material perreo de mejoramiento  
 - Presencia de lluvia desde las 9:00 hrs/ las 17:00 se suspenden lo. trabajos por condiciones climaticas adversas

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 49.1

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 9 Julio 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
X			X		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		
					.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- Excavacion sin clasificac.  
 - Mingado, cargado, transporte y regado de material pedregoso de mejoramiento.

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

**DEL CONTRATISTA:**

**DEL FISCALIZADOR:**

**DEL ADMINISTRADOR:**

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 50 /

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ

<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FECHA:</b>	10 Julio 2023

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		+			x

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	.	N	
		CHOFER	2	Excavadora	.	N	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		
					.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- Presencia de lluvia desde las 6:00AM y continúa hasta las 9:00, se trata de avanzar, pero se suspenden los trabajos por que el suelo esta muy saturado y dificultando el transporte de material por lo de mejoramiento

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

# GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

## LIBRO DE OBRA

No. HOJA: *51 / 1*

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRÓ NARVAEZ

<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FECHA:</b>	<i>11 Julio 2025</i>

### CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
<i>X</i>			<i>X</i>		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	*		
RESIDENTE DE OBRA	<i>1</i>	ALBAÑIL		Concreteira	*		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	<i>2</i>	Volqueta	*	<i>2</i>	
		CHOFER	<i>3</i>	Excavadora	*	<i>2</i>	
		OPERADOR	<i>2</i>	Equipo de Topografía	*		
		SOLDADOR			*		
		AYUDANTE DE SUELDA			*		
					*		
					*		
					*		

### TRABAJOS REALIZADOS

*- Excavacion sin clarificac.*  
*- Minado, cargado, transporte y regado de material pedregoso de mejoramiento.*

### GRÁFICOS

### OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

DEL CONTRATISTA:

DEL FISCALIZADOR:

DEL ADMINISTRADOR:

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

LIBRO DE OBRA

No. HOJA: *50 1*

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTRATISTA:	ING. CLAUDIO CAYAMBE
FISCALIZADOR:	ING. RODRIGO PICO
ADMINISTRADOR:	ING. JAIRO NARVAEZ

UBICACIÓN:	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
FECHA:	<i>12 Julio 2025</i>

CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		<i>X</i>			<i>X</i>

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	<i>1</i>	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	<i>2</i>	Volqueta	.	<i>3</i>	
		CHOFER	<i>3</i>	Excavadora	.	<i>2</i>	
		OPERADOR	<i>2</i>	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		
					.		

TRABAJOS REALIZADOS

*- Amanece lluvioso, se intenta trabajar pero por las condiciones climáticas nos obliga a suspender los trabajos, los únicos continuos todo el día.*

GRÁFICOS

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

DEL CONTRATISTA:

DEL FISCALIZADOR:

DEL ADMINISTRADOR:

*Claudio Cayambe*  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

*Rodrigo Pico*  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 53 1

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 12 Julio 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA

JORNADA : TARDE

SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
<u>X</u>					<u>X</u>

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	<u>1</u>	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL	<u>1</u>	PEON	<u>2</u>	Volqueta	.	<u>3</u>	
		CHOFER	<u>3</u>	Excavadora	.	<u>2</u>	
		OPERADOR	<u>2</u>	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		
					.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- Excavacion sin clasificar  
 - Mirado, cargado, transporte y regado de mate  
 final pereo.  
  
 - Presencia de lluvias desde las 13:00 hasta las  
 18:50, se suspenden los trabajos por condiciones  
 climaticas adversas

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 54 / 1

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR :** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 11 Julio 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	X			X	

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	*		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	*		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	*	2	
		CHOFER	3	Excavadora	*	3	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	*		
		SOLDADOR			*		
		AYUDANTE DE SUELDA			*		
					*		
					*		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**


- Excavacion sin Clasificar.  
- Minado, cargado, transporte y regado de material pedregoso.

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

**DEL CONTRATISTA:**

**DEL FISCALIZADOR:**

**DEL ADMINISTRADOR:**

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

### LIBRO DE OBRA

No. HOJA: *55 /*

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ

<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FECHA:</b>	<i>15 Julio 2025</i>

#### CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
X				X	

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	*		
RESIDENTE DE OBRA	<i>1</i>	ALBAÑIL		Concreteira	*		
TECNICO AMBIENTAL	<i>1</i>	PEON	<i>2</i>	Volqueta	*	<i>3</i>	
		CHOFER	<i>3</i>	Excavadora	*	<i>2</i>	
		OPERADOR	<i>2</i>	Equipo de Topografía	*		
		SOLDADOR			*		
		AYUDANTE DE SUELDA			*		


#### TRABAJOS REALIZADOS

<i>- Excavacion sin clasificar.</i>
<i>- Minado, cobrado transporte y llegada de material para el mejoramiento.</i>

#### GRÁFICOS


#### OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 561

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ

<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FECHA:</b>	<u>16 Julio 2025</u>

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	X		X		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	•		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	•		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	•	3	
		CHOFER	3	Excavadora	•	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	•		
		SOLDADOR			•		
		AYUDANTE DE SUELDA			•		
					•		
					•		
					•		
					•		

**TRABAJOS REALIZADOS**

- Excavacion sin clasificada.  
 - Mizado, cagado, transporte y regadera de material poroso de mejoramiento.

**GRÁFICOS**

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

### LIBRO DE OBRA

No. HOJA: 571

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ

<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FECHA:</b>	<u>17 Julio 2025</u>

#### CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X			X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	*		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	*		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	*	3	
		CHOFER	3	Excavadora	*	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	*		
		SOLDADOR			*		
		AYUDANTE DE SUELDA			*		
					*		
					*		
					*		


#### TRABAJOS REALIZADOS

- Excavacion sin clasificar.  
 - Minado, cargado, transporte y regada de material perreo.  
 - Presencia de lluvias desde las 8:30 AM hasta la noche, se suspenden trabajos por condiciones climaticas adversas.

#### GRÁFICOS

#### OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR



# GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

## LIBRO DE OBRA

No. HOJA: 581

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CONTRATISTA:	ING. CLAUDIO CAYAMBE
FISCALIZADOR :	ING. RODRIGO PICO
ADMINISTRADOR:	ING. JAIRO NARVAEZ

UBICACIÓN:	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
FECHA:	18 Julio 2025

### CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X			X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	.	2	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		

TRabajos REALIZADOS	GRÁFICOS
- Se espera en obra que los lluvias para el pero hoy todo el día se suspenden los trabajos por condiciones climáticas adversas	

### OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

DEL CONTRATISTA:	
DEL FISCALIZADOR:	
DEL ADMINISTRADOR:	

ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

### LIBRO DE OBRA

No. HOJA: 591

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ

<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FECHA:</b>	<u>19 Julio 2025</u>

#### CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X			X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		

#### TRABAJOS REALIZADOS

*- Se espera en obra que las lluvias paren poco luego todo el día, suspendiendo los trabajos por condiciones climáticas adversas.*

#### GRÁFICOS

#### OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

**DEL CONTRATISTA:**

**DEL FISCALIZADOR:**

**DEL ADMINISTRADOR:**

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 601

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ

<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FECHA:</b>	<u>20 Julio 2023</u>

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
X				X	

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	<u>1</u>	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	<u>2</u>	Volqueta	.	<u>3</u>	
		CHOFER	<u>3</u>	Excavadora	.	<u>2</u>	
		OPERADOR	<u>2</u>	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- Excavacion sin clasificar.  
 - Minado, cargado, transporte y regada de material pte de mejoramiento.

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR



## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

### LIBRO DE OBRA

No. HOJA: 621

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ

<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FECHA:</b>	<u>22 Julio 2023</u>

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	X		X		

PERSONAL TÉCNICO	MANO DE OBRA	MAQUINAR./HERRAMIENT.	MAQUINAR./HERRAMIENT.
SUPERINTENDENTE	MAESTRO MAYOR	Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	ALBAÑIL	Concreteira	
TECNICO AMBIENTAL	PEON	Volqueta	3
	CHOFER	Excavadora	2
	OPERADOR	Equipo de Topografía	
	SOLDADOR		
	AYUDANTE DE SUELDA		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

-Excavacion sin clasificar.

-Minado, compactado, tapaporte y regado de material para de mejoramiento.

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 63 /

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ

<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FECHA:</b>	<u>23 Julio 2023</u>

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X			X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	•		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	•		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	•	2	
		CHOFER	3	Excavadora	•	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	•		
		SOLDADOR			•		
		AYUDANTE DE SUELDA			•		
					•		
					•		
					•		
					•		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

*- Transporte de maquinaria*  
*- presencia de lluvias durante todo el día, no se pudo trabajar debido a condiciones climáticas adversas.*  
*- Señales informativas y reglamentarias.*

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 64 /

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR :** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 24 Julio 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	<u>X</u>				<u>X</u>

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	.	2	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografia	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		
					.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- Excavacion en clasificar.  
 - Minado, cargado, transporte y regado de material peteo de mejoramiento.  
 - Presencia de lluvia desde la 11:40 hasta las 13:45, se suspenden los trabajos por condiciones climaticas adversas.

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

### LIBRO DE OBRA

No. HOJA: 651

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ

<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FECHA:</b>	<u>25 de julio 2025</u>

#### CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X			X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		
					.		

#### TRABAJOS REALIZADOS

*- Presencia de lluvias todo el día, se suspenden los trabajos por condiciones climáticas adversas.*


#### GRÁFICOS

#### OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

**DEL CONTRATISTA:**

**DEL FISCALIZADOR:**

**DEL ADMINISTRADOR:**

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: *661*

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR :** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** *26 Julio 2025*

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
<i>X</i>				<i>X</i>	

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	<i>1</i>	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL	<i>1</i>	PEON	<i>2</i>	Volqueta	.	<i>3</i>	
		CHOFER	<i>3</i>	Excavadora	.	<i>2</i>	
		OPERADOR	<i>2</i>	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

*- Excavacion sin desahorar.*  
*- Mirado, cargado, transporte y regado do material*  
*Debido de mejoramiento*

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

**DEL CONTRATISTA:**

**DEL FISCALIZADOR:**

**DEL ADMINISTRADOR:**

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 671

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ

<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FECHA:</b>	<u>27 Julio 2025</u>

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA

JORNADA : TARDE

<b>SOLEADO</b>	<b>NUBLADO</b>	<b>LLUVIOSO</b>	<b>SOLEADO</b>	<b>NUBLADO</b>	<b>LLUVIOSO</b>
X			X		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		
					.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- Excavacion sm clasificar.  
 - Minado, cargado, regado y transporte de material pedreo.

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: **681**

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR :** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** **29 Julio 2025**

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		+			x

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		
					.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

- ~~Excavacion sin esterilizar~~  
 - Minado, cargado, transporte y regasto de material pteco.  
 - Presencia de lluvias desde las 9:50 AM hasta las 16:45 se suspenden los trabajos por condiciones climaticas adversas.

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 691

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR :** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 29 Julio 2015

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
✓			✓		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	2	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

*Minado, cargado, transporte y reparto de material perreo.*

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

**DEL CONTRATISTA:**

**DEL FISCALIZADOR:**

**DEL ADMINISTRADOR:**

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

### GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

#### LIBRO DE OBRA

No. HOJA: **701**

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ

<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FECHA:</b>	<b>30 Julio 2025</b>

#### CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	X			X	

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON	3	Volqueta	.	3	
		CHOFER	3	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografia	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		

#### TRABAJOS REALIZADOS

#### GRÁFICOS

- Minado, repado de material y eteo de mejoramiento.

#### OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
**ING. CLAUDIO CAYAMBE**  
**CONTRATISTA**

  
**ING. RODRIGO PICO**  
**FISCALIZADOR**

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 71 /

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ

<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FECHA:</b>	<u>3 de Julio 2025</u>

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
x					x

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor			
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira			
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON	2	Volqueta	3		
		CHOFER	3	Excavadora	2		
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía			
		SOLDADOR					
		AYUDANTE DE SUELDA					

**TRABAJOS REALIZADOS**

**GRÁFICOS**

-Minado, cargado, transporte y reparto de material peteo  
 -Colocacion de armicos

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

**DEL CONTRATISTA:**



**DEL FISCALIZADOR:**

**DEL ADMINISTRADOR:**



  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR



## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

LIBRO DE OBRA				No. HOJA: <u>21</u>	
<b>PROYECTO:</b>		"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"			
<b>CONTRATISTA:</b>		ING. CLAUDIO CAYAMBE		<b>UBICACIÓN:</b>	
<b>FISCALIZADOR :</b>		ING. RODRIGO PICO		CANTON MERA, PARROQUIA SHELL	
<b>ADMINISTRADOR:</b>		ING. JAIRO NARVAEZ		<b>FECHA:</b>	
				02 de Agosto de 2025	
CLIMA					
JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON		Volqueta	2
		CHOFER	2	Excavadora	2
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	
		SOLDADOR			
		AYUDANTE DE SUELDA			
TRABAIOS REALIZADOS				GRÁFICOS	
<p>- Transporte de maquinaria</p> <p>- Arreglo Área de Trabajo</p> <p>- Charlas Ambientales</p>					
OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES					
<b>DEL CONTRATISTA:</b>					
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>					
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ING. CLAUDIO CAYAMBE CONTRATISTA</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ING. RODRIGO PICO FISCALIZADOR</p> </div> </div>					



## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

LIBRO DE OBRA				No. HOJA: 731	
<b>PROYECTO:</b>		"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"			
<b>CONTRATISTA:</b>		ING. CLAUDIO CAYAMBE		<b>UBICACIÓN:</b>	
<b>FISCALIZADOR:</b>		ING. RODRIGO PICO		CANTON MERA, PARROQUIA SHELL	
<b>ADMINISTRADOR:</b>		ING. JAIRO NARVAEZ		<b>FECHA:</b>	
				02 de Agosto de 2025	
CLIMA					
JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	X				X
PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	.
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON		Volqueta	2
		CHOFER	2	Excavadora	2
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.
		SOLDADOR			.
		AYUDANTE DE SUELDA			.
					.
					.
					.
					.
					.
					.
TRABAIOS REALIZADOS			GRÁFICOS		
<p>- Excavación</p> <p>- Mirado, cargado y regado de material incluye transporte.</p> <p>- Presencia de lluvias desde las 14:00 PM hasta las 18:00 h. PM. momento en el cual se pararon los trabajos hasta que mejore las condiciones climaticas</p>					
OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES					
<b>DEL CONTRATISTA:</b>					
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>					
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>					
 ING. CLAUDIO CAYAMBE CONTRATISTA		 ING. RODRIGO PICO FISCALIZADOR			

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

LIBRO DE OBRA				No. HOJA: 741	
<b>PROYECTO:</b>		"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"			
<b>CONTRATISTA:</b>		ING. CLAUDIO CAYAMBE		<b>UBICACIÓN:</b>	
<b>FISCALIZADOR :</b>		ING. RODRIGO PICO		CANTON MERA, PARROQUIA SHELL	
<b>ADMINISTRADOR:</b>		ING. JAIRO NARVAEZ		<b>FECHA:</b>	
				03 de Agosto de 2025	
CLIMA					
JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	X			X	
PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON		Volqueta	2
		CHOFER	2	Excavadora	2
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.
		SOLDADOR			.
		AYUDANTE DE SUELDA			.
					.
					.
					.
					.
					.
					.
					.
TRABAJS REALIZADOS				GRÁFICOS	
- Excavación					
- Meneado, cargado y regado de material por el transporte.					
OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES					
<b>DEL CONTRATISTA:</b>					
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>					
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>					
 ING. CLAUDIO CAYAMBE CONTRATISTA		 ING. RODRIGO PICO FISCALIZADOR			

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

LIBRO DE OBRA				No. HOJA: 75 /	
<b>PROYECTO:</b>		"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"			
<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE	<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL		
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO	<b>FECHA:</b>	04 de Agosto de 2025		
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ				
CLIMA					
JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
<b>SOLEADO</b>	<b>NUBLADO</b>	<b>LLUVIOSO</b>	<b>SOLEADO</b>	<b>NUBLADO</b>	<b>LLUVIOSO</b>
X			X		
PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.
TECNICO AMBIENTAL		PEON		Volqueta	2
		CHOFER	2	Excavadora	2
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.
		SOLDADOR			.
		AYUDANTE DE SUELDA			.
					.
					.
					.
					.
					.
TRABAJOS REALIZADOS			GRÁFICOS		
<p style="margin: 0;">-Ejecucion</p> <p style="margin: 0;">-Minado, cargado y segado de material incluye transporte.</p>					
OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES					
<b>DEL CONTRATISTA:</b>					
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>					
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>					
 ING. CLAUDIO CAYAMBE CONTRATISTA	 ING. RODRIGO PICO FISCALIZADOR				

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

### LIBRO DE OBRA

No. HOJA: 26 / 1

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE	<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO	<b>FECHA:</b>	05 de Agosto de 2025
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ		

#### CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	X		X		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	*		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	*		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON		Volqueta	*	2	
Topografo	1	CHOFER	2	Excavadora	*	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografia	*	1	
		SOLDADOR			*		
		AYUDANTE DE SUELDA			*		
					*		
					*		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
- Excavación	
- Minado, cargado y regado de material incluye transporte	
- levantamiento topografico	

#### OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

### GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 771

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ

<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FECHA:</b>	06 de Agosto de 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
X			X		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON		Volqueta	.	2	
		CHOFER	2	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		
					.		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
- Excavación	
- Minería, cargado y regado de material incluye transporte	

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

### LIBRO DE OBRA

No. HOJA: 28 /

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE	<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO	<b>FECHA:</b>	07 de Agosto de 2025
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ		

#### CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	X				X

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON		Volqueta	.	2	
		CHOFER	2	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		

TRABAJO REALIZADOS	GRÁFICOS
-Excavacion	
-Meneado, cargado y reparto de material encluye transporte.	
-Presencia de lluvias desde las 13:00h PM hasta las 15:45 PM. motivo por el cual se suspenden los trabajos hasta que mejore las condiciones climaticas	



#### OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

LIBRO DE OBRA				No. HOJA: 79 /	
<b>PROYECTO:</b>		"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"			
<b>CONTRATISTA:</b>		ING. CLAUDIO CAYAMBE		<b>UBICACIÓN:</b>	
<b>FISCALIZADOR :</b>		ING. RODRIGO PICO		CANTON MERA, PARROQUIA SHELL	
<b>ADMINISTRADOR:</b>		ING. JAIRO NARVAEZ		<b>FECHA:</b>	
				08 de Agosto de 2025	
CLIMA					
JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X	X		
PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	
TECNICO AMBIENTAL		PEON		Volqueta	2
		CHOFER	2	Excavadora	2
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	
		SOLDADOR			
		AYUDANTE DE SUELDA			
TRABAJOS REALIZADOS			GRÁFICOS		
<p>- Excavación</p> <p>- Minedo, cargado y regado de material incluye transporte.</p> <p>- Presencia de lluvias desde las 8:20AM hasta las 11:00 AM, tiempo por el cual se suspenden las actividades.</p>					
OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES					
<b>DEL CONTRATISTA:</b>					
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>					
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>					
 ING. CLAUDIO CAYAMBE CONTRATISTA		 ING. RODRIGO PICO FISCALIZADOR			

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

**LIBRO DE OBRA** No. HOJA: 801

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE	<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO	<b>FECHA:</b>	<u>09 de Agosto de 2025</u>
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ		

CLIMA					
JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
<u>X</u>			<u>X</u>		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	<u>1</u>	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON		Volqueta	.	<u>2</u>	
		CHOFER	<u>2</u>	Excavadora	.	<u>2</u>	
		OPERADOR	<u>2</u>	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
<u>-Excavación</u>	
<u>-Mipado, cargado y regado de material incluye transporte</u>	



**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

LIBRO DE OBRA				No. HOJA: 81 /	
<b>PROYECTO:</b>		"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"			
<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE	<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL		
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO	<b>FECHA:</b>	10 de Agosto de 2025		
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ				
CLIMA					
JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X	X		
PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	
TECNICO AMBIENTAL		PEON		Volqueta	2
		CHOFER	2	Excavadora	2
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	
		SOLDADOR			
		AYUDANTE DE SUELDA			
TRABAJOS REALIZADOS			GRÁFICOS		
<p>- Excavación</p> <p>- Minedo, cargado y reparto de material incluye transporte</p> <p>- Limpieza area de trabajo, colocacion de leteros, basurero, etc. en otro frente para iniciar una vez acabado el primer frente</p>			Empty space for graphics		
OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES					
<b>DEL CONTRATISTA:</b>					
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>					
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>					
 ING. CLAUDIO CAYAMBE CONTRATISTA		 ING. RODRIGO PICO FISCALIZADOR			

**LIBRO DE OBRA** No. HOJA: 821

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR:** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 11 de Agosto de 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
X			X		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON		Volqueta	.	2	
		CHOFER	2	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
- Excavación	
- Minado, cargado y regado de material Incluye transporte.	



**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

LIBRO DE OBRA				No. HOJA: 83 /	
<b>PROYECTO:</b>		"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"			
<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE	<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL		
<b>FISCALIZADOR:</b>	ING. RODRIGO PICO	<b>FECHA:</b>	12 de Agosto de 2025		
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ				
CLIMA					
JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
X					X
PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	.
TECNICO AMBIENTAL		PEON		Volqueta	2
		CHOFER	2	Excavadora	2
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.
		SOLDADOR			.
		AYUDANTE DE SUELDA			.
					.
					.
					.
					.
TRABAJOS REALIZADOS			GRÁFICOS		
<p>- Excavación</p> <p>- Minedo, cargado y regado de material incluye transporte.</p> <p>- Presencia de</p>					
OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES					
<b>DEL CONTRATISTA:</b>					
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>					
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>					
 ING. CLAUDIO CAYAMBE CONTRATISTA		 ING. RODRIGO PICO FISCALIZADOR			

### GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

#### LIBRO DE OBRA

No. HOJA: 24 /

<b>PROYECTO:</b>	"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"		
<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE	<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FISCALIZADOR:</b>	ING. RODRIGO PICO	<b>FECHA:</b>	13 de Agosto de 2019
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ		

#### CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	X		X		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON		Volqueta	.	2	
		CHOFER	2	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
-Trasvaseción	
-Minado, cargado y reparto de material	
-Anclaje transporte	

#### OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

### LIBRO DE OBRA

No. HOJA: 85 /

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR :** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 14 de Agosto de 2025

#### CLIMA

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
X				X	

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	*		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	*		
TECNICO AMBIENTAL		PEON		Volqueta	*	2	
		CHOFER	2	Excavadora	*	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	*		
		SOLDADOR			*		
		AYUDANTE DE SUELDA			*		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
<p><u>- Excavación</u></p> <p><u>- Minedo, cargado y regado de material incluye transporte.</u></p>	

#### OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 86 / 1

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE	<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO	<b>FECHA:</b>	15 de Agosto de 2025
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ		

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
X				X	

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON		Volqueta	.	2	
		CHOFER	2	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		

TRABAJO REALIZADOS	GRÁFICOS
-Excavación	
-Hendido, cargado y reparto de material incluye transporte.	

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	





ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA



ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

LIBRO DE OBRA				No. HOJA: 87 /	
<b>PROYECTO:</b>		"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"			
<b>CONTRATISTA:</b>		ING. CLAUDIO CAYAMBE		<b>UBICACIÓN:</b>	
<b>FISCALIZADOR:</b>		ING. RODRIGO PICO		CANTON MERA, PARROQUIA SHELL	
<b>ADMINISTRADOR:</b>		ING. JAIRO NARVAEZ		<b>FECHA:</b>	
				16 de Agosto de 2025	
CLIMA					
JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
<b>SOLEADO</b>	<b>NUBLADO</b>	<b>LLUVIOSO</b>	<b>SOLEADO</b>	<b>NUBLADO</b>	<b>LLUVIOSO</b>
X			X		
PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA		ALBAÑIL		Concreteira	
TECNICO AMBIENTAL		PEON		Volqueta	
	1	CHOFER		Excavadora	
	1	OPERADOR		Equipo de Topografía	
		SOLDADOR			
		AYUDANTE DE SUELDA			
TRABAJOS REALIZADOS			GRÁFICOS		
- Excavación					
- Minado, cargado y regado de material incluye transporte.					
OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES					
<b>DEL CONTRATISTA:</b>					
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>					
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>					
 ING. CLAUDIO CAYAMBE CONTRATISTA		 ING. RODRIGO PICO FISCALIZADOR			





## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

**LIBRO DE OBRA** No. HOJA: 901

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR :** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 19 de Agosto de 2025

CLIMA					
JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X	X		

PERSONAL TÉCNICO	MANO DE OBRA	MAQUINAR./HERRAMIENT.	MAQUINAR./HERRAMIENT.
SUPERINTENDENTE	MAESTRO MAYOR	Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	ALBAÑIL	Concreteira	
TECNICO AMBIENTAL	PEON	Volqueta	2
	CHOFER	Excavadora	2
	OPERADOR	Equipo de Topografía	
	SOLDADOR		
	AYUDANTE DE SUELDA		

TRABAJO REALIZADOS	GRÁFICOS
-Excavación	
-Mina de, cargada y recuada de material incluye transporte.	

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR



**LIBRO DE OBRA** No. HOJA: 92 /

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR :** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 21 de Agosto de 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	X		X		

**PERSONAL TÉCNICO**

SUPERINTENDENTE	
RESIDENTE DE OBRA	1
TECNICO AMBIENTAL	1

**MANO DE OBRA**

MAESTRO MAYOR	
ALBAÑIL	
PEON	
CHOFER	2
OPERADOR	2
SOLDADOR	
AYUDANTE DE SUELDA	

**MAQUINAR./HERRAMIENT.**

Herramienta menor	*	
Concreteira	*	
Volqueta	*	2
Excavadora	*	2
Equipo de Topografía	*	
	*	
	*	
	*	
	*	
	*	

**MAQUINAR./HERRAMIENT.**


**TRABAJOS REALIZADOS**

- Excavación  
- Mpicada, cargada y regada de material en el transporte

**GRÁFICOS**



**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

**DEL CONTRATISTA:**  
**DEL FISCALIZADOR:**  
**DEL ADMINISTRADOR:**

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA



  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA



LIBRO DE OBRA				No. HOJA: 93 /	
<b>PROYECTO:</b>		"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"			
<b>CONTRATISTA:</b>		ING. CLAUDIO CAYAMBE		<b>UBICACIÓN:</b>	
<b>FISCALIZADOR:</b>		ING. RODRIGO PICO		CANTON MERA, PARROQUIA SHELL	
<b>ADMINISTRADOR:</b>		ING. JAIRO NARVAEZ		<b>FECHA:</b>	
				22 de Agosto de 2025	
CLIMA					
JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X	X		
PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	..
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	..
TECNICO AMBIENTAL		PEON		Volqueta	.. 2
		CHOFER	2	Excavadora	.. 2
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	..
		SOLDADOR			..
		AYUDANTE DE SUELDA			..
					..
					..
					..
					..
TRABAJOS REALIZADOS			GRÁFICOS		
<p style="margin: 0;">- Excavación</p> <p style="margin: 0;">- Minada, cargada y regada de material incluye transporte</p>					
OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES					
<b>DEL CONTRATISTA:</b>					
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>					
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>					
 ING. CLAUDIO CAYAMBE CONTRATISTA		 ING. RODRIGO PICO FISCALIZADOR			





## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

<b>LIBRO DE OBRA</b>				No. HOJA: <u>951</u>	
<b>PROYECTO:</b> "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"					
<b>CONTRATISTA:</b> ING. CLAUDIO CAYAMBE		<b>UBICACIÓN:</b> CANTON MERA, PARROQUIA SHELL			
<b>FISCALIZADOR:</b> ING. RODRIGO PICO		<b>FECHA:</b> <u>24 de Agosto de 2025</u>			
<b>ADMINISTRADOR:</b> ING. JAIRO NARVAEZ					
<b>CLIMA</b>					
JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
<u>X</u>			<u>X</u>		
<b>PERSONAL TÉCNICO</b>		<b>MANO DE OBRA</b>		<b>MAQUINAR./HERRAMIENT.</b>	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON		Volqueta	2
		CHOFER	2	Excavadora	2
		OPERADOR	2	Equipo de Topografia	.
		SOLDADOR			.
		AYUDANTE DE SUELDA			.
					.
					.
					.
					.
					.
					.
					.
					.
<b>TRABAJOS REALIZADOS</b>			<b>GRÁFICOS</b>		
<p><u>-Excavación</u></p> <p><u>-Mancado, cargada y retirada de material incluye transporte</u></p>					
<b>OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES</b>					
<b>DEL CONTRATISTA:</b>					
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>					
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>					
 ING. CLAUDIO CAYAMBE CONTRATISTA		 ING. RODRIGO PICO FISCALIZADOR			

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

LIBRO DE OBRA				No. HOJA: 96 / 1	
<b>PROYECTO:</b>		"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"			
<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO CAYAMBE	<b>UBICACIÓN:</b>	CANTON MERA, PARROQUIA SHELL		
<b>FISCALIZADOR :</b>	ING. RODRIGO PICO	<b>FECHA:</b>	25 de Agosto de 2025		
<b>ADMINISTRADOR:</b>	ING. JAIRO NARVAEZ				
CLIMA					
JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X			X
PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON		Volqueta	2
		CHOFER	2	Excavadora	2
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	
		SOLDADOR			
		AYUDANTE DE SUELDA			
TRABAJOS REALIZADOS			GRÁFICOS		
<p>- Excavación</p> <p>- Minería, cargada y relleno de material incluye transporte</p> <p>- Presencia de lluvias desde las 10:0 AM hasta las 15:50 PM, tiempo en la cual no se labora por condiciones climáticas extremas.</p>					
OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES					
<b>DEL CONTRATISTA:</b>					
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>					
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>					
 ING. CLAUDIO CAYAMBE CONTRATISTA		 ING. RODRIGO PICO FISCALIZADOR			

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

LIBRO DE OBRA				No. HOJA: 97 /	
<b>PROYECTO:</b>		"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"			
<b>CONTRATISTA:</b>		ING. CLAUDIO CAYAMBE		<b>UBICACIÓN:</b>	
<b>FISCALIZADOR:</b>		ING. RODRIGO PICO		CANTON MERA, PARROQUIA SHELL	
<b>ADMINISTRADOR:</b>		ING. JAIRO NARVAEZ		<b>FECHA:</b>	
				96 de Agosto de 2025	
CLIMA					
JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
	X		X		
PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concretera	.
TECNICO AMBIENTAL		PEON		Volqueta	2
		CHOFER	2	Excavadora	2
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.
		SOLDADOR			.
		AYUDANTE DE SUELDA			.
					.
					.
					.
					.
TRABAJOS REALIZADOS			GRÁFICOS		
<p style="margin: 0;">-Excavación</p> <p style="margin: 0;">-Minado, cargada y retirada de material incluye transporte.</p>					
OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES					
<b>DEL CONTRATISTA:</b>					
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>					
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>					
 ING. CLAUDIO CAYAMBE CONTRATISTA		 ING. RODRIGO PICO FISCALIZADOR			

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 98 /

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR :** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 27 de Agosto de 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X		X	

PERSONAL TÉCNICO	
SUPERINTENDENTE	
RESIDENTE DE OBRA	1
TECNICO AMBIENTAL	1

MANO DE OBRA	
MAESTRO MAYOR	
ALBAÑIL	
PEON	
CHOFER	2
OPERADOR	2
SOLDADOR	
AYUDANTE DE SUELDA	

MAQUINAR./HERRAMIENT.	
Herramienta menor	
Concreteira	
Volqueta	2
Excavadora	2
Equipo de Topografía	

MAQUINAR./HERRAMIENT.	


TRABAIOS REALIZADOS
- Excavación
- Mamparas, cargada y regada de material incluye transporte.

GRÁFICOS

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

**LIBRO DE OBRA** No. HOJA: 99 /

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR :** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 28 de Agosto de 2025

CLIMA					
JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
		X		X	

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA	1	ALBAÑIL		Concreteira	.		
TECNICO AMBIENTAL	1	PEON		Volqueta	.	2	
		CHOFER	2	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografia	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		

TRABAIOS REALIZADOS	GRÁFICOS
Excavación	
Mineda, cargada, y regada de material incluye transporte.	

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR



## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

**LIBRO DE OBRA** No. HOJA: 101 /

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR :** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 30 de Agosto de 2025

CLIMA					
JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
X				X	

PERSONAL TÉCNICO	MANO DE OBRA	MAQUINAR./HERRAMIENT.	MAQUINAR./HERRAMIENT.
SUPERINTENDENTE	MAESTRO MAYOR	Herramienta menor	
RESIDENTE DE OBRA	ALBAÑIL	Concreteira	
TECNICO AMBIENTAL	PEON	Volqueta	2
	CHOFER	Excavadora	2
	OPERADOR	Equipo de Topografía	
	SOLDADOR		
	AYUDANTE DE SUELDA		

TRABAJO REALIZADOS	GRÁFICOS
- Excavacion	
- Limpieza, cargada y regada de material incluye transporte	

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
 ING. CLAUDIO CAYAMBE  
 CONTRATISTA

  
 ING. RODRIGO PICO  
 FISCALIZADOR

**LIBRO DE OBRA**

No. HOJA: 102 /

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO CAYAMBE  
**FISCALIZADOR :** ING. RODRIGO PICO  
**ADMINISTRADOR:** ING. JAIRO NARVAEZ

**UBICACIÓN:** CANTON MERA, PARROQUIA SHELL  
**FECHA:** 31 de Agosto de 2025

**CLIMA**

JORNADA : MAÑANA			JORNADA : TARDE		
SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO	SOLEADO	NUBLADO	LLUVIOSO
X			X		

PERSONAL TÉCNICO		MANO DE OBRA		MAQUINAR./HERRAMIENT.		MAQUINAR./HERRAMIENT.	
SUPERINTENDENTE		MAESTRO MAYOR		Herramienta menor	.		
RESIDENTE DE OBRA		ALBAÑIL		Concretera	.		
TECNICO AMBIENTAL		PEON		Volqueta	.	2	
		CHOFER	2	Excavadora	.	2	
		OPERADOR	2	Equipo de Topografía	.		
		SOLDADOR			.		
		AYUDANTE DE SUELDA			.		
					.		
					.		
					.		

TRABAJOS REALIZADOS	GRÁFICOS
- Excavación	
- Mecedora, cargada y llegada de material incluye transporte.	

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

<b>DEL CONTRATISTA:</b>	
<b>DEL FISCALIZADOR:</b>	
<b>DEL ADMINISTRADOR:</b>	

  
ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

  
ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR



GOBIERNO DE  
**PASTAZA**  
*El Gobierno del Añono*

## ***10 ANEXO FOTOGRAFICO***

**PROYECTO:**

***“CONSTRUCCIÓN DE AFIRMADO DE VARIAS VÍAS UBICADA EN LA  
PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA”.***

***PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA***

ITEM	RUBRO	UNIDAD
1	Transporte de maquinaria	glb



ITEM	RUBRO	UNIDAD
13	Transporte de maquinaria	glb



ITEM	RUBRO	UNIDAD
25	Transporte de maquinaria	glb



ITEM	RUBRO	UNIDAD
27	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m³



ITEM	RUBRO	UNIDAD
28	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m <sup>3</sup>



ITEM	RUBRO	UNIDAD
29	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	m <sup>3</sup> -km



ITEM	RUBRO	UNIDAD
30	Limpieza de cunetas a máquina	m



ITEM	RUBRO	UNIDAD
31	Pancarta informativa de la obra (letrero)-con estructura	u



ITEM	RUBRO	UNIDAD
33	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	m



ITEM	RUBRO	UNIDAD
34	Contenedores metálicos de 55 galones	u



ITEM	RUBRO	UNIDAD
35	Kit antiderrames	u



ITEM	RUBRO	UNIDAD
38	Charla Ambiental	hora



ITEM	RUBRO	UNIDAD
37	Transporte de maquinaria	glb



ITEM	RUBRO	UNIDAD
38	Replanteo y nivelación	km



ITEM	RUBRO	UNIDAD
39	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m³



ITEM	RUBRO	UNIDAD
40	Material pátreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m³



ITEM	RUBRO	UNIDAD
41	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	m <sup>3</sup> -km



ITEM	RUBRO	UNIDAD
46	Limpieza de cunetas a máquina	m



ITEM	RUBRO	UNIDAD
50	Contenedores metálicos de 55 galones	u



ITEM	RUBRO	UNIDAD
51	Kit antiderrames	u



ITEM	RUBRO	UNIDAD
52	Chequeo Ambiental	ho



ITEM	RUBRO	UNIDAD
53	Transporte de maquinaria	glb



ITEM	RUBRO	UNIDAD
54	Replanteo y nivelación	km



ITEM	RUBRO	UNIDAD
55	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m³



ITEM	RUBRO	UNIDAD
56	Material petreo de mejoramiento (mirada, cargada y regada)	m <sup>3</sup>



ITEM	RUBRO	UNIDAD
57	Transporte de material petreo (10 a 20 km)	m <sup>3</sup> - km



ITEM	RUBRO	UNIDAD
58	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1.50 m, e=2.5 mm, PM-100	m



ITEM	RUBRO	UNIDAD
59	Limpieza de cunetas a máquina	m



ITEM	RUBRO	UNIDAD
60	Pancarta Informativa de la obra (letrero)-con estructura estructura	u



ITEM	RUBRO	UNIDAD
62	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno) polietileno	m



ITEM	RUBRO	UNIDAD
63	Contenedores metálicos de 55 galones	u



ITEM	RUBRO	UNIDAD
64	Kit antiderrames	u



ÍTEM	RUBRO	UNIDAD
65	Charla Ambiental	ho



---

ING. CLAUDIO CAYAMBE  
CONTRATISTA

---

ING. RODRIGO PICO  
FISCALIZADOR



GOBIERNO DE  
**PASTAZA**  
*El Gobierno del Añono*

# **11 CERTIFICADO CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO E IESS**

**PROYECTO:**

**“CONSTRUCCIÓN DE AFIRMADO DE VARIAS VÍAS UBICADA EN LA  
PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA”.**

**PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA**

24 de diciembre de 2025

Contribuyente:

**CAYAMBE GUILCAPI CLAUDIO FERMIN****RUC: 1600462723001**

Ciudad.-

De conformidad con lo establecido en el artículo 96 del Código Tributario sobre el cumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes y en concordancia con el artículo 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno sobre la responsabilidad por la declaración de impuesto del sujeto pasivo; el Servicio de Rentas Internas certifica que:

Una vez revisada la base de datos del SRI, el contribuyente **CAYAMBE GUILCAPI CLAUDIO FERMIN**, con RUC **1600462723001**, ha cumplido con sus obligaciones tributarias y **no registra deudas en firme**, información registrada a la fecha de emisión del presente certificado de cumplimiento tributario.

Sin embargo, la Administración Tributaria se reserva el derecho de verificar las declaraciones presentadas y ejercer la facultad determinadora, orientada a comprobar la correcta aplicación de las normas tributarias vigentes, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes en caso de detectarse falsedad en la información presentada.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Código de verificación: SRICCT2025000636659  
Fecha y hora de emisión: 24/12/2025 10:04:45 AM

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página web del SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.



## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) CAYAMBE GUILCAPI CLAUDIO FERMIN, representante legal de la empresa CAYAMBE GUILCAPI CLAUDIO FERMIN con RUC Nro. 1600462723001 y dirección SN. LUIS CARRION. SN. BOBONAZA. SN., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Ab. Víctor Adrián Farinango Salazar

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera

Emitido el 24 de diciembre de 2025

Validez del Certificado 30 días



GOBIERNO DE  
**PASTAZA**  
*El Gobierno del Añimo*

# **12 CONSTATACIÓN DE PERSONAL OBRERO Y TÉCNICO**

**PROYECTO:**

**“CONSTRUCCIÓN DE AFIRMADO DE VARIAS VÍAS UBICADA EN LA  
PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA”.**

**PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA**

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1803696218001

FACTURA

No. 001-100-000000161

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2412202501180369621800120011000000001614908098011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/12/2025 10:28:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2412202501180369621800120011000000001614908098011

MOPOSITA DIAZ ADRIANA CRISTINA

Dirección Matriz: Calle: FELIX PINTADO Numero: SN Interseccion: PADRE FORMAGIO

Dirección Sucursal: Calle: FELIX PINTADO Numero: SN Interseccion: PADRE FORMAGIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAYAMBE GUILCAPI CLAUDIO FERMIN

Identificación: 1600462723001

Fecha: 24/12/2025 Placa / Matricula: Guia

Dirección: LUIS CARRION S/N Y BOBONAZA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	RESIDENTE DE OBRA	residente de obra mes agosto del proyecto CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DL PASTAZA	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00

Información Adicional

Telefono: 032795281  
Email: constructorashuikip@gmail.com  
CORRESPONDE: AGOSTO 2025

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	540.50

SUBTOTAL 15%	470.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	470.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	70.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	540.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

R.U.C: 1600487548001

# FACTURA

No. 001-002-000000017

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2412202501160048754800120010020000000171234567811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2412202501160048754800120010020000000171234567811

MIRANDA MONTAHUANO MIGUEL ANGEL

Dirección Matriz: EUGENIO ESPEJO SN Y CESLAO MARIN

Dirección Sucursal: EUGENIO ESPEJO SN Y CESLAO MARIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAYAMBE GUILCAPI CLAUDIO FERMIN

RUC / CI: 1600462723001

Fecha Emisión: 24/12/2025

Guía Remisión:

Dirección: SHELL

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SP001		1	TEC. AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL CANTON MERA PROVINCIA DE PASTAZA, PERIODO MES DE AGOSTO	\$ 347.83	0	\$ 347.83

Información Adicional	
Email Cliente:	claudio.cayambe@gmail.com
Telef. Cliente:	0984647893

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilización del sistema financiero	\$ 400.00	0	días

SUBTOTAL 15%	\$ 347.83
SUBTOTAL 5%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 347.83
DESCUENTO	\$ 0
ICE	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 52.17
IVA 5%	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0
Valor Total \$	\$ 400.00



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CAJAMARCA ESCOBAR LUIS ALBERTO

diciembre 13 del 2025 09:47

CAJAMARCA ESCOBAR LUIS ALBERTO

## DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2025-09-16))  
(BANCO DEL PACIFICO S.A.)

No. Comprobante: 000000203586073

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2025-09-16
No. RUC / REGISTRO:	1600405003001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2025-09-30	
Nombre / Razón Social / Organización:	CAJAMARCA ESCOBAR LUIS ALBERTO - CAJAMARCA ESCOBAR LUIS ALBERTO			
Periodo de Pago:	2025 - 08			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

### AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2025 - 8	06	1600405003	CAJAMARCA ESCOBAR LUIS ALBERTO	491.22	30	NNA	101.19	0.00	
2025 - 8	35	1600633968	BRITO ZUÑIGA TITO RAMIRO	544.64	30	NNA	112.20	0.00	
2025 - 8	35	1600577934	GANAN SILVA DANNY DARIO	544.64	30	NNA	112.20	0.00	
2025 - 8	35	0503457079	ROMERO SARABIA LUIS MIGUELL	488.50	30	NNA	100.63	0.00	
							<b>2069.00</b>	<b>426.22</b>	<b>0.00</b>

Valor	446.92
Intereses por mora (+)	5.22
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	452.14
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	<b>452.14</b>

### Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

\*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

\*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmege

\*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Factura 001-002-000000028

Diciembre 12, 2025

VALENCIA ESCOBAR DARIO XAVIER

RUC 1600502114001  
Calle 28 de Julio S/N Y Calle Churiwia  
Taisha, Morona Santiago  
xavy866@gmail.com  
No obligado a llevar contabilidad

Autorización

N.º 1212202501160050211400120010020000000282602514219

Fecha: Dic. 12, 2025, 2:07 p.m.

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



1212202501160050211400120010020000000282602514219

CAYAMBE GUILCAPI CLAUDIO FERMIN

RUC 1600462723001  
claudio.cayambe@gmail.com  
SHELL  
Tel. 0985190910

Forma de pago

Plazo

Monto

Otros con utilización del sistema financiero

0 días (vence Dic. 12, 2025)

\$4500.00

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Descuento	Total
1	005	Servicio de Construccion :: Construcción de un tramo de 150m de vía en monte sinai	\$3,913.04	\$0.00	\$3,913.04
			Subtotal sin impuestos		\$3,913.04
			Subtotal IVA 15%		\$3,913.04
			Valor IVA 15%		\$586.96
			Valor total		\$4,500.00

Información adicional

Notas: Construcción de un tramo de 150m de via en monte sinai

Pie de página: No Asignado



RUC: 1600405003001

**FACTURA**

Nro: 001-002-00000226

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1609202501160040500300120010020000002261234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-09-16 08:52:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO:**



1609202501160040500300120010020000002261234567819

**CAJAMARCA ESCOBAR LUIS ALBERTO**

**Dir. Matriz**

LUIS A. MARTINEZ 220

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

**Razón social:** CLAUDIO FERMIN CAYAMBE GUILCAPI

**Fecha de emisión:** 16/09/2025

**Dirección:** SHELL

**CI/RUC:** 1600462723001

**Guía de remisión:**

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0011	1	ALQUILER EXCAVADORAS "APERTURA DEL ANILLIO VIAL SECTOR SANTA ROSA HASTA LA PARROQUIA SHELL" DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2023	22000.00	0.00	22000.00

**Formas de pago**

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	25300.00	30	días

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 15%	22000.00
SUBTOTAL	22000.00
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	3300.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>25300.00</b>

**Información Adicional**

DIRECCION DEL ADQUIRENTE SHELL

TELEFONO DEL ADQUIRENTE 0985190910

EMAIL DEL ADQUIRENTE claudio.cayambe@gmail.com

OBSERVACION P/R ALQUILER EXCAVADORAS "APERTURA DEL ANILLIO VIAL SECTOR SANTA ROSA HASTA LA PARROQUIA SHELL" DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2023



**CAJAMARCA ESCOBAR SANTIAGO ALEJANDRO**

**Dir. Matriz**

AV. LUIS A. MARTINEZ 220 Y GARCIA MORENO

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

**RUC: 1600438509001**

**FACTURA**

**Nro: 001-002-000000228**

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0707202501160043850900120010020000002281234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-07-07 17:30:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO:**



070720250116004385090012001002000000228123456781

**Razón social:** CLAUDIO FERMIN CAYAMBE GUILCAPI

**Fecha de emisión:** 07/07/2025

**Dirección:** LUIS CARRION SN Y BOBONAZA

**CI/RUC:** 1600462723001

**Guía de remisión:**

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0039	1	ALQUILER DE VOLQUETA	1600.00	0.00	1600.00

**Formas de pago**

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1840.00	30	días

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 15%	1600.00
SUBTOTAL	1600.00
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	240.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1840.00</b>

**Información Adicional**

DIRECCION DEL ADQUIRENTE

TELEFONO DEL ADQUIRENTE

EMAIL DEL ADQUIRENTE

OBSERVACION

LUIS CARRION SN Y BOBONAZA

0985190910

claudio.cayambe@gmail.com

P/R ALQUILER DE VOLQUETA



GOBIERNO DE  
**PASTAZA**  
*El Gobierno del Añimo*

## **13 PÓLIZAS**

**PROYECTO:**

**“CONSTRUCCIÓN DE AFIRMADO DE VARIAS VÍAS UBICADA EN LA  
PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA”.**

**PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA**

Póliza de Seguro de Fianzas Nro. : 45256  
Renovación : 45256

Endoso : 21887  
Referencia : 0

equisuiza



## SECTOR PÚBLICO

RUC : 1790007502001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolución No. 5368

**ASEGURADO :** 9779 - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA  
**Dirección :** FRANCISCO DE ORELLANA 739 Y 27 DE FEBRERO Y  
**AFIANZADO :** 406741 - CAYAMBE GUILCAPI CLAUDIO FERMIN  
**Dirección :** LUIS CARRION SN BOBONAZA

**RIESGO ASEGURADO:** BUEN USO DE ANTICIPO  
**VALOR ASEGURADO** US\$ 9,610.37  
**VIGENCIA** Desde: 11-2-2026 Hasta: 28-3-2026 Dias: 45

PRIMA	:	US\$	50.00
CONTRIBUCION SVCS	:	US\$	1.75
SEGURO CAMPESINO	:	US\$	0.25
DERECHOS DE EMISION	:	US\$	0.50
% SSC NO RETENIDO	:	US\$	0.00
15 % I.V.A.	:	US\$	7.88
OTROS	:	US\$	0.00
<b>TOTAL</b>	:	<b>US\$</b>	<b>60.38</b>

Con sujeción a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la presente Póliza y mediante el pago de la prima convenida, **EQUISUIZA SEGUROS S.A.** que en adelante se llamará la Compañía, se obliga a favor de: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA que en adelante se llamará el Asegurado, al pago del valor de los daños que, hasta por la suma máxima de: NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 37/100 Dolares EE.UU

le ocasione CAYAMBE GUILCAPI CLAUDIO FERMIN

que en adelante se llamará el Afianzado, por el buen uso del anticipo para:

BUEN USO DE ANTICIPO PARA CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTON MERA, PROVINCIA DE PASTAZA. SEGUN PROCESO MCO-GADPPZ-098-2022.

RENOVACION Y REBAJA DE SUMA ASEGURADA A SOLICITUD ESCRITA DEL CORREDOR

SEGUN CONDICIONES DE LA POLIZA ORIGINAL

La presente póliza es Incondicional, Irrevocable y de Cobro Inmediato, de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento; y de conformidad con lo establecido en Contrato principal afianzado; y las condiciones generales de esta póliza.

Esta póliza no tiene relación con ningún otro instrumento, contrato o documento que exista o pueda existir entre el Asegurado, el Afianzado y terceras personas. Por lo tanto, dejamos expresa constancia que dichos documentos o contratos no modifican, enmiendan o amplían la presente póliza y que la Compañía, responderá exclusivamente por la obligación aquí expresada.

Transcurrido el período de vigencia señalado, la presente póliza caducará y cesará simultáneamente las obligaciones asumidas por la Compañía, aún cuando el original del presente documento no sea devuelto. Esta póliza podrá ser renovada a petición escrita del Asegurado o del Afianzado.

En testimonio de lo cual, firman la presente póliza un representante de la Compañía, conjuntamente con el Asegurado y el Afianzado, en AMBATO, 6 de FEBRERO de 2026



Firmado electrónicamente por:  
**GABRIEL ALEJANDRO  
POSA ESPINEL**  
\*Alínea únicamente con Firmas2



Firmado electrónicamente por:  
**SILVIA CRISTINA  
MARINO CARRASCO**  
\*Alínea únicamente con Firmas2

**El Asegurado**  
**166000170001**

**EQUISUIZA SEGUROS S.A.**

ORIGINAL

Este formulario fue aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con resolución No. 90-188-S de 90/06/19.

Este documento, en su versión digital, está debidamente firmado electrónicamente y posee plena validez legal conforme a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, ROS 557-17 de abril de 2022. En caso de ser impreso, será necesario obtener la firma autógrafa autorizada de la compañía para su validación.

Póliza de Seguro de Fianzas Nro. : 53584  
 Renovación : 53584

Endoso : 13356  
 Referencia : 0



**SECTOR PUBLICO**

RUC : 1790007502001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolución No. 5368

<b>ASEGURADO :</b>	9779 - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
<b>Dirección :</b>	FRANCISCO DE ORELLANA 739 Y 27 DE FEBRERO Y
<b>AFIANZADO :</b>	406741 - CAYAMBE GUILCAPI CLAUDIO FERMIN
<b>Dirección :</b>	LUIS CARRION SN BOBONAZA

RIESGO ASEGURADO:	VALOR ASEGURADO		VIGENCIA		
FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	US\$	5,641.46	Desde: 2-3-2026	Hasta: 1-4-2026	Dias: 30
<b>PRIMA</b>	:	US\$	50.00		
<b>CONTRIBUCION SVCS</b>	:	US\$	1.75		
<b>SEGURO CAMPESINO</b>	:	US\$	0.25		
<b>DERECHOS DE EMISION</b>	:	US\$	0.50		
<b>% SSC NO RETENIDO</b>	:	US\$	0.00		
<b>15 % I.V.A.</b>	:	US\$	7.88		
<b>OTROS</b>	:	US\$	0.00		
<b>TOTAL</b>	:	US\$	60.38		

Con sujeción a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la presente Póliza y mediante el pago de la prima convenida, **EQUISUIZA SEGUROS S.A.** que en adelante se llamará la Compañía, se obliga a favor de: **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA** que en adelante se llamará el Asegurado, al pago del valor de los daños que, hasta por la suma máxima de: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 46/100 Dolares EE.UU

le ocasiona **CAYAMBE GUILCAPI CLAUDIO FERMIN**

que en adelante se llamará el Afianzado, por la falta de cumplimiento del contrato celebrado para:

FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PARA CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA SEGUN PROCESO MCO-GADPPZ-098-2022

RENOVACION A SOLICITUD ESCRITA DEL BENEFICIARIO

**SEGUN CONDICIONES DE LA POLIZA ORIGINAL**

La presente póliza es Incondicional, Irrevocable y de Cobro Inmediato, de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento; y de conformidad con lo establecido en Contrato principal afianzado; y las condiciones generales de esta póliza.

Esta póliza no tiene relación con ningún otro instrumento, contrato o documento que exista o pueda existir entre el Asegurado, el Afianzado y terceras personas. Por lo tanto, dejamos expresa constancia que dichos documentos o contratos no modifican, enmiendan o amplían la presente póliza y que la Compañía, responderá exclusivamente por la obligación aquí expresada.

Transcurrido el período de vigencia señalado, la presente póliza caducará y cesará simultáneamente las obligaciones asumidas por la Compañía, aún cuando el original del presente documento no sea devuelto. Esta póliza podrá ser renovada a petición escrita del Asegurado o del Afianzado.

En testimonio de lo cual, firman la presente póliza un representante de la Compañía, conjuntamente con el Asegurado y el Afianzado, en **AMBATO, 24 de FEBRERO de 2026**



**El Asegurado**  
**1660000170001**

**EQUISUIZA SEGUROS S.A.**

ORIGINAL

Este formulario fue aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con resolución No. 90-188-S de 90/06/19.

Este documento, en su versión digital, está debidamente firmado electrónicamente y posee plena validez legal conforme a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, ROS 557-17 de abril de 2022. En caso de ser impreso, será necesario obtener la firma autógrafa autorizada de la compañía para su validación.



PRINCO

.COM

CD-R  
700MB/80Min

2X - 56X  
CD-Recordable

Contents: Informe Ambiental Agosto 2025  
Construcción y afirmado de varias vías Ubicadas  
en la parroquia Shell, canton Merca,  
Provincia de Postaza.

Do not put into direct sunlight. Write with special soft marker pen.



GOBIERNO DE  
**PASTAZA**  
*El Gobierno del Animo*

# **14 INFORME DE CONFORMIDAD AMBIENTAL**

**PROYECTO:**

**“CONSTRUCCIÓN DE AFIRMADO DE VARIAS VÍAS UBICADA EN LA  
PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA”.**

**PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA**



Número: 11-249  
Memorando Nro. GADPPZ-DGA-2025-22550-M

Puyo, 23 de septiembre de 2025

**PARA:** Sr. Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas  
**Directór de Fiscalización**

**ASUNTO:** DGA: CONFORMIDAD AMBIENTAL AL INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

De mi consideración:

Estimado Director, en atención al Memorando Nro. GADPPZ-JGA-GA-2025-15057-M de fecha 22 de septiembre de 2025, suscrito por Ing. Stalin Xavier Cáceres Valverde JEFE DE GESTIÓN AMBIENTAL (E), mediante el cual hace referencia "(...) al Memorando Nro. GADPPZ-JGA-GA-2025-15054-M, de fecha 22 de septiembre de 2025, suscrito por la Ing. Teresa Brigitte Jácome Vargas ANALISTA DE CALIDAD AMBIENTAL I, en el que manifiesta en su parte pertinente:

"(...) de acuerdo al **GADPPZ-RECEPCION-2025-37598-E**, y en el marco de la Jefatura de Gestión Ambiental, en el que se encuentra establecido el proyecto de Regularización, Seguimiento y Control Ambiental de las actividades a desarrollarse por el GADPPZ, en referencia al Oficio No. CC-020-2025, de fecha 29 de agosto del 2025, suscrito por el Ing. Claudio Fermín Cayambe Guilcapi, en Calidad de Contratista, adjunta al presente documento el Informe de cumplimiento Ambiental de correspondiente al **periodo de trabajo de 01 de agosto 2025 al 31 de agosto de 2025**, para su revisión y/o aprobación de la obra, "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Adjunto sírvase encontrar el **INFORME TECNICO No.005-GADPPZ- DGA- JGA-TJ-2025**, de fecha 19 de septiembre de 2025, respecto al análisis del Informe Cumplimiento Ambiental del Contrato de MCO-GADPPZ-098-2022, "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Con lo expuesto, una vez analizada la información ingresada por el contratista, se determina la **CONFORMIDAD AMBIENTAL**, razón por la cual se sugiere remitir el particular a la Dirección de Fiscalización al Ing. Jair Narváez-Administrador de Contrato, para que proceda conforme lo establecido para trámite pertinente. (...)"

Al respecto, me permito comunicar que, una vez realizado el análisis de la documentación ingresada, y sobre la base del **INFORME TECNICO No.005-GADPPZ- DGA- JGA-TJ-2025**, elaborado el 19 de septiembre de 2025, por Ing. Teresa Brigitte Jácome Vargas ANALISTA DE CALIDAD AMBIENTAL I, se determina la **CONFORMIDAD AMBIENTAL** INFORME AMBIENTAL DE "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA".. Correspondiente al periodo desde el 01 de agosto 2025 al 31 de agosto de 2025

Particular que remito para los fines pertinentes.



**Memorando Nro. GADPPZ-DGA-2025-22550-M**

**Puyo, 23 de septiembre de 2025**

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Andres Eduardo Coloma Herrera  
**DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL (E)**

Referencias:

- GADPPZ-JGA-GA-2025-15057-M

Anexos:

- 5.-informe\_tÉcnico\_no.\_005-dga-jga-tj-2025-signed-signed-signed.pdf
- construccion\_de\_afirmado\_de\_varias\_vias\_ubicada\_en\_la\_parroquia\_shell,4\_gappz\_2025.pdf
- 37598-e.pdf
- hr-37598-e\_2025.pdf

Copia:

Srta. Ing. Teresa Brigitte Jácome Vargas - **Analista de Calidad Ambiental I** / Sr. Ing. Jairo Alberto Narváez Guevara - **Jefe de Estudios y Proyectos** / Sr. Ing. Stalin Xavier Cáceres Valverde - **Jefe de Gestión Ambiental (E)** / Sra. Ing. Juana Ismelda Villalva Manzaba - **Asistente Administrativa I** /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Ing. Juana Ismelda Villalva Manzaba - Asistente Administrativa I



ANDRES EDUARDO  
COLOMA HERRERA

Este documento es una copia



Memorando Nro. GADPPZ-JGA-GA-2025-15057-M

Puyo, 22 de septiembre de 2025

**PARA:** Sr. Ing. Andres Eduardo Coloma Herrera  
**Director de Gestión Ambiental (E)**

**ASUNTO:** DGA-JGA: CONFORMIDAD AMBIENTAL AL INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

De mi consideración:

Estimado Director, en atención al Memorando Nro. GADPPZ-JGA-GA-2025-15054-M, de fecha 22 de septiembre de 2025, suscrito por la Ing. Teresa Brigitte Jácome Vargas ANALISTA DE CALIDAD AMBIENTAL I, en el que manifiesta en su parte pertinente:

*"(...) de acuerdo al **GADPPZ-RECEPCION-2025-37598-E**, y en el marco de la Jefatura de Gestión Ambiental, en el que se encuentra establecido el proyecto de Regularización, Seguimiento y Control Ambiental de las actividades a desarrollarse por el GADPPZ, en referencia al Oficio No. CC-020-2025, de fecha 29 de agosto del 2025, suscrito por el Ing. Claudio Fermin Cayambe Guilcapi, en Calidad de Contratista, adjunta al presente documento el Informe de cumplimiento Ambiental de correspondiente al **periodo de trabajo de 01 de agosto 2025 al 31 de agosto de 2025**, para su revisión y/o aprobación de la obra, "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA".*

*Adjunto sírvase encontrar el **INFORME TECNICO No.005-GADPPZ- DGA- JGA-TJ-2025**, de fecha 19 de septiembre de 2025, respecto al análisis del Informe Cumplimiento Ambiental del Contrato de MCO-GADPPZ-098-2022, "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA".*

*Con lo expuesto, una vez analizada la información ingresada por el contratista, se determina la **CONFORMIDAD AMBIENTAL**, razón por la cual se sugiere remitir el particular a la Dirección de Fiscalización al Ing. Jair Narváez-Administrador de Contrato, para que proceda conforme lo establecido para trámite pertinente. (...)"*

En virtud de lo expuesto, solicito que se tenga a bien poner en conocimiento la **CONFORMIDAD AMBIENTAL**, a la Dirección de Fiscalización con copia al Ing. Jairo Narváez Administrador de Contrato, a fin de proceder con los trámites correspondientes.

Particular que remito para los fines pertinentes.

Atentamente,



Memorando Nro. GADPPZ-JGA-GA-2025-15057-M

Puyo, 22 de septiembre de 2025

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Stalin Xavier Cáceres Valverde  
**JEFE DE GESTIÓN AMBIENTAL (E)**

Referencias:

- GADPPZ-JGA-GA-2025-15054-M

Anexos:

- hr-37598-e\_2025.pdf
- 37598-e.pdf
- construccion\_de\_afirmado\_de\_varias\_vias\_ubicada\_en\_la\_parroquia\_shell.4\_gappz\_2025.pdf
- 5.-informe\_técnico\_no.\_005-dga-jga-tj-2025-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Srta. Ing. Teresa Brigitte Jácome Vargas - Analista de Calidad Ambiental I /



STALIN XAVIER  
CACERES VALVERDE



Memorando Nro. GADPPZ-JGA-GA-2025-15054-M

Puyo, 22 de septiembre de 2025

**PARA:** Sr. Ing. Stalin Xavier Cáceres Valverde  
**Jefe de Gestión Ambiental (E)**

**ASUNTO:** DGA-GA: : CONFORMIDAD AMBIENTAL AL INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

De mi consideración:

Estimado Jefe, de acuerdo al GADPPZ-RECEPCION-2025-37598-E, y en el marco de la Jefatura de Gestión Ambiental, en el que se encuentra establecido el proyecto de Regularización, Seguimiento y Control Ambiental de las actividades a desarrollarse por el GADPPz, en referencia al Oficio No. CC-020-2025, de fecha 29 de agosto del 2025, suscrito por el Ing. Claudio Fermin Cayambe Guilcapi, en Calidad de Contratista, adjunta al presente documento el Informe de cumplimiento Ambiental de correspondiente al periodo de trabajo de 01 de agosto 2025 al 31 de agosto de 2025, para su revisión y/o aprobación de la obra, "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Adjunto sírvase encontrar el INFORME TECNICO No.005-GADPPZ- DGA- JGA-TJ-2025, de fecha 19 de septiembre de 2025, respecto al análisis del Informe Cumplimiento Ambiental del Contrato de MCO-GADPPZ-098-2022, "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Con lo expuesto, una vez analizada la información ingresada por el contratista, se determina la CONFORMIDAD AMBIENTAL, razón por la cual se sugiere remitir el particular a la Dirección de Fiscalización al Ing. Jair Narváez-Administrador de Contrato, para que proceda conforme lo establecido para trámite pertinente.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Teresa Brigitte Jácome Vargas  
**ANALISTA DE CALIDAD AMBIENTAL I**

Referencias:


- GADPPZ-RECEPCION-2025-37598-E

Anexos:

- 37598-e.pdf  
- hr-37598-e\_2025.pdf  
- construccion\_de\_afirmado\_de\_varias\_vias\_ubicada\_en\_la\_parroquia\_shell\_4\_gappz\_2025.pdf  
- 5.-informe\_técnico\_no.\_005-dga-jga-tj-2025-signed-signed-signed.pdf

**INFORME TÉCNICO No. 005-GADPPz-DGA-JGA-TJ-2025**

**1. DATOS GENERALES**

 <b>GOBIERNO DE PASTAZA</b> El Gobierno del Amanecer	<b>INFORME TECNICO No.005-GADPPZ- DGA- JGA-TJ-2025</b>
---	--

**"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"**

SEGUIMIENTO Y CONTROL	
<b>Dirección</b>	Dirección de Gestión Ambiental
<b>Sección</b>	Jefatura de Gestión Ambiental
<b>Técnico Ambiental</b>	Ing. Teresa Jacome
<b>Fecha del Informe Técnico</b>	19-09-2025
INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
<b>Contrato</b>	MCO-GADPPz-098-2022
<b>Monto de la obra</b>	\$ 112.829,17 USD sin iva
<b>Plazo del contrato</b>	75 días
<b>Fecha Plazo de inicio de obra</b>	22 de mayo de 2025
<b>Ubicación del proyecto</b>	Provincia: Pastaza Cantón: Mera Parroquia: Parroquia Shell
<b>Fiscalizador</b>	Ing. Rodrigo Pico
<b>Administrador de contrato</b>	Ing. Jairo Narváez
DATOS CONTRATISTA	
<b>Contratista</b>	Ing. Claudio Fermín Cayambe Guilcapi
<b>Ruc</b>	1600462723001
<b>Email</b>	<a href="mailto:claudio.cayambe@gmail.com">claudio.cayambe@gmail.com</a>
<b>Teléfono</b>	0985190910
<b>Técnico ambiental del Contratista</b>	Ing. Miguel Angel Miranda Montahuano
<b>Teléfono</b>	0995713324
<b>email</b>	<a href="mailto:miguelangelmirandamotahuano@gmail.com">miguelangelmirandamotahuano@gmail.com</a>
INFORMACIÓN DEL INFORME AMBIENTAL	
<b>Nº de documento ingresado</b>	37598-E
<b>Fecha de ingreso QUIPUX</b>	29 de agosto de 2025
<b>Periodo de informe ambiental</b>	1 de agosto 2025 al 31 de agosto de 2025
<b>Fecha de ingreso en físico a la DGA</b>	01-09-2025
<b>Desarrollo.</b>	

**2. ANTECEDENTES**

A los ocho 08 días del mes de febrero de 2023, comparecen a la celebración del contrato de MENOR CUANTÍA de la obra con código N° MCO-GADPPz-098- 2022, por una parte, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, representado por el el Ing. Jaime Patricio Guevara Blaschke, en calidad de Prefecto Provincial, a quien en adelante se le denominará el CONTRATANTE; y, por otra parte, el Ing. Cayambe Guilcapi Claudio Fermín con RUC ° 1600462723001, a quien en adelante se le denominará el CONTRATISTA para el para la “CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA”.

Contrato por menor cuantía obra, celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, y por otra parte el Ing. Cayambe Guilcapi Claudio Fermín para la "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA”

En la ciudad de Puyo, a los ocho (08) días del mes de mayo del año dos mil veinticinco, comparecen a la suscripción del presente Contrato Modificatorio-ADENDA MODIFICATORIA AL CONTRATO Nro. MCO-049-02-2023 CUYO PROCESO ES MENOR CUANTÍA OBRAS MCO-GADPPz-098-2022, por una parte, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, representado por el Mgs. André Mauricio Granda Garrido, en calidad de Prefecto Provincial; y, por otra parte, el Ing. Cayambe Guilcapi Claudio Fermín, con Ruc Nro. 1600462723001, en calidad de Contratista.

El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados de sesenta y cinco (75) días, contados a partir **de la Orden de Inicio** de trabajos emitido por el administrador del contrato que es el 22 de mayo de 2025, emitido por el Administrador del Contrato, a través del documento memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2025-10533-M.

Mediante Memorando Nro. GADPPZ-DGA-2025-21248-M, de fecha 26 de mayo de 2025, se me emite la designación como **Técnica Ambiental** para el proceso “CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA”, cuyo código de Proceso es MCO-GADPPz-098-2022, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones de conformidad a la Normativa en la ejecución contractual.

En calidad de Administrador de Contrato del proceso MCO-GADPPz-098-2022 que corresponde a la CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA, es el Ing. Jairo Alberto Narváez Guevara y en Calidad de Fiscalizador está Ing. Jorge

Rodrigo Pico Angulo del GADPPz.

El proyecto cuenta con un permiso ambiental de tipo **CERTIFICADO AMBIENTAL No. . MAATE-SUIA-DZDCH-2022-CA-0956**, emitido el 17 de noviembre del 2022, el cual se otorga a actividades de bajo impacto, lo que le faculta que el proyecto en mención pueda proceder con sus actividades de mantenimiento establecidas en el contrato.

Conforme al Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2025-9400-M Puyo, 04 de agosto de 2025, se otorga la RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 1. MCO-GADPPz-098-2022 **"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"**, en el que se resuelve *"Artículo 1.- ORDENAR la ampliación de plazo del contrato Nro. MCO 049 02-2023 dentro del proceso signado con el código Nro. MCO-GADPPZ-098-2022, cuyo objeto de contratación es la: "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA", en virtud del Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2025-9387-M de 01 de agosto de 2025, suscrito por el Ing. Rodrigo Pico, Fiscalizador, y del Memorando Nro. GADPPZESTUDIOS-PROYECTOS-2025-10936-M de 01 de agosto de 2025 e INFORME TÉCNICO DE ADMINISTRADOR N° 001-VIASSHELL-JN suscrito por el Ing. Jairo Narváez , Administrador del contrato; la presente otorga una ampliación de plazo de 28 días, según los informes antes mencionados."*

Mediante documento Oficio No. CC-020-2025, de fecha 29 de agosto del 2025, suscrito por el Ing. Claudio Fermin Cayambe Guilcapi, en Calidad de Contratista, adjunta al presente documento el Informe de cumplimiento Ambiental de correspondiente al periodo de trabajo de 01 de agosto 2025 al 31 de agosto de 2025, para su revisión y/o aprobación.

Al respecto, con fecha 29 de agosto, se receipta el IAC mediante Quipux y con fecha 01 de septiembre del 2025, recibo en físico el Informe Ambiental de Cumplimiento de correspondiente al periodo de trabajo de 01 de agosto 2025 al 31 de agosto de 2025; y en calidad de Técnica Ambiental de Control y Seguimiento del proyecto en mención, se procedió a su revisión.

### 3. OBJETIVO

Analizar la información presentada, a fin de emitir el respectivo pronunciamiento Técnico al Informe de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental sugerido con base

de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales del proyecto " CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA", correspondiente al avance de obra del periodo 01 al 31 de agosto de 2025, de conformidad a la Normativa Ambiental vigente.

#### 4. ALCANCE

El proyecto " CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA", cuenta con permiso ambiental de tipo **CERTIFICADO AMBIENTAL No. . MAATE-SUIA-DZDCH-2022-CA-0956**, al respecto para el seguimiento y control del proyecto en mención, se auditarán actividades contempladas en el avance de obra, que corresponde al periodo 01 al 31 de agosto de 2025, de conformidad a la Normativa Ambiental vigente y el Plan de Manejo Ambiental sugerido con base a la Guía de Buenas Prácticas Ambientales.

#### 5. MARCO LEGAL APLICABLE

##### CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

**TÍTULO VII del régimen del Buen Vivir; Capítulo Segundo: Biodiversidad y Recursos Naturales; Sección Primera: Naturaleza y Ambiente;**

##### **Art. 395**

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.

##### **Art. 396**

- La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas.

##### REGLAMENTO AL CÓDIGO ORGÁNICO DE AMBIENTE

##### **CAPITULO III**

##### **MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD**

## **AMBIENTAL**

Art. 482.- Sistema de control ambiental permanente. - Está constituido por herramientas de gestión que permiten realizar el seguimiento y control sistemático y permanente, continuo o periódico del cumplimiento de los requisitos legales y normativos, así como de las autorizaciones ambientales.

Art. 483.- Monitoreos. - Los monitoreos serán gestionados por los operadores de proyectos, obras o actividades mediante reportes que permitan evaluar los aspectos ambientales, el cumplimiento de la normativa ambiental y del plan de manejo ambiental y de las obligaciones derivadas de las autorizaciones administrativas otorgadas.

Art. 487.- Inspecciones. - Las inspecciones de proyectos, obras o actividades para ejecutar el control y seguimiento ambiental deberán ser realizadas por funcionarios de la Autoridad Ambiental Competente.

**Art. 488.- Informes ambientales de cumplimiento.** - Los informes ambientales de cumplimiento deberán ser presentados por los operadores de proyectos, obras o actividades regularizados mediante registro ambiental, con el fin de evaluar la observancia y cumplimiento de la normativa.

## **CÓDIGO ORGÁNICO DE AMBIENTE**

### **TÍTULO II**

#### **DE LOS DERECHOS, DEBERES Y PRINCIPIOS AMBIENTALES**

Art. 6.- Derechos de la naturaleza. Son derechos de la naturaleza los reconocidos en la Constitución

### **TÍTULO III**

#### **REGIMEN DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL**

Art. 10.- De la responsabilidad ambiental. El Estado, las personas naturales y jurídicas, así como las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, tendrán la obligación jurídica de responder por los daños o impactos ambientales que hayan causado.

### **CAPÍTULO III**

#### **DE LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL**

Art. 173.-**De las obligaciones del operador.**

- El operador de un proyecto, obra y actividad, pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en los casos que sea posible, eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su actividad. Cuando se produzca algún tipo de afectación al ambiente, el operador establecerá todos los

mecanismos necesarios para su restauración.

- El operador deberá promover en su actividad el uso de tecnologías ambientalmente limpias, energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto, prácticas que garanticen la transparencia y acceso a la información, así como la implementación de mejores prácticas ambientales en la producción y consumo.

## **CAPÍTULO IV**

### **DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL**

**Art. 181.-** De los planes de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental será el instrumento de cumplimiento obligatorio para el operador.

- **NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN ISO 3864-1:2013, SÍMBOLOS GRÁFICOS. COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE SEGURIDAD.**

- Principios de Diseño para Señales de Seguridad e Indicaciones de Seguridad.

- **NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN ISO 2841:2014, ESTANDARIZACIÓN DE COLORES PARA RECIPIENTES DE DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.**

- Establece los colores para los recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos con el fin de fomentar la separación en la fuente de generación y la recolección selectiva.

## **6. DESCRIPCION DEL PROYECTO**

El proyecto comprende la parroquia Shell, del cantón Mera, en la provincia de Pastaza, tiene como propósito de mejorar la movilidad de la provincia de Pastaza mediante la construcción y mejoramiento de la infraestructura via

- **UBICACIÓN:**

Provincia: Pastaza

Cantón: Mera

Parroquia: Shell

**FASE:** Construcción

- **FECHA DE CONTROL:** 01 de agosto de 2025 - 31 de agosto de 2025

- **% DE AVANCE DE OBRA:** 100 % aproximado.

### Mapa de Ubicación Geográfica



### 6.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades constructivas ejecutadas de avance de obra para el proyecto: “CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA”, desde el inicio de la ejecución de obra en cada uno de los frentes del proyecto, se encuentran las siguientes ejecutadas, desde el mes de junio hasta el periodo de ampliación de plazo, concluyendo de esta manera la ejecución total del proyecto:

### 6.2. Rubros ejecutados

Medida Propuesta	C	NC	NA	OBSERVACIONES
<b>AFIRMADO LOS ALTARES (Junio)</b>				
CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	X			Se adquiere 5 contenedores metalicos para los afirmados de las vias que seran utilizados en cada frente Fotografía 9
CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	X			Fotografía 4 y registro 2

KIT ANTIDERRAMES	X			Se adquiere 5 kits antiderrames para los afirmados de las vías Fotografía 4
PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	X			Fotografía 16
SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	X			Fotografía 2 y registro 1
CAPACITACIÓN EN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS.	X			Fotografía 12
<b>AFIRMADO LOS ALTARES A2 (Junio)</b>				
CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES				Fotografía 9
CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)				Fotografía 4 y registro 2
KIT ANTIDERRAMES				Fotografía 4
PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA				Fotografía 16
SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES				Fotografía 2 y registro 1
CAPACITACIÓN EN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS.				Fotografía 12
<b>AFIRMADO MONTE SINAI (AMPLIACION DE VIA) (Julio)</b>				
CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	X			Fotografía 9
CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	X			Fotografía 4 y registro 2
KIT ANTIDERRAMES	X			Fotografía 4
PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	X			Fotografía 16




SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	X			Fotografía 2 y registro 1
CAPACITACIÓN EN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS.	X			Fotografía 12
<b>AFIRMADO PRAGA SACHA (Julio)</b>				
CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	X			Fotografía 9
CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	X			Fotografía 4 y registro 2
KIT ANTIDERRAMES	X			Fotografía 4
PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	X			Fotografía 16
SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	X			Fotografía 2 y registro 1
CAPACITACIÓN EN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS.	X			Fotografía 12
<b>AFIRMADO NUEVO MILENO (AMPLIACION) (Agosto)</b>				
CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	X			Fotografía 9
CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	X			Fotografía 4 y registro 2
KIT ANTIDERRAMES	X			Fotografía 4
PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	X			Fotografía 16
SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	X			Fotografía 2 y registro 1
CAPACITACIÓN EN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS.	X			Fotografía 12

## 7. CONCLUSIONES

- Con Oficio No. CC-020-2025, de fecha 29 de agosto del 2025, suscrito por el Ing. Claudio Fermin Cayambe Guilcapi, en Calidad de Contratista, adjunta al presente documento el Informe de cumplimiento Ambiental de correspondiente al periodo de trabajo de 01 de agosto 2025 al 30 de agosto de 2025, para su revisión y/o aprobación. Al respecto, con fecha 01 de septiembre del 2025, recibo el Informe Ambiental de Cumplimiento, en documento físico; y en calidad de Analista Ambiental de Control y Seguimiento del proyecto en mención, se procedió a su revisión y aprobación, conforme al cumplimiento de las actividades ejecutadas en el proyecto.
- Conforme a los rubros generados se determina el cumplimiento de los mismos correspondientes a los frentes de trabajo ejecutados; **AFIRMADO LOS ALTARES (Junio)**, **AFIRMADO PRAGA SACHA (Julio)**, **AFIRMADO NUEVO MILENO (AMPLIACION) (Agosto)**, **AFIRMADO LOS ALTARES A2 (Junio)**, **AFIRMADO MONTE SINAI (AMPLIACION DE VIA) (Julio)**, durante el periodo determinado en la ampliación de plazo del contrato Nro. MCO 049 02-2023 y del proceso asignado con el código Nro. MCO-GADPPZ-098-2022, considerando la ampliación de plazo de 28 días.

## 8. RECOMENDACIONES

- Se recomienda remitir esta información al Administrador de contrato conforme al cumplimiento del periodo 01 de agosto 2025 al 30 de agosto de 2025, de acuerdo a la ampliación de plazo en la RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 1. MCO-GADPPz-098-2022 del proyecto “CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA”.
- Se recomienda al contratista, el fiel cumplimiento conforme a lo establecido en el CONTRATO PROCESO MENOR CUANTÍA OBRA, MCO-GADPPZ-098-2022, proyecto “CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA”.

 <p>TERESA BRIGITTE JACOME VARGAS</p>		 <p>STALIN XAVIER CACERES VALVERDE</p>	
<b>Elaborado por:</b>	Ing. Teresa Jacome Vargas	<b>Revisado por:</b>	Stalin Cáceres
<b>Cargo</b>	<b>Analista de Calidad Ambiental 1</b>	<b>Cargo</b>	<b>Jefe de Calidad Ambiental (E)</b>
 <p>ANDRES EDUARDO COLOMA HERRERA</p>			
<b>Aprobado por:</b>	Andrés Coloma		
<b>Cargo:</b>	<b>Director de Gestión Ambiental (E)</b>		

## 9.- REGISTRO FOTOGRAFICO





- **% DE AVANCE DE OBRA:** 100 % aproximado.

**Mapa de Ubicación Geográfica**



KIT ANTIDERRAMES	X			Se adquiere 5 kits antiderrames para los afirmados de las vías Fotografía 4
PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	X			Fotografía 16
SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	X			Fotografía 2 y registro 1
CAPACITACIÓN EN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS.	X			Fotografía 12
<b>AFIRMADO LOS ALTARES A2 (Junio)</b>				
CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES				Fotografía 9
CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)				Fotografía 4 y registro 2
KIT ANTIDERRAMES				Fotografía 4
PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA				Fotografía 16
SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES				Fotografía 2 y registro 1
CAPACITACIÓN EN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS.				Fotografía 12
<b>AFIRMADO MONTE SINAI (AMPLIACION DE VIA) (Julio)</b>				
CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	X			Fotografía 9
CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	X			Fotografía 4 y registro 2
KIT ANTIDERRAMES	X			Fotografía 4
PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	X			Fotografía 16




SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	X			Fotografía 2 y registro 1
CAPACITACIÓN EN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS.	X			Fotografía 12
<b>AFIRMADO PRAGA SACHA (Julio)</b>				
CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	X			Fotografía 9
CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	X			Fotografía 4 y registro 2
KIT ANTIDERRAMES	X			Fotografía 4
PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	X			Fotografía 16
SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	X			Fotografía 2 y registro 1
CAPACITACIÓN EN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS.	X			Fotografía 12
<b>AFIRMADO NUEVO MILENO (AMPLIACION) (Agosto)</b>				
CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	X			Fotografía 9
CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	X			Fotografía 4 y registro 2
KIT ANTIDERRAMES	X			Fotografía 4
PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	X			Fotografía 16
SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	X			Fotografía 2 y registro 1
CAPACITACIÓN EN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS.	X			Fotografía 12

## 7. CONCLUSIONES

- Con Oficio No. CC-020-2025, de fecha 29 de agosto del 2025, suscrito por el Ing. Claudio Fermin Cayambe Guilcapi, en Calidad de Contratista, adjunta al presente documento el Informe de cumplimiento Ambiental de correspondiente al periodo de trabajo de 01 de agosto 2025 al 30 de agosto de 2025, para su revisión y/o aprobación. Al respecto, con fecha 01 de septiembre del 2025, recibo el Informe Ambiental de Cumplimiento, en documento físico; y en calidad de Analista Ambiental de Control y Seguimiento del proyecto en mención, se procedió a su revisión y aprobación, conforme al cumplimiento de las actividades ejecutadas en el proyecto.
- Conforme a los rubros generados se determina el cumplimiento de los mismos correspondientes a los frentes de trabajo ejecutados; **AFIRMADO LOS ALTARES (Junio)**, **AFIRMADO PRAGA SACHA (Julio)**, **AFIRMADO NUEVO MILENO (AMPLIACION) (Agosto)**, **AFIRMADO LOS ALTARES A2 (Junio)**, **AFIRMADO MONTE SINAI (AMPLIACION DE VIA) (Julio)**, durante el periodo determinado en la ampliación de plazo del contrato Nro. MCO 049 02-2023 y del proceso asignado con el código Nro. MCO-GADPPZ-098-2022, considerando la ampliación de plazo de 28 días.

## 8. RECOMENDACIONES

- Se recomienda remitir esta información al Administrador de contrato conforme al cumplimiento del periodo 01 de agosto 2025 al 30 de agosto de 2025, de acuerdo a la ampliación de plazo en la RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 1. MCO-GADPPz-098-2022 del proyecto “CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA”.
- Se recomienda al contratista, el fiel cumplimiento conforme a lo establecido en el CONTRATO PROCESO MENOR CUANTÍA OBRA, MCO-GADPPZ-098-2022, proyecto “CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA”.

 <p>TERESA BRIGITTE JACOME VARGAS</p>		 <p>STALIN XAVIER CACERES VALVERDE</p>	
<b>Elaborado por:</b>	Ing. Teresa Jacome Vargas	<b>Revisado por:</b>	Stalin Cáceres
<b>Cargo</b>	<b>Analista de Calidad Ambiental 1</b>	<b>Cargo</b>	<b>Jefe de Calidad Ambiental (E)</b>
 <p>ANDRES EDUARDO COLOMA HERRERA</p>			
<b>Aprobado por:</b>	Andrés Coloma		
<b>Cargo:</b>	<b>Director de Gestión Ambiental (E)</b>		

## 9.- REGISTRO FOTOGRAFICO





Oficio nro. CC-020-2025 ✓

Puyo, 29 de agosto 2025 ✓

**Asunto:** ENTREGA DE INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE NRO. **MCO-GADPPZ-098-2022.**

*73 hojas.  
JLD  
JCA  
G.A*

Señor

Máster André Mauricio Granda Garrido ✓

**PREFECTO GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA** ✓

Presente. -

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en las funciones que acertadamente desempeña al frente de la Institución.

Por medio de la presente me dirijo a usted, para entregarle el Informe Ambiental de cumplimiento correspondiente a la Orden de Compra: Obras (IC-GADPPz-098-2022), del proyecto denominado **"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"**, para lo cual, se entrega de manera física; y, digital en un CD, del periodo de control 01 de agosto al 31 de agosto del 2025.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,



Ing. Claudio Fermin Cayambe Guilcapi

**RUC: 1600462723001**

**CONTRATISTA**

GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA	
Recibido	<i>Kinkia Shimpikart</i>
Fecha:	<b>29 AGO 2025</b>
Hora:	<b>15:56</b>
Numero:	<b>37598-E</b>

GAD PROVINCIAL DE PASTAZA	
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
FECHA:	<b>01-09-2025</b> HORA: <b>10:33</b>
RECIBIDO:	<i>Teresa Villalva</i>
TRÁMITE:	<b>37598</b>
FIRMA:	<i>[Firma]</i>



## INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO PARA EL PROYECTO:

"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA  
PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"



**Periodo de control:**

01 de agosto al 31 de agosto del  
2025.

**Contratista:** Ing. Claudio Fermin Cayambe Guilcapi

**Técnico Ambiental:** Ing. Miguel Angel Miranda Montahuano

Tabla de contenido

1.	Ficha técnica.....	3
2.	Antecedentes .....	4
3.	Objetivos .....	4
3.1.	Objetivo general.....	5
3.2.	Objetivos específicos .....	5
4.	Alcance .....	5
5.	Marco legal.....	6
6.	Metodología utilizada para la elaboración del informe.....	8
7.	Descripción general del proyecto.....	10
8.	Descripción de personal, maquinaria y equipos .....	10
9.	Descripción de las actividades ejecutadas .....	10
10.	Detalle de rubros ambientales ejecutados .....	10
11.	Evaluación de hallazgos a la normativa ambiental, permiso ambiental y al plan de manejo ambiental.....	11
11.1.	Normativa aplicable al proyecto.....	12
11.2.	Plan de manejo ambiental .....	14
12.	Resultados de la evaluación .....	23
12.1.	Normativa aplicable al proyecto.....	23
12.2.	Plan de manejo ambiental .....	23
13.	Plan de acción.....	24
14.	Conclusiones.....	24
15.	Recomendaciones .....	24
16.	Firmas de responsabilidad.....	24
17.	Anexos.....	25

1. Ficha técnica

DATOS GENERALES DEL PROMOTOR			
RAZON SOCIAL	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA		
REPRESENTANTE LEGAL	GRANDA GARRIDO ANDRE MAURICIO (Prefecto)		
DOMICILIO DEL PROMOTOR	Km 7 Vía Puyo - Tena - Parroquia Fátima Hangares del GADPPz		
TELEFONO	032885380 - 0994184459		
E-MAIL	<a href="mailto:dgagadppz@gmail.com">dgagadppz@gmail.com</a> - <a href="mailto:andre.granda@pastaza.gob.ec">andre.granda@pastaza.gob.ec</a>		
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA			
EMPRESA CONSTRUCTORA	Ing. Claudio Fermin Cayambe Guilcapi		
RUC	1600462723001		
REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Claudio Fermin Cayambe Guilcapi		
TELEFONO	0985190910		
DATOS GENERALES DEL PERMISO AMBIENTAL			
NOMBRE DEL PROYECTO DEL PERMISO AMBIENTAL	CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA		
NOMBRE DEL PROYECTO	"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"		
TIPO DE AUTORIZACIÓN	CERTIFICADO AMBIENTAL		
OFICIO DE APROBACION	No. MAATE-SUIA-DZDCH-2022-CA-0956	CODIGO	No. MAATE-RA-2022-455730
FECHA DE EMISION	17 de noviembre del 2022.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD	PROVINCIA	Pastaza	
	CANTÓN	Mera	
	PARROQUIA	Shell	
DATOS GEOGRÁFICOS	AFIRMADO (Datum WGS 84 Zona 17S)		
	LATITUD	9836834.23 S	9836747.35 S
	LONGITUD	826181.44 E	825988.64 E
FASE DEL PROYECTO	Construcción		
DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO			
NUMERO DE PROCESO O CONTRATO	MCO-GADPPZ-098-2022		
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	08 de febrero del 2023.	INICIO DE OBRA	22 de mayo del 2025.
PLAZO DE EJECUCIÓN	75 días		
MONTO DE CONTRATO	\$ 112,829.17 USD sin IVA		
ADMINISTRADOR CONTRATO	Ing. Jairo Narváez		
FISCALIZADOR	Ing. Jorge Rodrigo Pico Angulo		
TÉCNICO AMBIENTAL	Ing. Teresa Brigitte Jácome Vargas		
TIPO DE REPORTE AMBIENTAL			
TIPO DE REPORTE	INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO		
PERIODO	01 de agosto al 31 de agosto del 2025		
AVANCE DE OBRA	100%		
PLANILLA	Finalizada		
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN			
TÉCNICO AMBIENTAL	Ing. Miguel Angel Miranda Montahuano		
CÉDULA	1600487548		

## 2. Antecedentes

Con fecha 08 de febrero de 2023, se suscribió el contrato entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza (GADPPz) y el Ing. Claudio Fermín Cayambe Guilcapi, cuyo objeto de contratación es la "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA". Los trabajos que se ejecutarán deberán estar sujetos a diseños, especificaciones y más documentos contractuales, por un monto de USD \$ 112.829,17 (Ciento doce mil ochocientos veintinueve dólares con diecisiete centavos) sin incluir el IVA, a ejecutarse en un plazo de 75 días.

Mediante NOTIFICACIÓN DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 047-2023, de fecha 9 de febrero de 2023, se notifica al Ing. Fabián Salazar, como Administrador de Contrato del proceso MCO-GADPPz-098-2022 para la CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA.

Mediante Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4610-M de fecha 27 de febrero de 2023, se designa como Fiscalizador del Contrato al Ing. Rodrigo Pico para el proceso MCO-GADPPz-098-2022 para la CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA.

Mediante Memorando Nro. GADPPZ-COMPRAS-PUBLICAS-2023-9830-M, de fecha 31 de mayo de 2023 se designa al Ing. Jairo Narváez como nuevo Administrador del Contrato.

Con fecha 8 de mayo de 2025 se realiza una adenda modificatoria al contrato a fin de establecer el nuevo número de póliza y la vigencia de la misma.

Mediante Oficio N.º GADPPz - JN - ADMSHELL - 002, suscrito por el Administrador, se solicita la entrega de personal técnico, equipo y metodología de trabajo a ser empleados en la ejecución del contrato para verificar el cumplimiento de lo requerido en el contrato.

Mediante Oficio N.º CC-001-2025, el contratista entrega la documentación solicitada.

Mediante Oficio N.º Oficio N.º JN-001-2025-SHELL, de fecha 21 de mayo de 2025, se notifica al contratista la disponibilidad del anticipo, conforme a lo estipulado en la cláusula sexta del contrato.

## 3. Objetivos

### 3.1. Objetivo general

- Realizar un seguimiento y control del Plan de Manejo Ambiental para el proyecto "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA".

### 3.2. Objetivos específicos

- Verificar el cumplimiento del PMA destinado para el proyecto: "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA" en sus diferentes etapas y programas.
- Desarrollar un informe del avance de cumplimiento de las actividades ambientales en el cual se indique la fase del proyecto y sus actividades, así como la presentación de los medios de verificación de los mismos.

#### 4. Alcance

El informe se desarrolla para el periodo de control del 01 de agosto al 31 de agosto del 2025, realizando el informe ambiental de cumplimiento del PMA para el proyecto: "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA.", medidas que se encuentran establecidas en el Certificado Ambiental aprobado con oficio de resolución No. MAATE-SUIA-DZDCH-2022-CA-0956, código SUIA no aplica; y que actualmente se encuentra finalizado el trabajo.

## 5. Marco legal

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, REGISTRO OFICIAL No. 449, 20 DE OCTUBRE DE 2008.

Art. 14.- "Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, *sumak kawsay*, [...]".

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: Inciso 27.

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales.

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño.

En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.

### LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL

(Publicada en el Suplemento del Registro Oficial # 418 del 10 de septiembre de 2004, previo a su actual status de codificada, la expedición de la Ley de Gestión Ambiental (D.L. No. 99-37 del 22 de julio de 1999 R.O. No. 245 del 30 de julio de 1999).

Los diversos organismos estatales y entidades sectoriales intervienen de manera activa en la descentralización de la gestión ambiental, prueba de aquello es que el Ministerio del Ambiente asigna la responsabilidad de ejecución de los planes a todas las instituciones del Estado que tienen que ver con los asuntos ambientales (Art. 13), siendo las Municipalidades y Consejos Provinciales quienes están interviniendo en este ámbito con la expedición de Ordenanzas Ambientales, siempre y cuando estén acreditados al Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA).

Debe remarcar el Capítulo II, dedicado a la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental, en el cual se establece que "las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución por los organismos descentralizados de control".

Art. 19, requiriéndose de la respectiva licencia otorgada por la autoridad ambiental nacional, autoridad sectorial nacional o autoridad ambiental seccional. Para su obtención establece como requisitos: estudios, evaluación de impacto ambiental, evaluación de riesgos, sistemas de monitoreo, auditorías ambientales (Art. 21).

Además, se contempla la posibilidad de que en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia ambiental, puedan ser evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas. La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se le realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban hacerse (Art. 22).

Art. 23. De esta norma legal señala los aspectos que debe contener la evaluación del impacto ambiental como:

- a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada;
- b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución;
- c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.

La evaluación del impacto ambiental, conforme al reglamento especial será formulada y aprobada, previamente a la expedición de la autorización administrativa emitida por el Ministerio del ramo (Art. 24). Sin duda, esta Ley de Gestión Ambiental, como Ley especial, se torna como la normativa jurídica ambiental general a la que deben sujetarse todas las instituciones públicas, privadas o mixtas en la ejecución de obras o estudios.

Impacto ambiental como:

- a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada;
- b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución;
- c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.

La evaluación del impacto ambiental, conforme al reglamento especial será formulada y aprobada, previamente a la expedición de la autorización administrativa emitida por el Ministerio del ramo (Art. 24). Sin duda, esta Ley de Gestión Ambiental, como Ley especial, se torna como la normativa jurídica ambiental general a la que deben sujetarse todas las instituciones públicas, privadas o mixtas en la ejecución de obras o estudios.

Art. 41. Contempla la acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las normas que protegen al ambiente y los derechos ambientales individuales o colectivos de la sociedad. De esta manera, queda establecida en esta ley la obligatoriedad de elaborar un Estudio de Impacto Ambiental en toda obra que suponga un riesgo ambiental. Actualmente, la mayoría de Municipalidades del país están incorporando en sus Ordenanzas la exigencia de realizar este estudio en toda obra nueva. Con esta medida el Estado descentraliza su ámbito de acción y mejora su efectividad y control en el área ambiental.

CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 983 DE 12 ABRIL DE 2017.

Art. 162.- Obligatoriedad. Todo proyecto, obra o actividad, así como toda ampliación o modificación de los mismos, que pueda causar riesgo o impacto ambiental, deberá cumplir con las disposiciones y principios que rigen al Sistema Único de Manejo Ambiental, en concordancia con lo establecido en el presente Código.

## Capítulo II de la Regularización Ambiental

Art. 172.- Objeto. La regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales. Para dichos efectos, el impacto ambiental se clasificará como no significativo, bajo, mediano o alto. El Sistema Único de Información Ambiental determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental a otorgarse.

Art. 173.- De las obligaciones del operador. El operador de un proyecto, obra y actividad, pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en los casos que sea posible, eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su actividad. Cuando se produzca algún tipo de afectación al ambiente, el operador establecerá todos los mecanismos necesarios para su restauración.

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN-ISO 3864-1:2013

Símbolos gráficos. Colores de seguridad y señales de seguridad.

Parte 1: principios de diseño para señales de seguridad e indicaciones de seguridad.

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2841 2014-03

Gestión ambiental. Estandarización de colores para recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.

Expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 2393 y publicado en el Registro Oficial # 565 del 17 de noviembre de 1986. Las disposiciones de este Reglamento, se aplican a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del ambiente laboral.

Art. 76.- ROPA DE TRABAJO.

Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado riesgo de accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucia, deberá utilizarse ropa de trabajo adecuada que será suministrada por el empresario.

#### REFORMA AL REGLAMENTO AL CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE

**Artículo 2.- Sustitúyase el artículo 485, por el siguiente:**

“Art. 485.- Revisión de informes de monitoreo. - Los monitoreos por parte del operador se presentarán a la Autoridad Ambiental competente de manera consolidada, dentro de los Informes de gestión ambiental.

Para el efecto los Informes de gestión, Informes Ambientales de Cumplimiento y Auditorías Ambientales de Cumplimiento se presentarán hasta el quince (15) de enero de cada año, conforme la autorización administrativa ambiental.”

**Artículo. 4.- En el artículo 624, sustitúyase los literales a), d) y e) por lo siguiente:**

“a) La evaluación de impacto y riesgo ambiental para la eliminación y/o disposición final, dentro de las instalaciones del proyecto, obra o actividad generadora, debe realizarse como parte de la regularización para la obtención de la autorización administrativa ambiental de dicho proyecto, obra o actividad, conforme a la normativa técnica aplicable, y contemplar las medidas pertinentes en el plan de manejo ambiental correspondiente. Previo al inicio de la regularización se deberá contar con el pronunciamiento de aprobación de los requisitos técnicos para la eliminación y/o disposición final de los residuos y/o desechos peligrosos o especiales otorgado por la Autoridad Ambiental Nacional;

#### REGLAMENTO AL CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE, - REGISTRO OFICIAL No. 507 DE 12 DE JUNIO- 2019

##### LIBRO PRELIMINAR

##### TÍTULO I OBJETO Y ÁMBITO

**Art. 1.- Objeto y ámbito.** - El presente Reglamento desarrolla y estructura la normativa necesaria para dotar de aplicabilidad a lo dispuesto en el Código Orgánico del Ambiente. Constituye normativa de obligatorio cumplimiento para todas las entidades, organismos y dependencias que comprenden el sector público central y autónomo descentralizado, personas naturales y jurídicas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, que se encuentren permanente o temporalmente en el territorio nacional.

**TITULO II: PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL CAPITULO IV: LICENCIA AMBIENTAL**

**Art. 431.-** Licencia ambiental. - La Autoridad Ambiental Competente, a través del Sistema Único de Información Ambiental, otorgará la autorización administrativa ambiental para obras, proyectos o actividades de mediano o alto impacto ambiental, denominada licencia ambiental.

**TITULO IV: PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL  
CAPITULO III MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL**

**Art. 484.-** Monitoreos de aspectos ambientales. - El operador llevará reportes que contengan las observaciones visuales, los registros de recolección, los análisis y la evaluación de los resultados de los Muestreos para medición de parámetros de la calidad y/o de alteraciones en los medios físico, biótico, socio-cultural, así como las acciones correctivas implementadas en el caso de identificarse incumplimientos de la normativa ambiental.

Las fuentes, sumideros, recursos y parámetros a ser monitoreados, así como la frecuencia del monitoreo y la periodicidad de los reportes constarán en el respectivo plan de monitoreo del plan de manejo ambiental y serán determinados según la actividad, la magnitud de los impactos ambientales y características socio-ambientales del entorno.

Los operadores deberán reportar los resultados de los monitoreos como mínimo, de forma anual a la Autoridad Ambiental Competente, sin perjuicio de lo establecido en la respectiva norma sectorial.

Los monitoreos de los recursos naturales se realizarán mediante análisis de indicadores cualitativos y cuantitativos, según sea aplicable, sobre los puntos de monitoreo aprobados por la Autoridad Ambiental Competente en el área de influencia de la actividad controlada y deberán ser contrastados con los datos de la línea base y, de ser el caso, con muestreos previos.

**Art. 486.-** Muestreos. - Es la actividad de toma de muestras con fines de evaluación y análisis de la calidad ambiental en proyectos, obras o actividades. Los Muestreos serán gestionados por los operadores para cumplir el plan de monitoreo del plan de manejo ambiental y para determinar la calidad ambiental de una descarga, emisión, vertido o recurso. Los Muestreos deben realizarse considerando normas técnicas vigentes y supletoriamente utilizando normas o estándares aceptados internacionalmente.

Para la toma de muestras de las descargas, emisiones y vertidos, el operador deberá disponer de sitios adecuados para muestreo y aforo de los mismos y proporcionará todas las facilidades e información requerida.

**Art. 486.-** Muestreos. - Es la actividad de toma de muestras con fines de evaluación y análisis de la calidad ambiental en proyectos, obras o actividades. Los Muestreos serán gestionados por los operadores para cumplir el plan de monitoreo del plan de manejo ambiental y para determinar la calidad ambiental de una descarga, emisión, vertido o recurso. Los Muestreos deben realizarse considerando normas técnicas vigentes y supletoriamente utilizando normas o estándares aceptados internacionalmente. Para la toma de muestras de las descargas, emisiones y vertidos, el operador deberá disponer de sitios adecuados para muestreo y aforo de los mismos y proporcionará todas las facilidades e información requeridas

**Art. 488.-** Informes ambientales de cumplimiento. - Los informes ambientales de cumplimiento deberán ser presentados por los operadores de proyectos, obras o actividades regularizados mediante registro ambiental, con el fin de evaluar la observancia y cumplimiento de la normativa ambiental vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas de la autorización administrativa ambiental, de acuerdo a los lineamientos que para el efecto emita la Autoridad Ambiental Nacional.

**Art. 489.-** Periodicidad de informes ambientales de cumplimiento. - Los proyectos, obras o actividades regularizadas mediante registro ambiental deberán presentar a la Autoridad Ambiental Competente un informe ambiental de cumplimiento una vez transcurrido un (1) año desde el otorgamiento de dicha autorización administrativa y posteriormente cada dos (2) años.

**Art. 491.-** Informes de gestión ambiental. - Los operadores de proyectos, obras o actividades de mediano y alto impacto presentarán informes de gestión ambiental anuales, mismos que serán revisados aleatoriamente por la Autoridad Ambiental Competente. Los informes de gestión ambiental contendrán la información que respalde el cumplimiento del plan de manejo ambiental y plan de monitoreo.

Los requisitos y formatos de los informes de gestión ambiental serán establecidos por la Autoridad Ambiental

Nacional.

**Art. 505.-** Plan de acción. – Cuando se detecten, a través de los mecanismos de control y seguimiento, incumplimientos al plan de manejo ambiental o a la normativa ambiental aplicable, el operador deberá presentar un plan de acción, en el término máximo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de notificación, por parte de la Autoridad Ambiental Competente, que permita corregir los incumplimientos identificados. El plan de acción deberá ser aprobado por la Autoridad Ambiental Competente, misma que realizará el control y seguimiento, de acuerdo al cronograma respectivo y los demás mecanismos de control establecidos en la ley y este Reglamento. La Autoridad Ambiental Competente tendrá un término máximo de (30) días para aprobar, observar o rechazar el plan de acción presentado.

#### **CAPITULO IV HALLAZGOS**

**Art. 508.-** Plan de cierre y abandono. - Los proyectos, obras o actividades regularizadas que requieran el cierre y abandono, deberán presentar la correspondiente actualización del plan de cierre y abandono aprobado en su plan de manejo ambiental, de ser el caso. El operador no podrá iniciar la ejecución del plan de cierre y abandono sin contar con la aprobación del mismo por parte de la Autoridad Ambiental Competente.

El plan de cierre y abandono deberá incluir, como mínimo:

- a) La identificación de los impactos ambientales que se generen durante el desarrollo de esta fase;
- b) Las medidas de manejo del área;
- c) Las medidas de restauración de las áreas abandonadas,
- d) Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de cierre y abandono; y,
- e) Las obligaciones derivadas de los actos administrativos y la presentación de los documentos que demuestren el cumplimiento de las mismas, de ser el caso.

La Autoridad Ambiental Competente deberá aprobar, observar o rechazar la solicitud en el término máximo de cuarenta y cinco (45) días, previo a la realización de una inspección in situ, para determinar el estado del proyecto y elaborar las observaciones pertinentes.

Una vez verificada la ejecución del plan de cierre y abandono, la Autoridad Ambiental Competente deberá emitir un informe técnico, mismo que motivará la extinción de la autorización administrativa ambiental del operado.

Los proyectos, obras o actividades no regularizados deberán presentar el correspondiente plan de cierre y abandono para aprobación de la Autoridad Ambiental Competente, sin perjuicio de las sanciones a las que hubiere lugar.

### **TITULO VI**

#### **GESTION INTEGRAL DE SUSTANCIAS QUIMICAS**

##### **CAPITULO II REGISTRO DE SUSTANCIAS QUIMICAS**

**Art. 527.-** Registro de Sustancias Químicas. - El Registro de Sustancias Químicas es la autorización administrativa ambiental que habilita al operador a ejecutar las fases de gestión de las sustancias químicas y permite a la Autoridad Ambiental Nacional regular y controlar la trazabilidad de las mismas; dicho Registro se obtendrá a través del Sistema Unico de Información Ambiental.

Las fases de gestión de las sustancias químicas son: abastecimiento, que comprende la importación, fabricación o producción y formulación; almacenamiento; transporte; uso; y, exportación. Las personas naturales o jurídicas que participen en cualquiera de las fases de gestión de sustancias químicas, deberán obtener el Registro de Sustancias Químicas de aquellas sustancias determinadas por parte de la Autoridad Ambiental Nacional. Los operadores que obtengan otras autorizaciones administrativas equivalentes al Registro de Sustancias Químicas, emitidas por autoridades competentes, no requerirán obtener este Registro ante la Autoridad Ambiental Nacional.

## TÍTULO VII

### GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS

#### CAPITULO III GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS

#### SECCION 3ª GENERACION Y FASES DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS

##### **Art. 584.-** Obligaciones de los generadores

Además de las obligaciones establecidas en la Ley y normativa aplicable, todo generador de residuos y desechos sólidos no peligrosos deberá:

- a) Ser responsable de su manejo hasta el momento en que son entregados al servicio de recolección o depositados en sitios autorizados que determine el prestador del servicio, en las condiciones técnicas establecidas en la normativa aplicable; y,
- b) Tomar medidas con el fin de minimizar su generación en la fuente, conforme lo establecido en las normas secundarias emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional.

**Art. 587.-** Separación en la fuente. – La separación en la fuente es la actividad de seleccionar y almacenar temporalmente en su lugar de generación los diferentes residuos y desechos sólidos no peligrosos, para facilitar su posterior almacenamiento temporal y aprovechamiento. Los residuos y desechos sólidos no peligrosos deberán ser separados en recipientes por los generadores y clasificados en orgánicos, reciclables y peligrosos; para el efecto, los municipios deberán expedir las ordenanzas municipales correspondientes.

Está prohibido depositar sustancias líquidas, pastosas o viscosas, excretas, desechos peligrosos o especiales, en los recipientes destinados para la separación en la fuente de los residuos sólidos no peligrosos. Las instituciones públicas adoptarán las medidas y acciones necesarias para la separación en la fuente de residuos y desechos en sus instalaciones.

#### SECCION

##### 1a DISPOSICIONES GENERALES

**Art. 613.** Prohibiciones. - En la gestión de residuos o desechos peligrosos y/o especiales se prohíbe:

- a) Disponer residuos o desechos peligrosos y/o especiales sin la autorización administrativa ambiental correspondiente;
- b) Disponer residuos o desechos peligrosos y/o especiales en áreas naturales que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, áreas especiales para la conservación de la biodiversidad, Patrimonio Forestal Nacional, ecosistemas frágiles, en el dominio hídrico público, aguas marinas, playas, en las vías públicas, patios, predios, solares, quebradas o en cualquier lugar no autorizado;
- c) Quemar a cielo abierto residuos o desechos peligrosos y/o especiales;
- d) Realizar mezclas entre residuos o desechos peligrosos y/o especiales, y de la misma manera la mezcla de estos con otros materiales cuando su destino no es la eliminación o disposición final. En el caso de generarse una mezcla de desechos especiales con otros materiales, la mezcla completa deberá ser manejada como desecho especial o según prime la característica de peligrosidad del material. En el caso de generarse una mezcla de desechos peligrosos con otros materiales, la mezcla completa deberá ser manejada como desecho peligroso;
- e) Utilizar residuos o desechos peligrosos y/o especiales como insumo para la elaboración de productos de consumo humano o animal; y,
- f) Realizar movimientos transfronterizos de residuos o desechos peligrosos y/o especiales sin la autorización de la Autoridad Ambiental Nacional y demás autoridades competentes. El incumplimiento de estas prohibiciones estará sujeto a los procesos administrativos y sanciones respectivas, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a las que haya lugar

#### SECCION 2ª

## GENERACION

**Art. 623.-** Generadores de residuos o desechos peligrosos y/o especiales. - Se considera como generador a toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que genere residuos o desechos peligrosos y/o especiales derivados de sus actividades productivas, de servicios, o de consumo domiciliario. Si el generador es desconocido, será aquella persona natural o jurídica que éste en posesión de esos desechos o residuos, o los controle en el marco de sus competencias.

El generador será el titular y responsable del manejo de los residuos o desechos peligrosos y/o especiales hasta su disposición final, excepto los generadores por consumo domiciliario, que se regularán conforme a la política y norma secundaria que la Autoridad Ambiental Nacional emita para el efecto. Los operadores serán responsables de los residuos o desechos generados por las actividades complementarias, equipos, maquinarias o servicios contratados o alquilados para realizar su actividad principal, en las mismas instalaciones de dicha actividad, conforme las disposiciones del presente capítulo.

**Art. 625.-** Obtención del Registro de Generador. - Los proyectos, obras o actividades nuevas y en funcionamiento, que se encuentren en proceso de regularización ambiental para la obtención de una licencia ambiental; y que generen o proyecten generar residuos o desechos peligrosos y/o especiales deberán obtener el registro de generador de residuos o desechos peligrosos y/o especiales de forma paralela con la licencia ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional establecerá excepciones en los casos en los que exista la motivación técnica y jurídica necesaria.

### 6. Metodología utilizada para la elaboración del informe

La metodología usada para la elaboración del informe está basada en las siguientes fases:

Fase de recopilación de información: La actividad primaria fue buscar y recopilar toda la información existente sobre las actividades desarrolladas en el periodo a ser reportado y otros.

Fase de verificación y validación de documentación: En esta fase de verificación y validación de información fue muy indispensable ya que se revisó minuciosamente toda la información obtenida como: oficios, memorando, informes técnicos de inspección, registros, fotografías, entre otros los cuales permitieron verificar los hallazgos, las operaciones y condiciones del proyecto, así como evaluar las acciones realizadas.

Fase de elaboración del Informe Ambiental de Cumplimiento: En esta fase se evaluó el procesamiento de información y datos de forma minuciosa la aplicación de la Normativa Ambiental vigente y el Plan de Manejo Ambiental, evaluando cada uno de los hallazgos e incumplimientos de acuerdo a los siguientes criterios establecidos en el Reglamento al Código Orgánico Ambiental:

Conformidad (C): Art. 499. Se establecerán conformidades cuando la Autoridad Ambiental Competente determine, mediante los mecanismos de control y seguimiento, que las actividades del operador cumplan con lo establecido en el plan de manejo ambiental, las obligaciones derivadas de las autorizaciones administrativas y la normativa ambiental vigente.

No Conformidad menor (NC--): Art. 500. No conformidades Se consideran no conformidades menores las siguientes:

- a) Incumplimiento a los límites permisibles o a los criterios de calidad por parámetro y fuente muestreada;
- b) Retraso o no presentación de los documentos administrativos de control y seguimiento ambiental en los términos establecidos;
- c) Incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los estudios ambientales, plan de manejo ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competente;

- d) Incumplimiento de las medidas de producción más limpia expedidas por la Autoridad Ambiental Nacional;
- e) Incumplimiento de las medidas para el manejo adecuado de productos o elementos considerados peligrosos, conforme la norma técnica correspondiente;
- f) Uso, comercialización, tenencia o importación de productos prohibidos o restringidos de acuerdo a la norma técnica correspondiente;
- g) Gestión de residuos, desechos o sustancias químicas, en cualquiera de sus fases, sin la autorización correspondiente o sin cumplir las condiciones administrativas y técnicas establecidas en la normativa ambiental aplicable;
- h) Incumplimiento parcial de las medidas de remediación, restauración o reparación aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente;
- i) Incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente o plan de acción aprobado;
- j) Incumplimiento de obligaciones establecidas en las autorizaciones administrativas y normativa ambiental, que permiten el seguimiento, monitoreo y control, requeridas por la Autoridad Ambiental Competente;
- k) Incumplimiento de las observaciones y solicitudes de información realizadas por la Autoridad Ambiental Competente en los términos señalados en el presente Reglamento; y,
- l) Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

No Conformidad mayor (NC+): Art. 501. No conformidades Se consideran no conformidades mayores, cuando se determine:

- a) Reiteración de una no conformidad menor que se haya determinado por los mecanismos de control y seguimiento establecidos en este Reglamento;
- b) Incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro y fuente muestreada;
- c) Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a largo plazo, producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativa ambiental aplicable;
- d) Incumplimiento total de las medidas de reparación, remediación y restauración aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente;
- e) Incumplimiento total de la ejecución del plan emergente o plan de acción aprobado;
- f) Abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con la aprobación de la Autoridad Ambiental Competente;
- g) Incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de contingencia;
- h) Realización de actividades no contempladas o distintas a las autorizadas por la Autoridad Ambiental Competente;
- i) Movimiento transfronterizo de residuos y desechos sin autorización administrativa;
- j) Disposición final o temporal de escombros, residuos o desechos en lugares no autorizados;
- k) Determinación de responsabilidad por daño ambiental mediante resolución en firme; y,
- l) Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

No Aplica (NA): Cuando se presentan actividades que no tienen relación con el PMA o la legislación vigente, y su aplicabilidad es innecesaria.

7. Descripción general del proyecto

El presente proyecto de construcción, afirmado y ampliación en diferentes partes viales de la parroquia Shell, Cantón Mera, Provincia de Pastaza, donde se realizará el afirmado de varias vías.

8. Descripción de personal, maquinaria y equipos Personal:

- Operadores
- Obreros
- Choferes Equipos y maquinaria:
- Volqueta
- Excavadora

9. Descripción de las actividades ejecutadas

Las actividades ejecutadas en la parte ambiental durante el presente periodo de control fueron:

- ✓ Charlas en temas de seguridad y ambiente.
- ✓ Inspección de señalética y uso de equipos de protección personal.

10. Detalle de rubros ambientales ejecutados

Durante el presente periodo de control se ejecutaron los siguientes rubros ambientales:

• MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE RUBROS AMBIENTALES

Medida Propuesta	C	NC	NA	OBSERVACIONES
<b>AFIRMADO LOS ALTARES (Junio)</b>				
CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	X			Se adquiere 5 contenedores metalicos para los afirmados de las vias que seran utilizados en los frentes Fotografia 9
CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	X			Fotografia 4 y registro 2
KIT ANTIDERRAMES	X			Se adquiere 5 kits antiderrames para los afirmados de las vias  Fotografia 4
PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA(LETRERO)-CON ESTRUCTURA	X			Fotografia 16

SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	X			Fotografía 2 y registro 1
CAPACITACIÓN EN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS.	X			Fotografía 12

AFIRMADO LOS ALTARES A2 (Junio)				
CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	X			Fotografía 9
CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	X			Fotografía 4 y registro 2
KIT ANTIDERRAMES	X			Fotografía 4
PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	X			Fotografía 16
SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	X			Fotografía 2 y registro 1
CAPACITACIÓN EN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS.	X			Fotografía 12

AFIRMADO MONTE SINAI (AMPLIACION DE VIA) (Julio)					
CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	X				Fotografia 9
CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	X				Fotografia 4 y registro 2
KIT ANTIDERRAMES	X				Fotografia 4
PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	X				Fotografia 16
SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	X				Fotografia 2 y registro 1
CAPACITACIÓN EN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS.	X				Fotografia 12

AFIRMADO PRAGA SACHA (Julio)					
CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	X				Fotografia 9
CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	X				Fotografia 4 y registro 2
KIT ANTIDERRAMES	X				Fotografia 4
PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	X				Fotografia 16
SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	X				Fotografia 2 y registro 1
CAPACITACIÓN EN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS.	X				Fotografia 12

AFIRMADO NUEVO MILENO (AMPLIACION) (Agosto)					
CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	X				Fotografía 9
CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	X				Fotografía 4 y registro 2
KIT ANTIDERRAMES	X				Fotografía 4
PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	X				Fotografía 16
SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	X				Fotografía 2 y registro 1
CAPACITACIÓN EN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS.	X				Fotografía 12

1. Evaluación de hallazgos a la normativa ambiental, permiso ambiental y al plan de manejo ambiental.

El nivel de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental del proyecto, se evalúa con la siguiente matriz: C (Conformidad), NC- (No Conformidad menor), NC+ (No Conformidad Mayor), NA (No Aplica).

1.1. Normativa aplicable al proyecto

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE AL PERIODO A SER REPORTADO



ITEM	NORMATIVA	APLICACIÓN	CUMPLIMIENTO			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			C	NC-	NC+	
1	CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 983 DE 12 ABRIL DE 2017.	<p>Art. 162.- Obligatoriedad. Todo proyecto, obra o actividad, así como toda ampliación o modificación de los mismos, que pueda causar riesgo o impacto ambiental, deberá cumplir con las disposiciones y principios que rigen al Sistema Único de Manejo Ambiental, en concordancia con lo establecido en el presente Código.</p> <p>Art. 172.- Objeto. La regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales. Para dichos efectos, el impacto ambiental se clasificará como no significativo, bajo, mediano o alto. El Sistema Único de Información Ambiental determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental a otorgarse.</p> <p>Art. 173.- De las obligaciones del operador. El operador de un proyecto, obra y actividad, pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en los casos que sea posible, eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su actividad. Cuando se produzca algún tipo de afectación al ambiente, el operador establecerá todos los mecanismos necesarios para su restauración.</p>	X			<p>La empresa contratista dispone de áreas de almacenamiento temporal de desechos. Ver anexo 2. Fotografía 12.</p> <p>La empresa contratista en cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato del proyecto, presenta el único informe ambiental de cumplimiento.</p>

2	Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo	<p>Expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 2393 y publicado en el Registro Oficial # 565 del 17 de noviembre de 1986. Las disposiciones de este Reglamento, se aplican a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del ambiente laboral.</p> <p>Las disposiciones de este Reglamento son aplicables a las actividades de construcción en sus diferentes fases. Deberán observarse fundamentalmente procedimientos de seguridad y capacitación; y, se aprovecharán experiencias prácticas y técnicas actualizadas que coadyuven al mejoramiento en la producción; a la protección de los trabajos y a la conservación de la maquinaria empleada en los mismos y sus instalaciones, evitando, además, riesgos de accidentes y enfermedades profesionales.</p> <p>Art. 76.- ROPA DE TRABAJO. Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado riesgo de accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucia, deberá utilizarse ropa de trabajo adecuada que será suministrada por el empresario.</p>	X		<p>La empresa contratista comprometida con precautelar la seguridad de sus trabajadores realiza capacitaciones, charlas de sobre temas de seguridad a sus trabajadores de igual manera entrega equipos de protección personal y controla el uso adecuado de los mismos.</p> <p>Ver anexo 2. Fotografía 7 y Fotografía 13.</p> <p>Ver anexo 3. Registro 3 y Registro 6.</p>
---	--	---	---	--	--


1.2. Plan de manejo ambiental

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS


ITEM	MEDIDA PROPUESTA	MEDIO DEVERIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
			C	NC-	NC+	N/A	
1	<p>Implementar señalética:</p> <p>Señalética de Prohibición Señalética de condición obligatoria Señalética preventiva de condición segura Señalética ambiental Señalética informativa.</p> <p>-Usar las figuras geométricas, colores de seguridad, y colores de contraste para señales de seguridad de la Tabla N°1 de la Norma INEN ISO 3864</p> <p>-Usar los diseños para señales de prohibición, acción obligatoria, precaución, condición segura.</p>	<p>- Ver anexo 2. Fotografía 1 -Ver anexo 3. Registro 1</p>	X			N/A	<p>La empresa contratista realiza la implementación de la señalética respectiva en los diferentes lugares de trabajo.</p>
2	Zonificar las áreas de trabajo con cinta de peligro.	- Ver anexo 2. Fotografía 2	X				<p>La empresa contratista realiza la zonificación del área de trabajo con cinta de peligro.</p>
3	Cubrir con una lona las volquetas que trasladan material pétreo hacia el lugar de la obra.	- Ver anexo 2. Fotografía 3	x				<p>El material transportado por las volquetas vienen cubiertas de lonas para evitar la caída de material en la vía.</p>
4	Realizar mantenimiento regular de la maquinaria y equipos utilizados en talleres					X	<p>No aplica por que las maquinarias están en perfecto estado y recién comenzaron a trabajar.</p>


	privados.								
5	<p>Implementar un kit anti derrame y equipos de respuesta rápida, para combatir posibles emergencias.</p> <p>Contenido del Kit Anti Derrame:          -Pala, paños absorbentes, (salchicha observante), guantes, botas, gafas protectoras, escoba, fundas o recipientes para recolectar los desechos contaminados.</p> 	<p>Ver anexo 2. Fotografía 4          -Ver anexo 3. Registro 2</p>	X					<p>No se registró ningún accidente o incidente durante el presente periodo de control.</p>	
6	<p>Se deberá instalar de forma permanente un extintor y botiquín de primeros auxilios en los vehículos y/o maquinaria pesada.</p> <p>Contenido del botiquín de primeros auxilios:          - Antisépticos, alcohol gel, gasas, tijeras, algodón, termómetro, esparadrapo.</p> 	<p>-Ver anexo 2. Fotografía 5</p>	X					<p>Se cuenta con equipos de control de incendios en las maquinarias, mismos son puntos de fácil acceso, fin de poder dar respuesta inmediata en caso de un incendio.</p>	
7	<p>Dotar al personal que labora en el proyecto de EPP.</p>	<p>-Ver anexo 2. Fotografía 6          -Ver anexo 3. Registro 3</p>	X					<p>La empresa contratista realiza la dotación de equipos de protección personal a sus trabajadores.</p>	

8	<p>Implementar un área para el almacenamiento temporal de combustibles, el cual deberá cumplir con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Deberá estar ubicado alejado de cuerpos hídricos, y aislado</li> <li>-Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no inundables.</li> <li>-La estructura será realizada con vigas de madera y cubierta de dura techo o también pueden ser hojas de zinc (Las dimensiones del área se las realizará en base a la cantidad de tanques de almacenamiento a utilizar).</li> <li>-El tanque de almacenamiento deberá estar protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones que contaminen el ambiente, y contará manguera y llaves de distribución.</li> <li>-El tanque de almacenamiento deberá estar rodeado de un cubeto o estructura de contención impermeable técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque.</li> <li>-En el área se deberá implementar un extintor para prevenir cualquier riesgo de incendio.</li> <li>-Tener un acceso adecuado para la carga de combustible y en caso de ser necesario para la entrada del carro de los bomberos.</li> <li>-El área deberá estar señalizado en base a la normativa NTE INEN-ISO 2266.</li> </ul>	<p>- Ver anexo 2. Fotografía 7</p>	<p>X</p>			<p>Para la movilización de combustible se lo realice con el transporte de una camioneta para el correspondiente tanqueo a las maquinarias.</p>
---	--	------------------------------------	----------	--	--	--

	 <p>Ubicar el material de desalojo en los sitios descritos en el ítem 7. del presente documento.</p> <p>Los cuales han sido ubicado de acuerdo a los siguientes criterios técnicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Deberán encontrarse dentro del área de influencia del proyecto.</li> <li>-El terreno debe estar desprovisto de vegetación.</li> <li>-Alejados de cursos hídricos.</li> <li>-Las áreas destinadas para escombreras deberán ser estables y seguras a corto y largo plazo.</li> <li>-Deberán contar con una capacidad mínima de 1500 m3</li> <li>-El transporte del material deberá realizarse en una volqueta con cubierta (lona), con el fin de evitar derrames en la carretera.</li> </ul> <p>Ubicación de escombreras:</p>	<p>- Ver anexo 2. Fotografía 8</p>	<p>X</p>				<p>Se utilizo una escombrera dentro de una zona comunitaria para depósito de materiales resultantes de desbroce y demás actividades que se ejecutan en el proyecto, mismo predio no se encuentra cerca de un cuerpo hídrico</p>
<p>9</p>							

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

ITEM	MEDIDA PROPUESTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
			C	NC-	NC+	N/A	
1	<p>Implementar de contenedores de colores debidamente etiquetados para la clasificación de los residuos en la vía, se deberá cumplir con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Encontrarse bajo techo.</li> <li>-Contenedores de 55 galones (4)</li> <li>El rotulado estará en un lugar visible con caracteres legibles según lo establecido en la NTE INEN 878. El nombre o denominación de los residuos con su logo respectivo y la distancia de observación según lo establecido en la NTE INEN ISO 3864-1</li> <li>- Se realizará una clasificación general de residuos:</li> <li>Colores de los contenedores a implementar.</li> <li>Azul: Reciclables</li> <li>Negro: No Reciclables</li> <li>Verde: Orgánicos</li> <li>Rojo: Peligrosos</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ver anexo 2. Fotografía 9</li> <li>-Ver anexo 3. Registro 4</li> </ul>					<p>Se realizan charlas informativas a los trabajadores en temas de seguridad, normas laborales y ambiente.</p>
2	<p>Dotar de fundas plásticas a los conductores de volquetes y maquinaria pesada para los desechos comunes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ver anexo 2. Fotografía 10</li> </ul>	X				<p>La empresa contratista realiza la dotación de fundas plásticas a sus trabajadores.</p>
3	<p>Implementar un área de almacenamiento temporal de desechos peligrosos el cual deberá tener las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Estar bajo cubierta</li> <li>-Iluminación natural</li> <li>-En un espacio abierto, cercado.</li> </ul>					X	<p>No aplica, no se manejará desechos peligrosos en la ejecución del proyecto</p>

<p>4</p>	<p>-El acceso a estos locales debe ser restringido, y el personal que ingrese estará provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad industrial;</p> <p>-Contar con señalización apropiada en lugares y formas visibles; en base a la norma NTE INEN 2266.</p> <p>-Contar con el material y equipamiento para atender contingencias</p> <p>-Contar con sistemas de extinción contra incendios</p> <p>-Contar con bases o pisos impermeabilizados o similares, según el caso.</p> <p>Colores de los contenedores a implementar          Rojo: Desechos Peligrosos</p> 	<p>- Ver anexo 2. Fotografía 11          -Ver anexo 3. Registro 5</p>	<p>X</p>				<p>Para todos los desechos no peligrosos se lleva un registro de manejo.</p>
----------	--	---	----------	--	--	--	--

PLAN DE CAPACITACIÓN

ITEM	MEDIDA PROPUESTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
			C	NC-	NC+	N/A	
1	<p>Capacitar al personal de trabajo sobre tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Medidas propuestas en el PMA</li> <li>-Manejo de los procedimientos de seguridad</li> <li>-Trabajos en altura (de ser el caso)</li> <li>-Protección del ambiente</li> <li>-Primeros Auxilios y procedimiento en caso de emergencias</li> <li>-Manejo de desechos peligrosos y no peligrosos.</li> <li>-Técnicas para prevenir conflictos con la comunidad.</li> </ul> <p>Todas las capacitaciones se las realizara previo a la emisión del inicio de obra.</p>	<p>-Ver anexo 2. Fotografía 12</p> <p>-Ver anexo 3. Registro 6</p>	X			N/A	<p>Se realizan charlas informativas a los trabajadores en temas de seguridad, normas laborales y ambiente.</p> <p>Todas las charlas y capacitaciones se lleva un registro de firmas de asistencia para hacer constancia de dicha actividad.</p>

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

ITEM	MEDIDA PROPUESTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
			C	NC-	NC+	N/A	
1	<p>Realizar una reunión previa con los involucrados directos del proyecto para darles a conocer las ventajas de la implementación del proyecto obra o actividad.</p>	<p>- Ver anexo 2. Fotografía 13</p> <p>-Ver anexo 3. Registro 7</p>	X			N/A	<p>Se realiza socialización con los moradores del sector y verificar los alcances del proyecto.</p> <p>Todas las charlas y capacitaciones se lleva un registro de firmas de asistencia para hacer constancia de dicha actividad.</p>
2	<p>Implementar un buzón donde se recepte las quejas y sugerencias de la población.</p>	<p>-Ver anexo 2.</p>	X				<p>Se implementa un buzón de quejas y sugerencias.</p>
3	<p>En caso de existir quejas o inquietudes estas serán resueltas en un plazo de 72 horas, y con firma de acta de soluciones propuestas a la queja</p>					X	<p>No aplica no hay quejas.</p>

PLAN DE CONTINGENCIA

ITEM	MEDIDA PROPUESTA	MEDIO DEVERIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
			C	NC-	NC+	N/A	
1	Elaborar un Plan de Contingencia accesible a todo el personal en el cual se aborde la gestión de contingencia en caso de incendio, derrame, fuga o explosión.	- Ver anexo 3. Registro 8	X			N/A	Se elabora un plan de contingencia.
2	Implementar señalética fija y/o móvil con números de emergencia	- Ver anexo 2. Fotografía 1	X				Se ha colocado señaléticas móviles para la topografía ya que aun los trabajos no se realizan.
3	En caso de contingencia se deberá realizar: - Plan de acción - Plan emergente Y posterior comunicar a la autoridad	- Ver anexo 3. Registro 8	X				Se realizo plan de acción para el proyecto en el presente periodo de control.

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

ITEM	MEDIDA PROPUESTA	MEDIO DEVERIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
			C	NC-	NC+	N/A	
1	Verificar el nivel de cumplimiento al presente PMA, a través de un informe internos de cumplimiento de las medidas del Plan Aprobado por la Autoridad Ambiental.	-Check List	X				Se verifico que cumple con el plan de manejo Ambiental y da constancia en el informe presentado.
2	Monitorar las áreas destinadas para escombreras					X	No se requiere un informe de monitoreo de escombreras debido a que el material de excavación a desalojar fue muy infimo, la mayoría del material se lo utilizó en el mismo proyecto.

PLAN DE REHABILITACION

ITEM	MEDIDA PROPUESTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
			C	NC-	NC+	N/A	
1	Revegetación o reforestación de áreas degradadas en el proyecto con plantas nativas de la zona.					X	No aplica para este proyecto.
2	Compensación ambiental (En caso de realizar afectaciones en terrenos privados)					X	No aplica para este proyecto.

PLAN DE ENTREGA Y ABANDONO DEL ÁREA


ITEM	MEDIDA PROPUESTA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
			C	NC-	NC+	N/A	
1	Desmantelamiento de la infraestructura temporal existente en el área del proyecto (campamento, área de almacenamiento de combustibles y desechos peligrosos)	- Ver anexo 2. Fotografía 14	X				Se realiza el retiro de la infraestructura temporal utilizada para el área de desechos
2	Limpieza general del área del proyecto.	- Ver anexo 2. Fotografía 15	X				Se realiza la limpieza general del área del proyecto tras finalizar los trabajos respectivos.

12. Resultados de la evaluación

12.1 Normativa aplicable al proyecto

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE AL PROYECTO						
Nro.	NORMATIVA LEGAL	C	NC	NC	NA	Total de Medidas
1	CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 983 DE 12 ABRIL DE 2017.	1	0	0	0	1
2	Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo	1	0	0	0	1
TOTAL		2	0	0	0	2
PORCENTAJE		100%	0	0	0	100%

RESULTADO DE HALLAZGOS DE LA NORMATIVA AMBIENTAL

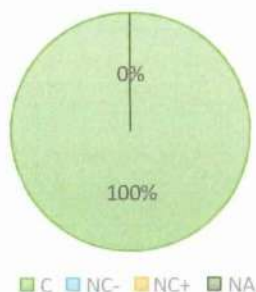

Elaborado por: Ing. Miguel Ángel Miranda Montahuano

12.2 Plan de manejo ambiental

RESULTADO DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL						
#	PLANES DE MANEJO AMBIENTAL	C	NC-	NC+	NA	Total de Medidas
1	Plan de Prevención y Mitigación de Impactos	08	-	-	01	09
2	Plan de manejo de desechos	03	-	-	01	04
3	Plan de Capacitación	01	-	-	-	01
4	Plan de relaciones comunitarias	02	-	-	01	03
5	Plan de contingencia	03	-	-	-	03
6	Plan De Monitoreo Y Seguimiento	01	-	-	01	02
7	Plan de rehabilitación	-	-	-	02	02
8	Plan de entrega y abandono del área	02	-	-	-	02
TOTAL		20	-	-	06	26
PORCENTAJE		77 %	0%	0%	23 %	100%



### CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



Elaborado por: Ing. Miguel Ángel Miranda Montahuano

#### 13. Plan de acción

No se requirió un plan de acción para el proyecto en el presente periodo de control, ya que no presenta incumplimientos al plan de manejo ambiental, normativa y/o resolución de aprobación del permiso ambiental (no conformidades menores y mayores).

#### 14. Conclusiones

- Se realizó seguimiento y control a las actividades detalladas en el plan de manejo ambiental del proyecto "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"; que comprende al periodo 01 de agosto al 31 de agosto del 2025.
- Mediante una matriz de evaluación se determinó el nivel de cumplimiento de las actividades previstas en el Plan de Manejo ambiental en el presente periodo de control.
- El presente informe justifica mediante medios de verificación el cumplimiento de las actividades planteadas en el plan de manejo ambiental del proyecto.

#### 15. Recomendaciones

- Dar seguimiento constante a las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto.

#### 16. Firmas de responsabilidad



Ing. Claudio Cayambe  
**CONTRATISTA**



Ing. Miguel Miranda  
**TÉCNICO AMBIENTAL**

Anexo 1. Certificado ambiental



**GUILLERMO LASSO**  
PRESIDENTE

**CERTIFICADO AMBIENTAL No. MAATE-SUIA-DZDCH-2022-CA-0956**

**DIRECCIÓN ZONAL**

**MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA**

Dado en MERA, 17 de noviembre de 2022

La DIRECCIÓN ZONAL, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico del Ambiente y su Reglamento, y demás normativa ambiental vigente aplicable.

**CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO AMBIENTAL a favor de:**

CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADA EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA

Otorgar el Certificado Ambiental a: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, considerando que ha registrado la información de su proyecto, obra o actividad en el Sistema Único de Información Ambiental SUIA; debiendo emplear durante todas las fases del mismo, las directrices que le apliquen dentro de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, emitida por la Autoridad Ambiental Nacional

**DETALLES DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD:**

**DATOS TÉCNICOS:**

Proyecto/Obra/Actividad:

Actividad Principal CIU: Construcción de carreteras, calles, autopistas y otras vías para vehículos o peatones.

Sector: Otros Sectores

Ubicación Geográfica :PASTAZA, MERA, SHELL

Coordenadas geográficas (Datum WGS 84 Zona 17S): Ver Anexo

**DATOS ADMINISTRATIVOS:**

Nombre del representante legal: GUEVARA BLASCHKE JAIME PATRICIO

Dirección: Km 7 Vía Puyo - Tena - Parroquia Fátima Hangares del GADPPz

**Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica**

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía

Código postal: 170101

Teléfono: +593 7 250 2000

[www.gadppz.gub.ec](http://www.gadppz.gub.ec)



Anexo 1. Certificado ambiental



**GUILLERMO LASSO**  
PRESIDENTE

Teléfono: 032885380 - 0987573972 -

Email: davidalejandroyedra@gmail.com - christianvargas900@gmail.com -

Código del Proyecto: No. MAATE-RA-2022-455730

Actividad principal CIU: F4210.11.01

De conformidad a lo establecido en el artículo 178 del Código Orgánico del Ambiente y el artículo 427 del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, el presente Certificado Ambiental, no es de carácter obligatorio, siendo importante observar la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, en el desarrollo de su proyecto, obra o actividad en lo que fuere aplicable.

Atentamente,

VARGAS SALAZAR GAVINO  
DIRECCIÓN ZONAL  
MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Yo, GUEVARA BLASCHKE JAIME PATRICIO con Cédula/RUC N° 1600191454 declaro que la información que consta en el presente certificado es de mi absoluta responsabilidad. En caso de forzar, falsificar, modificar, alterar o introducir cualquier corrección al presente documento, asumo las responsabilidades y sanciones determinadas en la ley.

Atentamente,

Sr. GUEVARA BLASCHKE JAIME PATRICIO



**SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL**

Anexo 2. Registro Topográfico







Fotografía 1. Señalética y Área de trabajo



Fotografía 2. Zonificación Área de Trabajos







Fotografía 6. Uso de EPP









Fotografía 12. Capacitaciones al Personal




Fotografía 13. Socialización



Fotografía 14. Desmantelamiento de la infraestructura temporal existente



Fotografía 15. Limpieza general del área del proyecto.

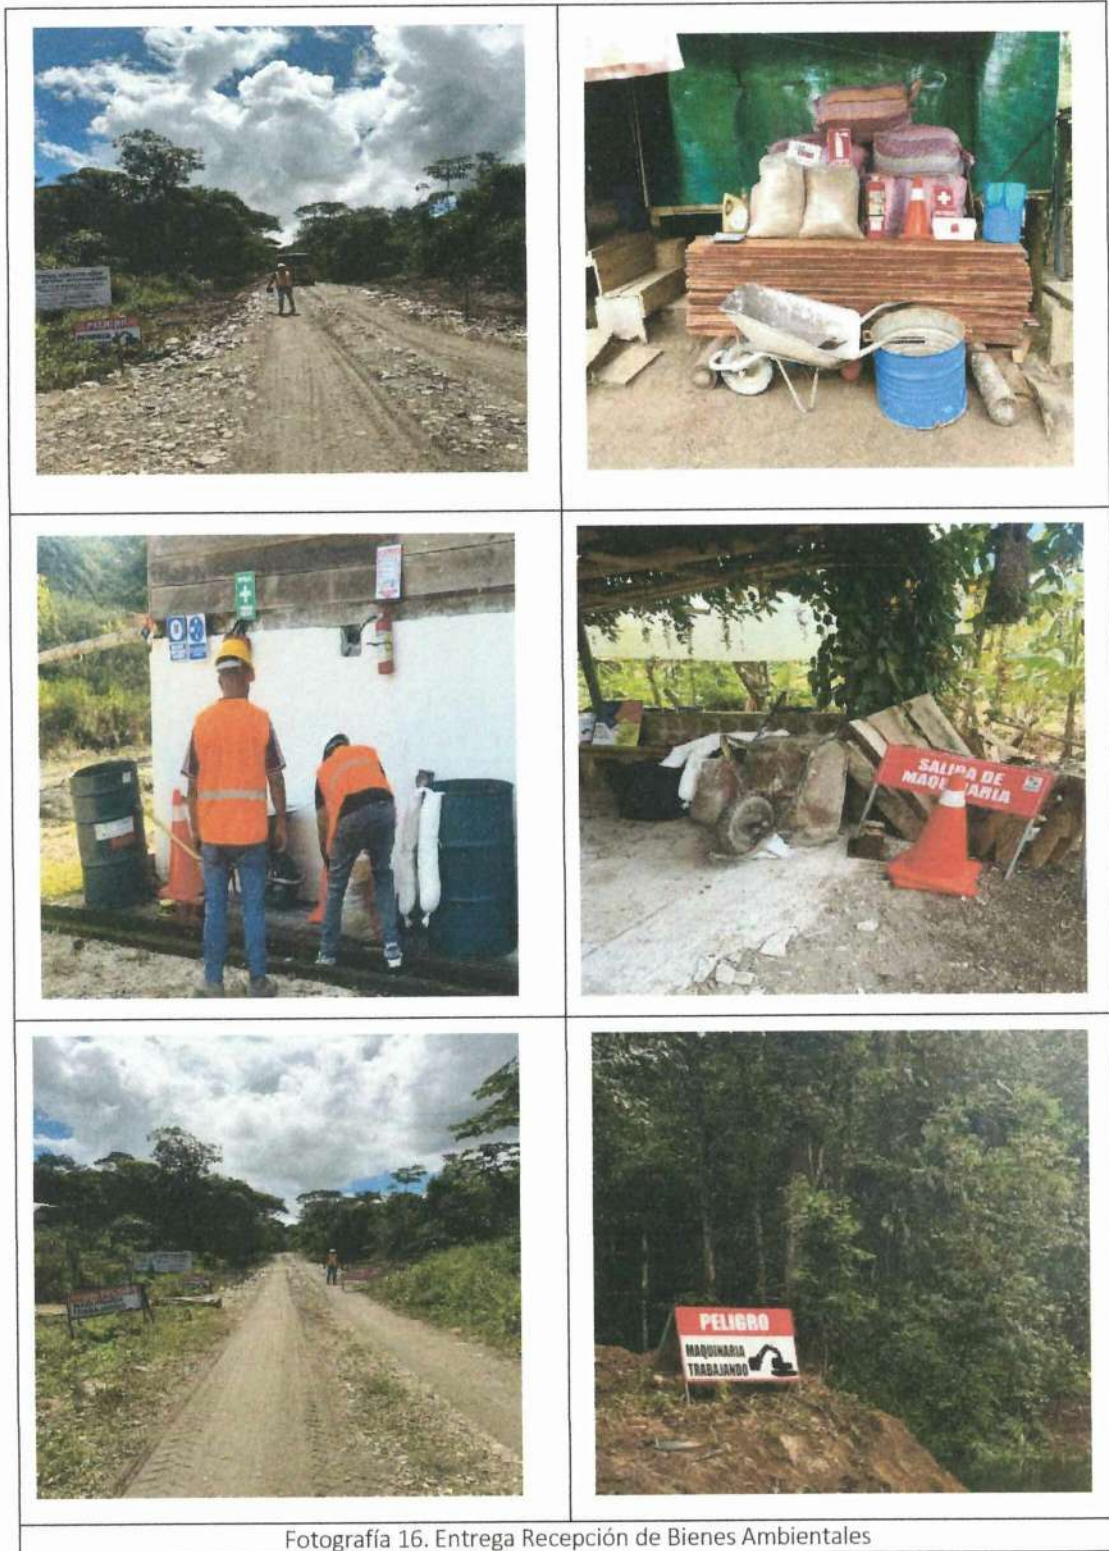

Fotografía 16. Entrega Recepción de Bienes Ambientales

Anexo 3. Registros

Registro 1. Factura de señaléticas

**NO TIENE LOGO**

**BRAVO IÑIGUEZ JAIME ANDRES**

WIJAO DISEÑO

Dirección Matriz: Barrio: BOSANDES Calle: BOBONAZA Numero: S/N Interseccion: JAIME ROLDOS

Dirección Sucursal: Barrio: BOSANDES Calle: BOBONAZA Numero: S/N Interseccion: JAIME ROLDOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 1600535775001

**FACTURA**

No. 002-002-000000058

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006202501160053577500120020020000000583953589010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/06/2025 14:59:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3006202501160053577500120020020000000583953589010

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAYAMBE GUILCAPI CLAUDIO FERMIN

Identificación: 1800462723001

Fecha: 30/06/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Parroquia Shell

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
M-9		3.00	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS DE 1.30 X 0.80		70.00	0.00	0.00	0.00	210.00

Información Adicional

Telefono: 0985190910

Email: claudio.cayambe@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	241.50

SUBTOTAL 15%	210.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	210.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	31.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>241.50</b>
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Registro 2. Factura Kit Antiderrames

**NO TIENE LOGO**

SANTOS LEON MARCIA AZUCENA

EXTINFIRE

Dirección Matriz: Calle GONZALES SUAREZ Intersección CESLAO MARIN

Dirección Sucursal: Calle GONZALES SUAREZ Intersección CESLAO MARIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 1600067530001

**FACTURA**

No. 002-001-000001243

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 2705202501160006753000120020010000012434630210914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/05/2025 17:16:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2705202501160006753000120020010000012434630210914

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAYAMBE QUILCAPI CLAUDIO FERMIN

Identificación: 1600462723001

Fecha: 27/05/2025

Dirección: PARROQUIA SHELL

Placa / Matrícula: Guía

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
KITDERRA		1.00	KIT BÁSICO PARA DERRAMES DE HIDROCARBUROS		113.04	0.00	0.00	0.00	113.04
CHAI MAL LA		5.00	CHALECOS TIPO MALLA		3.04	0.00	0.00	0.00	15.20
GINPEL 120 0M		1.00	ROLLO DE CINTA PELIGRO COLOR AMARILLO DE 200M		6.96	0.00	0.00	0.00	6.96
GAFECO		4.00	GAFAS TRANSPARENTES ECONÓMICAS		2.61	0.00	0.00	0.00	10.44
GAFECOS		1.00	GAFAS OSCURAS ECONÓMICAS		3.48	0.00	0.00	0.00	3.48
PII 2032		2.00	PII AS 2032		1.74	0.00	0.00	0.00	3.48

Información Adicional

Telefono: 0985190910

Email: claudio.cayambe@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	175.49

SUBTOTAL 15%	152.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	152.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	22.89
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	175.49
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**MARTINEZ ROBALINO WASHINGTON WILFRIDO**

DEPOSITO DE CEMENTO MARTINEZ

**Dirección:** GENERAL VILLAMIL Y 24 DE MAYO

**Matriz:**

**Dirección:** GENERAL VILLAMIL Y 24 DE MAYO

**Sucursal:**

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI**

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1600231169001

**FACTURA**

No 001-001-000093630

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

3007202501160023116900120010010000936307477040614

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-07-30T19:13:02-05:00

**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN

**EMISIÓN:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



3007202501160023116900120010010000936307477040614

**Razón Social/Nombres y Apellidos:** CAYAMBE GUILCAPI CLAUDIO FERMIN

**Identificación:** 1600462723001

**Fecha Emisión:** 2025-07-30

**Guía Remisión:**

**Dirección:** LUIS CARRION Y BOBONAZA SHELL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
AGM251		12.00	ARMICO GALV PM100 E2.50 D1.20M 2P	111.6000	0.00	1339.20
ARM15		44.00	ARMICO GALV PM100 E 2.50 D1.5M 10C 2P	137.7782	0.00	6062.24
ARM2250		12.00	ARMICO GALV PM100 E2.50 D 2.00MTS 10C 2P	181.8696	0.00	2182.44
PS1686		1930.00	PERNOS Y TUERCAS PARA ARMICOS	0.0000	0.00	0.00

**Información Adicional**

**Dirección:** LUIS CARRION Y BOBONAZA SHELL

**Teléfono:** s/n

**E-mail:**

**Observaciones:**

Forma de Pago	Valor	Plazo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11021.46	0 Días

**Contactos:** Telf: 0999215783 - 0987133867

Email: wmartinezr01@live.com

<b>SUBTOTAL 15.00%</b>	9583.88
<b>SUBTOTAL 0%</b>	0.00
<b>SUBTOTAL No objeto de IVA</b>	0.00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	9583.88
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>ICE</b>	0.00
<b>IVA 15.00%</b>	1437.59
<b>IRBPNR</b>	0.00
<b>PROPINA</b>	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	11021.46



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO



AHORRO POR SUBSIDIO:


(Incluye IVA cuando corresponda)

Proveedor del servicio: computmax.ec

Registro 3. Entrega de equipos de protección personal

	FECHA:	02-06-2025					
	PROYECTO	"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"					
CONTRATISTA:		Ing. Claudio Fermin Cayambe Guilcapi					
LUGAR:		Shell					
PERSONAL DE LA EMPRESA		<input checked="" type="checkbox"/>					
SUBCONTRATISTA		<input type="checkbox"/>					
COMUNIDADES		<input type="checkbox"/>					
TEMA:		Entrega de Equipos de Protección Personal					
INSTRUCTOR:		Ing. Miguel Ángel Miranda Montahuano		CI: 1600487548			
DATOS GENERALES		EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL				RECEPCIÓN	
Nombres:	Cedula:	c	c	g	b	g	m
		a	h	u	o	a	a
		s	a	a	t	f	s
		c	l	n	a	a	c
		o	e	t	s	s	a
			r				r
			i				i
			l				l
			a				a
Jorge Brito	166233950	x	x		x		
Pedro Pucjuel	150039699-7	x	x		x		
Wiz Wiz	160026076	x	x		x		
DECLARO A VER RECIBIDO LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AQUÍ SEÑALADOS, ASÍ COMO LAS INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTO USO Y ACEPTÉ EL COMPROMISO QUE SE SOLICITA DE:							Entregado por:
a. Utilizar el equipo durante la jornada de trabajo. b. Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización. c. Solicitar un nuevo equipo en caso de pérdida o deterioro del mismo.							 Ing. Miguel Miranda

	FECHA:	01 - 07 - 2025					
	PROYECTO	"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"					
CONTRATISTA:	Ing. Claudio Fermin Cayambe Guilcapi						
LUGAR:	Shell						
PERSONAL DE LA EMPRESA	<input checked="" type="checkbox"/>						
SUBCONTRATISTA	<input type="checkbox"/>						
COMUNIDADES	<input type="checkbox"/>						
TEMA:	Entrega de Equipos de Protección Personal						
INSTRUCTOR:	Ing. Miguel Ángel Miranda Montahuano	Ci: 1600487548					
<b>DATOS GENERALES</b>		<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL</b>				<b>RECEPCIÓN</b>	
Nombres:	Cedula:	c a s c o	c h l e o	g u l n e s	b t a s	g f a r l i a	Firma
José Barrozo	050345679	X	X		X		<i>José Barrozo</i>
CHRISTIAN POROZ	16003869	X	X				<i>CHRISTIAN POROZ</i>
Edoardo Perez	1704385148	X	X				<i>Edoardo Perez</i>
DECLARO A VER RECIBIDO LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AQUÍ SEÑALADOS, ASÍ COMO LAS INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTO USO Y ACEPTÉ EL COMPROMISO QUE SE SOLICITA DE:						Entregado por:	
a. Utilizar el equipo durante la jornada de trabajo. b. Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización. c. Solicitar un nuevo equipo en caso de pérdida o deterioro del mismo.						 Ing. Miguel Miranda	

	FECHA:	01-08-2025						
	PROYECTO	"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"						
CONTRATISTA:	Ing. Claudio Fermin Cayambe Guilcapi							
LUGAR:	Shell							
PERSONAL DE LA EMPRESA	<input checked="" type="checkbox"/>							
SUBCONTRATISTA	<input type="checkbox"/>							
COMUNIDADES	<input type="checkbox"/>							
TEMA:	Entrega de Equipos de Protección Personal							
INSTRUCTOR:	Ing. Miguel Ángel Miranda Montahuano	CI: 1600487548	<i>[Signature]</i>					
DATOS GENERALES		EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL			RECEPCIÓN			
Nombres:	Cedula:	c a s c o	c h l n e o	g u a a t s	b o a a s	g a c r i l l a	m a s a	Firma
Luis Romero	050345803	X	X		X			<i>[Signature]</i>
Eduardo Perez	1704385848	X	X					<i>[Signature]</i>
Cristian Perez	1600386355	X	X					<i>[Signature]</i>
DECLARO A VER RECIBIDO LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AQUÍ SEÑALADOS, ASÍ COMO LAS INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTO USO Y ACEPTÉ EL COMPROMISO QUE SE SOLICITA DE:							Entregado por:	
a. Utilizar el equipo durante la jornada de trabajo. b. Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización. c. Solicitar un nuevo equipo en caso de pérdida o deterioro del mismo.								<i>[Signature]</i> Ing. Miguel Miranda

Registro 4. Factura Contenedores Metálicos

**Depósito de Tanques y Pomas Virgen del Cisne**  
 Velasco Toapanta Antonio Adolfo  
 Dr. Vía Shell 50 50 V 50  
 Puyo - Pastaza - Ecuador - Cel: 095 86 46 953  
**RUC: 1600968265001**  
 Autorización SRI N° 1132807375  
 \*Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE\*

**NOTA DE VENTA**  
 001-001-  
**000000959**  
 Fecha de Emisión: **18/06/2025**  
 DIA MES AÑO

Sr(es): Claudio Cayambe  
 Dirección: Shell Telf.: \_\_\_\_\_  
 RUC/C.I.: 1600462723001 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V./ VENTA
2	Tanques de Metal	15	30

**FORMA DE PAGO**  
 Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta De Crédito/ Débito  Otros

**TOTAL USD** 30

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_  
 RECIBI CONFORME: \_\_\_\_\_  
 Original: Adquirente / Copia: Emisor  
 \*Imp. & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 \*Aut.: 14083 \*RUC: 1803599388001 \*José Luis Cárdenas Fonseca  
 Impreso desde N° 000901 al 001200 Fecha Impresión: 07-04-2025 Válido hasta: 07 de Abril.-/2026

**Depósito de Tanques y Pomas Virgen del Cisne**  
 Velasco Toapanta Antonio Adolfo  
 Dr. Vía Shell 50 50 V 50  
 Puyo - Pastaza - Ecuador - Cel: 095 86 46 953  
**RUC: 1600968265001**  
 Autorización SRI N° 1132807375  
 \*Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE\*

**NOTA DE VENTA**  
 001-001-  
**000001002**  
 Fecha de Emisión: **23/04/2025**  
 DIA MES AÑO

Sr(es): Claudio Cayambe  
 Dirección: Shell Telf.: 0984647892  
 RUC/C.I.: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_


Cant.	DETALLE	P. Unit.	V./ VENTA
2	Tanques Metálicos	15	30

**FORMA DE PAGO**  
 Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta De Crédito/ Débito  Otros

**TOTAL USD** 30

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_  
 RECIBI CONFORME: \_\_\_\_\_  
 Original: Adquirente / Copia: Emisor  
 \*Imp. & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 \*Aut.: 14083 \*RUC: 1803599388001 \*José Luis Cárdenas Fonseca  
 Impreso desde N° 000901 al 001200 Fecha Impresión: 07-04-2025 Válido hasta: 07 de Abril.-/2026

Registro 5. Registro de Manejo de Desechos



**FECCHA:** Periodo 01/06/2025 hasta 30/06/2025

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO FERMIN CAYAMBE GUILCAPI

**LUGAR:** SHELL

**TEMA:** REGISTRO DE MANEJO DE LOS DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS


**GENERACION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS**

Tipo de residuo	Cantidad total, del desecho	Unidad Volumen O Peso	Reciclaje	Relleno Sanitario	Nombre o empresa gestora De residuos	Observaciones
Papel y cartón	2	kg		X	GADM Mera	
Plástico	3	kg		X	GADM Mera	
Chatarra						
Vidrio						
Textiles						
Vegetales						
Restos alimenticios	7	kg		X	GADM Mera	
Madera	3	kg		X	GADM Mera	
Ordinarios Comunes	6	kg		X	GADM Mera	
Inertes						


**GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES**

Descripción (nombre de desecho de acuerdo al Listado nacional)	Código del desecho	Contenedor		Cantidad Tota del desecho	Unidad Volumen peso	Nro. Registro como generador de desechos	Manifiesto único de entrega	Situación es de emergencia	Gestor de residuos (código del gestor)
		Tipo	Cantidad						

**Notas:**  
No se generan desechos peligrosos durante el presente periodo de reporte

**Nombre del responsable:** Miguel Miranda      **Cargo:** Técnico Ambiental      **Firma:** 



<b>FECHA:</b>	Periodo 01/07/2025 hasta 31/07/2025								
<b>PROYECTO:</b>	"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"								
<b>CONTRATISTA:</b>	ING. CLAUDIO FERMIN CAYAMBE GUILCAPI								
<b>LUGAR:</b>	SHELL								
<b>TEMA:</b>	REGISTRO DE MANEJO DE LOS DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS								
<b>GENERACION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS</b>									
Tipo de residuo	Cantidad total, del desecho	Unidad Volumen O Peso	Reciclaje	Relleno Sanitario	Nombre o empresa gestora De residuos	Observaciones			
Papel y cartón	1	kg		x	GADM Mera				
Plástico	2	kg		x	GADM Mera				
Chatarra									
Vidrio									
Textiles									
Vegetales									
Restos alimenticios	2	kg		x	GADM Mera				
Madera									
Ordinarios Comunes	3	kg		x	GADM Mera				
Inertes									
<b>GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES</b>									
Descripción (nombre de desecho de acuerdo al Listado nacional)	Código del desecho	Contenedor		Cantidad Tota del desecho	Unidad Volumen peso	Nro. Registro como generador de desechos	Manifiesto único de entrega	Situación es de emergencia	Gestor de residuos (código del gestor)
		Tipo	Cantidad						
<b>Notas:</b>									
No se generaron desechos Peligrosos durante el presente periodo de reporte.									
<b>Nombre del responsable:</b>				<b>Cargo:</b>			<b>Firma:</b>		
Miguel Miranda				Técnico Ambiental					



**FECHA:** Periodo 01-08-2015 hasta 31-08-2015

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**CONTRATISTA:** ING. CLAUDIO FERMIN CAYAMBE GUILCAPI

**LUGAR:** SHELL

**TEMA:** REGISTRO DE MANEJO DE LOS DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS

**GENERACION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS**

Tipo de residuo	Cantidad total, del desecho	Unidad Volumen O Peso	Reciclaje	Relleno Sanitario	Nombre o empresa gestora De residuos	Observaciones
Papel y cartón	0,5	kg		X	GADM Mera	
Plástico	1	kg		X	GADM Mera	
Chatarra						
Vidrio						
Textiles						
Vegetales						
Restos alimenticios	1,5	kg		X	GADM Mera	
Madera						
Ordinarios Comunes	1	kg		X	GADM Mera	
Inertes						

**GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES**

Descripción (nombre de desecho de acuerdo al Listado nacional)	Código del desecho	Contenedor		Cantidad Tota del desecho	Unidad Volumen peso	Nro. Registro como generador de desechos	Manifiesto único de entrega	Situación es de emergencia	Gestor de residuos (código del gestor)
		Tipo	Cantidad						

**Notas:**






No se generaron desechos Peligrosos durante el presente periodo de reporte.






**Nombre del responsable:** Manuel Miranda






**Cargo:** Técnico Ambiental

**Firma:**

Registro 6. Registro de Asistencia de Capacitaciones

		<b>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / SISTEMA DE GESTIÓN DE SST</b>	
		<b>REGISTRO DE CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	
PROYECTO:	"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"		
TEMA:	Capacitación del Plan de Manejo Ambiental		
INSTRUCTOR:	Ing. Miguel Ángel	CI: 1600487548	
	Miranda Montahuano		
LUGAR:	Shell 05-06-2025		
PERSONAL DE LA EMPRESA		<input checked="" type="checkbox"/>	
SUBCONTRATISTA		<input type="checkbox"/>	
COMUNIDADES		<input type="checkbox"/>	
n.º	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Wes O. Arz	1600226276	
2	Jorge Brito	160062395-0	
3	Rodrigo Pineda	150039699-7	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			






		<b>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / SISTEMA DE GESTIÓN DE SST</b>	
		<b>REGISTRO DE CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	
PROYECTO:	"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"		
TEMA:	Capacitación Primeros Auxilios		
INSTRUCTOR:	Ing. Miguel Ángel	Cl: 1600487548	
	Miranda Montahuano		
LUGAR:	Shell 03-07-2025		
PERSONAL DE LA EMPRESA			<input checked="" type="checkbox"/>
SUBCONTRATISTA			<input type="checkbox"/>
COMUNIDADES			<input type="checkbox"/>
n.-	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Los Romero	050345709-9	
2	CRISTIAN Ponce	1600386955	
3	Eduardo Perez	1704385648	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

		<b>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / SISTEMA DE GESTIÓN DE SST</b>	
		<b>REGISTRO DE CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	
<b>PROYECTO:</b>		"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"	
<b>TEMA:</b>		Capacitación Seguridad Industrial y Utilización del EPP	
<b>INSTRUCTOR:</b>		Ing. Miguel Ángel Miranda Montahuano	CI: 1600487548 
<b>LUGAR:</b>		Shell 12-06-2025	
<b>PERSONAL DE LA EMPRESA</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>SUBCONTRATISTA</b>		<input type="checkbox"/>	
<b>COMUNIDADES</b>		<input type="checkbox"/>	
n.-	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	W. O. A. R.	1600228276	
2	Jorge Brito	160063395-2	
3	Rodrigo Pujol	160039699-7	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			




		<b>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / SISTEMA DE GESTIÓN DE SST</b>	
		<b>REGISTRO DE CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	
<b>PROYECTO:</b>		"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"	
<b>TEMA:</b>		Capacitación Primeros Auxilios	
<b>INSTRUCTOR:</b>		Ing. Miguel Ángel Miranda Montahuano	CI: 1600487548 
<b>LUGAR:</b>		Shell 08-08-2025	
<b>PERSONAL DE LA EMPRESA</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>SUBCONTRATISTA</b>		<input type="checkbox"/>	
<b>COMUNIDADES</b>		<input type="checkbox"/>	
n.-	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Luis Romero	0503451079	
2	Eduardo Perez	1704385648	
3	Cristian Perez	1600386955	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			












		<b>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / SISTEMA DE GESTIÓN DE SST</b>	
		<b>REGISTRO DE CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	
<b>PROYECTO:</b>	"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"		
<b>TEMA:</b>	Capacitación en Manejo de los residuos Sólidos		
<b>INSTRUCTOR:</b>	Ing. Miguel Ángel Miranda Montahuano	Ci: 1600487548	
<b>LUGAR:</b>	Shell 22-06-2025		
<b>PERSONAL DE LA EMPRESA</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>SUBCONTRATISTA</b>	Shell	<input type="checkbox"/>	
<b>COMUNIDADES</b>		<input type="checkbox"/>	
n.-	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Walter Ortiz	1600226276	
2	Jorge Brito	160063395-0	
3	Rodrigo Lengua	150039699-7	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			








		<b>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / SISTEMA DE GESTIÓN DE SST</b>	
<b>PROYECTO:</b>		<b>REGISTRO DE CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	
<b>PROYECTO:</b>		"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"	
<b>TEMA:</b>		<i>Registro de asistencia y participación (Reuniones, foros, capacitaciones o practicas de Entrenamiento)</i>	
<b>INSTRUCTOR:</b>		Ing. Miguel Ángel Miranda Montahuano	CI: 1600487548 <i>[Signature]</i>
<b>LUGAR:</b>		<i>Shell 18-06-2025</i>	
<b>PERSONAL DE LA EMPRESA</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>SUBCONTRATISTA</b>		<input type="checkbox"/>	
<b>COMUNIDADES</b>		<input type="checkbox"/>	
n.-	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	<i>Luis Ortiz</i>	<i>1600 2262 76</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Nestor Payuay</i>	<i>1600 1243 70</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>Pablo Vargas</i>	<i>16010 28 077</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>Rodrigue Parafiel</i>	<i>1500396 997</i>	<i>[Signature]</i>
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



		<b>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / SISTEMA DE GESTIÓN DE SST</b>	
		<b>REGISTRO DE CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	
<b>PROYECTO:</b>		"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"	
<b>TEMA:</b>		Registro de asistencia y participación o prácticas de Entrenamiento	
<b>INSTRUCTOR:</b>		Ing. Miguel Ángel Miranda Montahuano	CI: 1600487548 
<b>LUGAR:</b>		Shell 11-07-2025	
<b>PERSONAL DE LA EMPRESA</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>SUBCONTRATISTA</b>		<input type="checkbox"/>	
<b>COMUNIDADES</b>		<input type="checkbox"/>	
n.-	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Luis Romero	050345707-9	
2	CRISTIAN ROMERO	1600386955	
3	Edoardo Perez	1704585648	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

		<b>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / SISTEMA DE GESTIÓN DE SST</b>	
		<b>REGISTRO DE CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	
<b>PROYECTO:</b>		"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"	
<b>TEMA:</b>		Capacitación de los Recursos Humanos y Manejo	
<b>INSTRUCTOR:</b>		Ing. Miguel Ángel Miranda Montahuano	CI: 1600487548
<b>LUGAR:</b>		Shell 22-08-2025	
<b>PERSONAL DE LA EMPRESA</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>SUBCONTRATISTA</b>		<input type="checkbox"/>	
<b>COMUNIDADES</b>		<input type="checkbox"/>	
n.-	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Luis Romero	0503451279	
2	Eduardo Perez	1704385648	
3	Cristian Perez	1600386955	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Registro 7. Registro de Asistencia Socialización

		<b>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / SISTEMA DE GESTIÓN DE SST</b>	
		<b>REGISTRO DE CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	
<b>PROYECTO:</b>		"CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE PASTAZA"	
<b>TEMA:</b>		Registro asistencia y Participación operadores de Grúas	
<b>INSTRUCTOR:</b>		Ing. Miguel Ángel Miranda Montahuano	CI: 1600487548 
<b>LUGAR:</b>		Shell 14 - 08 - 2025	
<b>PERSONAL DE LA EMPRESA</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>SUBCONTRATISTA</b>		<input type="checkbox"/>	
<b>COMUNIDADES</b>		<input type="checkbox"/>	
n.-	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Los Romero	050345107-9	
2	Eduarda Perez	1600386455	
3	Cristian Perez	1404795648	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

⋮

## PLAN MÍNIMO DE CONTINGENCIA

### PROYECTO:

**“CONSTRUCCION DE AFIRMADO DE VARIAS VIAS  
UBICADAS EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA,  
PROVINCIA DE PASTAZA”**

### PARA:

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA**



GOBIERNO DE  
**PASTAZA**  
*El Gobierno del Añono*

AGOSTO 2025

## INDICE

NORMATIVA LEGAL.....	4
<b>POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DEL ING. CLAUDIO FERMÍN CAYAMBE GUILCAPI 4</b>	
CAPITULO I .....	5
<b>DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS .....</b>	
Artículo 1.- OBLIGACIONES DEL ING. CLAUDIO FERMÍN CAYAMBE GUILCAPI .....	5
Artículo 2.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES .....	6
Artículo 3.- PROHIBICIONES DE ING. CLAUDIO FERMÍN CAYAMBE GUILCAPI .....	7
Artículo 4.- PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES .....	7
Artículo 5.- INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES - INCENTIVOS.....	8
Artículo 6.....	8
CAPITULO II .....	9
<b>DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES.....</b>	
Artículo 7.- RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS:.....	9
Artículo 8.- RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR O PATRONO.....	9
CAPITULO III .....	10
<b>PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA POBLACION VULNERABLE .....</b>	
Artículo 9.- PERSONAL FEMENINO .....	10
Artículo 10.- MENORES DE EDAD .....	10
Artículo 11.- PERSONAL EXTRANJERO .....	10
CAPITULO IV .....	10
<b>DE LOS ACCIDENTES MAYORES .....</b>	
Artículo 12.- PARA PREVENIR LA OCURRENCIA DE EVENTOS COMO INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN SE ADOPTARÁN LOS SIGUIENTES CONTROLES.....	10
Artículo 13.- DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS.....	10
CAPITULO V.....	11
<b>SEÑALIZACIÓN .....</b>	
<b>DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES .....</b>	
Artículo 14.- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES .....	12
Artículo 15.- REGISTRO DE ACCIDENTES – INCIDENTES .....	13
CAPITULO VII .....	13
<b>DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS .....</b>	
Artículo 16.- INDUCCIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN .....	13
CAPITULO VIII .....	14
<b>DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL .....</b>	
Artículo 17.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y ROPA DE TRABAJO .....	14
CAPITULO IX.....	15
<b>NORMATIVA ISO 2266-2013 .....</b>	
REQUISITOS.....	15
CAPITULO X.....	19



<b>DE LA GESTIÓN AMBIENTAL.....</b>	<b>19</b>
Artículo 18.- GESTIÓN AMBIENTAL .....	19
<b>CAPITULO X.....</b>	<b>20</b>
<b>FENOMENOS NATURALES .....</b>	<b>20</b>
SISMO O TERREMOTO:.....	20
INUNDACIONES: .....	21
DERRAMES .....	22
EXPLOSIONES .....	24
ERUPCIONES VOLCANICAS .....	27
<b>CAPITULO XII .....</b>	<b>29</b>
<b>EMERGENCIAS MEDICAS.....</b>	<b>29</b>
<b>PRINCIPIOS DE EMERGENCIA .....</b>	<b>29</b>
<b>DISPOSICIONES GENERALES O FINALES .....</b>	<b>30</b>



## PLAN MÍNIMO DE CONTINGENCIA

### NORMATIVA LEGAL

- Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decisión 584
- Reglamento al instrumento andino de Seguridad y Salud. Resolución 957
- Reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Decreto 2393
- Reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos de empresas. Acuerdo No. 1404
- Colores y Señales de Seguridad. Norma Técnica Ecuatoriana INEN ISO 3864-1
- Colores de identificación de tuberías Norma Técnica Ecuatoriana INEN 440:84
- Transporte, Almacenamiento y Manejo de materiales peligrosos. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266
- Etiquetado de Precaución. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2288
- Extintores portátiles Inspección, Mantenimiento y Recarga. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 739 Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas. Acuerdo N°174 Convenios Internacionales OIT ratificados por la República del Ecuador.
- Acuerdo Ministerial 220. Guía para elaboración de Reglamentos Internos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

### **POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DEL ING. CLAUDIO FERMÍN CAYAMBE GUILCAPI**

El Ing. Claudio Cayambe. Quien realiza un trabajo responsable especialmente para el mejoramiento de la parroquia Shell buscando la satisfacción de la población, con puntualidad y calidad en la entrega de su trabajo.

Con este fin, el Ing. Claudio Fermín Cayambe Guilcapi se compromete a:

- Cumplir con la legislación vigente aplicable, así como con los compromisos adquiridos con las partes interesadas.
- Gestionar y prevenir los riesgos, laborales, de salud, ambientales y de calidad que se generan como parte de las actividades del trabajo



ejecutado.

- Promover, la creación de una cultura basada en el compromiso con la seguridad, la salud y el ambiente, mediante la continua información y supervisión de las tareas propias de la ejecución de los trabajadores solicitados.
- Comunicar y promover la adopción de estos compromisos a sus colaboradores.
- Compromiso de optimizar los recursos económicos, técnicos, y humanos
- Mejora continua en seguridad, salud de los trabajadores
- Cumplir con la legislación vigente en Seguridad y Salud.

**PLAN MÍNIMO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES RAZÓN  
SOCIAL Y DOMICILIO.**

**ING. CLAUDIO FERMÍN CAYAMBE GUILCAPI**

1600462723001

Shell/Pastaza

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:**

Construcciones de obras civiles.

**OBJETIVOS DEL PLAN MÍNIMO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

1. Cumplir con toda la normativa nacional vigente
2. Prevenir los riesgos laborales, sean estos provenientes de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, señalando los actos o condiciones inseguras.
3. Crear una cultura de prevención de Riesgos Laborales en las actividades de trabajo.

**CAPITULO**

**LO I DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS**

**Artículo 1.- OBLIGACIONES DEL ING. CLAUDIO FERMÍN CAYAMBE GUILCAPI**

El empleador tendrá las siguientes obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo:



- a) Formular objetivos, planes y programas y apoyar el cumplimiento de los mismos, involucrando la participación de los trabajadores.
- b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con el fin de programar planes de acción preventivos y correctivos.
- c) Controlar los riesgos identificados, en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando las medidas colectivas sobre las individuales.  
En caso de  
que estas medidas sean insuficientes, se deberá proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, la ropa de trabajo y/o de protección personal necesarios.
- d) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Plan Mínimo de Seguridad y Prevención de Riesgos y difundirlo entre todos sus trabajadores.

#### **Artículo 2.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES**

Los trabajadores tendrán el derecho a:

- a) Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado que garantice su salud, seguridad y bienestar.
- b) Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los trabajadores tienen derecho a interrumpir su actividad cuando, por motivos razonables, considere que existe un peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de otros trabajadores, previa la notificación y verificación de su patrono. En tal supuesto, no podrán sufrir perjuicio alguno, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.
- c) A recibir información sobre los riesgos laborales
- d) Solicitar inspecciones al centro de trabajo

Los trabajadores tendrán las siguientes obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales:

- a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo, así como con las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos.
- b) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como

los equipos de protección individual y colectiva, cuando aplique.

- c) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesarios, capacitados.
- d) Informar a sus superiores acerca de acciones o condiciones inseguras de cualquier situación de trabajo (actividades, equipos, instalaciones, herramientas, entre otras), que a su juicio entrañe, por motivos razonables un peligro para la Seguridad o la Salud de los trabajadores.
- e) Informar a su Jefe Directo oportunamente, sobre cualquier dolencia que sufran y que se haya originado como consecuencia de las labores que realizan o de las condiciones y ambiente de trabajo.
- f)

**Artículo 3.- PROHIBICIONES DE ING. CLAUDIO FERMÍN CAYAMBE GUILCAPI**

Quedará totalmente prohibido.

- a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres; salvo que previamente se adopten las medidas preventivas necesarias para la defensa de la salud.
- b) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de embriaguez o bajo de la acción de cualquier toxico.
- c) Facultar al trabajador el desempeño de sus labores, sin el uso de la ropa de trabajo y equipo de protección personal.
- d) Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que no cuenten con las defensas o guardas de protección u otras seguridades que garanticen la integridad física de los trabajadores.
- e) Dejar de cumplir las disposiciones o indicaciones que sobre prevención de riegos establezcan las autoridades competentes en materia de Seguridad y Salud del trabajo
- f) Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue entrenado previamente.
- g) Contratar niñas y niños y adolescentes, queda prohibido.

**Artículo 4.- PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES**



Está prohibido a los trabajadores:

- a) Participar en riñas, juegos de azar o bromas en lugares y horas de trabajo. Cometer imprudencias, bromas o actos que puedan causar accidentes de trabajo.
- b) Consumir drogas o alcohol en el trabajo o en cualquier instalación de la entidad. A la persona que infrinja esta regla se le retirará del área de trabajo y se le suspenderá inmediatamente de sus funciones.
- c) Efectuar trabajos no autorizados, sin el debido permiso o entrenamiento previos.
- d) Modificar, destruir, remover sistemas de seguridad o accesorios de protección de los equipos, herramientas, maquinaria y áreas restringidas con que cuenta la entidad.

#### **Artículo 5.- INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES - INCENTIVOS**

El Ing. Claudio Fermín Cayambe Guilcapi, adoptará las medidas necesarias para sancionar, a quienes por acción u omisión incumplan lo previsto en el presente documento y demás normas sobre prevención de riesgos laborales. La sanción se aplicará tomando en consideración, entre otros, la gravedad de la falta cometida, el número de personas afectadas, la gravedad de las lesiones o los daños producidos o que hubieran podido producirse por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias y si se trata de un caso de reincidencia.

#### **Artículo 6.-**

en caso de incumplimiento de las disposiciones constantes en el presente plan, se aplicarán las sanciones que disponen el código del trabajo y el reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo (decreto ejecutivo 2393) y de acuerdo a la gravedad de la falta cometida según se indica a continuación.

- a) **FALTAS LEVES:** Se consideran faltas leves aquellas que contravienen los reglamentos, leyes y normas, que no ponen en peligro la integridad física del trabajador, de sus compañeros de trabajo o de los bienes de la empresa-
- b) **FALTAS GRAVES:** Se consideran faltas graves todas las transgresiones

que causen daños físicos o económicos a los trabajadores, a la empresa o a terceros relacionados con la empresa, así como aquellas transgresiones que, sin causar efectivamente daños físicos o económicos, impliquen alto riesgo de producirlos.

- c) **FALTAS MUY GRAVES:** Se consideran faltas muy graves todo evento que cause daños físicos o económicos a los trabajadores, a los bienes de la empresa o a la integridad de terceros relacionados con la empresa o que sean un evento reincidente.

## CAPITULO II

### DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

#### Artículo 7.- RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS:

El Ing. Claudio Fermín Cayambe Guilcapi, nombrará un responsable de prevención de riesgos de entre todos sus colaboradores, luego de brindar la capacitación adecuada para asumir dicha función.

El responsable de prevención de riesgos tendrá las siguientes funciones:

- a) Reconocer, prevenir y controlar los riesgos laborales.
- b) Facilitar el adiestramiento de sus trabajadores en materia de seguridad.
- c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones descritas en el presente documento.
- d) Mantener la comunicación y retroalimentación en temas de prevención de riesgos, de accidentes de trabajo con todos sus colaboradores.

Deberá ser registrado conforme a la ley ante el Ministerio de Relaciones Laborales.

#### Artículo 8.- RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR O PATRONO

En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Patrono tendrá las siguientes responsabilidades:

- a. Liderar y facilitar el cumplimiento del presente documento.
- b. Asignar recursos para la adecuada ejecución de las disposiciones descritas en este Plan Mínimo de Seguridad, así como para la prevención de los Riesgos

Laborales.

- c. Mantener permanente comunicación con todos sus trabajadores, sobre todo para la prevención e identificación de riesgos, actos o condiciones inseguras.
- d. Desarrollar y ejecutar programas preventivos basados en la identificación de riesgos, aplicando controles en la fuente, en el medio de transmisión y en el trabajador.

### **CAPITULO III**

#### **PREVENCION DE RIESGOS DE LA POBLACION VULNERABLE**

##### **Artículo 9.- PERSONAL FEMENINO**

En caso de contar con personal femenino, se debe salvaguardar la salud reproductiva, evitando exposiciones a factores de riesgo, que pueden incidir sobre la trabajadora o su hijo (a)

##### **Artículo 10.- MENORES DE EDAD**

Se prohíbe la contratación de menores de edad.

##### **Artículo 11.- PERSONAL EXTRANJERO**

En caso de contar con personal extranjero, se garantizará las mismas condiciones que aplican al personal nacional, en el tema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

### **CAPITULO IV**

#### **DE LOS ACCIDENTES MAYORES**

##### **Artículo 12.- PARA PREVENIR LA OCURRENCIA DE EVENTOS COMO**

##### **INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN SE ADOPTARÁN LOS SIGUIENTES**

##### **CONTROLES:**

- a. Verificar las condiciones eléctricas de todo equipo o máquina antes de su uso.
- b. No modificar, ni realizar instalaciones eléctricas sin autorización.
- c. Evitar cargas excesivas en tomacorrientes.
- d. Almacenar adecuadamente productos químicos como pinturas, solventes y comestibles, considerando:
  - i. El área donde se los almacena deberá ser alejada de otros

materiales combustibles que pudieran favorecer la creación de un fuego.




- ii. Usar envases y tapas que cierren correctamente.
- iii. Mantener identificados todos los envases.

**Artículo 13.- DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS**

El Ing. Claudio Fermín Cayambe Guilcapi, ante una situación de emergencia deberá conocer el modo de actuación a seguir y comunicarlo a sus colaboradores. Para esto, se tendrá en cuenta lo siguiente, dentro de las instalaciones de cada proyecto y en las instalaciones propias o taller del mismo:

- a. Identificar un área segura o punto de encuentro, en caso de evacuación.
- b. Establecer salidas de emergencia que permanezcan siempre libres y sin seguro
- c. Establecer o localizar vías de evacuación hacia el área segura o punto de encuentro de cada sitio.
- d. Colocar extintores portátiles en la zona de más alto riesgo de incendio, en el caso de talleres
- e. Conocer la ubicación de extintores, hidrantes o cajetines de emergencia en los proyectos donde se ejecuten actividades.

**CAPITULO V  
SEÑALIZACIÓN**

Característica	Uso	Ejemplo
<p><b>PROHIBICIÓN:</b> Redonda, con pictograma negro, fondo blanco, borde y banda roja</p>	Prohibido el paso, prohibido estacionar, prohibido fumar, entre otros.	 
<p><b>OBLIGACIONES:</b> Obliga un comportamiento determinado, es redonda, con pictograma blanco y fondo azul</p>	Uso de equipos de protección personal	

<p><b>SOCORRO O SALVAMENTO:</b> Indicación de señales para evacuación, es rectangular o cuadrada con pictograma blanco, fondo verde</p>	<p>Vías de evacuación, salidas de emergencia, punto de primeros auxilios, teléfono de emergencia, ducha de seguridad, lavajos</p>	
<p><b>ADVERTENCIA:</b> Advierte peligros existentes. Triángulo equilátero de borde y pictograma negro sobre fondo amarillo</p>	<p>Riesgo eléctrico, riesgo de ruido, hombres trabajando, entre otros.</p>	
<p><b>RELATIVAS A EQUIPOS CONTRA INCENDIOS:</b> Indican la ubicación o lugar donde se encuentran equipos de control de incendios. Son rectangulares o cuadradas, con pictograma negro y fondo rojo</p>	<p>Extintores, hidrantes, monitoreos, pulsadores de alarmas.</p>	

## CAPITULO VI

### DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

#### Artículo 14.- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

- Es obligación del responsable, investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de insumo para desarrollar y difundir la investigación y la creación de nueva tecnología.
- Todo accidente deberá ser notificado, investigado y reportado de acuerdo con el procedimiento de notificación, investigación y reporte de accidentes e incidentes de la empresa.
- El responsable de Seguridad y Salud deberá elaborar y entregar el reporte de notificación de todo accidente con baja, es decir, que causará la pérdida de más de una jornada laboral. Dicho reporte, deberá ser enviado a la Dirección

de Riesgos del Trabajo del IESS, en el término de diez (10) días, contados desde la fecha del siniestro. En caso de ser un accidente que involucre a un tercero, bajo la modalidad de Actividades Complementarias, Servicios Técnicos Especializados o Empresas Contratistas, los representantes de dichas empresas deberán proceder con la notificación de acuerdo con lo indicado anteriormente.

#### **Artículo 15- REGISTRO DE ACCIDENTES – INCIDENTES**

- a) Será Obligación del responsable, el llevar el registro de los accidentes de trabajo e incidentes laborales ocurridos, así como las estadísticas de accidentabilidad respectiva.
- b) En el caso de empresa o institución contrastar el déficit de gestión existente en la prevención de riesgos laborales, que ocasionaron el accidente; o las medidas de seguridad aplicadas durante el trabajo, en el caso de los afiliados sin relación de dependencia o autónomos;
- c) Definir y motivar los correctivos específicos y necesarios para prevenir la ocurrencia y repetición de los accidentes de trabajo;
- d) Establecer las consecuencias derivadas del accidente del trabajo;
- e) Apoyar y controlar a las organizaciones laborales para que estas provean ambientes saludables y seguros a los trabajadores afiliados al IESS; a la aplicación de procedimientos de trabajo seguros en el caso de los afiliados sin relación de dependencia o autónomos y,
- f) Puntualizar la responsabilidad de la organización laboral y del afiliado sin relación de dependencia o autónomo en relación al accidente de trabajo.

### **CAPITULO VII**

#### **DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS**

#### **Artículo 16.- INDUCCIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN**

- a) Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales vinculados a las actividades que realizan. Complementariamente, los empleadores comunicarán las informaciones necesarias a los trabajadores sobre las medidas que se ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y salud de los mismos

- b) Todo trabajador nuevo, antes de iniciar su actividad laboral, deberá realizar el proceso de inducción específica al puesto de trabajo.
- c) Toda empresa de Actividades Complementarias, Servicios Técnicos Especializados o Empresas Contratistas, contratada por la empresa, deberá cumplir con el proceso de inducción general básico de la empresa Contratante, así como con su propio proceso de inducción al puesto de trabajo
- d) La información y capacitación en prevención de riesgos, deberá centrarse principalmente en:
  - 1. Los factores de riesgos significativos presentes en el lugar de trabajo y relacionados con las actividades a desarrollarse, en especial las de alto riesgo.
  - 2. Las lecciones aprendidas generadas a partir de la ocurrencia de accidentes y/o incidentes ocurridos en la operación.
  - 3. Las recomendaciones sugeridas después de la realización y análisis de simulacros.
  - 4. Educación para la Salud.

## **CAPIYULO VIII**

### **DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL**

#### **Artículo 17.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y ROPA DE TRABAJO**

- a) El responsable de Seguridad y Salud definirá las especificaciones y estándares que deberán cumplir los equipos de protección individual a ser utilizados por sus trabajadores.
- b) La empresa, en la realización de sus actividades, priorizará la protección colectiva sobre la individual.
- c) El equipo de protección individual requerido para cada empleado y trabajador, en función de su puesto de trabajo y las actividades que realiza, será entregado de acuerdo con los procedimientos internos.
- d) Todos los empleados y trabajadores deberían ser capacitados para el uso apropiado de los equipos de protección individual que utiliza, su correcto mantenimiento y los criterios para su reemplazo.
- e) Todo equipo de protección individual dañado o deteriorado, deberá ser



inmediatamente reemplazado antes de iniciar cualquier actividad. Para cumplir con este requerimiento, la empresa deberá mantener un stock adecuado de los equipos de protección individual para sus empleados y trabajadores.

## **CAPITULO IX NORMATIVA ISO 2266-2013**

### **REQUISITOS**

#### **1. Requisitos específicos**

##### **1.1. Personal**

1.1.1. El manejo de materiales peligrosos debe hacerse cumpliendo lo dispuesto en las leyes y reglamentos nacionales vigentes y convenios internacionales suscritos por el país.

1.1.2. Todas las personas naturales o jurídicas que almacenen, manejen y transporten materiales peligrosos deben garantizar que cuando se necesite cargar o descargar la totalidad o parte de su contenido, el transportista y el usuario deben instalar señalización o vallas reflectivas de alta intensidad o grado diamante con la identificación del material peligroso, que aislen la operación, con todas las medidas de seguridad necesarias.

1.1.3. Toda empresa que maneje materiales peligrosos debe contar con procedimientos e instrucciones operativas formales que le permitan manejar en forma segura dichos materiales a lo largo del proceso:

- a. Embalaje. Rotulado y etiquetado.
- b. Producción
- c. Carga
- d. Descarga
- e. Almacenamiento
- f. Manipulación
- g. Disposición adecuada de residuos
- h. Descontaminación y limpieza

1.1.4. Quienes manejen materiales peligrosos deben garantizar que todo el personal



que esté vinculado con la operación cumpla con los siguientes requisitos:

1.1.5. Contar con los equipos de seguridad adecuados y en buen estado, de acuerdo a lo establecido en la Hoja de seguridad de materiales.

1.1.6. Instrucción y entrenamiento específicos, documentados, registrados y evaluados de acuerdo a un programa, a fin de asegurar que posean los conocimientos y las habilidades básicas para minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes y

enfermedades ocupacionales. Se recomienda que el programa de capacitación incluya como mínimo los siguientes temas:

- a. Reconocimiento e identificación de materiales peligrosos.
- b. Clasificación de materiales peligrosos.
- c. Aplicación de la información que aparece en las etiquetas, hojas de seguridad de materiales, tarjetas de emergencia y demás documentos de transporte.
- d. Información sobre los peligros que implica la exposición a estos materiales.
- e. Manejo, mantenimiento y uso del equipo de protección personal.
- f. Planes de respuesta a emergencias.
- g. Manejo de la guía de respuesta en caso de emergencia en el transporte.

1.1.7. Todo el personal vinculado con la gestión de materiales peligrosos debe tener conocimiento y capacitación acerca del manejo y aplicación de las hojas de seguridad de materiales con la finalidad de conocer sus riesgos, los equipos de protección personal y cómo responder en caso de que ocurran accidentes con este tipo de materiales. La información debe estar en idioma español y contendrá 16 secciones:

1. Identificación del material y del proveedor.
2. Identificación de peligros.
3. Composición e información de los ingredientes peligrosos.
4. Primeros auxilios.
5. Medidas de lucha contra incendios.
6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental.



7. Manejo y almacenamiento.
8. Control de exposición / protección individual.
9. Propiedades físicas y químicas.
10. Estabilidad y reactividad.
11. Información toxicológica.
12. Información ecotoxicológica.
13. Información relativa a la eliminación de los productos.
14. Información relativa al transporte.
15. Información sobre la reglamentación.
16. Otras informaciones.
- 17.

## 1.2 Transportistas

- 1.2.1 Los transportistas deben capacitar a sus conductores mediante un programa anual que incluya como mínimo los siguientes temas:
  - a) Leyes, disposiciones, normas, regulaciones sobre el transporte de materiales peligrosos.
  - b) Principales tipos de riesgos, para la salud, seguridad y ambiente.
  - c) Buenas prácticas de envase / embalaje.
  - d) Procedimientos de carga y descarga.
  - e) Estibado correcto de materiales peligrosos.
  - f) Compatibilidad y segregación.
  - g) Planes de respuesta a emergencias.
  - h) Conocimiento y manejo del kit de derrames.
  - i) Mantenimiento de la unidad de transporte. Manejo defensivo.
  - j) Aplicación de señalización preventiva.
  - k) Primeros auxilios.
- 1.2.2 Los transportistas que manejen materiales peligrosos deben contar con los permisos de funcionamiento de las autoridades competentes.
- 1.2.3 El transportista debe garantizar que los conductores y el personal auxiliar reciban de forma inmediata a su admisión, la inducción de seguridad que abarque los temas específicos de su operación.
- 1.2.4 Los transportistas deben revisar y observar periódicamente con la autoridad competente la estructura de las rutas de tránsito, que

podrían ser causas de problemas que afecten al conductor, al vehículo, la carga y el ambiente.

- 1.2.5 Todo vehículo para este tipo de transporte debe ser operado al menos por dos personas: el conductor y un auxiliar. El auxiliar debe poseer los mismos conocimientos y entrenamiento que el conductor. El transportista es responsable del cumplimiento de este requisito.
- 1.2.6 En caso de daños o de fallas del vehículo en ruta, el transportista llamará a empresas especializadas garantizando el manejo de la carga dentro de normas técnicas y de seguridad según instrucciones del fabricante y del comercializador, de igual manera debe informar inmediatamente el daño y la presencia de materiales peligrosos a las autoridades competentes.
- 1.2.7 Los conductores deben informar al transportista de forma frecuente y regular todo lo acontecido durante el transporte. Deben comunicar, así mismo, posibles retrasos en la entrega de la carga.
- 1.2.8 Los conductores deben contar con licencia de conducir tipo E.
- 1.2.9 Antes de cada recorrido el transportista debe elaborar y entregar al conductor un plan de transporte, de tal forma que se tenga un control y seguimiento de la actividad. Un plan de transporte debe incluir:
  - a. Hora de salida de origen.
  - b. Hora de llegada al destino.
  - c. Ruta seleccionada.
  - d. Antes de cada recorrido, la empresa que maneje materiales peligrosos, en conjunto con los transportistas deben cumplir la siguiente:
    - Las jornadas máximas no deben exceder 12 horas (incluyendo la hora de la comida/cena).
    - La jornada máxima al volante (conducción) no debe exceder 9 horas de manejo. Solo por excepción, en casos de emergencias (paros, desastres naturales, daño mecánico, accidentes de tránsito, cuando sea necesario asegurar el funcionamiento de servicios de interés público con carácter urgente y excepcional) se podrá autorizar un exceso de jornada laboral de máximo 2 horas, en estos casos se debe ampliar los controles operativos sobre el conductor (supervisión de velocidad, recomendaciones dadas al

conductor, retroalimentación del conductor). Cuando se presente autorizaciones de exceso de jornada, la persona que autoriza debe documentar que el conductor recibió todas las recomendaciones de seguridad necesarias.

- a. Paradas para descanso. Se recomienda parar por 15 minutos, cada 3 horas de manejo.

Cuando por cuestiones de seguridad del transportista o del producto no ubiquen sitios seguros para descanso, un período más grande de conducción es permitido; sin embargo, en todos los casos, el conductor debe descansar antes de completar 5 horas de conducción. Cálculo del período de descanso:

- Hasta 03:00 de conducción: mínimo de 15 minutos de descanso.  
Hasta 04:00 de conducción: mínimo de 20 minutos de descanso.
- Hasta 05:00 de conducción: mínimo de 30 minutos de descanso.

El conductor no debe trabajar más de 72 horas en una semana de trabajo de 6 días consecutivos (jornada semanal).

Después de cada jornada de trabajo, el conductor debe descansar por un mínimo de 11 horas antes de empezar la jornada siguiente, con un mínimo de 45 horas de descanso semanal

El conductor debe tener un período de descanso de 1 día (24 horas) después de trabajar 6 días consecutivos.

La duración total máxima de conducción semanal, comprendidas las horas extraordinarias, no debe exceder de 56 horas por semana, ni de 96 horas máximas de conducción durante dos semanas consecutivas.

## CAPITULO X DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

### Artículo 18.- GESTIÓN AMBIENTAL

El Ing. Ing. Claudio Fermín Cayambe Guilcapi, cumplirá con la legislación nacional aplicable y vigente sobre conservación y protección del ambiente. Para cumplir dicho cometido, deberá:



1. Proveer condiciones de trabajo seguras, saludables y ambientalmente sustentables.
2. Evitar cualquier tipo de contaminación e impacto adverso sobre el ambiente y las comunidades de su área de influencia.
3. Monitorear periódicamente aquellas emisiones gaseosas, líquidas y sólidas, requeridas por la reglamentación nacional, de acuerdo con los cronogramas establecidos y aprobados por las entidades Ambientales de Control, relacionadas con las actividades de la empresa.



## CAPITULO X

### FENOMENOS NATURALES

#### SISMO O TERREMOTO:

Un sismo o un terremoto es un fenómeno natural que consiste en una sacudida de la superficie terrestre, producida por el movimiento de las capas interiores (tectónicas) de la Tierra. En el caso de sismos muy severos, la mayoría de las víctimas mueren o quedan heridas por la caída de escombros, mientras que otras perecen por incendios o inundaciones que a menudo acompañan los terremotos. Dependiendo de su intensidad, los terremotos o sismos pueden provocar diversas consecuencias en la naturaleza y para la vida humana. Entre ellas, podemos mencionar: Los sismos o terremotos son imprevistos por lo que es importante disponer de una preparación en sus tres etapas: Antes:

- Identificar una ruta de evacuación.
- Disponer de documentos personales a la mano.
- Conformar la brigada de primeros auxilios y disponer de un botiquín de emergencia.
- Eliminar obstáculos de las rutas de evacuación.
- Ubicar, señalizar las zonas de seguridad y las rutas de evacuación.
- Mantener siempre con carga el celular.
- Realizar simulacros de evacuación en caso de terremotos, con el fin de instruir a las personas sobre las medidas a tomar y determinar si el plan de emergencia es efectivo

#### Durante:

- Se debe conservar la serenidad evitando el pánico o histeria colectiva.
- Ubicarse en lugares seguros previamente establecidos.
- Evacuar el lugar una vez que el sismo haya finalizado, utilice las escaleras
- Si está en la calle permanezca lejos de casas, cables de tendido eléctrico y ventanas.
- No lleve consigo objetos pesados y no regrese por cosas que olvidó en el área del proyecto como celulares, mochilas, etc.
- Si los conductores de maquinaria pesada están conduciendo, las personas



deberán mantenerse en sus asientos o detener el vehículo y salir hasta que finalice el sismo.

- Una vez en el punto de encuentro presentarse ante su brigadista de evacuación Después:
  - Observar si alguien está herido y si es brigadista practicar primeros auxilios.
  - Dirigirse a los puntos de encuentro, sin perder la calma y sin alejarse del grupo.
  - No tocar cables de energía eléctrica que han caído, aléjese de las instalaciones del proyecto.
  - No regresar a las áreas dañadas sin previa autorización, el retorno al proyecto se lo desarrollará una vez se les haya autorizado.
  - Utilice el teléfono solo en llamadas urgentes.
  - Sintonizar la radio para conocer las medidas de emergencia adoptadas.

#### INUNDACIONES:

Las inundaciones se originan principalmente en épocas de lluvias causando pérdidas humanas y económicas. En una inundación, las aguas de los ríos, lagos y mares se desbordan cubriendo temporalmente los terrenos más bajos. Puede ser muy grave dependiendo de la profundidad que alcance el agua, su velocidad, acumulación y duración.

Antes:

- Identificar una ruta de evacuación.
- En época lluviosa tener listas las botas de caucho, poncho impermeable.
- Colocar documentos importantes en una bolsa de plástico para que no se destruyan con el agua.
- Tener a mano una linterna y asegurarse de que tenga pilas.
- Tener la radio portátil

cargada. Durante:

- Estar atento a las indicaciones emitidas por los Brigadistas de Emergencias.
- No acercarse a cables ni postes de luz.
- Buscar un lugar más seguro, subir a un lugar alto y permanecer allí.
- No atravesar ríos o zonas inundadas sin apoyo de embarcaciones o de personal especializado.



- No cruzar puentes donde el nivel de las aguas se acerque al borde del mismo, ya que sus bases pueden estar debilitadas.
- Si está dentro de maquinaria o volquetas:
- Si llega a un área inundada, dar la vuelta y tomar otra dirección.
- No intentar cruzar cauces de ríos.
- Si la maquinaria o volquetas se detiene o se atasca, abandonarlo de inmediato y subir a un lugar alto.
- Alejarse de lugares donde puedan producirse

derrumbes Después:

- No regresar a la instalación hasta que sea seguro hacerlo.
- No tocar ni pisar cables eléctricos caídos.
- No movilizar los heridos, es mejor avisar a los brigadistas de primeros auxilios y rescate para este tipo de ayuda. Asegurarse primero de que no ha habido daños estructurales en las instalaciones o fallas eléctricas que puedan ocasionar otros accidentes.
- Desalojar el agua estancada.
- Tener cuidado con los animales peligrosos, ya que ellos también buscan zonas secas.

## **DERRAMES**

Antes:

- Verificar que los tanques de almacenamiento cuenten con cubetos impermeabilizados, con una capacidad del 110% del tanque de mayor capacidad.
- Verificar que los equipos para atender derrames se encuentren operativos.
- Verificar que se cuente con kits antiderrames en sectores donde se manipule o almacene sustancias químicas líquidas.
- Verificar que los recipientes que contienen sustancias químicas o desechos peligrosos líquidos se encuentren etiquetados.
- Verificar que ductos, tanques y otros recipientes que se utilizan para el transporte o almacenamiento de las sustancias químicas se encuentran en buen estado.
- Capacitar al personal en el manejo de sustancias químicas.



- Capacitar a los trabajadores en atención a derrames.
- Identificar y definir los puntos de control de derrames que requiera

proyecto Durante:

- Comunicar al responsable del proyecto sobre el derrame identificado.
- Suspender el suministro de combustibles, o descarga de otra sustancia química o desecho peligroso líquidos que sean el objeto del derrame.
- Contener el derrame utilizando los equipos, materiales y otros recursos que disponga la instalación, en función del nivel del derrame, del tipo de sustancia, del lugar y condiciones climáticas donde ocurrió el evento.
- Evacuar la zona del derrame.
- Utilizar los mecanismos que se requieran para recolectar la sustancia derramada, en función del nivel del derrame, del tipo de sustancia, del lugar donde ocurrió y de las condiciones climáticas.

**Después:**

- Proceder con la limpieza, remediación o rehabilitación del área afectada por el derrame.
- Colocar los desechos que se generen por la limpieza o rehabilitación en recipientes etiquetados, y en el área de almacenamiento temporal de desechos para su posterior gestión con un gestor calificado.
- Aplicar las medidas correctivas necesarias para restaurar, cambiar o reparar el ducto, recipiente o dispositivo que haya producido el derrame.
- Aplicar las medidas preventivas necesarias para evitar que el derrame ocurra por el mismo motivo.
- Presentar los informes correspondientes de la atención de la emergencia.

Derrames de productos inflamables

- Elimine todas las fuentes de ignición de la zona.
- Evacue la zona afectada por el derrame.
- Consulte la Ficha de seguridad del producto.
- Utilice los equipos de protección individual correspondientes.
- Utilice un adsorbente específico para recoger este tipo de productos

(ROTISORB o producto similar), siguiendo las instrucciones del fabricante.  
NO UTILIZAR NUNCA SERRÍN.

- El material con el que se ha adsorbido el líquido derramado debe tratarse como un residuo peligroso, enváselo y etiquételo adecuadamente.
- Notifique el incidente al Servicio de Prevención.

#### Derrames de productos básicos

- Evacue la zona afectada por el derrame.
- Consulte la Ficha de seguridad del producto.
- Utilice los equipos de protección individual correspondientes.
- Utilice un adsorbente específico para recoger este tipo de productos (BASOSORB o producto similar), siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Una vez neutralizado y recogido debe lavarse la zona con abundante agua y jabón.
- El material con el que se ha adsorbido el líquido derramado debe tratarse como un residuo peligroso, enváselo y etiquételo adecuadamente.
- Notifique el incidente al Servicio de Prevención.

#### KIT ANTIDERRAME



**Antes:**












- Aprenda cómo identificar actividades sospechosas y qué hacer en caso de amenazas de explosiones.
- Asegúrese de que su empleador tenga información actualizada sobre cualquier necesidad médica que pueda tener y cómo comunicarse con los beneficiarios designados o los contactos de emergencia.
- Verificar que los extintores se encuentren en óptimas condiciones.
- Si ve algo, diga algo. Al estar alerta y reportar actividades sospechosas al responsable del proyecto, para ayudar a proteger a sus compañeros, vecinos y comunidad.

**Durante:**

- Siempre siga las instrucciones de la persona responsable del proyecto. Es posible que los servicios de emergencia no estén en la escena de inmediato.
- Mantenga la calma. Si las cosas se están cayendo a su alrededor, ubíquese debajo de una mesa o escritorio resistente.
- Si es seguro hacerlo, abandone el área lo más rápido posible. No se detenga para recuperar objetos personales o hacer llamadas telefónicas.
- Una vez salga hacia un lugar seguro, infórmele a su contacto familiar de emergencia que está a salvo enviándole un mensaje de texto o mensaje en las redes sociales. Solamente debe hacer llamadas telefónicas para emergencias.
- Aunque no esté directamente involucrado en la explosión, manténgase informado y preste atención a los funcionarios locales

**ASIGNACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ETIQUETADO**

En el SGA se indican, por este orden, el pictograma, la palabra de advertencia y la indicación de peligro para cada categoría de la clase de peligro correspondiente. Cuando la clase y/o la categoría figuran en las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Reglamentación Modelo, debajo de los requisitos del SGA se añade para cada categoría el pictograma correspondiente.

EXPLOSIVOS						
Explosivos inestables	División 1.1	División 1.2	División 1.3	División 1.4	División 1.5	División 1.6
					Número 1.5 sobre fondo anaranjado	Número 1.6 sobre fondo anaranjado
Peligro	Peligro	Peligro	Peligro	Atención	Peligro	<i>Sin palabra de advertencia</i>
Explosivo inestable	Explosivo; peligro de explosión en masa	Explosivo; grave peligro de proyección	Explosivo; peligro de incendio, de onda explosiva o de proyección	Peligro de incendio o de proyección	Peligro de explosión en masa en caso de incendio	<i>Sin indicación de peligro</i>
Sin pictograma en la Reglamentación Modelo de las Naciones Unidas (Transporte no autorizado)						

**Notas** sobre los colores de los elementos de los pictogramas según las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, Reglamentación Modelo:

- 1) Para las Divisiones 1.1, 1.2 y 1.3: símbolo (bomba explotando): negro; fondo: anaranjado; número de la División (1.1, 1.2 o 1.3, según corresponda) y grupo de compatibilidad (\*) en la mitad inferior y cifra "1" en el ángulo inferior: negro.
- 2) Para las Divisiones 1.4, 1.5 y 1.6: fondo: anaranjado; números: negro; grupo de compatibilidad (\*) en la mitad inferior y cifra "1" en el ángulo inferior: negro.
- 3) El pictograma para las Divisiones 1.1, 1.2 y 1.3 está asignado también a sustancias que presentan un riesgo subsidiario de explosión, pero sin el número de la División ni el grupo de compatibilidad (véanse también "Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente" y "Peróxidos orgánicos").

**Como prevenir una explosión**

- Alejar los tanques o estanques de los puntos de ignición (personas) para incrementar la seguridad.
- La distancia de los tanques o estanques a las líneas de propiedad, caminos o edificación importante, variará según la capacidad de almacenamiento.
- Definir zonas estancas de seguridad (muros de contención, suelo impermeable) o sistemas de conducción de derrames a lugares controlados (drenaje hacia un pozo estanco separado de éstos).
- Revisar periódicamente los sistemas de venteo (ductos que evitan que se incremente la presión en el interior de un tanque).

- Mantener protegidas de materiales extraños o agua de lluvia a estos ductos de venteo.
- Señalizar todos los tanques identificando el combustible que contiene y su capacidad.
- Nunca ubicar el recinto de almacenamiento donde atraviesan redes de agua, eléctricas, teléfonos, etc., sean aéreas o subterráneas.

#### ERUPCIONES VOLCANICAS

##### Durante:

- Trasladarse de una manera ordenada a las zonas seguras que el personal ha dispuesto para el grupo
- Si la caída de ceniza se realiza cuando usted se encuentre en el proyecto de ZONA NO SEGURA, deberá colocarse sus utensilios de protección que lleva en su mochila. Y evacuar a su ZONA SEGURA
- En las zonas seguras tomar su kit de emergencia y colocarse inmediatamente su mascarilla, gorra, gafas y guantes
- No use lentes de contacto ya que usándolos podría estar expuesto a una abrasión en la córnea.
- Informar al encargado del proyecto si debe tomar algún medicamento en especial.
- Mantener la calma y escuchar con atención las indicaciones y disposiciones que emita la persona a cargo.
- No realizar actividades que demanden un esfuerzo físico (saltar, correr entre otros)
- Si por alguna razón se introdujo ceniza a sus ojos NO REFREGARSE (esta acción puede provocar daños irreversibles en sus ojos) y avisar inmediatamente a la persona a cargo.
- Si presenta algunos síntomas fuera de lo normal avisar de manera inmediata a su profesor/a
- No abandonar de manera arbitraria e irresponsable la zona de seguridad donde usted está ubicado/a
- Mantenga cerradas las puertas y ventanas
- No use artefactos electrónicos (producen calor y baja de oxígeno)

- Si tiene la necesidad de acudir al baño coordinar el permiso con la persona responsable del grupo.
- Tomar SOLO agua envasada
- Si observa cambios en la textura o color del agua no la utilice

Después:

- Permanezca en el sitio seguro designado hasta que se realice la evacuación
- Actúe con tranquilidad y bajo las indicaciones dadas por la persona responsable
- No abandonar de manera arbitraria e irresponsable la zona de seguridad donde usted está ubicado/a
- Mantenga cerradas las puertas y ventanas.
- Después de la caída de ceniza continuar usando los utensilios de protección (mascarilla, gafas, gorra y guantes).
- No use lentes de contacto ya que usándolos podría estar expuesto a una fricción en la córnea.
- Si observa cambios en la textura o color del agua no la utilice.
- Si tiene inquietudes consúltelas con el encargado
- Utilice agua envasada.
- Si siente frío utilice su cobija.
- No ocupe las líneas telefónicas con llamadas que no sean urgentes. Si las condiciones lo permiten se retornará a las actividades del proyecto en forma normal bajo disposición de la autoridad competente.

NIVELES DE ALERTA VOLCÁNICA				
	ALERTA VERDE	ALERTA AMARILLA	ALERTA NARANJA	ALERTA ROJA
ACTIVIDAD	Sin Variación	Inestable	Variación significativa	Desarrollo de evento eruptivo
FENÓMENO	Habitual	Explosiones menores, aparición de fumarolas, incremento parámetros de monitoreo.	Probable incremento en la actividad eruptiva	Erupción mayor, incremento en cenizas
¿QUE HACER?	Sin peligro para la población	Mantenerse informado por canales oficiales de autoridades locales y nacionales	Mantenerse informado, mantenerse preparados para evacuación	Seguir las instrucciones de autoridades locales en sus lugares de trabajo

### Emergencias médicas



## CAPITULO XII EMERGENCIAS MEDICAS

Una vez que se ha realizado la llamada de emergencia, es de vital importancia esperar en el lugar hasta que las unidades de los servicios de emergencia lleguen, mientras tanto, se debe mantener la calma, tomar las medidas de seguridad respectivas y en lo posible brindar ayuda:

- Asegurar el lugar de la emergencia.
- Despejar a los curiosos del lugar de emergencia (personal de seguridad corporativa).
- Despejar las vías de acceso para las unidades de los servicios de emergencias (seguridad corporativa).
- Estabilizar a los heridos y brindar los primeros auxilios básicos si está capacitado.
- Si no está capacitado y una vez comunicado el incidente, brindar el acompañamiento hasta el arribo de la unidad médica.

### PRINCIPIOS DE EMERGENCIA

#### Regla de las T:

- Triage (Clasificar prioridades por color ATLS – rojo, amarillo, verde y negro).
- Tratar
- Transportar.
- Clasificar gravedad para TRATAR PRIORIDADES.
- TRATAR solo LO NECESARIO para transportar.
- Clasificar para EVACUAR PRIORIDADES.

#### Evacuación:

Es la movilización del paciente severamente comprometido hacia un centro de mayor complejidad en un medio de transporte adecuado.

Una evacuación médica es el traslado de emergencia que se hace a un paciente gravemente herido o enfermo que se encuentra en un centro médico donde no puede recibir el tratamiento adecuado, por lo que se toma la decisión de trasladarlo a un lugar que sí cuente con lo necesario para atender el problema eficientemente.

**CAPITULO XIII**  
**DISPOSICIONES GENERALES O**  
**FINALES**

Quedan incorporadas al presente Plan Mínimo de Prevención de Riesgos, todas las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, sus reglamentos, los reglamentos sobre seguridad y salud ocupacional en general, las normas y disposiciones emitidas por el IESS y las normas internacionales de obligatorio cumplimiento en el País, las mismas que prevalecerán en todo caso.


No existen rutas de evacuación específicas debido a que el proyecto se lo realiza en una zona abierta, lo que permite a los trabajadores tener diferentes rutas de evacuación.

Firma de responsabilidad,



Ing. Miguel Miranda  
**TÉCNICO AMBIENTAL**

FLUJOGRAMA CASEVAC

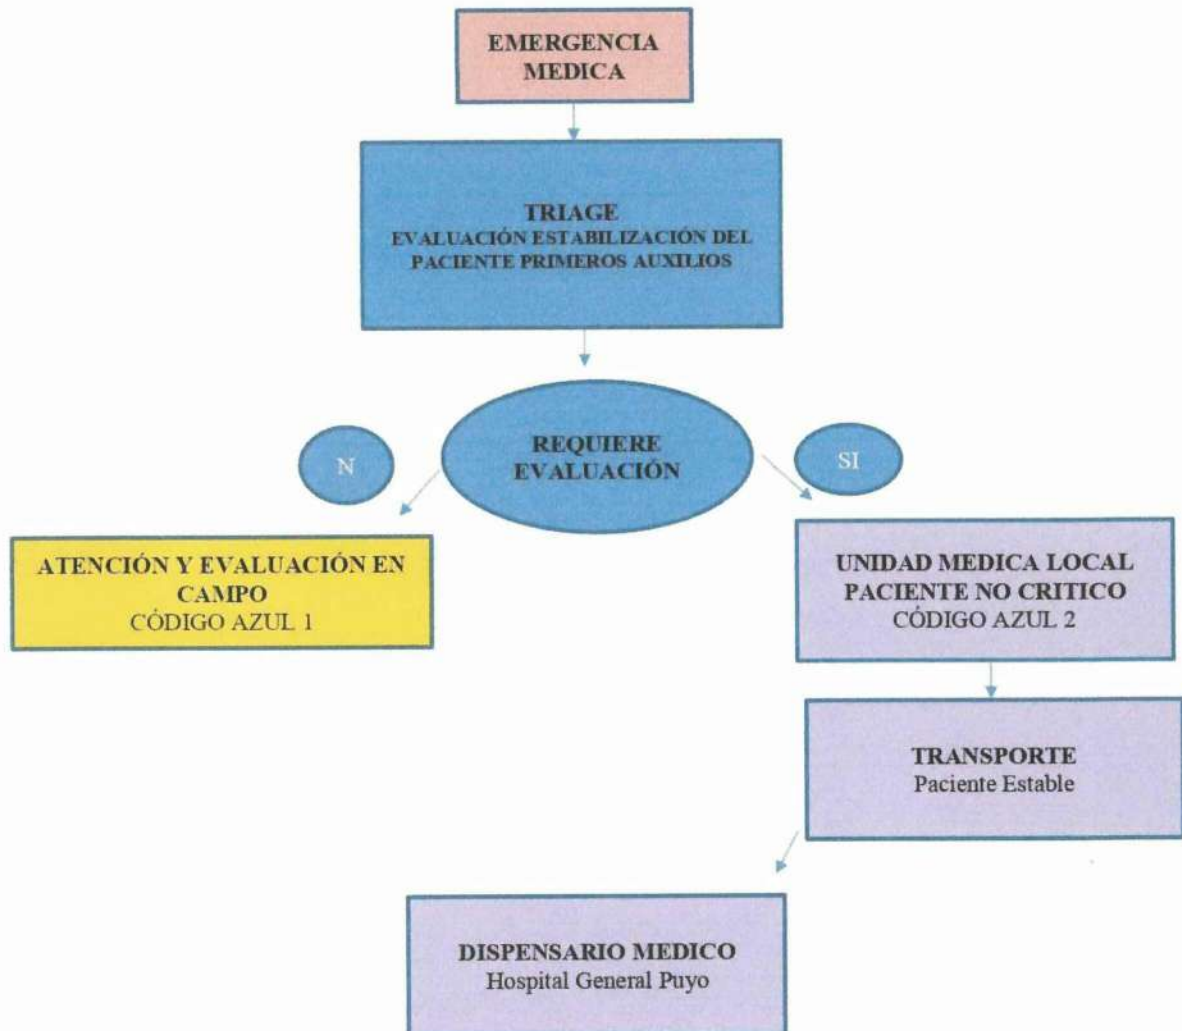

**TELÉFONOS EN CASO DE EMERGENCIA**

UBICACIÓN	CLÍNICAS	TELÉFONOS
SHELL MERA ECUADOR	POLICIA SISTEMA INTEGRADO ECU 911	(03) 2885-101
SHELL MERA ECUADOR	BOMBEROS	(03) 2790-122
SHELL MERA ECUADOR	HOSPITAL SHELL	(03) 2862-003

**CONTACTOS PERSONAL PROYECTO**

<b>CONTRATISTA</b>	0985190910
<b>TECNICO AMBIENTAL</b>	0995713324



# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

## NÓMINA MENSUAL - DETALLE DE INGRESOS

### 3 ROL SINDICALIZADOS

Mayo/2026

PPI	Funciinario	Cargo	DA NOCTU	SALARIO UNIFICADO	ART. 27	ALIMENTACION	TRANSPOORTE	SUBS FAMILIA R	SUBS ANTIGUE DAD	APORTE PATRONAL	O TERCE RESERVA	FONDO RESERVA	O CUART	TUROS EXTRA S-50	TUROS EXTRA S-100	Total Ingresos
	DIRECCION ADMINISTRATIVA	(31)	471.25	53,988.21	40,822.19	5,810.00	830.00	351.86	2,414.36	12,635.55	431.16	7,139.64	120.51	8,419.79	294.90	133,729.42
00110	1600136541 ALTAMIRANO MORALES JUAN LEONARDO	GUARDIAN	74.22	500.00	358.43	73.50	10.50	106.04	661.12	3,494.60	71.54	2,010.11	40.17	792.90	205.02	37,173.58
00514	1600354797 ALVAREZ DAGUA CRISTIAN ALFREDO	CONSERJE		531.00	358.43	66.50	9.50		23.75	113.32		81.50		88.92		1,231.41
00110	1600244352 ARBOLEDA SANABRIA JERVIS FRANKLIN	CHOFER		777.97	544.94	56.00	8.00		25.22	118.87		110.20				1,702.57
00110	1717106528 CAICOEDA RIVADENEIRA LUIS ALBERTO	GUARDIAN		500.00	358.43	73.50	10.50	4.82	20.49	104.30		71.51				1,143.06
00614	1600514234 CAINA TAPE EDWIN ORLANDO	CHOFER		482.00	363.74	63.00	9.00	4.82	20.49	125.67		86.16		188.59		1,343.47
00514	1600362618 CARRASCO SANCHEZ EDWIN FABIAN	CHOFER		525.00	544.94	52.50	7.50	9.64	19.69	144.55		99.10		53.52		1,522.67
00614	1600316081 CHICAIZA ANALUISA EDGAR ALONSO	CHOFER	100.15	500.00	358.43	66.50	9.50	9.64	18.38	130.00		89.13				1,389.09
00110	1600450736 DIAZ MENA JASON FABIAN	GUARDIAN	77.80	500.00	358.43	73.50	10.50	9.64	21.25	116.47		79.85				1,252.15
00514	1600254161 FLOREZ TAMAYO ELOY	CHOFER		785.56	544.94	59.50	8.50		20.00	113.75		110.83				1,163.62
00514	1600391070 FREIRE SANCHEZ EDGAR RODRIGO	CHOFER		672.00	410.82	66.50	9.50		41.24	161.66		104.01		27.06	138.79	1,712.23
00514	1600446759 GONZALEZ SANCHEZ JORGE FERNANDO	CHOFER		520.00	368.48	66.50	9.50		30.24	151.71		74.01				1,610.63
00514	1600567455 HERRERA FLORES VICENTE RENE	CHOFER		525.00	544.94	70.00	10.00		23.40	107.85		89.13				1,169.84
00110	1802562130 LAGUA PILCO LUIS MARCELO	GUARDIAN	54.55	500.00	358.43	63.00	9.00	9.64	24.94	130.00		76.05				1,394.01
00110	1600434441 LICUY HUATATOCA LEONARDO DELFIN	CONSERJE		500.00	358.43	63.00	9.00		21.25	110.93		71.51				1,201.21
00110	1600535502 MORALES OLALLA EDISON JOHNNY	JEFE DE TRABAJOS		500.00	358.43	52.50	7.50	4.82	17.50	104.30		71.51				1,133.38
00110	1600513457 OCAÑA ROSERO JUAN DANIEL	GUARDIAN	101.94	500.00	358.43	63.00	9.00	9.64	20.00	116.68		80.00				1,120.31
00110	1600370967 PAGUAY GUARCO DANIEL ALFREDO	CONSERJE		500.00	358.43	59.50	8.50		21.25	104.30	71.54		40.17			1,163.69
00110	1600376899 PEÑAFIEL SANMIGUEL WILSON RAMIRO	CHOFER		525.00	544.94	66.50	9.50		19.69	130.00		103.79				1,295.63
00514	1600285405 QUINTANA HARO ALBERTH ISAAC	INSP OBRAS PUBLICAS		743.00	411.53	42.00	6.00		29.72	151.38		103.79		91.39		1,576.81
00514	1600240525 QUITO QUITO JOSE FERNANDO	CHOFER		525.00	544.94	66.50	9.50		21.00	165.76		113.65		294.36		1,740.71
00614	1600156895 RUIZ CADENA DOMINGO LEONIDAS	CHOFER		566.00	544.94	63.00	9.00		28.30	134.98		92.54				1,438.76
00110	1600513566 SALENA VILLAGOMEZ FLAVIO MIGUEL	GUARDIAN	62.59	500.00	358.43	70.00	10.00		21.25	111.90		93.21		49.06		1,134.17
00514	1600439259 SOLORZANO RAMOS VICTOR MANUEL	CHOFER		525.00	544.94	66.50	9.50	4.82	19.69	135.96		93.21				1,448.68
00110	1600336901 TAPIA ROJAS KLEVER JUAN	CONSERJE		531.00	358.43	66.50	9.50	9.64	29.21	108.07		74.09				1,186.44
00110	1600560138 TAPUY AGUINDA KLEVER LEONARDO	CONSERJE		500.00	358.43	59.50	8.50	19.28	17.50	104.30		71.51				1,139.02
00110	1600403735 TRAVEZ CAJAS CRISTIAN ANIBAL	CHOFER		525.00	544.94	45.50	6.50	9.64	19.69	130.00		89.13				1,370.40
00614	1600564940 VARGAS WASHICTA RICHARD FRANKLIN	OBROERO		482.00	353.74	70.00	10.00		20.49	102.76		198.50				1,046.99
	DIRECCION ADMINISTRATIVA	(3)		1,575.00	1,634.82	192.50	27.50	4.82	64.32	471.55		198.50		671.23		4,840.24
00110	1802564847 CESPEDES PERRAZO HECTOR OSWALDO	CHOFER		525.00	544.94	66.50	9.50		19.69	182.02		89.13		428.16		1,775.81
00110	1600290850 ESPINOZA AREVALO DIEGO RODRIGO	CHOFER		525.00	544.94	63.00	9.00		21.00	130.00		89.13				1,382.07
00110	1600269052 REINOSO CASCO MANUEL ELICIO	CHOFER		525.00	544.94	63.00	9.00	4.82	23.63	159.53		103.37		243.07		1,682.36
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	(55)		33,230.68	24,076.99	3,433.50	490.50	212.08	1,524.78	7,782.89	359.62	4,393.70	80.34	6,659.41	89.88	82,334.37
	ESTUDIOS Y PROYECTOS	(38)		23,093.05	16,935.84	2,425.50	346.50	134.96	1,055.53	5,394.34	249.21	3,175.24	40.17	4,328.02	41.25	57,219.61
00514	0602113953 ALVARADO CALDERON JOSE OSWALDO	CHOFER		807.27	544.94	66.50	9.50		44.40	164.29		112.64				1,748.54
00514	1600223372 ALVAREZ ESCOBAR BAYRON RODRIGO	OPERADOR DE MOTONVELADORA		820.65	410.82	66.50	9.50	14.46	45.14	149.62		102.58				1,619.27
00514	1600283986 AREQUIPA PARRA BYRON VINICIO	AYUDANTE DE MECANICA		769.62	544.94	70.00	10.00		40.41	203.62	139.66	139.60	40.17	361.35		2,319.37
00514	1715563118 BOLLO GUARACA LUIS ALBERTO	CHOFER		807.27	544.94	66.50	9.50	9.64	42.38	230.02		79.52		540.96		2,251.21
00514	1600391757 CACERES SALCEDO GUSTAVO ADOLFO	OPERADOR EQUIPO PESADO		531.00	357.04	63.00	9.00	9.64	22.57	115.99		90.20		66.60		1,254.36
00514	1600360414 CADENA QUISHPE EDGAR JAVIER	OPERADOR EQUIPO PESADO		672.00	410.82	66.50	9.50	4.82	25.20	131.56		81.61		133.95		1,405.78
00514	1600355669 CASCO MIRANDA DANNY GERMAN	OPERADOR EQUIPO PESADO		482.00	363.74	66.50	9.50		19.28	119.03		81.61				1,280.43
00514	1102737382 CELI CARRION MANUEL ALFONSO	AYUDANTE DE MECANICA		769.62	544.94	66.50	8.00	4.82	40.41	159.72	109.55	109.50				1,797.74

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

## NÓMINA MENSUAL - DETALLE DE INGRESOS





### 3 ROL SINDICALIZADOS

Mayo/2026

PPI	Funcionario	Cargo	DA NOCTU	SALARIO UNIFICADO	ART. 27	ALIMENTACION	TRANS. PORTE	FAMILIA R	SOCS ANTIGUA R.D.	APORTE PATRONAL	O TERCE RESERVA	FONDO RESERVA O CUART	TORRAS EXTRA 100	TORRAS EXTRA S.50	Total Ingresos
00514	1600344657 COX DAVALOS ITALO FRANKLIN	CHOFER		525.00	544.94	63.00	9.00	4.82	21.00	160.07	109.75	109.75	247.53		1,665.11
00514	1600282139 CUEVA ROMERO JOSE ANTONIO	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA		672.00	410.82	66.50	9.50	30.24	30.24	184.17	126.26	126.26	432.96		1,932.45
00514	1600288771 GAMBOA ALBAN GUIDO OSWALDO	MECANICO		824.43	410.82	66.50	9.50	43.28	43.28	171.02			172.36		1,702.73
00514	1600164088 GOMEZ BASTIDAS FLAVIO LEONARDO	CHOFER		525.00	544.94	66.50	9.50	22.31	22.31	166.01			214.08		1,538.34
00514	1600519035 GONZALEZ ORDOÑEZ BYRON PAUL	CHOFER		482.00	357.04	66.50	9.50	18.08	18.08	101.94					1,104.95
00514	1600409500 GREFA VARGAS WILSON FERNANDO	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA		500.00	355.66	59.50	8.50	22.50	22.50	103.96			69.89		1,050.12
00514	1600379968 GUAMAN GUANGA HENRRY MARCO	OPERADOR EQUIPO PESADO		482.00	357.04	66.50	9.50	19.28	19.28	101.94					1,110.97
00514	1600168767 GUEVARA TORRES JOSE VICENTE	OPERADOR EQUIPO PESADO		482.00	357.04	63.00	9.00	9.64	22.90	101.94					1,115.41
00514	1400333025 JARAMILLO GUILLEN HUAHINTON JESUS	OPERADOR EQUIPO PESADO		482.00	357.04	66.50	9.50	4.82	16.87	101.94					1,108.56
00514	1600265407 JARRIN ZUÑIGA JENNIFER OSWALDO	CHOFER G 1		546.00	544.94	66.50	9.50	4.82	27.40	132.79					1,424.99
00514	1600178154 LESCANO CONSTANTE CARLOS HERIBERTO	AYUDANTE DE MECANICA		482.00	544.94	66.50	9.50	24.10	24.10	124.77					1,337.35
00514	1600393266 LLERENA JARAMILLO DERLIS DANNY	AYUDANTE DE MECANICA		482.00	544.94	66.50	9.50	9.64	16.87	124.77					1,339.76
00514	1600290330 LOPEZ CAIZA JOSE RAUL	CHOFER		775.63	544.94	66.50	9.50	40.72	40.72	203.55			313.50	41.25	2,135.14
00514	1600187247 MENDEZ CAGUANO SEGUNDO ARTURO	MECANICO		489.25	410.82	63.00	9.00	18.35	18.35	109.36					1,174.76
00514	1715225338 MENDOZA BENALCAZAR SEGUNDO RAFAEL	AYUDANTE DE MAQUINARIA		482.00	357.04	56.00	8.00	9.64	21.69	101.94					1,106.20
00514	1500623713 MOLINA MACHADO NELSON RAMIRO	OPERADOR EQUIPO PESADO		672.00	410.82	66.50	9.50	4.82	26.88	184.17			432.96		1,933.91
00514	1600381394 MORALES CABRERA JACINTO ABEL	OPERADOR DE AUTO TREN		672.00	410.82	63.00	9.00	4.82	26.88	184.17			432.96		1,929.91
00514	1600297988 ORTEGA CURIPALLO CARLOS GUILLERMO	CHOFER		525.00	544.94	59.50	8.50	21.00	21.00	150.59			169.48		1,562.25
00514	1600313819 PAREDES GONZALEZ EDINTON PATRICIO	OPERADOR DE EXCAVADORA		821.65	410.82	38.50	5.50	43.14	43.14	185.31			292.70		1,924.67
00514	1600175267 PICO ANGULO LUIS EDUARDO	OPERADOR EQUIPO PESADO		774.98	357.04	63.00	9.00	42.82	42.82	137.54					1,478.48
00514	1600159666 PIEDRA PIEDRA JORGE EDUARDO	CHOFER		566.00	544.94	66.50	9.50	28.30	28.30	145.67			87.97		1,548.75
00514	1102593330 RODRIGUEZ PIEDRA ANGEL LEONEL	OPERADOR DE RODILLO		801.83	410.82	66.50	9.50	42.10	42.10	147.34					1,579.10
00514	1600207979 SANCHEZ CEVALLOS JAIME OSWALDO	OPERADOR DE CARGADORA		827.85	410.82	63.00	9.00	4.82	43.46	185.61			288.96		1,960.77
00514	1802587566 SANCHEZ MOLINA ANGEL FABIAN	CHOFER		566.00	544.94	59.50	8.50	25.47	25.47	134.98					1,431.93
00514	1802319309 SANDOVAL HARO JOFFRE GERMANICO	CHOFER		525.00	544.94	63.00	9.00	21.00	21.00	139.75			80.28		1,478.78
00514	0602573974 SANI MOYON JUAN RICARDO	OPERADOR EQUIPO PESADO		482.00	357.04	66.50	9.50	9.64	19.28	109.16			59.42		1,187.38
00514	1600749632 TAPUY AGUNDA ANGEL WALTER	OPERADOR EQUIPO PESADO		482.00	363.74	66.50	9.50	16.87	16.87	102.76					1,111.92
00514	0501709224 UNAPUCHA ANGEL MARIO	VULCANIZADOR		520.00	357.04	63.00	9.00	4.82	18.20	106.56					1,151.68
00514	1600403883 VILLAMARIN TAPIA CRISTIAN IVAN	OPERADOR EQUIPO PESADO		482.00	357.04	66.50	9.50	9.64	16.87	101.94					1,043.49
00514	1600361123 ZUMBA MORALES DANIEL VINICIO	AYUDANTE DE MECANICA		482.00	544.94	63.00	9.00	4.82	18.08	124.77					1,332.15
00514	MECANICA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	(1)		531.00	357.04	59.50	8.50	9.64	26.55	123.18			125.80		1,241.21
00514	1600433153 ALVAREZ PAREDES OSCAR ROLANDO	CHOFER		8,831.63	6,372.58	885.50	126.50	67.48	402.01	2,075.54	110.41	1,218.46	1,829.77	48.63	22,008.68
00514	OBRAS PUBLICAS	(15)		482.00	363.74	66.50	9.50	16.87	16.87	102.76					1,111.92
00514	1600355570 AGUNDA VARGAS JORGE DARWIN	OPERADOR EQUIPO PESADO		531.00	357.04	63.00	9.00	25.22	25.22	107.90			73.97		1,167.13
00514	160027969 AGUIRRE FREIRE CARLOS IVAN	AUX. DE SERVICIOS		566.00	544.94	63.00	9.00	29.72	29.72	134.98					1,347.64
00514	1600290306 CARRANZA LOPEZ WILLIAM PATRICIO	AYUDANTE DE MECANICA		482.00	544.94	59.50	8.50	9.64	18.08	124.77					1,332.97
00514	1600541385 CHANGO SALAZAR VICTOR HUGO	OPERADOR EQUIPO PESADO		482.00	357.04	59.50	8.50	14.46	18.08	101.94					1,111.41
00514	1600358871 CHAVEZ SANABRIA CRISTIAN EDUARDO	OPERADOR EQUIPO PESADO		821.65	410.82	66.50	9.50	9.64	43.14	160.98	110.41	110.36	92.43		1,875.60
00514	1600288662 CHILQUINGA VALLEJO FRANKLIN RENE	OPERADOR DE EXCAVADORA		482.00	363.74	66.50	9.50	4.82	19.28	143.87			338.40		1,526.75
00514	1600366508 CUVI HUARACA JORGE ENRIQUE	AUXILIAR DE CAMA BAJA		482.00	363.74	66.50	9.00	18.08	18.08	112.50			66.97	13.23	1,197.65
00514	1600190068 GUALINGA GAYAS TELMO	OBROERO		482.00	363.74	56.00	8.00	23.63	23.63	130.00					1,388.70
00514	1600323941 HERNANDEZ GUARULEMA FREDDY DANILLO	CHOFER		525.00	544.94	66.50	9.50	29.14	29.14	114.39					1,215.45
00514	1600176089 HERNANDEZ PEREZ KLEVER VALDEMAR	INSP. OBRAS PUBLICAS		555.00	386.49	45.50	6.50	9.64	30.24	184.17			432.96		1,942.09
00514	1802356772 SAILEMA PALOMINO SEGUNDO HUMBERTO	OPERADOR DE EXCAVADORA		672.00	410.82	66.50	9.50	9.64	30.24	184.17					1,942.09

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**  
**NÓMINA MENSUAL - DETALLE DE INGRESOS**  
**3 ROL SINDICALIZADOS**  
**Mayo/2026**

PPI	Funcionario	Cargo	DA NOCTU	SALARIO UNIFICADO	ART. 27	ALIMENTACION	SUBS PORTE	SUBS FAMILIA R	SUBS ANTIGUE DAD	APORTE PATRONAL	O TERCE RESERVA	O FONDO RESERVA	O CUART	TUROS EXTRAS 100	TUROS EXTRA S.50	Total Ingresos
00514	160049261 VEGA JIMENEZ WILLIAM ALADINO	OPERADOR DE EXCAVADORA		708.00	410.82	70.00	10.00	4.82	35.40	178.97		122.70		354.16	179.17	1,894.87
00514	160033787 VELEZACA MATAILO GREGORIO DE JESUS	OPERADOR EQUIPO PESADO		774.98	357.04	56.00	8.00	9.64	40.69	163.61		112.17		179.17	35.40	1,736.70
00514	091935578 VELIZ VERA JOHN ANIBAL	INSP OBRAS PUBLICAS		743.00	411.53	24.50	3.50	4.82	33.44	151.38		103.79		274.29	91.39	1,567.95
00514	060292084 VILLACRES BARRENO ELVIS FABIAN	CHOFER		525.00	544.94	56.00	8.00		21.00	163.32				375.82		1,592.95
	UNIDAD VIAL			775.00	411.53	63.00	9.00		40.69	189.83				375.82		1,864.87
00614	0801133945 QUIROÑEZ CASTILLO DOCITEO ALEJANDRO	INSP OBRAS PUBLICAS		775.00	411.53	63.00	9.00		40.69	189.83				375.82		1,864.87
	DIRECCION DE DESARROLLO SUSTENTABLE			3,417.00	2,727.38	343.00	49.00	28.92	144.14	782.54		466.05		296.25		8,254.28
	DESARROLLO SUSTENTABLE			3,417.00	2,727.38	343.00	49.00	28.92	144.14	782.54		466.05		296.25		8,254.28
00614	1500647217 ANDI AGUINDA PEDRO LEONCIO	OPERADOR EQUIPO PESADO		482.00	363.74	38.50	5.50	9.64	22.90	102.76		70.45				1,095.49
00614	1600623027 ASQUI VELOZ DAYAN EDUARDO	AYUDANTE DE CULTIVO		482.00	363.74	63.00	9.00		16.87	102.76		96.18				1,037.37
00311	1600160285 MARTINEZ GUALINGA REMIGIO EDUARDO	CHOFER		525.00	544.94	56.00	8.00		23.63	140.29		83.66		158.63		1,478.78
00311	1600377772 MERINO ALARCON WILMAN ALBERTO	OBROERO		482.00	363.74	59.50	8.50	9.64	22.90	122.03		70.45				1,310.60
00614	1600375255 PINDUISACA PILCO LUIS ERNESTO	AYUDANTE DE CULTIVO		482.00	363.74	3.50	0.50		16.87	102.76		74.86		52.88		1,039.82
00311	1600361586 SARMIENTO SARMIENTO DIEGO JAVIER	AYUDANTE DE CULTIVO		482.00	363.74	63.00	9.00		16.87	109.18		70.45				1,181.17
00311	1400171649 SHARUP WAJARAI DOMINGO ROMIO	AYUDANTE DE CULTIVO		482.00	363.74	59.50	8.50		24.10	102.76		70.45				1,111.05
	DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL			500.00	355.70	66.50	9.50		20.00	103.97		71.28				1,126.95
	GESTION AMBIENTAL			500.00	355.70	66.50	9.50		20.00	103.97		71.28				1,126.95
00311	1600187832 JARRIN NAVAS NESTOR JULIO	AYUDANTE DE CULTIVO		500.00	355.70	66.50	9.50		20.00	103.97		71.28				1,126.95
	Totale=> (94.00)		471.25	53,988.21	40,822.19	5,810.00	830.00	351.86	2,414.36	12,635.55	431.16	7,139.64	120.51	8,419.79	294.90	133,729.42

DIRECTOR GENERAL  
 ING. WALTER FLORES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION  
 ING. WALTER VILLARREAL

DIRECTOR DE FINANZAS  
 ING. HENRY LEON

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS  
 ING. HENRY LEON



**Memorando Nro. GADPPZ-BODEGA-2026-7218-M**

**Puyo, 03 de junio de 2026**

**PARA:** Sr. Mgs. Luis Salvador Lascano Andrade  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** INFORMANDO CUMPLIMIENTO LAS RECOMENDACIONES: No. 6,8,9 y 12

Estimado Director, en atención al Memorando No. GADPPZ-GADPPZ-2023-6200-M, en referencia a las Recomendaciones No. 6,8,9y12 de la Contraloría General del Estado, esta Jefatura esta cumpliendo:

**Recomendación No. 6:** Al momento del ingreso de bienes producto de actas de recepción, verificará que sus características correspondan a las marcas, modelos y series, que sustente la propiedad de cada bien y que constan en la señalada acta.

**Recomendación No. 8:** Dispondrá al Jefe de Bodega que, en las diligencias de recepción, verifique que los bienes cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad, a fin de que sean registrados en el sistema de control de bienes institucionales en las mismas condiciones de compra.

**Recomendación No. 9:** Inspeccionará, verificará y recibirá los bienes e inventarios adquiridos por la entidad, con base en las especificaciones técnicas, órdenes de compra, contrato y factura, con la finalidad de suscribir el acta entrega recepción y realizar el ingreso respectivo en el sistema de control de bienes.

**Recomendación No.12:** Verificará que los bienes recibidos cumplan con los términos contenidos en las especificaciones técnicas y términos de referencia, pliegos, contrato y factura, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Lcdo. Hector Marcelo Quishpi Lliquin  
**JEFE DE BODEGA**

Anexos:

- notificacion\_administrador\_contrato\_lic-004-signed0311272001780430029.pdf
- ingreso\_1080230049001780430035.pdf
- informe\_del\_administrador\_asfalto\_4\_-\_liquidacion-signed0745306001780430041.pdf
- compromiso2026.18-signed\_(1).pdf
- 7209-m.pdf
- \_estudio\_de\_mercado\_proceso\_de\_licitacion\_asfalto-signed-signed-signed0348799001780430060.pdf



**Memorando Nro. GADPPZ-BODEGA-2026-7218-M**

**Puyo, 03 de junio de 2026**

Copia:

Sra. Lcda. Mayra Janeth Aldas Aldas - **Asistente Administrativo 1** /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Lcda. Mayra Janeth Aldas Aldas - Asistente Administrativo 1



Validar únicamente en FirmaEC.  
Firmado electrónicamente por:  
**HECTOR MARCELO  
QUISPI LLIQUN**

## UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

NOTIFICACIÓN Nro. 009-2026

**ADMINISTRADOR DE CONTRATO: LICB-GADPPZ-2025-004**

**“ADQUISICIÓN DE ASFALTO CALIENTE Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO CALIENTE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA”**

Puyo, 21 de enero de 2026

Ingeniero. -

**Victor Patricio Caiza Parra**

Presente. -

De mi consideración:

En relación con el proceso de contratación pública signado con el código: **LICB-GADPPZ-2025-004**, denominado **“ADQUISICIÓN DE ASFALTO CALIENTE Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO CALIENTE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA”**, me permito indicar lo siguiente:

La Máxima Autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, mediante Contrato por Licitación de Bienes, de fecha **31 de diciembre de 2025**, en su **cláusula décima segunda**, le designa a usted como Administrador del Contrato, en este sentido, deberá cumplir con lo dispuesto en los artículos 359 y 361 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a fin de administrar adecuadamente el proceso.

*Con este antecedente se observará lo dispuesto en el Art. 81 en concordancia con el Art. 80 y el Art. 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública:*

***Art. 81.- Estipulaciones del contrato.** - Los contratos contendrán estipulaciones específicas relacionadas con las funciones y deberes de los administradores del contrato, así como de quienes ejercerán la supervisión o fiscalización.*

*El administrador del contrato será responsable de tramitar y dar seguimiento al pago que se haya ordenado a favor del contratista. El control previo al pago que realizan los órganos financieros de la entidad deberá ser oportuno y coordinado con el administrador del contrato en caso de observaciones al expediente de pago. En caso de existir criterios o posturas distintas entre los servidores que intervienen en la etapa de pago, primará la postura del administrador del contrato.*

*El administrador de contrato responderá por sus actuaciones administrativas que este emitiera acorde a las atribuciones previstas en la normativa, no pudiendo extenderse su responsabilidad a la ejecución técnica del contrato u orden de compra a su cargo. En caso de que sus actuaciones administrativas excedan a sus atribuciones, será responsable civil y administrativamente, sin perjuicio de otras responsabilidades.*

*En el expediente se hará constar todo hecho relevante que se presente en la ejecución del contrato, de conformidad a lo que se determine en el Reglamento. Especialmente se referirán a los hechos, actuaciones y documentación relacionados con pagos; contratos complementarios; terminación del contrato; ejecución de garantías; aplicación de multas Y sanciones; y, recepciones.*

*Todas las entidades contratantes, en cualquier etapa de la fase de ejecución contractual, deberán pronunciarse por escrito sobre los requerimientos o peticiones de los contratistas de forma obligatoria en el término máximo fijado en cada contrato, que no excederá el término de diez (10) días, contados desde la fecha de recepción de la petición.*

*Así mismo, cualquier pedido o requerimiento que realice la entidad contratante al contratista deberá realizarse de forma expresa, por escrito, incluyendo los requerimientos que se cursen en la etapa de procesamiento del pago.*

**Art. 92.- Responsable de la administración y fiscalización del contrato.-** *El administrador y el fiscalizador del contrato son responsables de tomar todas las medidas necesarias para su adecuada ejecución, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, plazos y costos previstos. Esta responsabilidad es administrativa, civil y penal según corresponda. En todos los procedimientos que se formalicen a través de contratos u órdenes de compra, las entidades contratantes designarán de manera expresa a un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales. El Reglamento General desarrollará la designación, reemplazos, atribuciones y demás temas relacionados con la correcta gestión de la administración de los contratos u órdenes de compra.*

Así como el Art. 359 y 361 de su Reglamento General, que establecen lo siguiente:

**Artículo 359.- De la administración del contrato.** *- La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado designará al administrador del contrato, dicha designación se podrá realizar a través de la resolución de adjudicación, en el contrato, o en una comunicación posterior a la firma del contrato. En cualquier caso, deberá ser notificada formalmente la persona sobre la que recaiga esta responsabilidad.*

*El administrador del contrato deberá tener aptitud para administrar la ejecución contractual, decisión que recae sobre la máxima autoridad o su delegado. Excepcionalmente las entidades contratantes que no cuenten en su nómina con servidores aptos para administrar el contrato, de manera motivada, podrán contratar la administración del contrato bajo la modalidad legal que corresponda. (...)*

**Art. 361.- Atribuciones del administrador del contrato.** - - Además de las establecidas en la Ley, son funciones del administrador del contrato u orden de compra las siguientes:

1. Coordinar todas las acciones necesarias para garantizar la debida ejecución del contrato;
2. Imponer las multas establecidas en el contrato, para lo cual se deberá respetar el debido proceso;
3. Reportar a la máxima autoridad de la entidad contratante, cualquier aspecto operativo, técnico, económico y de otra naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del contrato;
4. Coordinar con las direcciones institucionales y con los profesionales de la entidad contratante, que, por su competencia, conocimientos y perfil, sea indispensable su intervención para garantizar la debida ejecución del contrato;
5. Notificar la disponibilidad del anticipo cuando sea contemplado en el contrato como forma de pago coordinando con el área financiera de la entidad contratante;
6. Verificar los movimientos de la cuenta bancaria del contratista, y su relación con el devengamiento del anticipo o lo correspondiente a la ejecución contractual;
7. Proporcionar al contratista las instrucciones necesarias para garantizar el cumplimiento del contrato;
8. Requerir motivadamente al contratista, la sustitución de cualquier integrante de su personal cuando lo considere incompetente o negligente en su oficio, presente una conducta incompatible con sus obligaciones, o se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y los documentos anexos, debidamente justificado. El personal con el que se sustituya deberá acreditar la misma o mejor capacidad, experiencia y demás exigencias establecidas en los pliegos;
9. Autorizar o negar el cambio del personal asignado a la ejecución del contrato, verificando que el personal que el contratista pretende sustituir acredite la misma o mejor capacidad, experiencia y demás exigencias establecidas en los pliegos, desarrollando adecuadamente las funciones encomendadas;
10. Verificar de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación, que el contratista disponga de todos los permisos y autorizaciones para el ejercicio de su actividad, en cumplimiento de la legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato;
11. Reportar a las autoridades competentes, cuando tenga conocimiento que el contratista se encuentra incumpliendo sus obligaciones laborales y patronales conforme a la ley;
12. Verificar permanentemente y en los casos aplicables, el cumplimiento de participación nacional, desagregación y transferencia tecnológica, así como cualquier otra figura legalmente exigible y que se encuentre prevista en el contrato o que por la naturaleza del objeto y el procedimiento de contratación sean imputables al contratista;
13. Elaborar e intervenir en las actas de entrega recepción a las que hace referencia el artículo 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; así como, coordinar con el contratista, la recepción del mismo;
14. Publicar en el Portal de Contratación Pública durante la fase contractual toda la información relevante, de conformidad con los manuales de usuario o instructivos que emita el Servicio Nacional de

*Contratación Pública. Para dicho efecto, el usuario creador del proceso deberá habilitar el usuario para el administrador del contrato;*

*15. Preparar y organizar el expediente de toda la gestión de administración del contrato, dejando evidencia documental a efectos de las auditorías ulteriores que los órganos de control del Estado realicen;*

*16. Solicitar a los contratistas y servidores que elaboraron los estudios, que en el término máximo de quince (15) días, desde la notificación, informen sobre la existencia de justificación para suscribir contratos complementarios, órdenes de trabajo y diferencias en cantidades de obra que superen el quince por ciento (15%) del valor del contrato principal; y,*

*17. Cualquier otra que de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación sea indispensable para garantizar su debida ejecución. Las atribuciones adicionales del administrador del contrato deberán estar descritas en el contrato.*

**Normas de Control Interno N° 408-16 y 408-17**, correspondiente a la Administración del contrato y administración de la obra y sobre el Administrador del contrato, respectivamente.

Por su parte, el Manual de Buenas Prácticas de la Contratación Pública para el desarrollo del Ecuador, en su página 19 indica:

*La supervisión y seguimiento a la ejecución de los contratos. - Controlar, supervisar y vigilar la ejecución de los contratos asignados, a fin de garantizar a la entidad, el fiel cumplimiento de las obligaciones pactadas, con observancia de lo que dispone la LOSNCP, su reglamento, Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, Resoluciones del SERCOP, pliegos, especificaciones técnicas o términos de referencia según el caso.*

*En los contratos de obra, deberá el consultor del diseño de la misma suscribir el contrato de asesoramiento con el cual se respaldará el trabajo tanto del constructor y del fiscalizador. Todo equipo de fiscalización deberá estar comandado por el jefe de fiscalización y los fiscalizadores que se estime necesarios de acuerdo con los rubros de obra, así, por ejemplo, fiscalizador hidrosanitario, fiscalizador mecánico de suelos, fiscalizador arquitectónico, etc.*

Según la Sección 1.19 de las Condiciones Generales de los modelos de pliegos, al referirse a la administración del contrato señala:

**Administración del contrato:** *La entidad contratante designará de manera expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. El administrador deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas.*

*El administrador del contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptación o no de los pedidos de prórroga que pudiera formular el contratista.*

*El administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el período de vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como también deberá atenerse a las condiciones generales y específicas del pliego que forma parte del contrato. Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el área financiera (tesorería) de la entidad contratante a la que le corresponde el control y custodia de las garantías.*

*Respecto de su gestión reportará a la autoridad institucional señalada en el contrato, debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.*

*Tendrá bajo su responsabilidad la aprobación y validación de los productos e informes que emita y/o presente el contratista y suscribirá las actas que para tales efectos se elaboren.*

En el mismo sentido se advierte que el contrato administrativo, conforme el Reglamento General de la LOSNCP, comprenden varios documentos. Adjunto a la presente notificación un ejemplar del contrato original administrativo.

De igual manera, deberá coordinar con esta dependencia la asignación del usuario y contraseña en el Portal Institucional del SERCOP (Copia de la cedula, correo electrónico y fecha de ingreso a la institución), para el registro de toda la actividad de la ejecución contractual, para ello deberá basarse en el Manual de Usuario de la Fase Contractual, publicado en el mismo portal.

Atentamente,



**Ing. Gabriela Tatiana Luzuriaga Rosado**  
**JEFE DE COMPRAS PUBLICAS (E)**



**ESTUDIO DE MERCADO PARA LA DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL LICITACION BIENES Y  
SERVICIOS**

<b>Tipo de producto:</b>	<b>Bien</b>	<b>X</b>	<b>Servicio</b>
<b>Identificación del objeto:</b>	Adquisición de asfalto caliente y emulsión asfáltica para el mantenimiento vial con asfalto caliente en la provincia de Pastaza.		
<b>Fecha:</b>	12/Noviembre/2025		

**1.- ANÁLISIS DEL BIEN O SERVICIO A SER ADQUIRIDO:**

**ESPECIFICACIONES GENERALES:**

Ítems	CPC	Descripción	Especificaciones técnicas	Unidad	Cantidad
1	1533000110	Asfalto Caliente	Asfalto con aditivo multipropósito en base de nanotecnología (formula maestra)	m3	7,325.79
2	153300017	Emulsión Asfáltica	Emulsión Asfáltica de alta penetración EAP	Gls	53,417.24

**ASFALTO**

ESPECIFICACIONES	CARACTERISTICAS
COMPOSICIÓN QUÍMICA	Nano-organosilanos
MOLÉCULA	Nano material (4-6nm)
ORGANOSILANOS	Espectroscopia infrarroja (IR)
ENLACE ASFALTICO AGREGADO	Químico (Covalente)
MEJORADOR DE ADHERENCIA	100% de recubrimiento en los agregados incluso en partículas por debajo de 75 micras
COMPATIBILIDAD CON AGREGADOS	Compatible con todo tipo de agregados
DOSIFICACIÓN	0.5kg/Ton de ligante asfaltico
OPTIMIZACIÓN DE ASFALTO	De 3 a 4 kg/Ton de mezcla
ENVEJECIMIENTO DE ASFALTO	Evita la oxidación y envejecimiento prematura de la mezcla asfáltica
REDUCCIÓN DE TEMPERATURA DE COMPACTACIÓN TIPO WARM MIX	De 30° a 40° C menos
REDUCCIÓN DE TEMPERATURA DE FABRICACIÓN TIPO WARM MIX	De 10° a 20° C menos
OLOR	Sin olor
CORROSIVO	No corrosivo
INFLAMABLE	No inflamable
ESTABLE A TEMPERATURA	Si
MEZCLADO	Fácil mezclado



EMULSIÓN	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS
VISCOSIDAD, SAYBOLT FUROL, 25°C, SEG	NTE INEN 198/20/100
ENSAYO TAMIZ, %	NTE INEN 1982/---/0.1
ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO, 1 DÍA, %	NTR INRN 909/---/1
CARGA DE PARTÍCULA	NTE INEN 908/ Positivo(+)
ENSAYO DESTILACIÓN	--
RESIDUO POR DESTILACIÓN, % PESO	NTE INEN 905/57/63
ENSAYO SOBRE EL RESIDUO DE DESTILACIÓN:	--
PENETRACIÓN, 25°C, 100 g, 5 SEG	NTE INEN 917/100
SOLUBILIDAD EN TRICLOROETILENO, %	NTE INEN 915/97.5/---

EMPERATURAS RECOMENDADAS	MIN.	MAX.
ALMACENAMIENTO	10°C	60°C
APLICACIÓN	40°C	70°C

**NOTA:** La “Adquisición de Asfalto Caliente y Emulsión Asfáltica para el mantenimiento vial con asfalto caliente en la provincia de Pastaza”, deberá ser entregada en el sitio en donde se encuentre ejecutando el mantenimiento vial según el cronograma de trabajos del GADPPz, la longitud media de los proyectos será de 40.10 km a la redonda desde la mina.

#### Equipo Mínimo:

N°	Equipo y/o instrumento	Cantidad	Características
1	Planta de Asfalto, se justificará con el contrato de compraventa o factura o título de propiedad o matrícula o contrato de servicio.	1	Capacidad Min. 110 Ton/h
2	Volqueta, se justificará con el contrato de compraventa o factura o título de propiedad o matrícula o contrato de servicio.	1	Capacidad Min. 20 m3 Potencia Min. 440HP
3	Trituradora primaria (Mandíbula), se justificará con el contrato de compraventa o factura o título de propiedad o matrícula o contrato de servicio	1	Capacidad Min. 120 ton/h
4	Trituradora de cono hidráulico, se justificará con el contrato de compraventa o factura o título de propiedad o matrícula o contrato de servicio.	1	Capacidad Min. 100 ton/h
5	Trituradora de impacto vertical (VSI), se justificará con el contrato de compraventa o factura o título de propiedad o matrícula o contrato de servicio.	1	Capacidad Min. 50-150 ton/h
6	Cargadora Frontal, se justificará con el contrato de compraventa o factura o título de propiedad o matrícula o contrato de servicio.	1	Potencia Min. 217 Hp
7	Camión esparcidor de Asfalto, se justificará con el contrato de compraventa o factura o título de propiedad o matrícula o contrato de servicio.	1	Capacidad Min 1000 -5000 galones. Potencia Mínima: 140HP



**Personal Técnico Mínimo:**

No	Función	Nivel de Estudio	Titulación Académica	Cantidad	Años de Experiencia
1	Técnico en Ing. Civil	Tercer nivel	Ing. Civil	1	2 años
2	Técnico Ambiental y/o Recursos No Renovables	Tercer nivel	Ing. Ambiental y/o Ingeniero En Agroempresas Y Recursos Naturales Renovables	1	2 años

Medio de comprobación: Se acreditará la formación académica (nacional o extranjera) a través de los títulos registrados en la SENESCYT para lo cual deberán detallar el número de cédula del personal propuesto.

**Experiencia del personal técnico mínimo:**

No.	Función	Descripción de la Experiencia	Tiempo Mínimo	Número mínimo de Certificados
1	Técnico en Ing. Civil	El oferente debe acreditar la experiencia del personal técnico en obras de asfalto o similar con instituciones públicas o personas naturales o jurídicas privadas por un monto mínimo del 30% del presupuesto referencial, dentro de los últimos 2 años.	2 años	1
2	Técnico Ambiental	El oferente debe acreditar la experiencia del personal técnico en obras de asfalto o similar con instituciones públicas o personas naturales o jurídicas privadas por un monto mínimo del 30% del presupuesto referencial, dentro de los últimos 2 años.	2 años	1

**Medio de comprobación para acreditar la experiencia del personal técnico se deberá adjuntar a la oferta los siguientes documentos:**

- Hoja de Vida del Personal Técnico;
- Copias simples de mínimo dos certificados de trabajo, en donde se acredite la experiencia de por lo menos dos (2) años, en obras de asfalto o similar, para el personal propuesto, emitidos por el contratante o su representante legal, ejecutados dentro de los últimos dos (2) años.  
Los certificados de trabajo deberán contener, al menos, la siguiente información:
  - ✓ Empresa donde presta o prestó el servicio
  - ✓ Cargo desempeñado
  - ✓ Tiempo
  - ✓ Medios de contacto (Teléfonos y/o correos electrónicos)
  - ✓ Los certificados de trabajo deberán estar suscritos electrónicamente por el representante legal de la empresa pública y/o privada donde presta o prestó **sus servicios o por la persona facultada/delegada para hacerlo. No se aceptarán auto certificados.**
- Copia de Factura(s) legalmente emitida conforme la normativa tributaria vigente para quienes trabajaron como servicios profesionales.

El GADPPZ se reserva el derecho de validar los datos consignados.

**Número de oferentes:** Considerar proveedores inscritos con el CPC del objeto en el RUP y Número de oferentes investigados en el estudio de mercado

El número de oferentes se establece de acuerdo a los oferentes habilitados en el portal de compras pública en el CPC 1533000110 (BETUN Y ASFALTO NATURAL), existen registrados 2037 a nivel nacional; y, en la provincia de Pastaza, catón Pastaza, teniendo 39 proveedores registrados. <https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/BusquedaProveedorCpc.cpe#>

**2.- MONTOS DE ADJUDICACIONES SIMILARES:**

Se deberá considerar los montos de adjudicaciones similares realizados en los últimos dos años (# 2 Art. 53. RE-SERCOP-2022-0134 NORMATIVA SECUNDARIA)

**Palabra de búsqueda:** Asfalto - Rango de Búsqueda octubre2023 – octubre 2025



Código	Descripción	Categoría de Proveedor	Fecha de inscripción	Evaluación	Monto de adjudicación	Fecha de adjudicación
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-10-01	85	1,200,000.00	2023-10-15
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-10-02	80	800,000.00	2023-10-18
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-10-03	75	500,000.00	2023-10-20
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-10-04	70	300,000.00	2023-10-22
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-10-05	65	200,000.00	2023-10-25
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-10-06	60	150,000.00	2023-10-28
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-10-07	55	100,000.00	2023-10-30
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-10-08	50	80,000.00	2023-11-02
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-10-09	45	60,000.00	2023-11-05
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-10-10	40	40,000.00	2023-11-08
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-10-11	35	20,000.00	2023-11-10
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-10-12	30	10,000.00	2023-11-12
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-10-13	25	5,000.00	2023-11-15
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-10-14	20	3,000.00	2023-11-18
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-10-15	15	2,000.00	2023-11-20
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-10-16	10	1,000.00	2023-11-22
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-10-17	5	500.00	2023-11-25
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-10-18	0	0.00	2023-11-28
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-10-19	0	0.00	2023-12-01
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-10-20	0	0.00	2023-12-04
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-10-21	0	0.00	2023-12-07
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-10-22	0	0.00	2023-12-10
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-10-23	0	0.00	2023-12-13
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-10-24	0	0.00	2023-12-16
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-10-25	0	0.00	2023-12-19
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-10-26	0	0.00	2023-12-22
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-10-27	0	0.00	2023-12-25
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-10-28	0	0.00	2023-12-28
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-10-29	0	0.00	2024-01-01
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-10-30	0	0.00	2024-01-04
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-10-31	0	0.00	2024-01-07



Código	Descripción	Categoría de Proveedor	Fecha de inscripción	Evaluación	Monto de adjudicación	Fecha de adjudicación
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-10-31	0	0.00	2024-01-10
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-11-01	0	0.00	2024-01-13
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-11-02	0	0.00	2024-01-16
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-11-03	0	0.00	2024-01-19
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-11-04	0	0.00	2024-01-22
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-11-05	0	0.00	2024-01-25
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-11-06	0	0.00	2024-01-28
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-11-07	0	0.00	2024-02-01
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-11-08	0	0.00	2024-02-04
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-11-09	0	0.00	2024-02-07
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-11-10	0	0.00	2024-02-10
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-11-11	0	0.00	2024-02-13
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-11-12	0	0.00	2024-02-16
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-11-13	0	0.00	2024-02-19
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-11-14	0	0.00	2024-02-22
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-11-15	0	0.00	2024-02-25
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-11-16	0	0.00	2024-02-28
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-11-17	0	0.00	2024-03-03
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-11-18	0	0.00	2024-03-06
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-11-19	0	0.00	2024-03-09
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-11-20	0	0.00	2024-03-12
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-11-21	0	0.00	2024-03-15
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-11-22	0	0.00	2024-03-18
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-11-23	0	0.00	2024-03-21
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-11-24	0	0.00	2024-03-24
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-11-25	0	0.00	2024-03-27
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-11-26	0	0.00	2024-03-30
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-11-27	0	0.00	2024-04-02
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-11-28	0	0.00	2024-04-05
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-11-29	0	0.00	2024-04-08
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-11-30	0	0.00	2024-04-11
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-12-01	0	0.00	2024-04-14
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-12-02	0	0.00	2024-04-17
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-12-03	0	0.00	2024-04-20
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-12-04	0	0.00	2024-04-23
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-12-05	0	0.00	2024-04-26
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-12-06	0	0.00	2024-04-29
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-12-07	0	0.00	2024-05-02
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-12-08	0	0.00	2024-05-05
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-12-09	0	0.00	2024-05-08
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-12-10	0	0.00	2024-05-11
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-12-11	0	0.00	2024-05-14
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-12-12	0	0.00	2024-05-17
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-12-13	0	0.00	2024-05-20
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-12-14	0	0.00	2024-05-23
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-12-15	0	0.00	2024-05-26
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-12-16	0	0.00	2024-05-29
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-12-17	0	0.00	2024-06-01
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-12-18	0	0.00	2024-06-04
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-12-19	0	0.00	2024-06-07
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-12-20	0	0.00	2024-06-10
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-12-21	0	0.00	2024-06-13
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-12-22	0	0.00	2024-06-16
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-12-23	0	0.00	2024-06-19
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-12-24	0	0.00	2024-06-22
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-12-25	0	0.00	2024-06-25
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-12-26	0	0.00	2024-06-28
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-12-27	0	0.00	2024-07-01
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-12-28	0	0.00	2024-07-04
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-12-29	0	0.00	2024-07-07
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-12-30	0	0.00	2024-07-10
1533000110	Asfalto natural	Proveedor de Materiales	2023-12-31	0	0.00	2024-07-13





Una vez realizada la búsqueda de procesos similares en el portal de Sistema Oficial de Contratación Pública, se encontraron procesos iguales, pero con distintas especificaciones técnicas al objeto del contrato, me permito comunicar que solo se encontró un (1,00) proceso con código SIE-GADPPZ-2025-002, objeto del contrato **ADQUISICIÓN DE ASFALTO CALIENTE Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO CALIENTE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025** que cumple con las especificaciones técnicas y se ajusta al objeto de contratación, a continuación se detalla la tabla de los procesos:

ENTIDAD CONTRATANTE	CÓDIGO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	ESTADO	MONTOS DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN	OBSERVACIONES
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	SIE-GADMLA-2024-091	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA (ASFALTO AC-20) EN CALIENTE; ASFALTO RC-250 (RIEGO DE ADHERENCIA) INCLUIDO EL TRANSPORTE, Y TRANSPORTE DE LA MEZCLA ASFÁLTICA; PARA EL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, ENTRE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, PARA EJECUTAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA VIA E10, E45, E45A TRAMO NUEVA LOJA – CHIRITZA - EL ENO, PUENTE SAN MIGUEL DE LA RED VIAL ESTATAL DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS.	Ejecución de Contrato	\$ 51,310.66	29/11/2024	En este proceso las especificaciones técnicas no se ajustan a las requeridas en cuanto a su composición.
DIRECCION DISTRITAL 06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-CHIMBORAZO-MTOP	SIE-MTOPCHIMBORAZO-2024-003	CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA Y ASFALTO RC 250 PARA IMPRIMACIÓN, PARA	Ejecución de Contrato	\$ 30,114.00	13/09/2024	En este proceso las especificaciones técnicas no se ajustan a las especificaciones







**4.- PROFORMAS DE PROVEEDORES:** Las entidades contratantes procurarán contar con al menos tres proformas (#4 del Art. 53. RE-SERCOP-2022-0134 NORMATIVA SECUNDARIA)

La institución mediante el área de compras públicas público en el SERCOP la necesidad de obtención de proformas, donde se obtuvieron 03 proformas las cuales se detallan a continuación:

NECESIDADES DE CONTRATACIÓN NC-1660000170001-2025-00331:



**Detalle de Necesidad de Contratación**

**Detalle del Proceso**

- Nombre Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
- Tipo de necesidad: Necesidad de Contratación
- Código Necesidad de Contratación: NC 166000170001-2025-00331
- Estado de la necesidad: Finalizada
- Objeto de compra: SERVICIO DE AJUSTAR DE ARGENTINA PAVO E, MANTENIMIENTO KILÓMETRO CON ASFALTO CALIENTE Y RECONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA.
- Fecha de Publicación de la Necesidad: 2025-03-28 18:51:02
- Fecha Límite para la entrega de Proformas: 2025-03-30 13:44:02

**Funcionario Encargado**

- Nombre: COMPAS PUBLICO
- Correo Electrónico: compas.adhira@pastaza.gob.ec

**Lugar de entrega**

- Provincia: PASTAZA
- Cantón: PASTAZA
- Parroquia: PUJO CARRERAS CENTRAL
- Dirección: KATMIL, MARQUES DEL SAOPPE

Se presentaron un total de 3 oferentes.

**Proveedores:**

No.	RUC/ID	Razón Social
1	1600674368001	CASTRO VACA ADRIAN RUBEN
2	1691710080001	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
3	1691729612001	J&KM INTERNATIONAL S.A.S.



**REVISIÓN DE RUC CON RESPECTO AL OBJETO DE CONTRATACIÓN:**

- CASTRO VACA ADRIAN RUBEN, RUC: 1600674368001



<b>Apellidos y nombres</b> CASTRO VACA ADRIAN RUBEN		<b>Número RUC</b> 1600674368001
<b>Estado</b> ACTIVO	<b>Régimen</b> GENERAL	<b>Artesano</b> No registra
<b>Fecha de registro</b> 05/09/2018	<b>Fecha de actualización</b> 25/01/2024	
<b>Inicio de actividades</b> 05/09/2018	<b>Reinicio de actividades</b> No registra	<b>Cese de actividades</b> No registra
<b>Jurisdicción</b> ZONA 3 / PASTAZA / PASTAZA		<b>Obligado a llevar contabilidad</b> NO
<b>Tipo</b> PERSONAS NATURALES	<b>Agente de retención</b> NO	<b>Contribuyente especial</b> NO

**Domicilio tributario**

**Ubicación geográfica**

Provincia: PASTAZA Cantón: PASTAZA Parroquia: PUYO

**Dirección**

Calle: FRANCISCO DE ORELLANA Número: SN Intersección: 27 DE FEBRERO  
Código postal: 160101 Referencia: FRENTE AL GOBIERNO PROVINCIAL, EN COMERCIAL CASTRO

**Medios de contacto**

No registra

**Actividades económicas**

- F41001001 - CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES: EDIFICIOS DE ALTURAS ELEVADAS, VIVIENDAS PARA ANCIANATOS, CASAS PARA BENEFICENCIA, ORFANATOS, CÁRCELES, CUARTELES, CONVENTOS, CASAS RELIGIOSAS. INCLUYE REMODELACIÓN, RENOVACIÓN O REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES.
- F42101101 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CALLES, AUTOPISTAS Y OTRAS VÍAS PARA VEHÍCULOS O PEATONES.
- F42201101 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL RELACIONADAS CON: TUBERÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTOS PRINCIPALES Y ACOMETIDAS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA SISTEMAS DE RIEGO (CANALES), ESTACIONES DE BOMBEO, DEPÓSITOS.
- F42201201 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO, INCLUIDA SU REPARACIÓN, INSTALACIONES DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA.
- F42202001 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA: CENTRALES ELÉCTRICAS, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y COMUNICACIONES; OBRAS AUXILIARES EN ZONAS URBANAS.
- F42909201 - OBRAS DE CONSTRUCCIONES DISTINTAS DE LAS DE EDIFICIOS POR EJEMPLO: INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE.
- F43120201 - MOVIMIENTO DE TIERRAS: EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y ORDENACIÓN DE TERRENOS DE CONSTRUCCIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, REMOCIÓN DE PIEDRAS, VOLADURA, ETCÉTERA.
- F43302002 - ACTIVIDADES PARA HABILITAR EDIFICIOS ACABADOS INTERIORES COMO TECHOS CUBIERTA DE MADERA DE PAREDES MAMPARAS MOVILES CHAPISTERIA ETCETERA
- M71102201 - ACTIVIDADES DE DISEÑO DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE INGENIERÍA PARA PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO.

**Establecimientos**

**Abiertos**

1

**Cerrados**

0

**Obligaciones tributarias**

- 2011 DECLARACION DE IVA

Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en [www.sri.gov.ec](http://www.sri.gov.ec).

**Números del RUC anteriores**

No registra



Código de verificación: RCR170906079707360  
Fecha y hora de emisión: 07 de octubre de 2025 13:13  
Dirección IP: 181.211.9.178

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERC/CG18-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 402 del 10 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.





- AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A, RUC: 1691710080001

SRI		Certificado	
Registro Único de Contribuyentes			
<b>Razón Social</b> AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A		<b>Número RUC</b> 1691710080001	
<b>Representante legal</b> • GUEVARA SAPIR ODLO YRICO			
<b>Estado</b> ACTIVO	<b>Régimen</b> GENERAL		
<b>Fecha de registro</b> 07/06/2009	<b>Fecha de actualización</b> 13/12/2022	<b>Inicio de actividades</b> 09/07/2009	
<b>Fecha de constitución</b> 09/07/2009	<b>Reinicio de actividades</b> No registra	<b>Cese de actividades</b> No registra	
<b>Jurisdicción</b> ZONA 3 / PASTAZA / PASTAZA		<b>Obligado a llevar contabilidad</b> SI	
<b>Tipo</b> SOCIEDADES	<b>Agente de retención</b> SI	<b>Contribuyente especial</b> NO	
<b>Domicilio tributario</b>			
<b>Ubicación geográfica</b>			
Provincia: PASTAZA Cantón: PASTAZA Parroquia: PUYO			
<b>Dirección</b>			
Barrio: EL DORADO Calle: AV. TARIQU Número: S/N Intersección: LOS LAURELES			
Referencia: CASA DE DOS PISOS COLOR TOMATE ATRAS DE LA TRANSCOMUNIDAD			
<b>Medios de contacto</b>			
Celular: 0984508890 Celular: 0999613185 Email: Amazo_Building2009@hotmail.com			
Email: odloguevara1961@gmail.com			
<b>Actividades económicas</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- F42101101 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CALLES, AUTOPISTAS Y OTRAS VÍAS PARA VEHÍCULOS O REATONES.</li> <li>- F4220001 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA CENTRALES ELÉCTRICAS, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y COMUNICACIONES, OBRAS AUXILIARES EN ZONAS URBANAS.</li> <li>- F4300001 - ALQUILER DE GRÚAS CON OPERADOR Y OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN QUE NO PUEDEN ASIGNARSE A UN TIPO DE CONSTRUCCIÓN ESPECÍFICO CON OPERARIO.</li> <li>- G4892002 - VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, INCLUYE PARTES Y PIEZAS.</li> <li>- M1100001 - ACTIVIDADES DE DISEÑO DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE INGENIERÍA PARA GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN.</li> </ul>			
<b>Establecimientos</b>			
<b>Abiertos</b>		<b>Cerrados</b>	
2		1	

1/2

www.sri.gob.ec

www.sri.gob.ec

**Razón Social**  
AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A

**Número RUC**  
1691710080001

**Obligaciones tributarias**

- 2011 - DECLARACION DE IVA
- 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- 1031 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- ANUAL
- ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI

Los obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).

**Números del RUC anteriores**

No registra



Código de verificación: RUC169142979937100  
Fecha y hora de emisión: 18 de abril de 2024 17:00  
Versión: 10.1.8.148

Verifique este certificado. Si presenta certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. 040-DISEN-2018-0000017, publicada en el Portal Electrónico del Registro Oficial del 01 de marzo de 2018, así lo que no requiere estar al tanto por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la estación SRI Móvil.





- J&KM INTERNATIONAL S.A.S., RUC: 1691729612001

<b>SRI</b>		<b>Certificado</b> Registro Único de Contribuyentes	
<b>Razón Social</b> J&KM INTERNATIONAL S.A.S.		<b>Número RUC</b> 1691729612001	
<b>Representante legal</b> * MARCELA JACQUELINE VENTURA MURRAY JOSEPH			
<b>Estado</b> ACTIVO	<b>Régimen</b> GENERAL	<b>Artesano</b> No registra	
<b>Fecha de registro</b> 07/11/2024	<b>Fecha de actualización</b> 09/06/2025	<b>Inicio de actividades</b> 07/11/2024	
<b>Fecha de constitución</b> 07/11/2024	<b>Relación de actividades</b> No registra	<b>Cese de actividades</b> No registra	
<b>Jurisdicción</b> ZONA 3 / PASTAZA / PASTAZA		<b>Obligado a llevar contabilidad</b> SI	
<b>Tipo</b> SOCIEDADES	<b>Agente de retención</b> NO	<b>Contribuyente especial</b> NO	
<b>Domicilio tributario</b>			
<b>Ubicación geográfica</b>			
<b>Provincia:</b> PASTAZA <b>Cantón:</b> PASTAZA <b>Parroquia:</b> PUYO			
<b>Dirección</b>			
<b>Calle:</b> AV. TARQUI Intersección: LOS LAURELES <b>Número de piso:</b> SIN Referencia: DIAGONAL AL CAMAL MUNICIPAL			
<b>Medios de contacto</b>			
<b>Celular:</b> 0983694589 <b>Email:</b> jempas2524@gmail.com <b>Teléfono domicilio:</b> 032361445			
<b>Actividades económicas</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>* 02119295 - FABRICACIÓN DE BANDAS DE RODADURA INTERCAMBIABLES, CÁMARAS PARA CURBETAS, FAJAS DE PROTECCIÓN DE LA CÁMARA</li> <li>* 02119302 - FABRICACIÓN DE MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EXPLORADORAS, REVELADORAS, TRADILLAS, PALAS MECÁNICAS, CARGADORAS DE CUCHARÓN, ETC.</li> <li>* 02099101 - FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS, INCLUIDAS CÁRRAAS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES</li> <li>* F41011 - CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS FAMILIARES INDIVIDUALES, EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, INCLUIDO EDIFICIOS DE ALTURAS ELEVADAS, VIVIENDAS PARA ARCHIBUROS, CASAS PARA BENEFICENCIA, ORFANATOS, CÁRCELES, CUARTELES, CONVENTOS, CASAS RELIGIOSAS, INCLUIDE REMODELACIÓN, RENOVACIÓN O REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES</li> <li>* F11001 - CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, EDIFICIOS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, LA FABRICAS, TALLERES, PLANTAS DE ENSAMBLAJE, HOSPITALES, ESCUELAS, EDIFICIOS DE OFICINAS, HOTELES, ALMACENES, CENTROS COMERCIALES, BOVEDAS, RESTAURANTES, OBSERVATORIOS, IGLESIAS, MUSEOS, AEROPORTUARIOS, PORTUARIOS Y EDIFICIOS DE ESTACIONES DE BUSES, TROLEBUSES, TREN, INCLUIDO ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS, DE INSTALACIONES DEPOSITOS, INTERCARES, TECHAMAS ETCETERA, INCLUIDE REMODELACIÓN, RENOVACIÓN O REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES</li> </ul>			

<b>Razón Social</b> J&KM INTERNATIONAL S.A.S.	<b>Número RUC</b> 1691729612001
<ul style="list-style-type: none"> <li>* F41000 - MONTAJE Y LEVANTAMIENTO DE CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS EN EL LUGAR.</li> <li>* F41011 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CALLES, AUTOPISTAS Y OTRAS VÍAS PARA VEHICULOS O PEATONES.</li> <li>* F410101 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CALLES, AUTOPISTAS Y OTRAS VÍAS PARA VEHICULOS O PEATONES.</li> <li>* F410102 - OBRAS DE SUPERFICIE EN CALLES, CARRETERAS, AUTOPISTAS, PUENTES O TUNELLES, ASFALTADO DE CARRETERA, PINTURA Y OTROS TIPOS DE MARCADO DE CARRETERA, INSTALACIÓN DE BARRERAS DE EMERGENCIA, SEÑALES DE TRAFICO Y ELEMENTOS SIMILARES, INCLUIDE LA CONSTRUCCIÓN DE PASADIZOS PARA PEATONES.</li> <li>* F410103 - OBRAS DE SUPERFICIE EN CALLES, CARRETERAS, AUTOPISTAS, PUENTES O TUNELLES, ASFALTADO DE CARRETERA, PINTURA Y OTROS TIPOS DE MARCADO DE CARRETERA, INSTALACIÓN DE BARRERAS DE EMERGENCIA, SEÑALES DE TRAFICO Y ELEMENTOS SIMILARES, INCLUIDE LA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS PARA AEROPUERTOS.</li> <li>* F410104 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL RELACIONADAS CON TUBERIAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTOS PRINCIPALES Y ACOMETIDAS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, SISTEMAS DE REGO (CANALES, ESTACIONES DE BOMBEO, DEPOSITOS).</li> <li>* 0410000 - VENTA AL POR MENOR DE TODO TIPO DE PARTES, COMPONENTES, SUBMONTAJES, MANTENIMIENTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES COMO NEUMÁTICOS, GUANTES, CÁMARAS DE AIRE PARA NEUMÁTICOS (TUBOS) INCLUIDE BOMBAS, BATERIAS, EQUIPO DE ILUMINACIÓN, PARTES Y PIEZAS ELÉCTRICAS.</li> <li>* 0410101 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: PIEDRA, ARENA, GRASA, CEMENTO, ETCETERA.</li> <li>* 0410101 - CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS Y EQUIPAJE, INDEPENDIENTEMENTE DEL MODO DE TRANSPORTE UTILIZADO, ESTIBA Y DESESTIBA, INCLUIDE CARGA Y DESCARGA DE VEHICULOS PERFORADOS DE CARGA.</li> <li>* 0410101 - PRODUCCIÓN DE OBRAS DE TEATRO, CONCERTOS, ÓPERAS Y ESPECTÁCULOS DE DANZA.</li> </ul>	
<b>Establecimientos</b>	
<b>Abiertos</b> 1	<b>Cerrados</b> 0
<b>Obligaciones tributarias</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>* 2011 - DECLARACIÓN DE IVA</li> <li>* 1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES</li> <li>* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO</li> <li>* REPORTE DE BENEFICIARIOS FINALES Y DE COMPOSICIÓN SOCIETARIA REFERENCIA ANUAL</li> <li>* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS -ADI</li> </ul>	
<p><b>Los obligaciones tributarias referidas en este documento están sujetas a cambios. Formas publicacione sus obligaciones tributarias en www.sri.gob.ec.</b></p>	
<b>Números del RUC anteriores</b>	
No registra	

<b>Razón Social</b> J&KM INTERNATIONAL S.A.S.	<b>Número RUC</b> 1691729612001
<b>Fecha de constitución</b> Fecha y hora de emisión: 09/06/2025 09:03:00 AM	<b>Fecha de actualización</b> 09/06/2025 09:03:00 AM
<b>QR</b>	<b>QR</b>



**REVISIÓN DE OBLIGACIONES EN EL IESS:**

- CASTRO VACA ADRIAN RUBEN, RUC: 1600674368001



**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES**

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) CASTRO VACA ADRIAN RUBEN, representante legal de la empresa CASTRO VACA ADRIAN RUBEN con RUC Nro. 1600674368001 y dirección BARRIO MEXICO. FRANCISCO DE ORELLANA. S/N. 27 DE FEBRERO. FRENTE AL CON. PROV., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraran registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Ab. Victor Adrián Farinango Salazar  
Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera

Emitido el 07 de noviembre de 2025

Validez del Certificado 30 días





- AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A, RUC: 1691710080001



#### CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) GUEVARA MARIN ODILO VINICIO, representante legal de la empresa AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. con RUC Nro. 1691710080001 y dirección BARRIO EL DORADO. TARQUI. SN. LOS ROSALES. CASA DE DOS PISOS., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Ab. Víctor Adrián Farinango Salazar

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera

Emitido el 07 de noviembre de 2025

Validez del Certificado 30 días





- J&KM INTERNATIONAL S.A.S., RUC: 1691729612001



#### CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) MARIN JACOME KENYA MERYJOSEPH, representante legal de la empresa J&KM INTERNATIONAL S.A.S. con RUC Nro. 1691729612001 y dirección CAMAL MUNICIPAL. AV. TARQUI LOS LAURELES . SN. Y LOS LAURELES . CAMAL MUNICIPAL ., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Ab. Victor Adrián Farinango Salazar

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera

Emitido el 07 de noviembre de 2025

Validez del Certificado 30 días





**REVISIÓN DE OBLIGACIONES EN EL SRI:**

- **CASTRO VACA ADRIAN RUBEN, RUC: 1600674368001**

**Consulta contribuyentes con obligaciones firmes, impugnadas y en facilidades de pago**

RUC / cédula  
1600674368001

Fecha de corte  
07-NOV-2025

Razón social / Apellidos y nombres  
CASTRO VACA ADRIAN RUBEN



El ciudadano / contribuyente no registra deudas firmes, impugnadas o en facilidades de pago.

- **AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A, RUC: 1691710080001**

**Consulta contribuyentes con obligaciones firmes, impugnadas y en facilidades de pago**

RUC / cédula  
1691710080001

Fecha de corte  
07-NOV-2025

Razón social / Apellidos y nombres  
AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.



El ciudadano / contribuyente no registra deudas firmes, impugnadas o en facilidades de pago.

- **J&KM INTERNATIONAL S.A.S., RUC: 1691729612001**

**Consulta contribuyentes con obligaciones firmes, impugnadas y en facilidades de pago**

RUC / cédula  
1691729612001

Fecha de corte  
07-NOV-2025


Razón social / Apellidos y nombres  
J&KM INTERNATIONAL S.A.S.



El ciudadano / contribuyente no registra deudas firmes, impugnadas o en facilidades de pago.



Se ha verificado que la proforma presentada por el Sr. Castro Vaca Adrián Rubén, cumple con las especificaciones técnicas de la necesidad NC-1660000170001-2025-00344, **ADQUISICIÓN DE ASFALTO CALIENTE Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO CALIENTE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.**

PROFORMA N. 07 - 2025						
NOMBRE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA						
RUC: 2660000170001						
DIRECCION: FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO						
FECHA: 1/11/2025						
Objeto de compra: "ADQUISICIÓN DE ASFALTO CALIENTE Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO CALIENTE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA"						
Código Necesidad de Contratación: NC-1660000170001-2025-00344						
No.	Descripción del Producto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Forma de Pago
1	ASFALTO CALIENTE	m3	7325.79	190.00	\$1,391,900.10	
2	EMULSIÓN ASFÁLTICA	Gl	53417.24	10.00	\$534,172.40	
					SUB-TOTAL =	\$1,926,072.50
					IVA (15%) =	\$288,910.88
					TOTAL =	\$2,214,983.38
EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA PRESENTE PROFORMA SERÁ DE 90 DIAS DE CONFORMIDAD AL ART.233 DEL CÓDIGO DE COMERCIO						
NOTA: LOS PRECIOS QUOTADOS ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE MI PERSONA COMO PROMOTOR, EN FUNCIÓN DEL ARTÍCULO 29A.3 DE LA LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL EN MATERIA ANTICORUPCIÓN						
NOTA: ESTE COSTO INCLUYE TRANSPORTE ATT,						
 <p>ADRIAN RUBEN CASTRO PASTA</p> <p>ING. ADRIAN CASTRO RUC: 2600674360001 FONO: 0999978585 EMAIL: ingcviadriancastro@hotmail.com</p>						

PROVEEDOR	CASTRO VACA ADRIAN RUBEN
PROFORMA	0007-2025
SUB TOTAL	\$ 1.926.072,50
IVA 15%	\$ 288.910,88
TOTAL	\$ 2.214.983,38
DIRECCION Y TELEFONOS DE CONTACTO	Av. Alberto Zambrano, Teléfono: 0999978585
FECHA DE LA PROFORMA	01/11/2025
VIGENCIA DE LA PROFORMA	90 DIAS



Se ha verificado que la proforma presentada por el Sr. Odilo Guevara, Gerente, de la compañía **AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A**, cumple con las especificaciones técnicas de la necesidad NC-1660000170001-2025-00344, **ADQUISICIÓN DE ASFALTO CALIENTE Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO CALIENTE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.**

PROFORMA N. 50 - 2025						
NOMBRE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL CANTÓN PASTAZA						
RUC: 1660000170001						
DIRECCIÓN: FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO						
FECHA: 03/11/2025						
Objeto de compra: ADQUISICIÓN DE ASFALTO CALIENTE Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO CALIENTE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA						
Codigo de Necesidad: NC-1660000170001-2025-00344						
No.	Descripción del Producto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Forma de Pago
1	ASFALTO que contengan un aditivo multipropósito en base a la nanotecnología (Fórmula maestra)	M3	7325.79	180.00	1.318.642.20	
2	EMULSIÓN Asfáltica Católica de Alta Penetración Tipo: EAP	GLS	53417.24	3.40	181.356.87	
					SUB - TOTAL =	1.499.999.07
					IVA (15%) =	224.999.86
					TOTAL =	1.724.998.93
EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA PRESENTE PROFORMA SERA DE 90 DIAS DE CONFORMIDAD AL ART.233 DEL CODIGO DE COMERCIO						
NOTA: LOS PRECIOS OFERTADOS ES DE EXCLUIDA RESPONSABILIDAD DE MI PERSONA COMO PROMOTOR, EN FUNCIÓN DEL ARTÍCULO 294.3 DE LA LEY ORGÁNICA REFORMATIVA DEL CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL EN MATERIA ANTICORUPCIÓN						
NOTA: ESTE COSTO INCLUYE TRANSPORTE Y COLOCACION DE EMULSION ATT.						
 <p>SR. ODILIO GUEVARA AMAZONAS BUILDING S.A RUC: 1661710080001 FONO: 0999813185-099332972 EMAIL: jmarinon@hotmail.com</p>						

PROVEEDOR	AMAZONAS BUILDING S.A.
PROFORMA	0050/ 2025
SUB TOTAL	\$ 1.499.999,07
IVA 15%	\$ 224.999,86
TOTAL	\$ 1.724.998,93
DIRECCION Y TELEFONOS DE CONTACTO	Barrio Miraflores, Teléfono: 0984508890
FECHA DE LA PROFORMA	03/11/2025
VIGENCIA DE LA PROFORMA	90 DIAS





Se ha verificado que la proforma presentada por la Lcda. Kenya Marín Jácome, Gerente, de la compañía **J&KM INTERNACIONAL S.A.A**, cumple con las especificaciones técnicas de la necesidad NC-1660000170001-2025-00344, **ADQUISICIÓN DE ASFALTO CALIENTE Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO CALIENTE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.**

J&KM INTERNACIONAL S.A.S					
RUC: 1660000170001					
<b>PROFORMA N.- 045-2025</b>					
<b>NOMBRE CLIENTE:</b>		GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA			
<b>RUC CLIENTE:</b>		166000170001			
<b>DIRECCION CLIENTE:</b>		FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO			
<b>FECHA:</b>		03/11/2025			
<b>CÓDIGO DE NECESIDAD:</b>		NC-NC-1660000170001-2025-00344			
<b>OBJETO DE COMPRA:</b>		ADQUISICIÓN DE ASFALTO CALIENTE Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO CALIENTE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA			
NO.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	ASFALTO DE CANTONAS DE ADTIVO MULTIPROPÓSITO EN BASE A LA NANOTECNOLOGÍA (FÓRMULA NEUTRA)	KG	7355.79	162.00	1.191.637.18
2	EMULSION ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ALTA PENETRACIÓN TIPO EAF	KLG	55417.54	2.75	152.393.13
<b>SUB-TOTAL \$</b>					<b>1.344.030.31</b>
<b>IVA (15%) \$</b>					<b>201.602.04</b>
<b>TOTAL \$</b>					<b>1.545.632.35</b>
EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA PRECOTA PROPUESTA SERÁ DE 90 DÍAS DE CONTINUIDAD AL ACT. DEL ÍTEM DE COMPROB.					
NOTA: LOS PRECIOS OPERADOS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE MI PRECOTORA COMO PRECOTADOR, EN FUNCIÓN DEL ARTÍCULO 594.1 DE LA LEY ORGANICA SUPLENATORIA DEL CÓDIGO ORGANICO OTORGAL PENAL EN MATERIA ANTICORUPCIÓN					
<p>NOTA: ESTE COTIZO INCLUYE TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE EMULSION ATY.</p>  <p>LC. KENYA MARIN JACOME J&amp;KM INTERNACIONAL S.A.S RUC: 1660004589 FONO: 0983694589 EMAIL: JENYKALD@GMAIL.COM DIRE: PASTAZA, PUVO CARCERA CANTONAL CALLE LOS LAURELES AV. TARIQUI</p>					

PROVEEDOR	J&KM INTERNACIONAL S.A.A
PROFORMA	0045-2025
SUB TOTAL	\$ 1.662.420,28
IVA 15%	\$ 249.363,04
TOTAL	\$ 1.911.783,32
DIRECCION Y TELEFONOS DE CONTACTO	AV. TARIQUI LOS LAURELES, Teléfono: 0983694589
FECHA DE LA PROFORMA	03/11/2025
VIGENCIA DE LA PROFORMA	90 DIAS





**TABLA COMPARATIVA DE LAS PROFORMAS DONDE SE VERIFICA EL VALOR UNITARIO MINIMO.**

DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD	CANT	PROFORMA 007-2025	PROFORMA 050-2025	PROFORMA 026-2025	PROFORMAS	
				CASTRO VACA ADRIAN RUBEN	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD	J&KM INTERNATIONAL S.A.S	VALOR UNITARI MINIMO	VALOR TOTAL MINIMO
				RUC. 1600674368001	RUC. 1691710080001	RUC. 186000048001		
V. UNITARIO	V. UNITARIO	V. UNITARIO						
Asfalto Caliente	Asfalto con aditivo multipropósito en base de nano tecnología (formula maestra)	M3	7.325,79	190,00	180,00	185,00	180,00	\$ 1.318.642,20
Emulsión Asfáltica	Emulsión Asfáltica de alta penetración EAP	Gls	53.417,24	10,00	3,40	5,75	3,40	\$ 181.356,87
<b>SUB TOTAL SIN IVA</b>								\$ 1.499.999,07

Proforma	Proveedor	Valor proforma (Sub Total)
007-2025	CASTRO VACA ADRIAN RUBEN	\$ 1.926.072,50
050-2025	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.	\$ 1.499.999,07
045-2025	J&KM INTERNATIONAL S.A.S.	\$ 1.662.420,28

**4.1.- VERIFICACIÓN DE PROFORMAS:**

En base a la información recibida se procede a realizar un check list de cumplimiento de los proformantes para luego analizar las propuestas

No.	RUC/ID	Razón Social	Actividad Económica	Adjunta Anexos	Datos de la contratare en la proforma
1	1600674368001	CASTRO VACA ADRIAN RUBEN	Si registra Ruc	Si	Correcto
2	1691710080001	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.	Si registra Ruc	Si	Correcto
3	1691729612001	J&KM INTERNATIONAL S.A.S.	Si registra Ruc	Si	Correcto





**Proveedor Castro Vaca Adrián Rubén, con Ruc 1600674368001.**  
**Si Cuenta con la actividad económica según el Rup**



**Sistema Oficial de Contratación**



**Pública**

---

**REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES**

Una vez revisado los documentos presentados, certifica que CASTRO VACA ADRIAN RUBEN con RUC número 1600674368001, ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos establecidos, por lo tanto queda **HABILITADO** en el Registro Único de Proveedores, RUP.

**Nombre Comercial:**

---

**Datos de la Persona:**

**Nombre Completo:** ADRIAN RUBEN CASTRO VACA

**RUC:** 1600674368001

**CATEGORIA:** Mipri 0-32880

**Forma parte de la EPS:**  SI  NO

**Dirección Principal:**

Provincia: PASTAZA Cédula: PASTAZA Parroquia: PUYO CARBONERA CANTONAL, Teniente: 27 DE FERRERO Calle: FRANCISCO DE ORELLANA Numero: 318 Edificio: Párrafo Web: Correo Electrónico: rgovaldiancastro@gmail.com Teléfono(s):

**Items, Obras o Servicios Suscritados:**

Código	Producto
19330	BETUN Y ASFALTO NATURALES: ASPALTITAS Y PEGAS ASPALTICAS
32118	EDIFICIOS RESIDENCIALES DE TRES O MAS VIVIENDAS
32121	EDIFICIOS INDUSTRIALES
32122	EDIFICIOS COMERCIALES
32129	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
32211	CARRITERAS ( EXCEPTO CARRITERAS ELEVADAS); CALLES, CAMINOS
32215	PISTAS DE ATERRIZAJE
32221	PUNTES Y CARRITERAS ELEVADAS
32222	TUNELES Y SUBTERRANEOS
32241	TUBERIAS DE GRAN LONGITUD
32242	LINEAS DE COMUNICACION Y DE ENERGIA ( CABLES DE GRAN LONGITUD
32251	TUBERIAS URBANAS
32252	CABLES Y OBRAS CONEXAS URBANAS
32270	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO
32290	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
34111	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE UNA O DOS VIVIENDAS
34112	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE TRES O MAS VIVIENDAS
34121	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS REAJUSTALES
34122	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES
34129	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
34210	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRITERAS (EXCEPTO CARRITERAS ELEVADAS); CALLES, CAMINOS, VAS FERREAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE EN ASFALTOS
34220	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE PUNTES, CARRITERAS ELEVADAS, TUNELES Y SUBTERRANEOS
34230	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE PUERTOS, VAS DE NAVEGACION, REPRESAS, Y OTRAS OBRAS HIDRAULICAS Y DE IRRIGACION
34241	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE TUBERIAS DE GRAN LONGITUD
34242	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE COMUNICACION Y DE ENERGIA (CABLES DE GRAN LONGITUD)
34251	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE TUBERIAS URBANAS
34252	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA CABLES Y OBRAS AFINES URBANAS
34280	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE MINAS Y PLANTAS INDUSTRIALES
34270	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO
34290	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA H.C.R
34310	SERVICIO DE DEMOLICION
34320	SERVICIO DE RELLENO Y DESMORTE DE TERRENO
34330	SERVICIO DE SACADURA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
34341	SERVICIO DE PERFORACION DE POZOS DE AGUA
34342	SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMAS SEPTICOS
34350	MONTAJE E INSTALACION DE CONSTRUCCIONES PREPARADAS
34311	SERVICIOS DE INSTALACION DE PLOTES
34322	SERVICIOS DE ESTRUCTURACION DE TECHOS
34330	SERVICIOS DE TECHADO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS
34340	SERVICIOS DE TRABAJOS CON HORMONON
34350	SERVICIOS DE INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO
34360	SERVICIOS DE ALBANILERIA
34360	OTROS SERVICIOS DE CONSTRUCCION COMERCIAL ESPECIALIZADOS
34370	SERVICIOS DE INSTALACION DE VIDRIOS Y VENTANAS
34370	SERVICIOS DE ENVISADO
34370	SERVICIOS DE PINTURA
34370	SERVICIO DE COLOCACION DE AZULEJOS Y BALDOSAS
34380	OTROS SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS , REVESTIMIENTO DE PAREDES Y PAPEL DE EMPAPELAR PAREDES
34390	SERVICIOS DE CARPINTERIA DE MADERA Y CARPINTERIA METALICA
34370	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CERCAS Y REJAS
34390	OTROS SERVICIOS DE AGAMADO Y FINALIZACION DE EDIFICIOS
34400	SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION O DEMOLICION DE EDIFICIOS O PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, CON OPERARIOS



**Anexos con información adicional.**

El proveedor adjunta la proforma, RUC y RUP.

Proveedor: NC 166000170001-2025-00344 - Ciudadela - PROFORMA DEL PROVEEDOR CASTRO VACA AERIAN RUBEN 166000000

**Datos del Proveedor**

- RUC: 166000170001
- Nombre Social: CASTRO VACA AERIAN RUBEN
- Correo electrónico: ingcivil@riencastro@hotmail.com
- Teléfono:
- Pais: ECUADOR
- Provincia: PASTAZA
- Cantón: PASTAZA
- Dirección: FRANCISCO DE ORELLANA EN 27 DE FEBRERO

**Detalle del objeto de compra**

No.	CPC	Descripción del Producto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario Ofertado	Valor Total
1	10000070	MEZCLA ASFÁLTICA	Unidad	1.00	1660072.50000	1660072.50000 USD
						<b>TOTAL: 1660072.50000 USD</b>

Vigencia de la Proforma: 90 días (2025-02-27)

**Documentos Anexos**

**ARCHIVO PARA ADJUNTAR SU PROFORMA**


Descripción del Archivo: PROFORMA [Descargar Archivo](#)

**ARCHIVO ADICIONAL (OBLIGATORIO A LA PUBLICACIÓN) - (OPCIONAL)**

Descripción del Archivo: RUP [Descargar Archivo](#)

Descripción del Archivo: RUC [Descargar Archivo](#)

Los datos de la proforma están correctos.

PROFORMA N. 07 - 2025						
<b>NOMBRE:</b> GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA						
<b>RUC:</b> 166000170001						
<b>DIRECCIÓN:</b> FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO						
<b>FECHA:</b> 1/11/2025						
<b>Objeto de compra:</b> "ADQUISICIÓN DE ASFALTO CALIENTE Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO CALIENTE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA"						
<b>Código Necesidad de Contratación:</b> NC-166000170001-2025-00344						
No.	Descripción del Producto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Forma de Pago
1.	ASFALTO CALIENTE	m <sup>3</sup>	7325.79	190.00	\$1,391,900.10	
2.	EMULSIÓN ASFÁLTICA	Gl	53417.24	10.00	\$534,172.40	
					SUB-TOTAL =	\$1,926,072.50
					IVA (15%) =	\$288,910.88
					<b>TOTAL =</b>	<b>\$2,214,983.38</b>
EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA PRESENTE PROFORMA SERA DE 90 DIAS DE CONFORMIDAD AL ART.133 DEL CODIGO DE COMERCIO						
NOTA: SON PROVEEDORAS EFECTIVAS EN EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE SU PERSONA COMO PROVEEDOR, EN FUNCIÓN DEL ARTÍCULO 201.3 DE LA LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL EN MATERIA ANTICORUPCIÓN						
NOTA: ESTE COSTO INCLUYE TRANSPORTE ATT.						
 <p>Escanea este código QR para:  <b>ADRIAN RUBEN CASTRO</b>          PBOA          Ciudadela Francisco de Orellana y 27 de Febrero</p> <p>ING. ADRIAN CASTRO          RUC: 1660074366001          FONO: 0999978595          EMAIL: ingcivil@riencastro@hotmail.com</p>						



**Proveedor AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A, con Ruc 1691710080001**  
**Ruc 1691710080001 si cuenta con la actividad económica.**

**Sistema Oficial de Contratación**

**SERCOOP** **Gobierno Pastaza**

**Pública**

**REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES**

Una vez revisado los documentos presentados, se verifica que **AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.** con RUC número 1691710080001, ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos establecidos, por lo tanto queda **HABILITADO** en el Registro Único de Proveedores, (RUP)

**Nombre Comercial:**

**Naturaleza Jurídica:** SOCIEDAD ANÓNIMA

**Sede/Alcaldía:** GUAYARA MARIN COCLO

**Localidad:** MUNICIPIO

**Documento de Identificación:** 1800181132

**Categoría:** Mediana 1000001.8000000

**Forma parte de la EPS:**  SI  NO

**Dirección Principal:**

Provincia: PASTAZA Cantón: PASTAZA Parroquia: PUYO CABECERA CANTONAL Transversal: LOS LAURELES Calle: A2/ TERCERA Número: 24 Edificio: Págs. Web: <https://amazonas-building-amazonbuild-sa.sectoreda.com> Correo Electrónico: [amazonas@amazonas.com](mailto:amazonas@amazonas.com) Teléfono:

**Obras, Obras o Servicios Suministrados**

Código	Producto
10300	GRANULOS, CANTOS, GRAVA, PIEDRA PARTIDA O TITURADA, MACADAM, MACADAM ALUTRAMADO, ORAVILLA, LAGCA Y POLVOS DE PIEDRA
10300	BETUN Y ASFALTO NATURALES, ADALITAS Y ROCAS ASFALTICAS
44028	VOQUETES PARA USO PUERBA DE CARRETERA
50110	EDIFICIOS RESIDENCIALES DE TRES O MAS VIVIENDAS
50121	EDIFICIOS INDUSTRIALES
50122	EDIFICIOS COMERCIALES
50129	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
50211	CARRETERAS ( EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS), CALLES, CAMINOS
50213	PISTAS DE ATERRIZAJE
50221	PUNTES Y CARRETERAS ELEVADAS
50231	ADUCTIVOS Y OTROS CONDUCTOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA,EXCEPTO TUBERIAS
50232	FUERITOS, VAS DE NAVEGACION E INSTALACIONES CONEXAS
50233	REPRESAS
50234	OBRAS HIDRAULICAS DE IRROGACION Y PARA LA REGULACION DE FUNDACIONES
50241	TUBERIAS DE GRAN LONGITUD
50242	LINEAS DE COMUNICACION Y DE ENERGIA ( CABLES) DE GRAN LONGITUD
50251	TUBERIAS URBANAS
50252	CABLES Y OBRAS CONEXAS URBANAS
50253	CONSTRUCCIONES DE CENTRALES GENERADORAS
50254	OTRAS CONSTRUCCIONES PARA LA MANUFACTURA
50270	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO
50280	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
50111	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE UNA O DOS VIVIENDAS
50112	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE TRES O MAS VIVIENDAS
50121	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES
50122	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES
50129	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
50210	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS, CALLES, CAMINOS, VAS FERREAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE EN AEROPUERTOS)
50220	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE PUNTES, CARRETERAS ELEVADAS, TUNELES Y SUBTERRANEOS
50230	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE FUERTOS, VAS DE NAVEGACION, REPRESAS, Y OTRAS OBRAS HIDRAULICAS Y DE IRROGACION
50241	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE TUBERIAS DE GRAN LONGITUD
50242	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE COMUNICACION Y DE ENERGIA (CABLES) DE LARGA DISTANCIA
50251	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE TUBERIAS URBANAS
50252	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA CABLES Y OBRAS AFINES URBANAS
50253	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE VASOS Y PLANTAS INDUSTRIALES
50270	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO
50280	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA H.C.P
50310	SERVICIOS DE DEMOLICION
50320	SERVICIOS DE RELLENO Y DESARROLLO DE TIERRAS
50330	SERVICIOS DE EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
50341	SERVICIOS DE PERFORACION DE POZOS DE AGUA
50342	SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS SEPTICOS
50400	MONTAJE E INSTALACION DE CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS
50511	SERVICIOS DE INSTALACION DE PILOTES
50520	SERVICIOS DE ESTRUCTURACION DE TECHOS
50530	SERVICIOS DE TRABAJO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS
50540	SERVICIOS DE TRABAJOS CON HORMONON
50550	SERVICIOS DE INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO
50560	SERVICIOS DE ALBAÑALERIA
50570	SERVICIOS DE INSTALACION DE ANCLAJES
50580	OTROS SERVICIOS DE CONSTRUCCION COMERCIAL ESPECIALIZADOS
50511	SERVICIOS DE INSTALACION DE CABLES Y OTROS ESPERTIVOS ELECTRICOS





5402	SERVICIOS DE INSTALACION DE EQUIPOS DE ALARMA CONTRA INCENDIOS
5403	SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE ALARMA ANTIRROBO
5404	SERVICIOS DE INSTALACION DE ANTENAS PARA EDIFICIOS RESIDENCIALES
5409	OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA
5421	SERVICIOS DE FONTANERIA DE AGUA
5422	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE DESAGÜES
5401	SERVICIOS DE INSTALACION DE CALEFACCION
5423	SERVICIOS DE INSTALACION DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE
5440	SERVICIOS DE INSTALACION DE APARATOS DE GAS
5450	SERVICIOS DE AISLAMIENTO
5490	OTROS SERVICIOS DE INSTALACION N.C.P.
5470	SERVICIOS DE PINTURA
5470	SERVICIOS DE COLOCACION DE ADUEJOS Y BALDOSAS
5470	OTROS SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS . REVESTIMIENTO DE PAREDES Y PAPEL DE EMPAPELAR PAREDES
5470	SERVICIOS DE CARRINTERIA DE MADERA Y CARRINTERIA METALICA
5470	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CERCAS Y REJAS
5470	OTROS SERVICIOS DE ACABADO Y FINALIZACION DE EDIFICIOS
5480	SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION O DEMOLICION DE EDIFICIOS O PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL CON OPERARIOS
6430	SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONES CON CONDUCTOR
73112	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE VEHICULOS DE MOTOR SIN CONDUCTOR PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS
83211	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y PREVISION ARQUITECTONICOS
83211	SERVICIOS DE PLANIFICACION URBANA
8390	SERVICIOS DE CARTOGRAFIA
8390	TODOS LOS DEMAS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS N.C.P.
8720	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
9790	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.

El presente documento ha sido generado a través del Sistema Oficial de Contratación del Estado, cualquier modificación, alteración al documento invalida automáticamente el mismo.

### Anexos con información adicional.

El proveedor adjunta la proforma, RUC y RUP.

Buscador - NIT 100000775001-3328-00334 - Credenciales - PROFORMA DEL PROVEEDOR AMAZONAS BUILDING AMAZONAS S.R.L. 181711800001

**Datos del Proveedor**

- RUC: 181711800001
- Razón Social: AMAZONAS BUILDING AMAZONAS S.R.L.
- Correo electrónico: jordan@amazonas.com
- Teléfono:
- País: ECUADOR
- Provincia: PASTAZA
- Cantón: PASTAZA
- Dirección: AV. TARIQUI UN LOS LAURELES

**Detalle del objeto de compra**

Nº.	CIC	Descripción del Producto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario Ofertado	Valor Total			
1	333000110	MEZCLA ASFÁLTICA	MEZCLA ASFÁLTICA	ADQUISICIÓN DE ASFALTO CALIENTE Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO CALIENTE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA. NOTA: SE DEBE ADJUNTAR RUC Y LAS PROFORMAS DEBEN SER FIRMADAS CON FIRMAS ELECTRÓNICAS, ADEMPIDO CANTIDADES Y DESCRIPCIÓN QUE DEBEN LLEVAR LAS PROFORMAS.	Unidad	1.00	146996.0700	146996.0700	USD.
					<b>TOTAL:</b>	<b>146996.0700</b>	<b>USD.</b>		

Vigencia de la Proforma: 30 (Días hábiles)

**Documentos Anexos**

**ARCHIVO PARA ADJUNTAR SU PROFORMA**

Descripción del Archivo: PROFORMA [Descargar Archivo](#)

**ARCHIVO ADICIONAL/OBSERVACIONES A LA PUBLICACIÓN - (OPCIONAL)**

Descripción del Archivo: RUC [Descargar Archivo](#)

RUP [Descargar Archivo](#)



Datos de la proforma que estén correctos.

PROFORMA N. 50 - 2025							
<b>NOMBRE:</b> GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL CANTÓN PASTAZA							
<b>RUC:</b> 16098617001							
<b>DIRECCIÓN:</b> FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO							
<b>TELÉFONO:</b> 051117001							
<b>Objeto:</b> Se requiere ADQUISICIÓN DE ABRILLOS CALIZAS Y PIEZAS DE BALDOSA PARA EL MANTENIMIENTO VAC CON ABRILLOS CALIZAS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA							
<b>Código de Identificación:</b> NC-04600017001-003-00101							
No.	Descripción del Producto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Forma de Pago	
1	ABRILLO que contiene un abrido multipropósito en base a la nanotecnología (fórmula moxina)	ML	3325.79	180.00	1,318,642.30		
2	CONCRETO ARTESAL tipo 2000 kg en 50kg Paralelepípedo Tipo SAP	BLA	84817.33	1.40	121,864.27		
					<b>SUB-TOTAL =</b>	<b>1,440,506.57</b>	
					<b>IVA (0%) =</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL =</b>	<b>1,440,506.57</b>	
A. FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: DE BIENES DE CONSTRUCCIÓN DE ART. 203 DEL CÓDIGO DE COMERCIO							
NOTA: ESTE PRECIO ESTIMADO ES DE CARÁCTER REFERENCIAL Y NO GARANTIZA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, EL PRECIO DEL SERVICIO SE DETERMINARÁ EN EL ACTO DE CONTRATACIÓN DE BIENES DE CONSTRUCCIÓN DE ART. 203 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.							
NOTA: ESTE COSTO INCLuye TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE EMALDICHADO.							
 <p>INFORMACIÓN DE CONTACTO:                  DR. OSCAR GUAYANA                  AV. FRANCISCO ORELLANA 27                  RUC: 160110880001                  TEL: 099841348400000073                  EMAIL: jyakmaron@gmail.com</p>							

**Proveedor J&KM INTERNATIONAL S.A.S., con Ruc 1691729612001**  
**Ruc 1691710080001 si cuenta con la actividad económica.**



Sistema Oficial de Contratación Pública



REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES

Una vez revisado los documentos presentados, certifico, que **J&KM INTERNATIONAL S.A.S.** con RUC número **1691729612001**, ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos establecidos, por lo tanto queda **HABILITADO** en el Registro Único de Proveedores, RUP.

Nombre Comercial:

Naturaleza Jurídica: Sociedad por Acciones Simplificadas  
 Máxima Autoridad Representante Legal: MARIN JACOME KENYA MERY JOSEPH

Documento de Identificación: 1000496770

Categoría: Micro 0-300000

Forma parte de la EPS:  Si  No

Dirección Principal:

Provincia: PASTAZA Cantón: PASTAZA Parroquia: PUYO CABECERA CANTONAL Transversal: LOS LAURELES Calle: AV. TARGUI Número: Edificio: Página Web: Correo Electrónico: jkmsas2024@gmail.com Teléfono(s):

Bienes, Obras o Servicios Suministrados

Código	Producto
15120	MARMOL Y OTRAS PIEDRAS CALIZAS DE TALLA O DE CONSTRUCCION
15130	GRANITO, ARENISCA Y OTRAS PIEDRAS DE TALLA O DE CONSTRUCCION
21600	OBRA Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCION (INCLUI DO TABLEROS DE MADERA CELULAR, TABLEROS ARMADOS PARA PISOS DE PARQUE, TABILLAS Y RUFIAS)
35490	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P.
36040	MATERIALES PLASTICOS PARA USOS DOMESTICOS Y MANUALIDADES
37117	LOSAS, LADRILLOS, LOSETAS Y OTROS ARTICULOS DE VIDRIO Prensado o Moldeado, DEL TIPO UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION: VIDRIERAS EMPLOMADAS Y ARTICULOS ANALOGOS; VIDRIO MULTICELULAR O VIDRIO CELULAR, EN BALDOSAS, PLACAS O FORMAS ANALOGAS
37320	LADRILLOS, BLOQUES, Y BALDOSAS REFRACTARIOS Y ARTICULOS ANALOGOS DE CONSTRUCCION DE MATERIALES CERAMICOS REFRACTARIOS, EXCEPTO DE TIERRAS SILICEAS
37350	LADRILLOS DE CONSTRUCCION, BLOQUES PARA PISOS, LOSAS DE APOYO O DE RELLENO, TEJAS, CANONES DE CHIMENEAS, GOMBRERETES Y REVESTIMIENTOS DE CHIMENEA, ORNAMENTOS ARQUITECTONICOS Y OTROS ARTICULOS DE CONSTRUCCION, DE MATERILES CERAMICOS NO REFRACTARIOS
27550	COMPONENTES ESTRUCTURALES PREFABRICADOS PARA CONSTRUCCION O INGENIERIA CIVIL, DE CEMENTO, HORMIGON O PIEDRA ARTIFICIAL
37600	OTROS ARTICULOS DE PIEDRA DE CONSTRUCCION O DE TALLA LABRADA Y SUS MANUFACTURAS; OTROS TIPOS DE GRAVILLA; LASCA Y POLVO ARTIFICIALMENTE COLOREADOS DE PIEDRA NATURAL; ARTICULOS DE PIZARRA AGLOMERADA





30540	TRENES ELECTRICOS DE JUGUETE Y VIAS, SEÑALES Y OTROS ACCESORIOS PARA ESTOS TRENES; MAQUETAS DE TAMAÑO REDUCIDO (A ESCALA) PARA MONTAR Y OTROS JUEGOS DE CONSTRUCCION Y JUGUETES PARA ARMAR
41263	ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS DE FERROCARRIL O DE TRANVIA, DE HIERRO O ACERO
42190	OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEPTO EDIFICIOS PREFABRICADOS) Y PARTES DE ESTRUCTURAS DE HIERRO, ACERO O ALUMINIO; PLANCHAS, VARRILLAS, ANGULOS, PERFILES, SECCIONES, TUBERIAS, ETC., PREPARADOS PARA SU UTILIZACION EN ESTRUCTURAS DE HIERRO, ACERO O ALUMINIO; METALES D
44212	CENTROS DE MAQUINADO, MAQUINAS DE CONSTRUCCION UNITARIA (ESTACION UNICA) Y MAQUINAS DE TRANSFERENCIA ENTRE VARIAS ESTACIONES PARA TRABAJAR METALES
44222	MAQUINAS HERRAMIENTAS (INCLUSO MAQUINAS PARA CLAVAR, ENGRANAR, ENCOLAR O MONTAR DE OTRA MANERA) PARA EL TRABAJO EN MADERA, CORCHO, HUSO, EBONITA, PLASTICOS DUROS U OTROS MATERIALES DUROS SIMILARES (EXCEPTO LAS MAQUINAS PARA EL TRABAJO DE MATERIALES POR R
44428	VOLQUETES PARA USO FUERA DE CARRETERA
81180	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ANDAMIOS
83211	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS), CALLES, CAMINOS
83222	TUNELES Y SUBTERRANEOS
83261	CONSTRUCCIONES PARA LA MINERIA
83262	CONSTRUCCIONES DE CENTRALES GENERADORAS
83263	CONSTRUCCIONES DE INSTALACIONES QUIMICAS Y AFINES
83269	OTRAS CONSTRUCCIONES PARA LA MANUFACTURA
84111	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE UNA O DOS VIVIENDAS
84112	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE TRES O MAS VIVIENDAS
84121	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES
84122	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES
84129	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
84210	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS), CALLES CAMINOS, VIAS FERREAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE EN AEROPUERTOS
84220	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE PUENTES, CARRETERAS ELEVADAS, TUNELES Y SUBTERRANEOS
84230	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE PUERTOS, VIAS DE NAVEGACION REPRESAS, Y OTRAS OBRAS HIDRAULICAS Y DE IRRIGACION
84241	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE TUBERIAS DE GRAN LONGITUD
84242	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE COMUNICACION Y DE ENERGIA (CABLES) DE LARGA DISTANCIA
84261	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE TUBERIAS URBANAS
84262	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA CABLES Y OBRAS AFINES URBANOS
84280	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE MINAS Y PLANTAS INDUSTRIALES
84270	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARGIMIENTO
84290	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA N.C.P
84320	SERVICIOS DE RELLENO Y DESMONTE DE TERRENOS
84330	SERVICIOS DE EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
84400	MONTAJE E INSTALACION DE CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS
84530	SERVICIOS DE TECHADO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS
84540	SERVICIOS DE TRABAJOS CON HORMIGON
84550	SERVICIOS DE INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO
84590	OTROS SERVICIOS DE CONSTRUCCION COMERCIAL ESPECIALIZADOS
84611	SERVICIOS DE INSTALACION DE CABLES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRICOS
84612	SERVICIOS DE INSTALACION DE EQUIPOS DE ALARMA CONTRA INCENDIOS
84613	SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE ALARMA ANTIRROBO
84622	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE DESAGUES
84632	SERVICIOS DE INSTALACION DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE
84720	SERVICIOS DE ENYESADO
84740	SERVICIOS DE COLOCACION DE AZULEJOS Y BALDOSAS
84760	SERVICIOS DE CARPINTERIA DE MADERA Y CARPINTERIA METALICA
84800	SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION O DEMOLICION DE EDIFICIOS O PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL CON OPERARIOS
61161	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y VIDRIO PLANO
61186	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MINERIA, CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL
61261	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y VIDRIO PLANO
61286	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MINERIA, CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL
62161	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y VIDRIO PLANO EN TIENDAS NO ESPECIALIZADAS
62186	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MINERIA, CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL EN TIENDAS NO ESPECIALIZADAS
62261	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y VIDRIO PLANO EN TIENDAS ESPECIALIZADAS
62286	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MINERIA, CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL EN TIENDAS ESPECIALIZADAS
62361	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y VIDRIO PLANO POR PEDIDO POSTAL
62386	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MINERIA, CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL POR PEDIDO POSTAL
62461	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y VIDRIO PLANO SIN INTERVENCION DE TIENDAS DE VENTA
62561	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y VIDRIO PLANO A COMISION O POR CONTRATO
62586	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MINERIA, CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL A COMISION O POR CONTRATO
64333	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES DE CARGA POR CARRETERA EN CAMIONES EQUIPADOS CON UNA PLATAFORMA PARA EL TRANSPORTE DE CONTENEDORES
65123	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES DE CARGA EN EMBARCACIONES DE CASOTAJE Y TRANSOCÉANICAS PARA EL TRANSPORTE DE CONTENEDORES
65229	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VIAS DE NAVEGACION INTERIOR
66290	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE OTROS TIPOS DE CARGA POR VIA AEREA
71334	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA DAÑOS A LOS BIENES





73122	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y DE INGENIERIA CIVIL SIN OPERARIOS
81130	SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN INGENIERIA Y TECNOLOGIA
83190	OTROS SERVICIOS DE GESTION, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION
83211	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y PREDISENO ARQUITECTONICOS
83212	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTONICO Y DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS
83222	SERVICIOS DE ARQUITECTURA PAISAJISTA
83313	SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA PARA PLANTAS Y PROCESOS INDUSTRIALES
83321	SERVICIOS DE GESTION DE PROYECTOS EN RELACION CON LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
83322	SERVICIOS DE GESTION DE PROYECTOS EN RELACION CON LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
83323	SERVICIOS DE GESTION DE PROYECTOS EN RELACION CON LA CONSTRUCCION DE PLANTAS Y PROCESOS INDUSTRIALES
83328	SERVICIOS DE GESTION DE PROYECTOS EN RELACION CON LA CONSTRUCCION DE OTROS PROYECTOS
83333	SERVICIOS DE INGENIERIA DE ASESORAMIENTO Y PREDISENO PARA PLANTAS Y PROCESOS INDUSTRIALES
83343	SERVICIOS DE DISEÑO DE INGENIERIA PARA PLANTAS Y PROCESOS INDUSTRIALES
83381	SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCION Y DE INSTALACION DE EDIFICIOS
83382	SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCION Y DE INSTALACION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
83383	SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCION Y DE INSTALACION DE PLANTAS Y PROCESOS INDUSTRIALES
83388	SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCION Y DE INSTALACION DE OTROS PROYECTOS
83393	OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA PARA PLANTAS Y PROCESOS INDUSTRIALES
83990	TODOS LOS DEMAS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS N.O.P.
85123	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE OTRO TIPO DE TRABAJADORES PARA EL COMERCIO O LA INDUSTRIA
86210	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MINERIA Y PETROLEOS
87189	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.O.P.
91123	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y DE SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD
91133	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA MINERIA Y LOS RECURSOS MINERALES, LA MANUFACTURA Y LA CONSTRUCCION
91134	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE Y LAS COMUNICACIONES
91135	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE DISTRIBUCION, PREPARACION DE COMIDAS, HOTELES Y RESTAURANTES
91137	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO DE FINES MULTIPLES

El presente documento ha sido generado a través del Sistema Oficial de Contratación del Estado, cualquier modificación, alteración al documento invalida automáticamente al mismo

### Anexos con información adicional.

El proveedor adjunta la proforma, rup y ruc

Buscar > MC-0060000170901-2022-00294 > Contratación > PROFORMA DEL PROVEEDOR J&M INTERNACIONAL S.A.S. 1691720612001

**Datos del Proveedor:**

- RUC: 1691720612001
- Razón Social: J&M INTERNACIONAL S.A.S.
- Correo electrónico: jtmjau2004@gmail.com
- Teléfono:
- País: ECUADOR
- Provincia: PASTAZA
- Cantón: PASTAZA
- Dirección: Av. TARQUILLOS LAURELES

**Detalle del objeto de compra**

No.	CPC	Descripción del Producto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario Ofertado	Valor Total
1	702000110 MIECLA ASFALTICA	ADQUISICIÓN DE ASPHALTO CALIENTE Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL CON ASPHALTO CALIENTE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA, NOTO SI DEBE ADJUNTAR RUC Y LAS PROFORMAS DEBEN SER FIRMADAS CON FIRMAS ELECTRONICAS, ADJUNTO CANTIDADES Y DESCRIPCIÓN QUE DEBEN LLEGAR LAS PROFORMAS	Unidad	1.00	1662435.28000	1662435.28000 USD.
					<b>TOTAL:</b>	<b>1662435.28000 USD.</b>

**Vigencia de la Proforma:** 30 días calendario

**Documentos Anexos**

**ARCHIVO PARA ADJUNTAR SU PROFORMA**

Descripción del Archivo: PROFORMA [Descargar Archivo](#)

**ARCHIVO ADICIONAL/OBSERVACIONES A LA PUBLICACIÓN - (OPCIONAL)**

Descripción del Archivo: RUP [Descargar Archivo](#)

Descripción del Archivo: RUC [Descargar Archivo](#)





Datos de la proforma que estén correctos.

J&M INTERNACIONAL S.A.S						
RUC: 1691729612001						
<b>PROFORMA N.- 045-2025</b>						
NOMBRE CLIENTE:		GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA				
RUC CLIENTE:		38000217001				
DIRECCIÓN CLIENTE:		FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO				
FECHA:		03/11/2025				
CORREO DE SEGURIDAD:		NC-8C-1600000170001-8025-00346				
OBJETO DE COMPRA:		ADQUISICIÓN DE ASFALTO CALIENTE Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO CALIENTE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA				
NO.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	
1	ASFALTO QUE CONTIENGA UN ADITIVO (MULTIPROPÓSITO SE MIDE A LA INASTECOMEXIA (FRANCO MEXTEA))	M3	7325,79	185,00	1.355.271,15	
2	EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA DE ALTA PENETRACIÓN TYP: EAF	ML	35417,24	8,75	307.149,19	
					SUB-TOTAL B	1.662.420,28
					IVA (15%) B	249.363,04
					TOTAL B	1.911.783,32
EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA PRESENTA PROFORMA DEBE DE SER DE CONFORMIDAD AL ART. 239 DEL CÓDIGO DE COMERCIO						
NOTA: LOS PRECIOS OPERATIVOS ASÍ DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE SU PRECISOR, EN FUNCIÓN DEL ARTÍCULO 234.1 DE LA LEY ORGÁNICA INFORMATIVA DEL CÓDIGO ORGANICO INTERNACIONAL PENAL EN MATERIA ANTICORUPCIÓN						
NOTA: ESTE COSTO INCLUYE TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE REBELDES ATT:						
 L.C. BERYA MAREZ JACQUE J&M INTERNACIONAL S.A.S RUC: 1600674368001 PISO: 350306383 EMAIL: JEM@J&MINTERNACIONAL.COM DDE: PASTAZA, PUNTO CARRERA CANTONAL CALLE LOS LAURELES- AV. TARQUI						

## 4.2.- ANÁLISIS DE PROFORMAS:

ITEM	CPC	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN SERVICIOS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
				ADRIAN RUBEN CASTRO		AMAZONAS BUILDING S.A		J&KM INTERNACIONAL S.A.S	
				RUC: 1600674368001		RUC: 1600674368001		RUC: 1691729612001	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1533000110	7.325,79	Asfalto Caliente	\$190,00	\$1.391.900,10	\$180,00	\$1.318.642,20	\$185,00	\$1.355.271,15
2	153300017	53.417,24	Emulsión Asfáltica	\$10,00	\$ 534.172,13	\$3,40	\$ 181.356,87	\$5,75	\$307.149,13
<b>SUBTOTAL</b>				\$ 1.926.07,50	<b>SUBTOTAL</b>	\$ 1.499.999,07	<b>SUBTOTAL</b>	\$ 1.662.420,28	
<b>IVA 15%</b>				\$ 288.910,04	<b>IVA 15%</b>	\$ 224.999,86	<b>IVA 15%</b>	\$ 249.363,04	
<b>TOTAL</b>				\$ 2.214.983,38	<b>TOTAL</b>	\$ 1.724.998,93	<b>TOTAL</b>	\$ 1.911.783,32	
DIRECCIÓN Y TELÉFONOS DE CONTACTO				AVENIDA ALBERTO ZAMBRANO , TELEF: 0999978585		BARRIO MIRAFLORES CALLE LUIS MOLINA S/N FIDEL RODRIGUEZ, TELEF: 0999813185		AV. TARQUI LOS LAURELES, , TELEF: 09983694589	
FECHA DE LA PROFORMA				01/11/2025		03/11/2025		03/11/2025	
VIGENCIA DE LA PROFORMA				90 DIAS		90 DIAS		90 DIAS	
PLAZO DE EJECUCIÓN				365		365		365	
FORMA DE PAGO				ANTICIPO		ANTICIPO		ANTICIPO	



## 5.- ANÁLISIS DE MEJOR VALOR POR DINERO

De conformidad con lo dispuesto en el **artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP)**, que establece el principio de **Valor por Dinero**, se realiza el presente análisis con el propósito de garantizar que la contratación pública genere la mayor eficiencia, eficacia, calidad y economía en la utilización de los recursos institucionales.

En este sentido, para el proceso denominado **“Adquisición de asfalto caliente y emulsión asfáltica para el mantenimiento vial con asfalto caliente en la provincia de Pastaza”**, se han considerado diversos factores que inciden en la obtención del mejor valor por dinero. Entre estos se incluyen: la **calidad del producto**, el **cumplimiento de las especificaciones técnicas INEN**, la **durabilidad y rendimiento del material**, la **disponibilidad inmediata del asfalto y la emulsión**, así como la **capacidad logística y de entrega del proveedor** para garantizar el abastecimiento oportuno en los distintos frentes de trabajo vial.

Por tanto, la evaluación de las ofertas no se limitará únicamente al **precio**, sino que se ponderarán las condiciones adicionales que aporten valor al proceso, tales como el soporte técnico, la confiabilidad del suministro y la sostenibilidad del producto en las condiciones climáticas propias de la provincia de Pastaza. De esta manera, se busca asegurar la **eficiencia en la inversión pública**, promoviendo la **optimización de recursos** y contribuyendo a la **mejora de la red vial provincial**, en cumplimiento de los objetivos institucionales de desarrollo territorial y conectividad vial.

### 5.1.- MERCADO COMPETITIVO DE PROVEEDORES

El presente bien correspondiente a la **“Adquisición de asfalto caliente y emulsión asfáltica para el mantenimiento vial con asfalto caliente en la provincia de Pastaza”**, se encuentra disponible en el mercado **bajo condiciones competitivas**, lo que garantiza la existencia de múltiples oferentes capaces de suministrar los productos requeridos conforme las especificaciones técnicas establecidas por el área requirente.

En atención a lo establecido en las disposiciones del SERCOP, se procedió a realizar la Publicación de Necesidad en la herramienta correspondiente, con el fin de identificar el nivel de competencia existente y verificar la oferta disponible en el mercado. De acuerdo con el **Catálogo Central de Productos (CPC) 1533000110 - Mezcla Asfáltica**, se evidencia que, a nivel nacional, se encuentran **2.037,00 proveedores habilitados** en el Portal de Compras Públicas; mientras que, en la **provincia de Pastaza, en el cantón Pastaza**, constan **39,00 proveedores registrados**. Esta información permite confirmar la existencia de un **mercado amplio y competitivo**, lo cual garantiza la pluralidad de oferentes y viabiliza el proceso de contratación bajo los principios de transparencia y concurrencia.

En este contexto, la **publicación de la necesidad de contratación y la recepción de proformas** se efectuará conforme lo establecido en la normativa vigente, con el objetivo de verificar formalmente la capacidad de respuesta del mercado y las condiciones de competencia que garanticen el mejor valor por dinero para la institución.

**Dictamen:** De acuerdo con la información registrada en la **publicación de necesidad NC-1660000170001-2025-00344** se recibieron **3 (tres) proformas** de distintos proveedores del mercado nacional, lo cual demuestra la **existencia de oferentes competitivos** con capacidad técnica, logística y operativa para entregar los bienes requeridos conforme la necesidad planteada por la Dirección de Obras Públicas.

## 5.2.- PRIORIZAR ATRIBUTOS DISTINTOS AL PRECIO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), referente al principio de **Valor por Dinero**, se analiza la necesidad de priorizar, dentro del presente proceso, **atributos distintos al precio**, tales como la calidad, sostenibilidad, innovación, costos del ciclo de vida y criterios de desempeño o funcionalidad del bien.

El presente proceso, correspondiente a la **“Adquisición de asfalto caliente y emulsión asfáltica para el mantenimiento vial con asfalto caliente en la provincia de Pastaza”**, no requiere priorizar atributos adicionales al precio, dado que los bienes solicitados cuentan con **especificaciones técnicas claramente definidas** en los términos de referencia y se enmarcan dentro de productos **no estandarizados pero de fácil acceso en el mercado nacional**, con condiciones de calidad verificables mediante cumplimiento de normas INEN y ASTM.

Asimismo, los materiales solicitados deberán cumplir estrictamente con las especificaciones técnicas establecidas por el área requirente, lo que garantiza el nivel de calidad requerido sin necesidad de incorporar criterios adicionales de evaluación. Por lo tanto, la adjudicación se realizará tomando como base el **cumplimiento técnico y el precio ofertado**, asegurando la eficiencia, efectividad y transparencia del proceso de contratación.

En este sentido, para el proceso denominado **“Adquisición de asfalto caliente y emulsión asfáltica para el mantenimiento vial con asfalto caliente en la provincia de Pastaza”**, se han considerado diversos factores que inciden en la obtención del mejor valor por dinero. Entre estos se incluyen: la **calidad del producto**, el **cumplimiento de las especificaciones técnicas INEN**, la **durabilidad y rendimiento del material**, la **disponibilidad inmediata del asfalto y la emulsión**, así como la **capacidad logística y de entrega del proveedor** para garantizar el abastecimiento oportuno en los distintos frentes de trabajo vial.

### **ESCENARIO PARA LICITACIÓN**

Para la presente contratación al considerarse **NO ESTANDARIZADOS** pero de características técnicas definidas del bien, se receptorán las proformas para el estudio de mercado con base **a la mejora de las características** que se pueda definir siempre y cuando cumplan con las características esenciales definidas en el presente informe de necesidad conjuntamente con las Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia. (definir ET si son bienes y TDR si son servicios), esta mejora puede ser:

**TIPO SOCIAL:** Cuando se menciona el término de la **Asfalto Caliente y Emulsión Asfáltica**, más allá de ser un material de ingeniería, tiene un **magnífico potencial social** si se considera bien:

- No solo como un costo técnico, sino como una inversión en bienestar y justicia social.
- Puede fortalecer economías locales, y reducir brechas sociales.
- Para que eso ocurra, debe usarse con visión social: priorizando las necesidades de la comunidad donde van a ser intervenidas, asegurando calidad, transparencia, participación, protección al trabajador, etc.
- A continuación, se detalla algunas de estas mejoras sociales que podrían aplicarse al proceso de adquisición de **Asfalto Caliente y Emulsión Asfáltica**:

Detalle de la mejora social que se considera:

- El proveedor deberá contar con personal operativo de la provincia de Pastaza, dentro de su nómina de empleados.

**TIPO AMBIENTAL:** El empleo de asfalto caliente conlleva impactos ambientales importantes que deben ser considerados en cualquier proyecto vial: emisiones atmosféricas, efectos sobre la salud, calentamiento urbano, consumo energético y generación de residuos. Sin embargo, mediante medidas de mitigación adecuadas —como el uso de mezclas tibias, reciclado, control de emisiones, gestión responsable de residuos, monitoreo permanente y ubicación estratégica de plantas— estos impactos pueden reducirse significativamente.

Incluir criterios ambientales dentro del análisis de valor por dinero no sólo protege el medio ambiente y la salud pública, sino que puede mejorar la sostenibilidad y aceptación social del proyecto, y muchas veces generar ahorro de largo plazo.

A continuación, te detallo cómo el **Asfalto Caliente y Emulsión Asfáltica** puede estar relacionada con aspectos ambientales, y qué tipo de medidas de manejo ambiental podrían implementarse para mitigar impactos o potenciar beneficios ecológicos.

- El proveedor deberá tener vigente el registro minero regional para plantas de procesamiento de materiales áridos y pétreos y la licencia ambiental de la planta de tratamiento; un Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero En Agroempresas Y Recursos Naturales Renovables, el cual lleve el manejo y aplique las normas de la licencia ambiental.

**TIPO DE MEJORA TECNOLÓGICA:** El Asfalto Caliente y la Emulsión Asfáltica se utiliza comúnmente en la construcción de infraestructura vial y urbana, y su eficacia depende en gran medida de la tecnología utilizada en su fabricación, procesamiento, y aplicación. A continuación, te detallo algunas mejoras tecnológicas que pueden optimizar su uso y mejorar su desempeño, lo cual puede tener implicaciones en costos, calidad y sostenibilidad.

- El proveedor deberá contar con una planta de asfalto que tenga un rendimiento de producción o capacidad de producción mínima de 110 Toneladas/hora.
- El proveedor deberá contar con las Trituradoras necesarias en condiciones operativas para la preparación de los áridos de material pétreo para las mezclas asfálticas, dicha maquinaria deberá tener una capacidad producción mínima de 100 a 150 Toneladas / hora.
- El Proveedor deberá contar volquetes de capacidad de mínima de 20.00 m<sup>3</sup> y Potencia Min. 440HP, para el transporte de la mezcla asfáltica.
- El proveedor deberá contar con un camión-tanquero esparcidor de líquidos derivados del asfalto para transportar la emulsión asfáltica y con el mismo imprimir los proyectos que se vayan asfaltar, el camión-tanquero deberá contar con una capacidad Min 1000 -5000 galones y una Potencia Mínima del camión de 140HP además con todas las especificaciones técnicas para realizar el trabajo.

Bajo esta primicia, el PRINCIPIO DE VALOR POR DINERO, será aplicada en la presente contratación, por lo que dentro de la propuesta el oferente deberá proponer ofertas con mejoras a las Especificaciones Técnicas definidas en la contratación y con ello se definirán OTROS PARAMETROS en los pliegos.

### OTROS PARAMETROS

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PUNTAJE
Personal Operativo	Se otorgará un (1) punto al proveedor que demuestre que el personal operativo propuesto forma parte de su nómina, conforme a lo establecido en el artículo 41.1 al 41.3 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica y el artículo 30 de su reglamento. En caso de no presentar los medios de verificación correspondientes, no se asignará puntaje alguno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Copia de Cedula.</li> <li>- Certificado de afiliación o el certificado de historia laboral.</li> <li>- Según el Art. 41.1 al 41.3 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica y el Art. 30 de su reglamento.</li> </ul>	1
Equipo y Maquinaria Mínimo	Se otorgará 3 puntos al proveedor quien tenga todo el equipo mínimo y maquinaria necesaria en condiciones operativas tanto para realizar los procesos de obtención de los áridos de material pétreo, obtención de las mezclas asfálticas, formula maestra, además deberá contar con el registro minero Regional vigente para los materiales pétreos necesarios, además deberá contar con el equipo o maquinaria solicitada para el transporte de mezclas asfálticas, emulsión asfáltica, derivados del asfalto para la imprimación de las áreas a intervenir, toda la maquinaria requerida deberá contar con las potencias máximas y mínimas requeridas por el contratante, además deberá tener vigente la revisión técnica y matrícula de la maquinaria pesada otorgada por el MTOP, el proveedor que no cumpla con los medios de puntuación no se otorgará ninguna puntuación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión técnica y Matriculación de la maquinaria otorgado por el MTOP.</li> <li>- Contrato de compraventa o factura o título de propiedad o matrícula o contrato de servicio.</li> </ul>	3
Registro Minero, Licencia Ambiental y Equipo Técnico Mínimo	Se otorgará 1 punto al proveedor que tenga el Registro minero Regional Vigente, la Licencia Ambiental de la planta de tratamiento y el equipo técnico mínimo; un Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero En Agroempresas Y Recursos Naturales Renovables, el cual lleve el manejo y aplique las normas de la licencia ambiental, el proveedor que no cumpla con los medios de puntuación no se otorgará ninguna puntuación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificado del registro minero regional Vigente.</li> <li>- Licencia Ambiental vigente de la planta de tratamiento.</li> <li>- Título legalizado en la SENESCYT del equipo técnico.</li> </ul>	1

### 5.3.- CONCLUSIONES DE ANÁLISIS DE VALOR POR DINERO DEL ESTUDIO DE MERCADO

Luego de efectuar el análisis de todos los componentes que podrían acogerse para determinar el mejor valor por dinero, se deja en evidencia que la presente contratación el precio no será el único parámetro de evaluación, sino aquellos atributos adicionales que permitan tener mejores rendimientos en la ejecución contractual, razón por la cual **se considera** el principio de Valor por Dinero para la presente contratación para lo cual se ha establecido condiciones adicionales a la oferta.



## 6.- DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEFINITIVO

Analizado los incisos anteriores, se define el presupuesto del ítem requeridos en la presente contratación a través del análisis del costo por cada uno de los ítems evaluados y que se obtuvieron proformas de conformidad a la oferta y la demanda lo requerido, tenemos los siguientes costos:

***Tabla comparativa de los valores unitarios mínimos de las Proformas VS Procesos Similares del Sercop actualizados en base a la calculadora presupuestaria donde se selecciona el valor unitario mínimo.***

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PROFORMA 007-2025	PROFORMA 044-2025	PROFORMA 045-2025	CALCULAD. SERCOP ACTUALIZADO	VALOR UNITARIO MINIMO	VALOR TOTAL MINIMO
				CASTRO VACA ADRIAN RUBEN RUC: 1600674368001	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD RUC: 1691710080001	J&KM INTERNATION AL S.A.S RUC: 186000048001			
1	Asfalto Caliente	M3	7.325,79	190,00	180,00	185,00	171,68841	171,68841	\$ 1.257.753,237
2	Emulsión Asfáltica	Gls	53.417,24	10,00	3,40	5,75	4,75983	3,40000	\$ 181.618,616
<b>SUB TOTAL SIN IVA</b>									<b>\$ 1.439.371,853</b>

En conclusión, el presupuesto referencial es:





ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR U	VALOR TOTAL
1	Asfalto Caliente	Asfalto con aditivo multipropósito en base de nano tecnología (formula maestra).	M3	7.325,79	\$ 171,68841	\$ 1.257.753,237
2	Emulsión Asfáltica	Emulsión Asfáltica de alta penetración EAP.	Gls	53.417,24	\$ 3,40000	\$ 181.618,616
<b>SUB TOTAL SIN IVA</b>						<b>\$ 1.439.371,853</b>





<b>Valor:</b>	Para la presente contratación se ha definido todos los parámetros definidos en la normativa legal aplicable a temas de contratación pública, el cual asciende al valor de USD 1.439.371,853 (Un millón cuatrocientos treinta y nueve mil trescientos setenta y uno con 853/100 dólares de Estados Unidos de Norteamérica), No incluye IVA.
<b>Justificación:</b>	Bajo lo dispuesto en el art. 49 del RGLOSNC, numeral 1); se realizó una definición del presupuesto referencial mediante el análisis de las publicaciones realizadas de procesos similares en los últimos dos años y las 3 (Tres) proformas obtenida en la publicación necesidades de contratación y recepción de proformas (Memorando Nro. GADPPZ-COMPRAS-PUBLICAS-2025-15251-M); la determinación del presupuesto referencial <b>SE CONSIDERA EL PRECIO MÁS BAJO.</b>

**FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIO DE MERCADO:**

 <p>Firmado electrónicamente por: <b>CRISTIAN GEOVANNY INLASACA PADILLA</b> Validar Únicamente con FirmaEC</p>		 <p>Firmado electrónicamente por: <b>ERYKA MIREYA SILVA MANZANO</b> Validar Únicamente con FirmaEC</p>	
<b>Elaborado por:</b>	Ing. Cristian Geovanny Inlasaca	<b>Revisado por:</b>	Mgs. Eryka Mireya Silva Manzano
<b>Cargo:</b>	Analista de Unidad Vial 1	<b>Cargo:</b>	Jefe de Unidad Vial (E)
<b>N° certificación de contratación pública:</b>	aLEXmofhck	<b>N° certificación de contratación pública:</b>	VyJKOZFawD
<b>N° Cedula</b>	1600650806	<b>N° Cedula</b>	1600347817
 <p>Firmado electrónicamente por: <b>YESSSENIA LIZBETH TELLO SOLANO</b> Validar Únicamente con FirmaEC</p>		 <p>Firmado electrónicamente por: <b>HECTOR VINICIO ALARCON YEPEZ</b> Validar Únicamente con FirmaEC</p>	
<b>Aprobado por:</b>	Ing. Yessenia Lizbeth Tello Solano	<b>Aprobado por:</b>	Mgs. Héctor Vinicio Alarcón Yépez
<b>Cargo:</b>	Subdirectora de Obras Publicas	<b>Cargo:</b>	Director de Obras Públicas
<b>N° certificación de contratación pública:</b>	AGM7y4AdW2	<b>N° certificación de contratación pública:</b>	dPHYjA8TyZ
<b>N° Cedula</b>	0503325185	<b>N° Cedula</b>	1600377384



**Memorando Nro. GADPPZ-BODEGA-2026-7209-M**

**Puyo, 28 de mayo de 2026**

**PARA:** Sr. Mgs. Luis Salvador Lascano Andrade  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Ingreso 108 bodega de la planilla de avance Nro.04 - Liquidación del proceso: **ADQUISICIÓN DE ASFALTO CALIENTE Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO CALIENTE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA**

Estimado Director, conforme Memorando No. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2026-22779-M, remito ingreso Nro. 108, factura y expediente del proceso contrato **ADQUISICIÓN DE ASFALTO CALIENTE Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO CALIENTE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA**".

Expediente se remite al Administrador, Sr. Victor Caiza Parra.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Hector Marcelo Quishpi Lliquin  
**JEFE DE BODEGA**

Referencias:

- GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2026-22779-M

Anexos:

- informe\_de\_necesidad-2025\_valorordinero\_asfalto-signed-signed-0907097001764711072.pdf
- partidas\_consolidadas0569062001763390045.pdf
- acta\_2\_preguntas\_y\_ aclaraciones\_asfalto\_licb-2025-004-signed-signed-signed-signed.pdf
- acta\_de\_apertura\_asfalto\_diciembre\_-signed-signed-signed-signed.pdf
- oferta\_licb\_004\_asfalto\_amazonbuild.zip
- calificacion\_vae0443195001767109479.pdf
- cta-convalidacion-asfalto-diciembre-signed-signed-signed-signed-signed-0959277001767109517.pdf
- contrato\_licitación\_de\_adquisición\_de\_asfalto\_final-signed-signed-signed-signed.pdf
- garantia\_bancaria0893879001768947280.pdf
- polizas\_amazonas\_20260489896001768947290.pdf
- resolución\_nro.\_gadppz-gadppz-2026-0779-r.pdf
- notificacion\_administrador\_contrato\_lic-004-signed.pdf
- formato\_especificaciones\_tecnicas\_et\_2025\_asfalto-signed-signed-0931232001764711079.pdf
- to\_de\_requerimiento\_2025\_\_asfalto\_noviembre-signed-signed-signed-signed-signed-signed-sig.pdf
- certificaciOn\_poa\_n°\_014\_â\_oopp\_â\_2026.-signed.pdf
- compromiso2026.18-signed.pdf
- resolucion\_de\_inicio\_lico\_004.pdf
- anexo\_vae\_productor\_asfalto-signed-signed-signed-signed.pdf
- calificacion\_asfalto\_diciembre\_2025-signed-signed-signed-signed-signed-signed.pdf
- anexos\_aclaratorios.zip
- resolución\_nro.\_gadppz-gadppz-2025-0768-r.pdf
- pliego\_reapertura\_asfalto\_licb004.pdf
- 4\_formato\_de\_requerimiento\_2025\_\_asfalto-signed-signed-signed-signed-signed.pdf
- plurianual2025\_no.\_017-signed.pdf
- acta\_de\_cierre\_portal-signed0843643001762376810.pdf
- castro\_vaca\_adrian\_ruben0807753001762376811.pdf
- amazonas\_building\_amazonbuild\_s\_a\_0405548001762376811.pdf
- autorización\_sr.\_prefecto\_22434-m.pdf
- certificacion\_cate\_72-signed.pdf
- j&km\_international\_s\_a\_s\_0557441001761594903.pdf
- castro\_vaca\_adrian\_ruben0100481001761594903.pdf
- amazonas\_building\_amazonbuild\_s\_a\_0636731001761594902.pdf
- acta\_de\_cierre\_portal-signed0114237001761594902.pdf
- j&km\_international\_s\_a\_s\_0322280001762376812.pdf
- 3\_estudio\_de\_mercado\_proceso\_de\_licitacion\_asfalto-signed-signed-signed-signed.pdf
- certificaciOn\_poa\_n°\_563\_â\_oopp\_â\_2025.-signed.pdf



**Memorando Nro. GADPPZ-BODEGA-2026-7209-M**

**Puyo, 28 de mayo de 2026**

- certificacion\_pac-signed-signed0125655001763390046.pdf
- acta\_4\_entrega\_recepcion\_paracial\_de\_bienes\_asfalto-signed-signed-signed\_(1).pdf
- cantidades\_y\_valores\_de\_asfalto\_en\_caliente2-signed0045123001779818397.pdf
- compromiso2026.18-signed\_(1).pdf
- informe\_del\_administrador\_-asfalto\_4\_-\_liquidacion-signed.pdf
- ntrato\_modificatorio\_adquisicion\_asfalto\_caliente\_lunes\_final-signed-signed-signed-signed-signed.pdf
- planilla\_liquidacion\_asf1-signed\_(1)-signed\_(1).pdf
- tickes\_asfalto.rar
- tickets\_emulsion\_asfalto.pdf
- anexos\_avance\_4\_liquidación-signed-signed.pdf
- ingreso\_108.pdf

Copia:

Sr. Victor Patricio Caiza Parra - **Analista de Estudios y Proyectos 1** / Sra. Lcda. Mayra Janeth Aldas Aldas - **Asistente Administrativo 1** /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Lcda. Mayra Janeth Aldas Aldas - Asistente Administrativo 1



Validar únicamente en FirmaEC.  
Firmado electrónicamente por:  
**HECTOR MARCELO  
QUISHPI LLIQWIN**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

**Compromiso No: 18**

Transacción No: 134

Fecha: 12/01/2026

Proveedor: AMAZONAS BUILDING S.A.

Identificación: Ruc 1691710080001

Programa: 05 FUNCION SERVICIO CONECTIVIDAD VIALIDAD Y ENERGIA

SubPrograma: 01 MOVILIDAD CONECTIVIDAD Y ENERGIA

Proyecto: D506 MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIAL

Actividad: 510 MANTENIMIENTO VIAS ASFALTADAS Y LASTRADAS

**DOCUMENTOS DE REFERENCIA**

Documento	No	Fecha	Valor
MEMORANDO 23712-M		12/01/2026	1,439,027.30

**DETALLE:**

AMAZONAS BUILDING S.A..- ADQUISICIÓN DE ASFALTO CALIENTE Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO CALIENTE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA".

MARCELO

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
05.01.D506.510.730811.000.16.01.50.000.0000.0918 MATERIALES DE CONSTRUCCIO	1,439,027.30	2,602,949.00
Total =>	1,439,027.30	2,602,949.00



Firmado electrónicamente por:  
**JORGE MARCELO CUEVA  
ROMERO**

Validar únicamente con FirmaEC

Lic. Marcelo Cueva  
Jefe De Presupuesto ( E



**“ADQUISICIÓN DE ASFALTO CALIENTE Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL  
MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO CALIENTE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA”**

**ING. PATRICIO CAIZA PARRA  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO**

**INFORME DE ADMINISTRACIÓN Nº 04**

<b>PROYECTO:</b>	ADQUISICIÓN DE ASFALTO CALIENTE Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO CALIENTE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA	
<b>CONTRATISTA:</b>	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A	
<b>MONTO DE CONTRATO:</b>	\$ 1.439.027,30 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL VEINTE Y SIETE CON 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), SIN INCLUIR EL IVA	
<b>PERÍODO DE INFORME:</b>	01 de abril de 2026	30 de abril de 2026
<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	12 de mayo de 2026	

**1. DATOS GENERALES**

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	ADQUISICIÓN DE ASFALTO CALIENTE Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO CALIENTE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA
<b>CÓDIGO DEL PROCESO</b>	LICB-GADPPZ-2025-004
<b>MONTO DEL CONTRATO</b>	\$ 1.439.027,30
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	20 de enero de 2026
<b>PLAZO CONTRACTUAL</b>	365 DÍAS CONTADOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
<b>MONTO DEL ANTICIPO</b>	
<b>FECHA ENTREGA DEL ANTICIPO</b>	
<b>FECHA DE INICIO DE TRABAJOS</b>	20 de enero de 2026
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL</b>	19 de enero de 2027
<b>SUSPENSIÓN DE TRABAJO</b>	
<b>AMPLIACIÓN DE PLAZO</b>	0 días
<b>CONTRATISTA</b>	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A



## 2. PERIODO DE INFORME

El periodo es del 01 al 30 de abril de 2026, se ha realizado por parte de la administración de contrato un permanente seguimiento de las actividades ejecutadas y la prevención de los trabajos con recomendaciones que posteriormente se refleja en la terminación del proyecto.

En la ejecución de cada rubro se verifico que el contratista utilice el equipo ofertado y necesario para su realización, con las mejores prácticas constructivas, se mantuvo en obra el personal capacitado y en número suficiente.



### 3. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE PERIODO

RESUMEN DE PROYECTOS						
ID	DESCRIPCION	LONGITUD ASFALTO (m)	ESPESOR ASFALTO (m)	ÁREA ASFALTO (m2)	ASFALTO (m3)	EMULSION (gls)
1	MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO EN CALIENTE EN EL SECTOR PAZ YAKU PARROQUIA MADRE TIERRA, CANTÓN MERA Y PROVINCIA DE PASTAZA	1510.00	0.0495	9359.84	478.30	3462.02
2	MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO EN CALIENTE EN LOS SECTORES PUTUIMI - SAN JOSÉ PARROQUIA MADRE TIERRA, CANTÓN MERA Y PROVINCIA DE PASTAZA	1790.00	0.0495	10735.82	531.75	3970.97
3	MANTENIMIENTO ASFALTICO EN LA VÍA DEL SECTOR SOMEK - PASEO DE LOS MONOS – KM 2 DE LA VIA DIEZ DE AGOSTO, PARROQUIA PUYO, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA	2308.35	0.0495	13362.38	668.94	4942.48
4	MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO EN CALIENTE EN EL SECTOR MARIANITAS DE LA PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA	61.00	0.0495	397.86	19.71	147.16
5	MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO EN CALIENTE DE LA FALLA GEOLOGICA DEL KM 3 DE LA VÍA VILLANO, PARROQUIA Y CANTÓN ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA	256.00	0.0495	1396.96	69.19	516.71
6	MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO EN CALIENTE EN EL SECTOR PORTAL DEL SOL DE LA PARROQUIA PUYO, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA	1280.00	0.0495	7686.64	380.72	2843.14
7	MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO EN CALIENTE EN EL SECTOR CAROLINITAS DE LA PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA	1325.00	0.0495	7952.00	393.86	2941.29
8	MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO EN CALIENTE EN EL SECTOR SANTA ROSA ALTO - LAS ANTENAS DE LA PARROQUIA PUYO, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA	1600.00	0.0495	10561.43	523.11	3906.46
9	BACHEO CON ASFALTO EN CALIENTE EN LA VÍA CHINCHAYACU - LA ENCAÑADA - NUEVA VIDA - AMAZANGA - PUTUIMI		0.0600	2000.00	120.00	170.00
10	BACHEO CON ASFALTO EN CALIENTE EN LA VÍA CANELOS - LA CUYA		0.0600	667.00	40.02	60.00
	TOTAL	10130.35		64119.93	3225.60	22960.23



**Nota:** Debido a las condiciones climáticas adversas registradas en la provincia de Pastaza, caracterizadas por intensas precipitaciones, se produjo una emergencia vial a la altura del kilómetro 3 de la vía a Villano, asociada a la activación de una falla geológica, lo que generó inestabilidad del talud, deslizamiento de material y afectación a la calzada, comprometiendo la seguridad y la transitabilidad vehicular.

Esta situación requirió 2 intervenciones de manera urgente, ya que dicha vía constituye el único medio de acceso y movilidad para los habitantes de las comunidades asentadas a lo largo de su recorrido.



#### 4. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL CONTRATO

- **Periodo N° 01: del 20 al 31 de enero de 2026**

RESUMEN DE PROYECTOS						
ID	DESCRIPCION	LONGITUD ASFALTO (m)	ESPESOR ASFALTO (m)	ÁREA ASFALTO (m <sup>2</sup> )	ASFALTO (m <sup>3</sup> )	EMULSION (gls)
1	MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO EN CALIENTE DE LA VÍA DE ACCESO HACIA LA COMUNIDAD CHORRERAS, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA	1435.00	0.0495	7890.55	437.09	2918.56
2	MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO EN CALIENTE DE LA VÍA POMONA - TASHAPI, PARROQUIA POMONA, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA	1530.00	0.0495	8975.55	499.06	3320.25
3	MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO EN CALIENTE DE LA VÍA DE ACCESO A LA LOTIZACIÓN DIQUE DE LOS MECÁNICOS, PARROQUIA DIEZ DE AGOSTO, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA	1000.00	0.0495	6411.71	359.20	2371.56
4	MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO EN CALIENTE DE LA FALLA GEOLOGICA DEL KM 3 DE LA VÍA VILLANO, PARROQUIA Y CANTÓN ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA	128.00	0.0495	698.48	56.13	258.35
5	MANTENIMIENTO ASFALTICO EN EL SECTOR DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD - AMURIZAP, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA	700.00	0.0495	4438.73	235.25	1641.80
6	BACHEO CON ASFALTO EN CALIENTE EN LA VÍA DANUVIO - DIEZ DE AGOSTO - SAN RAMÓN - TRIUNFO		0.0600	1115.00	67.00	130.00
7	BACHEO CON ASFALTO EN CALIENTE EN LA VÍAS EL ROSAL - SIMÓN BOLÍVAR - SANTA MARTHA - EU AMAZONICA		0.0600	850.00	51.00	90.00
8	BACHEO CON ASFALTO EN CALIENTE EN LA VÍAS POMONA - BOBONAZA - DIQUE DE VERACRUZ - UNION BASE - VARIAS VÍAS DE LA PARROQUIA TARQUI		0.0600	950.00	57.00	80.00
	TOTAL	5,937.15		34,004.12	1,761.73	10,810.52



**Periodo N° 02: del 01 al 28 de febrero de 2026**

RESUMEN DE PROYECTOS						
ID	DESCRIPCION	LONGITUD ASFALTO (m)	ESPEJOR ASFALTO (m)	ÁREA ASFALTO (m2)	ASFALTO (m3)	EMULSION (gls)
1	MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO EN CALIENTE EN LOS SECTORES FLOR MARÍA - ELECTROPASTAZA - LALAMA, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA	2210,00	0,0495	13260,00	660,00	3175,42
2	MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO EN CALIENTE EN LOS SECTORES BANEÑOS - MALARIA, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA	910,00	0,0495	7081,33	420,00	2619,24
3	MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO EN CALIENTE EN LA VÍA HACIA SAN PABLO DE ALISHUNGO, PARROQUIA TENIENTE HUGO ORTIZ, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA	1630,00	0,0495	9780,00	645,00	3615,06
4	BACHEO CON ASFALTO EN CALIENTE EN LA VÍA FATIMA - CITET DE LA PARROQUIA FATIMA, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA		0,0600	440,00	20,00	60,00
TOTAL		4750,00		30561,33	1745,00	9469,73

• **Periodo N° 03: del 01 al 31 de marzo de 2026**

RESUMEN DE PROYECTOS						
ID	DESCRIPCION	LONGITUD ASFALTO (m)	ESPEJOR ASFALTO (m)	ÁREA ASFALTO (m2)	ASFALTO (m3)	EMULSION (gls)
1	MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO EN CALIENTE EN LOS SECTORES FLOR MARÍA - ELECTROPASTAZA - LALAMA, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA	1000.00	0.0495	6140.50	360.00	2271.25
2	MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO EN CALIENTE DE LA VÍA DE ACCESO A LA FERIA GANADERA DE LA PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA	300.00	0.0495	2175	120.00	804.49
3	MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO EN CALIENTE EN EL CENTRO DE ACOPIO DE LECHE DE LOS GANADEROS DE LA PARROQUIA EL TRINFO, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA	140.00	0.0495	1420.00	80.00	525.23
4	BACHEO CON ASFALTO EN CALIENTE EN LA VÍA SHELL – MADRE TIERRA – PUERTO SANTA ANA		0.0600	1350.00	81.00	50.00
5	BACHEO CON ASFALTO EN CALIENTE EN LA VÍA TACULIN - BOBONAZA - CALVARIO		0.0600	1670.00	100.20	100.00
TOTAL		3070.00		22535.50	1386.20	7366.03



## 5. AVANCE FINANCIERO DE PROYECTO

El monto contractual del proyecto, alcanza la suma es de \$ 1.439.027,30 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL VEINTE Y SIETE CON 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), SIN INCLUIR EL IVA, para la obra: ADQUISICIÓN DE ASFALTO CALIENTE Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO CALIENTE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.

PLANILLAS	MONTO PLANILLADO			% AVANCE		
	ANTER.	ACTUAL	ACUMUL.	ANTER.	MES	ACUMUL.
PLAN. 1		339,152.31	339,152.31		23.57%	23.57%
PLAN.2	339,152.31	331,728.52	670,880.83	23.57%	23.05%	46.62%
PLAN.3	670,880.83	136,343.03	807,223.86	46.62%	9.47%	56.09%
PLAN. 4 - LIQUIDACIÓN	807,223.86	631,710.66	1,438,934.52	56.09%	43.90%	99.99%
<b>TOTAL</b>	<b>807,223.86</b>	<b>631,710.66</b>	<b>1,438,934.52</b>	<b>56.09%</b>	<b>43.90%</b>	<b>99.99%</b>

<b>VALOR TOTAL DEL PROYECTO</b>	USD 1.439.027,29	100.00 %
---------------------------------	------------------	----------

## 6. PLANILLA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS

DESCRIPCIÓN	Nº	PERÍODO		VALOR	PORCENT.
PLANILLA 1	1	20-ene-26	31-ene-26	339,152.31	23.57%
PLANILLA 2	2	01-feb-26	28-feb-26	331,728.52	23.05%
PLANILLA 3	3	01-mar-26	31-mar-26	136,343.03	9.47%
PLANILLA 4 - LIQUIDACIÓN	4	01-abr-26	30-abr-26	631,710.66	43.90%
<b>TOTAL</b>				<b>1,438,934.52</b>	<b>99.99%</b>

Valor: Seiscientos treinta y un mil setecientos diez dólares 66/100

## 7. TIEMPO UTILIZADO DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El plazo contractual es de noventa (365) días, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.

<b>PLAZO TOTAL</b>	365 DÍAS	100.00 %
<b>DÍAS UTILIZADOS</b>	101 DÍAS	27,67 %



## **8. ACCIONES EFECTUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO**

De conformidad con las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el contratista en el proceso de contratación pública por Licitación de Bienes, el personal que integra el equipo de ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO, de manera objetiva, permanente y en sitio ha realizado la supervisión constante de la provisión de Asfalto en caliente y emulsión asfáltica que se encuentra entregada en sitio de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad contratante. Finalmente, se han elaborado los anexos numéricos de cálculo para cuantificación de m<sup>3</sup>, anexos, fotográficos y se ha elaborado la planilla de Avance 4 - Liquidación, para su correspondiente trámite y pago.

### **INCIDENCIAS PRODUCIDAS EN OBRA**

No se ha producido en este período inicial ninguna incidencia grave.

### **CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES**

El material entregado cumple con los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas.

### **VERIFICACIÓN REALIZADA**

Durante la provisión, el contratista está entregando el material in situ, dependiendo el frente de trabajo de la institución contratante en coordinación con la administradora de contrato, procurando que el material sea el adecuado y cumpla con las normas técnicas y precautelando los recursos asignados al proyecto.

## **9. CONCLUSIONES**

La provisión de material ha sido entregada a entera satisfacción de la entidad contratante.

## **10. RECOMENDACIONES**

Se recomienda se proceda al pago de \$ 631.710,66, ya que se presenta el informe de conformidad.



**11. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME**

**NOMBRE:** VICTOR PATRICIO CAIZA PARRA  
**DIRECCIÓN:** BARRIO JUAN MONTALVO  
**CIUDAD:** PUYO  
**TELÉFONO CELULAR:** 0992600794  
**CORREO ELECTRÓNICO:** [victorpatoc@gmail.com](mailto:victorpatoc@gmail.com)



Validar únicamente en FirmaEC.  
Firmado electrónicamente por:  
**VICTOR PATRICIO  
CAIZA PARRA**

Ing. Patricio Caiza Parra  
**Administrador de Contrato**

**BODEGA: INVERSION**

**COMPROBANTE DE INGRESO N° 108**

FECHA: 28/05/2026

RECIBIDO DE: AMAZONAS BUILDING S.A.


DOCUMENTO REFERENCIA: FACTURA - 001101000000250 - 28/05/2026


UNIDAD OPERATIVA: BODEGA Y PROVEEDURIA

DETALLE: COMPRA A AMAZONAS BUILDING S.A., DESTINADO A BODEGA Y PROVEEDURIA.- de la

Planilla de avance Nro. 04 - Liquidación del proceso: "ADQUISICIÓN DE ASFALTO CALIENTE Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL CON ASFALTO CALIENTE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA", con CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA COMPROMISO N°18 y, Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2026-22779-M del 26 de mayo de 2026

Producto	Descripción	UM	Cantidad	Costo Unitario	SubTotal	% Desc	Costo Total
25063	ASFALTO (FORMULA MAESTRA)	UND	3,225.58	171.6800	553,767.57	0.00	553,767.57
29168	EMULSION (EAP)	GL	22,960.21	3.3947	77,943.09	0.00	77,943.09
			26,185.79				
						Subtotal	631,710.66
						Descuento	0.00
						IVA	94,756.60
						Total	726,467.26

  
Ing. Ernesto Muñoz  
Elaborado Por

  
Lcdo. Marcelo Quisphi  
Revisado Por
