

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 783

Fecha: 29/05/2023

Asiento N° 2460

Compromiso N° 309

BCE BDE CREDITO Cta Cte No 76210011

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA

USD 96,128.26

LA SUMA DE: NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE Y OCHO Dolares 26/100 Ctv

PUYO, 29 de Mayo del 2023

DETALLE DEL COMPROBANTE:

YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA.- PAGO DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N5 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N5 DEL PROYECTO ASFALTO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HAST ABSCISA 13+100) L=4.5KM. PARROQUIA VERACRUZ CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA. REFERENCIA ASIEN TO DE DIARIO N1907 DE FECHA 14/04/2023.

Usuario: ALE

DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor
CTA 3001525739	YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA	96,128.26
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		96,128.26

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	96,128.26	
1.1.1.03.01.009	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / BDE CREDITO		96,128.26
SUMAN o PASAN USD		96,128.26	96,128.26

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D511.519.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			96,128.26
TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	96,128.26

LCDO. ANDRE GRANDA.
Prefecto Provincial

TNLGO. RIGOBERTO GREFA.
Director Financiero E

LCDA. MARILU ORDOÑEZ.
Jefa De Contabilidad

ING. GABRIEL SO
Tesorero

TPB 229
06/06/2023
09:55

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**COMPROBANTE DE DIARIO N° 1033**

Fecha: 14/04/2023

Asiento N° 1907

Compromiso N° 309

Retención N° 001-010-000020776

DETALLE DEL COMPROBANTE:

YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N5 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N5 DEL PROYECTO ASFALTO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HAST ABSCISA 13+100) L=4.5KM. PARROQUIA VERACRUZ CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA.

Usuario: ALE

DOCUMENTOS				
Fecha	Documento	No Autorización	Valor	
11/04/2023	FACTURA	00110000000017 73162171212	183,853.17	

APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Debe	Haber	
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IVA	19,698.55		
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	164,154.62		
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS		161,281.91	
2.1.3.75.01.112	IMPUESTO A LA RENTA 1.75%		2,872.71	
2.1.3.81.14.001	CXP IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI		19,698.55	
SUMAN o PASAN USD		183,853.17	183,853.17	

APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago	
05.01.D511.519.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS		164,154.62		
TOTAL GASTOS USD	0.00	164,154.62	0.00	

LCDA. MARILU ORDOÑEZ
Contadora General

ING. ALEXANDRA POZO
Contador 1

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**COMPROBANTE DE DIARIO N° 1034**

Fecha: 14/04/2023

Asiento N° 1908

Compromiso N° 309

DETALLE DEL COMPROBANTE:

YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N5 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N5 DEL PROYECTO ASFALTO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HAST ABSCISA 13+100) L=4.5KM. PARROQUIA VERACRUZ CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA. COBRO DEL ANTICIPO.

Usuario: ALE

APLICACION CONTABLE			
Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS AI	65,153.65	
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	65,153.65	
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES		65,153.65
1.2.4.97.08.001	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR EJERCICIOS ANTER. DE GAD'S Y EMPR. F		65,153.65
SUMAN o PASAN USD		130,307.30	130,307.30

APLICACION PRESUPUESTARIA			
Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D511.519.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			65,153.65
TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	65,153.65
01.01.A100.114.380108.000.000 DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS		65,153.65	65,153.65
TOTAL INGRESOS USD		65,153.65	65,153.65

LCDA. MARILU ORDOÑEZ
Contadora General

ING. ALEXANDRA POZO
Contador 1



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 8-6-2023

Hora: 12:15:2

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: SOSA ESPINEL GABRIEL ALEJANDRO 76210011

Num. Ced o Ruc:1600789133001

Institución Pública: GAD. PROV. PASTAZA/BDE CREDITO							# Cta.: 76210011	
Fecha de Transferencia : 2023-06-07 00:00:00.0								
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben	Monto	# Ced.Ident.	Nom Ben	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado	Observacion
BANECUADOR B.P.	3001525739	96,128.26	1600789133001	YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA	1	07-06-2023 17:13:25	ACREDITADA	COMPROBANTE DE PAGO 783
BANECUADOR B.P.	3001525739	111,121.38	1600789133001	YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA	1	07-06-2023 17:13:25	ACREDITADA	COMPROBANTE DE PAGO 784
Total:		207,249.64	Reg.:2					

[Atrás](#)

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Compromiso No: 309

Transacción No: 1410

Fecha: 10/02/2023

Proveedor: YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA

Identificación: Ruc 1600789133001

DETALLE:

YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA.- ASFALTO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HAST ABSCISA 13+100) L=4.5KM. PARROQUIA VERACRUZ CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA.

RIGO

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
05.01.D511.519.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	372,974.30	5,548,718.94
Total =>	372,974.30	5,548,718.94



Para más información contacte con:
FRANCISCO RIGOBERTO
GREFA RIVADENEYRA

Subdirector Financiero

24/04/2023 8:12

Página 1/1



Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA

Dirección: Francisco de Orellana y 27 de Febrero

Teléfono: 032885380 / Fax: 032886179

E-mail: financiero@pastaza.gob.ec

Web: www.pastaza.gob.ec

Contribuyente Especial: 590

RUC: 1660000170001

COMPROBANTE DE RETENCION

Nº 001-010-000020776

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1404202307166000017000120010100000207761438918211

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

25/04/2023 10:39:17

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1404202307166000017000120010100000207761438918211

Razon Social / Nombres y Apellidos: YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA

RUC/CI: 1600789133001

Fecha Emisión: 14 de Abril del 2023

Guía de Remisión:

Número de Documento	Cód. SRI	Descrip. Reten.	% Reten.	Base Retención	Valor Retenido
001-100-000000017	346	1.75% IMPUESTO A LA RENTA	1.75	164,154.62	2,872.71
001-100-000000017	731	100% SRI RESOLUCION 074 075	100.00	19,698.55	19,698.55
				Total	22,571.26

Información Adicional:

Dirección:

Teléfono:



R.U.C.: 1600789133001

FACTURA

No. 001-100-000000017

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1104202301160078913300120011000000000173162171212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/04/2023 10:45:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1104202301160078913300120011000000000173162171212

YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA

Dirección Matriz: Barrio: LIBERTAD Calle: JAVIER VARGAS Intersección: FRANCISCO DE ORELLANA

Dirección Sucursal: Barrio: LIBERTAD Calle: JAVIER VARGAS Intersección: FRANCISCO DE ORELLANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Identificación 1660000170001

Fecha 11/04/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P5		1.00	PAGO DE LA PLANILLA DE AVANCE N°5 DE LA OBRA: "ASFALTADO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA", PROCESO N° COTO-GADPPZ-004-2022		162884.12	0.00	0.00	0.00	162884.12
RP5		1.00	PAGO DE LA PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL N°5 DE "ASFALTADO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA", COTO-GADPPZ-004-2022		1270.50	0.00	0.00	0.00	1270.50

Información Adicional	
Telefono:	032665380
Email:	financiero@pastaza.gob.ec



Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	183853.17

SUBTOTAL 12%	164154.62
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	164154.62
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	19698.55
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	183853.17

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

CONTROL PREVIO

		FINANCIERO			
		TIPO DE PROCESO		TIPO DE PROCESO	
		CONTRATO	PLANILLA	CONTRATO	PLANILLA
CONTRATISTA:	ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ				
DOCUMENTO:	PLANILLA DE AVANCE # 5		X		
CONCEPTO:	PAGO				
FECHA DEL DOCUMENTO:	27 de febrero de 2023				
TIPO DE PROCESO	COTIZACIÓN DE OBRA				
VALOR INCLUIDO IVA:	\$ 110,881.09	APLICA		APLICA	
	CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS	SI	NO	SI	NO
1	Requerimiento				
2	Estudios del proyecto				
3	Informe técnico y económico				
4	Factibilidad Ambiental				
5	Certificación POA				
6	Certificación Presupuestaria				
7	Convenio				
8	Pliegos del Procedimiento				
9	Informe Técnico de Evaluación de Ofertas				
10	Resolución de Adjudicación				
11	Garantía Original de fiel Cumplimiento del contrato				
12	Garantía Original de Buen Uso del Anticipo				
13	Certificado de no Adeudar al GADPPz				
14	Documentos Personales / Representante Legal				
15	Certificación Bancaria				
16	Certificado de cumplimiento Tributario (SRI)				
17	RUC Actualizado				
18	Contrato original y disposición escrita de trabajo (proceso completo)				
19	Planilla de Reajuste de de precios	X			
20	Orden de Inicio de Trabajos				
21	Planilla de obra con informe de Fiscalización (Fiscalizador Externo)	X			
22	Anexos de Obra	X			
23	Cuadro de Diferencia de Cantidades	X			
24	Conformidad Ambiental	X			
25	Informe de avance de Obra de Administrador de contrato	X			
26	Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales (IESS) Planilla	X			
27	Certificado de no ser obra nueva				
28	Multa				
29	Autorización de la máxima Autoridad para prórroga de Plazos				
30	Autorización de la máxima Autoridad para Rubros Nuevos				
31	Certificado que no es obra nueva				
32	Solicitud de recepción de Obra				
33	Solicitud de pago del Administrador del Contrato	X			
34	Solicitud de pago del Director de la Unidad al Financiero	X			
35	Factura/Nota de Venta				
36	Validación de la factura/Nota de Venta				
OBSERVACIONES:					
Revisado por:	 Firmado electrónicamente por: ING. VINICIO ALARCÓN YEPEZ ADMINISTRADOR DE CONTRATO	 Firmado electrónicamente por: MERCY JOHANNA QUISHPE CUENCA DEPARTAMENTO FINANCIERO			



Ex

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA

Pastaza

Fecha:

02 MAR 2023

Recibido:

Pao Pa

Número:

4689

Hora:

16h19

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4689-M

Puyo, 07 de marzo de 2023

PARA: Sr. Téc. Jose Mauricio Marin Montero
Director Financiero (E)

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE LA PLANILLA DE AVANCE 5 DEL PROCESO :
"ASFALTADO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD
TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM"

En referencia a los documentos: MEMORANDUM N° 006-FIBOM-JM-2022, de fecha 10 de febrero de 2023, suscrito por el ingeniero Juan Manuel Guacho – Fiscalizador Externo; y, Memorandos Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-6437-M, de fecha 28 de febrero de 2023, suscritos por el ingeniero Héctor Vinicio Alarcón Yépez – Analista de Estudios y Proyectos (Administrador de Contrato), hago hincapié lo siguiente:

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado 408-17 Administrador del contrato, que indica: *"El administrador del contrato velará porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegación y supervisión de esas tareas, la comunicación constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicación de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de sí para lograr el éxito del proyecto.- Es función del administrador del contrato establecer un sistema que evalúe el logro de los objetivos, mediante el cual pueda obtenerse información sobre su estado. Esto con el fin de tomar oportunamente acciones correctivas o para informar a las autoridades de la entidad sobre el desarrollo del proyecto"*

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado **408-18** Jefe de Fiscalización, indica: *"El Jefe de Fiscalización establecerá un sistema para asegurar la correcta ejecución de la obra, mediante el control de la calidad, el avance físico y el avance financiero de la obra. Dichos controles conllevan una evaluación mensual, de los aspectos mencionados y la comunicación de resultados a los mandos superiores, incluyendo los problemas surgidos, especialmente cuando afectan las condiciones pactadas en relación al plazo, presupuesto y calidad de la obra.- El Jefe de Fiscalización, se asegurará de que la obra se ejecute de conformidad con las bases establecidas en los estudios de preinversión, es decir, de acuerdo con el diseño definitivo, las especificaciones y demás normas técnicas aplicables, para lograr obtener del proyecto los beneficios esperados"*.

Con estos antecedentes, adjunto al presente la Planilla de Avance de Obra No. 05 (con todos los anexos) del proyecto: **"ASFALTADO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM"**, documentos que han sido revisados por el Administrador de Contrato y Fiscalizador Externo; por lo que, en base a los informes anexos, se determina como viable y procedente realizar el pago de \$ **99.000,97 USD** (NOVENTA Y NUEVE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 97/100), a favor del ingeniera Ximena Alexandra Yerovi Muñoz – Contratista, de acuerdo al siguiente detalle:



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4689-M

Puyo, 07 de marzo de 2023

PLANILLA DE AVANCE N° 05	\$ 162.884,12 USD
ANTICIPO DEVENGADO (-)	\$ 65.153,65 USD
REAJUSTE PROV. PLANILLA DE LIQUIDACIÓN N° 05	\$ 1.270,50 USSD
VALOR TOTAL	\$ 99.000,97 USD

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Álvaro Renato Sosa Castro
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

Referencias:

- GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-6437-M

Anexos:

- anexo_fotografico0236794001677596901.rar
- anexos_calculos0415579001677596919.rar
- conformidad_ambiental0455008001677596928.rar
- documentacion_cruzada0732370001677596972.rar
- ensayos0969416001677597008.rar
- factura_de_materiales0615220001677597028.rar
- iess0438640001677597043.rar
- informe_administrador_de_contrato0892478001677597060.rar
- reajuste_provisional_planilla_de_avance_n05.rar
- informe_fiscalizacion0570163001677597095.rar
- libro_de_obra0658650001677597126.rar
- planilla0450986001677597146.rar
- memorando_nro._gadppz-estudios-proyectos-2023-6437-m.pdf

Copia:

Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - **Secretaria Ejecutiva 2** / Sr. Ing. Daniel Anibal Ramos Campaña - **Director de Obras Publicas /**

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - Secretaria Ejecutiva 2

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL



Pastaza
Fecha:

07 MAR 2023

Ejecutar el control previo y efectuar
La contabilización conforme leyes y
Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL



Pastaza
Fecha:


07 MAR 2023

Ejecutar el control previo al pago
Conforme leyes y reglamentos
Vigentes.

1.75x = 2.872.71k
Ant = 65.153.65₁₁
Benef = 96.128.26₁₁



Firmado electrónicamente por:
ALVARO RENATO SOSA
CASTRO





GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA



DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Pastaza

Fecha:

28 FEB 2023

Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-6437-M

Recibido:

B

Puyo, 28 de febrero de 2023

Número:

Hora:

15h17

PARA: Sr. Ing. Adán Mariño Montesdeoca
Director de Fiscalización, Subrogante

ASUNTO: TRÁMITE DE PAGO DE LA PLANILLA DE AVANCE 5 DEL PROCESO :
"ASFALTADO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM"

En relación al Memorando N° 006-FIBOM-JM-2022, de fecha 10 de febrero de 2023, enviado por el Ing. Juan Manuel Guacho - **FISCALIZADOR EXTERNO**, del proyecto "ASFALTADO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM" se solicita lo siguiente:

De acuerdo a los Art(s). 70. de la LOSNCP; 121. del RLOSNCP; 408-16 y 408-17 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS (Acuerdo 039-CG), en lo que refiere a la "ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO", en atribuciones exclusivas y únicas a lo que la Ley señala para mi designación como Administrador de Contrato; en relación al contrato "ASFALTADO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM", a la presente fecha una vez que el Ing. Fiscalizador ha procedido a remitir la **PLANILLA DE AVANCE 5 (97.730,47 USD) y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE 5 (1.270,50 USD), con un VALOR TOTAL A PAGAR DE 99.000,97/USD Dólares Americanos SIN IVA**, una vez revisada la información me permito manifestar la conformidad de la documentación adjunta para su debido proceso.

En virtud de lo expuesto y en cumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas en el **CONTRATO**, solicito por medio de su persona **SE PROCEDA CON EL PAGO de la PLANILLA DE AVANCE 5 y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE 5 a favor de ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ**, Contratista responsable de la obra.

Adjunto información original para su debido proceso (cinco ejemplares para que se entregue en las distintas dependencias)

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Hector Vinicio Alarcon Yopez
JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS (E)



Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-6437-M

Puyo, 28 de febrero de 2023

Anexos:

- anexo_fotografico0236794001677596901.rar
- anexos_calculos0415579001677596919.rar
- conformidad_ambiental0455008001677596928.rar
- documentacion_cruzada0732370001677596972.rar
- ensayos0969416001677597008.rar
- factura_de_materiales0615220001677597028.rar
- iess0438640001677597043.rar
- informe_administrador_de_contrato0892478001677597060.rar
- reajuste_provisional_planilla_de_avance_n05.rar
- informe_fiscalizacion0570163001677597095.rar
- libro_de_obra0658650001677597126.rar
- planilla0450986001677597146.rar



HECTOR VINICIO
ALARCON YEPEZ

INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRA

PLANILLA No. 5 DE AVANCE DE OBRA

Período de Ejecución: 01/12/2022 al 31/12/2022

A) ANTECEDENTES:

Con fecha 30 del mes de junio del 2022, el GAD Provincial de Pastaza suscribe con la ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ, el contrato para la ejecución de la obra: "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

Mediante Contrato por Cotización de Obra N° COTO – GADPPz – 004 - 2022 según CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA se designa al Ing. Héctor Vinicio Alarcón Yépez como Administrador del Contrato de Obra: "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

B) DATOS GENERALES:

Código del proceso de contratación:	COTO – GADPPz – 004 - 2022
Objeto del contrato:	"ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"
Monto del contrato:	\$ 956,686.70 USD sin incluir IVA
Fecha de suscripción:	30 de junio de 2022
Monto del anticipo:	\$ 382,674.68 USD
Fecha de inicio de plazo:	23 de agosto de 2022
Fecha de terminación contractual:	19 de febrero de 2023
Contratista:	Ing. Ximena Alexandra Yerovi Muñoz
Administrador de Contrato:	Ing. Héctor Vinicio Alarcón Yépez

C) PLAZOS Y AVANCE

C.1 PLAZO DEL CONTRATO

Plazo total inicial: 180 días.

C.2 AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA DE LA PLANILLA

Fecha de aprobación:	
Días de ampliación aprobados:	
Motivación:	

C.3 PARALIZACIONES EN EL MES A PLANILLAR

Fecha de suspensión:	
Fecha de reinicio:	

C.4 REPROGRAMACIONES

No.	Fecha	Motivación
1	23 agosto de 2022	Reprogramado a la fecha de inicio.

C.5 CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

No.	Fecha de suscripción	Código de contrato	Monto	Motivación

D) DESARROLLO DEL PLANILLAJE

PLANILLA N°	MONTO LÍQUIDO A PAGAR (\$)	ANTICIPO DEVENGADO (\$)	OBSERVACIONES
PLANILLA DE AVANCE N° 1	67,870.83	45,247.22	TRAMITADA
PLANILLA DE AVANCE N° 2	63,900.57	42,600.38	TRAMITADA
PLANILLA DE AVANCE N° 3	88,661.49	59,107.66	TRAMITADA
PLANILLA DE AVANCE N° 4	126,287.73	84,191.82	TRAMITADA
PLANILLA DE AVANCE N° 5	97,730.47	65,153.65	TRAMITADA
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 1	746.58		TRAMITADA
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 2	1,341.91		TRAMITADA
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 3	1,861.89		TRAMITADA
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 4	1,894.32		TRAMITADA
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 5	1,270.50		TRAMITADA
TOTAL:	451,566.29	296,300.73	

MONTO DE AVANCE ECONOMICO TOTAL (\$)	740,751.82
TOTAL ANTICIPO DEVENGADO	296,300.73
% DE AVANCE TOTAL	77.43
MULTA PLANILLA DE AVANCE N° 1	
MULTA PLANILLA DE AVANCE N° 2	
MULTA PLANILLA DE AVANCE N° 3	
MULTA PLANILLA DE AVANCE N° 4	
MULTA PLANILLA DE AVANCE N° 5	

E) ANÁLISIS DEL PERÍODO DE PLANILLAJE

E.1 ANÁLISIS DE PLANILLAJE

ÍTEM	PARÁMETRO DE CUMPLIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
A	Avance de obra de acuerdo al cronograma	X		
B	Retardo parcial en el período de la planilla		X	
C	Disposiciones del Administrador	X		
D	Disposiciones del Fiscalizador	X		
E	Cumplimiento de especificaciones técnicas	X		
F	Utilización de maquinaria ofertada	X		
G	Asistencia a las reuniones	X		
H	Asistencia del personal ofertado	X		
I	Obstaculización de trabajos a otros contratistas o al contratante		X	
J	Demora en la presentación de planillas a Fiscalización		X	
K	Normativa de Seguridad Industrial y Seguro Ocupacional	X		
L	Normativa de Manejo Ambiental	X		

E.2 ANÁLISIS DE MULTAS (del periodo planillado)

ÍTEM	DETALLE DEL OBJETO DE SANCIÓN	MONTO BASE PARA CÁLCULO	%	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	No. DE DÍAS	VALOR DE LA MULTA
A							
B							
C							
D							
TOTAL DE MULTAS EN ESTE PERIODO DE PLANILLAJE:							

F) CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN

GARANTÍA TÉCNICA	VIGENTE
SEGURO SOCIAL	SI CUMPLE

En virtud del presente informe y en calidad de Administrador de Obra, SE APRUEBA Y SE SOLICITA se proceda con el pago de la Planilla de Avance de Obra No.5, con el siguiente detalle.

PORCENTAJE DE AVANCE PARCIAL EN ESTE PERÍODO (%)	17.03
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO (%)	77.43
VALOR TOTAL PLANILLA DE AVANCE N° 5 (\$)	162,884.12
VALOR TOTAL REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 5 (\$)	1,270.50
VALOR TOTAL PLANILLA DE AVANCE N° 5 EXCEDENTES (\$)	
VALOR TOTAL REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 5 EXCEDENTES (\$)	
DEVENGACIÓN DEL ANTICIPO EN ESTE PERÍODO (\$)	65,153.65
DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTAS PARA ESTA PLANILLA (\$)	
VALOR LIQUIDO A PAGAR (\$)	99,000.97

SON: Noventa y nueve mil dólares con 97/100 centavos.

TODAS LAS RETENCIONES TRIBUTARIAS SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL GADPPz.

Atentamente,



Ing. Vinicio Alarcón Y.

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

MEMORÁNDUM No 006-FIBOM-JM-2022

FECHA: Puyo, 10 de febrero del 2023
DE: FISCALIZADOR EXTERNO
PARA: ADMINISTRADOR DE CONTRATO
ASUNTO: SOLICITUD DE TRAMITE DE PAGO

Solicito proceder con el trámite para cancelar a favor de la Srta. Ing. Ximena Alexandra Yerovi Muñoz, de la obra "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA". El valor de \$99 000.97 conforme al siguiente detalle:

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No 05	\$ 97 730.47
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE No05	\$ 1 270.50
TOTAL	\$ 99 000.97

Particular que remito para los fines pertinentes

Atentamente:



Firmado electrónicamente por:
JUAN MANUEL GUACHO
GUACHO

Ing. Juan Manuel Guacho
FISCALIZADOR EXTERNO

NOTA: Una vez subsanadas las observaciones por parte del contratista y fiscalización solicitadas por el administrador de contrato mediante oficio N°009-V. A BONONAZA-2023, se hace la entrega del presente memorándum.



OFICIO: 033-FIBO-JG-2023
Puyo, 11 de enero del 2023

Ingeniero
Héctor Vínicio Alarcón Yépez
ADMINISTRADOR DE CONTRATO "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."
Presente.

De mi consideración,

Reciba un cordial y atento saludo, a la vez deseándole éxitos en sus funciones. En relación a la obra: **"ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."**, número de proceso: **COTO-GADPPz-004-2022**, hago la entrega a usted la **PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°05** incluido sus anexos, solicitándole de la manera más comedida su revisión y posterior autorización.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, anticipo mi más sincero agradecimiento.

Atentamente,



firmado electrónicamente por:
**JUAN MANUEL
GUACHO GUACHO**

ING. JUAN MANUEL GUACHO
FISCALIZADOR EXTERNO

CORREO: jguacho68@gmail.com
TELÉFONO: 0999985643

cc./archivo

Recibido

PLANILLA DE AVANCE N°05



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

FISCALIZACION EXTERNA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 05

OBRA	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4,5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.	PARCIAL	ACUMULADO
FECHA DE CONTRATO	jueves, 30 de junio de 2022	\$	956,686.70
CONTRATISTA	ING. XIMENA ALEXANDRA VEROVI MUÑOZ	\$	162,884.12
PLAZO	180		740,751.82
AMPLIACIONES	0		
SUSPENSIÓN	0		
TOTAL	180		77.43%

FECHA DE PLANILLA:	5 de enero de 2023	V. CONTRATO:	
INICIO DEL PLAZO:	23 de agosto de 2022	V. PLANILLAS:	
TERMINACIÓN DEL PLAZO:	19 de febrero de 2023	% DE AVANCE:	17.03%
PERÍODO:	1-dic-22		

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CONTRATO	TOTAL	CANTIDADES			IMPORTE			
						TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL EJECUCION	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
1	DESBRUCE, DESBOSQUEY LIMPIEZA	Ha	1.80	\$ 550.36	\$ 990.65	1.80	-	1.80	100.00%	\$ 990.65	\$ -	\$ 990.65
2	REPLANTEO Y NIVELACION A NIVEL DE ASFALTO	km	4.50	\$ 431.29	\$ 1,940.81	4.50	-	4.50	100.00%	\$ 1,940.82	\$ -	\$ 1,940.82
3	RE-MOCION DE ALCANTARILLAS	m	76.00	\$ 12.71	\$ 965.96	67.00	-	67.00	88.16%	\$ 851.57	\$ -	\$ 851.57
4	EXCAVACION PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	m³	1800.00	\$ 3.94	\$ 7,092.00	704.62	512.75	1,217.37	67.63%	\$ 2,776.20	\$ 2,020.24	\$ 4,796.44
5	EXCAVACION SIN CLASIFICAR(mOV.DE TIERRA)	m³	13176.98	\$ 0.97	\$ 12,781.67	36,804.00	-	36,804.00	279.31%	\$ 35,699.88	\$ -	\$ 35,699.88
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	m³	562.40	\$ 4.65	\$ 2,615.16	3,715.62	-	3,715.62	660.67%	\$ 17,277.64	\$ -	\$ 17,277.64
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	m³	1317.69	\$ 1.89	\$ 2,490.43	1,317.69	-	1,317.69	100.00%	\$ 2,490.43	\$ -	\$ 2,490.43
8	TUBERIA DE ACERO CORRUGADO D= 1.20 m. E=2.5 mm, mP=100	m	75.00	\$ 364.44	\$ 27,333.00	97.00	-	97.00	128.33%	\$ 35,350.68	\$ -	\$ 35,350.68
9	TUBERIA DE ACERO CORRUGADO D= 1.50 m. E=2.5 mm, mP=100	m	36.00	\$ 482.97	\$ 17,386.92	36.00	-	36.00	100.00%	\$ 17,386.92	\$ -	\$ 17,386.92
10	TUBERIA DE ACERO CORRUGADO D= 2.20 m. E=3.0 mm, mP=100	m	21.00	\$ 762.58	\$ 16,014.18	21.00	-	21.00	100.00%	\$ 16,014.18	\$ -	\$ 16,014.18
11	MURO DE H.S. FC=180KG./cm² TIPO B(CABEZALES)	m³	235.20	\$ 188.87	\$ 44,351.66	248.11	-	248.11	105.49%	\$ 46,786.10	\$ -	\$ 46,786.10
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO MINADA, CARGADA Y REGADA)	m³	8098.72	\$ 3.04	\$ 24,437.71	11,969.29	-	11,969.29	148.90%	\$ 36,386.64	\$ -	\$ 36,386.64
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	m³	5669.65	\$ 11.06	\$ 62,706.33	4,594.31	485.72	5,080.03	89.60%	\$ 50,813.07	\$ 5,372.06	\$ 56,185.13
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	m³	3573.76	\$ 14.01	\$ 50,068.38	2,790.13	353.80	3,143.93	87.97%	\$ 39,088.72	\$ 4,955.74	\$ 44,046.46
15	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	m³-km	53827.27	\$ 0.63	\$ 33,911.18	80,563.32	-	80,563.32	148.65%	\$ 50,748.60	\$ -	\$ 50,748.60
16	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	m³-km	163569.40	\$ 0.32	\$ 52,342.21	132,545.84	14,013.02	146,558.86	89.50%	\$ 42,414.66	\$ 4,484.17	\$ 46,898.83
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	m³-km	103102.97	\$ 0.32	\$ 32,992.95	80,495.25	10,207.13	90,702.38	87.97%	\$ 25,758.48	\$ 3,265.28	\$ 29,024.76
18	ASEALTO HC-250 , PARA IMPRIMACION	l	37800.00	\$ 0.82	\$ 30,996.00	20,953.10	12,785.63	33,738.73	89.26%	\$ 17,181.54	\$ 10,484.22	\$ 27,665.76
19	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	m³	27000.00	\$ 9.04	\$ 244,080.00	14,966.48	9,139.61	24,099.09	89.26%	\$ 135,296.98	\$ 82,558.79	\$ 217,855.77
20	HORMIGON PARA CUNETAS (FC=180 KG/Cm)	m³	1443.20	\$ 187.09	\$ 270,008.29	-	265.87	265.87	18.42%	\$ -	\$ 48,741.62	\$ 48,741.62
21	MARCAS EN PAVIMENTO - PINTURA ALTO TRAFICO	m	12800.00	\$ 0.60	\$ 7,680.00	-	-	-	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -
22	SENALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)m2	u	2.00	\$ 298.96	\$ 597.92	-	-	-	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -
23	SENALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)m2	u	5.00	\$ 298.96	\$ 1,494.80	-	-	-	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -



Nº	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Anticipo	Multas	Programado Efectuado	% AVANCE ECONOMICO	Acumulado
24	SENALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)m ²	u	5.00	\$ 124.59	\$ 622.95	-	-	-	0.00%	\$ -
25	SENALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)m ²	u	15.00	\$ 124.59	\$ 1,868.85	-	-	-	0.00%	\$ -
26	SENALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60mX0.80m) Moviles	u	2.00	\$ 72.87	\$ 145.74	2.00	-	2.00	100.00%	\$ 145.74
27	SENALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22mX0.60m) mOVILES	u	2.00	\$ 147.11	\$ 294.22	2.00	-	2.00	100.00%	\$ 294.22
28	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	u	1125.00	\$ 5.71	\$ 6,423.75	-	-	-	0.00%	\$ -
29	PANCAJETA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	u	1.00	\$ 354.44	\$ 354.44	1.00	-	1.00	100.00%	\$ 354.44
30	S/C COMO DE SEGURIDAD CON PROTECCION UV, 71Cm INGLY. CINTA REFLECTIVA	u	8.00	\$ 21.69	\$ 173.52	8.00	-	8.00	100.00%	\$ 173.52
31	SUMINISTRO DE PALETA DE ALTO Y SIGA	u	2.00	\$ 29.25	\$ 58.50	2.00	-	2.00	100.00%	\$ 58.50
32	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	m	500.00	\$ 0.31	\$ 155.00	500.00	-	500.00	100.00%	\$ 155.00
33	CONTENEDORES METALICOS DE 55 GALONES	u	2.00	\$ 17.31	\$ 34.62	2.00	-	2.00	100.00%	\$ 34.62
34	KIT ANTIDERRAMES	u	1.00	\$ 152.10	\$ 152.10	1.00	-	1.00	100.00%	\$ 152.10
35	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	u	20.00	\$ 44.69	\$ 893.80	20.00	-	20.00	100.00%	\$ 893.80
36	CAPACITACION SOBRE PRESERVACION DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	u	1.00	\$ 117.00	\$ 117.00	1.00	-	1.00	100.00%	\$ 117.00
37	CAPACITACION EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	u	1.00	\$ 117.00	\$ 117.00	1.00	-	1.00	100.00%	\$ 117.00
38	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	u	1.00	\$ 117.00	\$ 117.00	1.00	-	1.00	100.00%	\$ 117.00
TOTAL					\$ 968,686.70					\$ 677,867.70
TOTAL					\$ 162,884.12					\$ 162,884.12

VALOR DE LA PLANILLA		LIQUIDACION DE LA PLANILLA		% AVANCE ECONOMICO	
DESCUENTOS	ANTICIPO	Esta Planilla	Planillas Anteriores	Programado Efectuado	Acumulado
40.00%	\$ 65,153.65	\$ 65,153.65	\$ -	28.57%	41.02%
0.10%	\$ 231,147.08	\$ 231,147.08	\$ -	17.03%	60.40%
MULTAS	\$ 296,300.73	\$ 296,300.73	\$ -		77.43%
TOTAL A PAGARSE	\$ 65,153.65	\$ 65,153.65			
SON: NOVENTA Y SIETE MIL SIETE CIENTOS TREINTA CON 47/100	\$ 97,730.47	\$ 86,373.95			



Firmado electrónicamente por:
JUAN MANUEL
GUACHO GUACHO

ING. JUAN GUACHO
FISCALIZADOR



Firmado electrónicamente por:
XIMENA
ALEXANDRA
YEROVI MUNOZ

ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUNOZ
CONTRATISTA



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
FISCALIZACION EXTERNA

PLANTILLA DE AVANCE DE OBRA N° 05 (100%)

OBRA: ASFALTADO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARCOQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.
FECHA DE CONTRATO: Jueves, 30 de junio de 2022
CONTRATISTA: ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ
PLAZO: 180 Días a partir de la orden de inicio
AMPLIACIONES: 0 Días
SUSPENSION: 0 Días
TOTAL: 180 Días

PRECIO DE PLANILLA: \$ de enero de 2023
INICIO DEL PLAZO: 23 de agosto de 2022
TERMINACIÓN DEL PLAZO: 19 de febrero de 2023
PERÍODO: 1-dic-22 A 31/12/2022

V. CONTRATO: \$ 956,686.70
V. PLANILLAS a 100%: \$ 162,884.12 \$ 663,951.67
% DE AVANCE: 17.03% 69.40%

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CONTRATO	TOTAL	CANTIDADES			IMPORTE			
						TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL EJECUCION	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
1	DESBRUCE, DESBROSES Y LIMPIEZA	Ha	1.80	\$ 550.36	\$ 990.65	1.80	-	1.80	100.00%	\$ 990.65	-	\$ 990.65
2	REPLANTEO Y NIVELACION A NIVEL DE ASFALTO	km	4.50	\$ 431.29	\$ 1,940.81	4.50	-	4.50	100.00%	\$ 1,940.82	-	\$ 1,940.82
3	REMOCION DE ALCANTARILLAS	m	76.00	\$ 12.71	\$ 965.96	67.00	-	67.00	88.16%	\$ 851.37	-	\$ 851.37
4	EXCAVACION PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	m³	1800.00	\$ 3.94	\$ 7,092.00	704.62	512.75	1,217.37	67.63%	\$ 2,776.20	\$ 2,020.24	\$ 4,796.44
5	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (MOV. DE TIERRA)	m³	13176.98	\$ 0.97	\$ 12,781.67	13,176.98	-	13,176.98	100.00%	\$ 12,781.67	-	\$ 12,781.67
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	m³	662.40	\$ 4.65	\$ 2,615.16	562.40	-	562.40	100.00%	\$ 2,615.16	-	\$ 2,615.16
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	m³	1317.69	\$ 1.89	\$ 2,490.43	1,317.69	-	1,317.69	100.00%	\$ 2,490.43	-	\$ 2,490.43
8	TUBERIA DE ACERO CORRUGADO D= 1.20 m, E=2.5 mm, mP=100	m	75.00	\$ 364.44	\$ 27,333.00	75.00	-	75.00	100.00%	\$ 27,333.00	-	\$ 27,333.00
9	TUBERIA DE ACERO CORRUGADO D= 1.50 m, E=2.5 mm, mP=100	m	36.00	\$ 482.97	\$ 17,386.92	36.00	-	36.00	100.00%	\$ 17,386.92	-	\$ 17,386.92
10	TUBERIA DE ACERO CORRUGADO D= 2.20 m, E=3.0 mm, mP=100	m	21.00	\$ 762.65	\$ 16,014.15	21.00	-	21.00	100.00%	\$ 16,014.18	-	\$ 16,014.18
11	MUJO DE H.S. FC=180KG./Cm³ TIPO B(CABEZALES)	m³	235.20	\$ 188.57	\$ 44,351.66	235.20	-	235.20	100.00%	\$ 44,351.66	-	\$ 44,351.66
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO (MINADA, CARGADA Y REGADA)	m³	8038.72	\$ 3.04	\$ 24,437.71	8,038.72	-	8,038.72	100.00%	\$ 24,437.71	-	\$ 24,437.71
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	m³	5669.65	\$ 11.06	\$ 62,706.33	4,594.31	485.72	5,080.03	89.60%	\$ 50,813.07	\$ 6,372.06	\$ 56,185.13
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	m³	3573.76	\$ 14.01	\$ 50,068.38	2,790.13	353.80	3,143.93	87.97%	\$ 39,086.72	\$ 4,956.74	\$ 44,046.46
15	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	m³-km	53827.27	\$ 0.63	\$ 33,911.18	53,827.27	-	53,827.27	100.00%	\$ 33,911.19	-	\$ 33,911.19
16	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	m³-km	163569.40	\$ 0.32	\$ 52,342.21	132,545.84	14,013.02	146,558.86	89.60%	\$ 42,414.66	\$ 4,484.17	\$ 46,898.83
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	m³-km	103102.87	\$ 0.32	\$ 32,992.95	80,496.35	10,207.13	90,702.38	87.97%	\$ 25,756.48	\$ 3,266.38	\$ 29,024.76
18	ASFALTO RC-250, PARA IMPRIMACION	l	37300.00	\$ 0.82	\$ 30,996.00	20,653.10	12,785.63	33,438.73	89.26%	\$ 17,181.54	\$ 10,484.22	\$ 27,665.76
19	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=3"	m²	27000.00	\$ 9.04	\$ 244,080.00	14,966.48	9,132.61	24,099.09	89.26%	\$ 135,286.98	\$ 82,565.79	\$ 217,855.77
20	HORMIGON PARA CUNETAS (FC=180 KG/Cm)	m³	1443.20	\$ 187.09	\$ 270,008.29	-	265.87	265.87	18.42%	\$ -	\$ 49,741.62	\$ 49,741.62
21	MARGAS EN PAVIMENTO - PINTURA ALTO TRAFICO	m	12600.00	\$ 0.50	\$ 7,560.00	-	-	-	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -
22	SENALES ECOLOGICAS (ø 44X1.22)m2	u	2.00	\$ 298.96	\$ 597.92	-	-	-	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -
23	SENALES INFORMATIVAS (ø 44X1.22)m2	u	5.00	\$ 298.96	\$ 1,494.80	-	-	-	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -



Nº	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Anticipo	Multas	% AVANCE ECONOMICO	Acumulado
24	SENALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)m2	u	5.00	\$ 124.58	\$ 622.95	-	-	0.00%	\$ -
25	SENALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75) m2	u	15.00	\$ 124.58	\$ 1,868.85	-	-	0.00%	\$ -
26	SENALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60mX0.80m) Moviles	u	2.00	\$ 72.87	\$ 145.74	2.00	-	100.00%	\$ 145.74
27	SENALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22mX0.60m) mOVILES	u	2.00	\$ 147.11	\$ 294.22	2.00	-	100.00%	\$ 294.22
28	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	u	1125.00	\$ 5.71	\$ 6,423.75	-	-	0.00%	\$ -
29	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETrero)-CON ESTRUCTURA	u	1.00	\$ 354.44	\$ 354.44	1.00	-	100.00%	\$ 354.44
30	SC COMO DE SEGURIDAD CON PROTECCION UV, 71Cm INCLY. CINTA REFLECTIVA	u	8.00	\$ 21.69	\$ 173.52	8.00	-	100.00%	\$ 173.52
31	SUMINISTRO DE PALETA DE ALTO Y SIGA	u	2.00	\$ 29.25	\$ 58.50	2.00	-	100.00%	\$ 58.50
32	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	m	500.00	\$ 0.31	\$ 155.00	500.00	-	100.00%	\$ 155.00
33	CONTENEDORES METALICOS DE 65 GALONES	u	2.00	\$ 17.31	\$ 34.62	2.00	-	100.00%	\$ 34.62
34	KIT ANTIDERRAMES	u	1.00	\$ 152.10	\$ 152.10	1.00	-	100.00%	\$ 152.10
35	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	u	20.00	\$ 44.69	\$ 893.80	20.00	-	100.00%	\$ 893.80
36	CAPACITACION SOBRE PRESERVACION DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	u	1.00	\$ 117.00	\$ 117.00	1.00	-	100.00%	\$ 117.00
37	CAPACITACION EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	u	1.00	\$ 117.00	\$ 117.00	1.00	-	100.00%	\$ 117.00
38	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	u	1.00	\$ 117.00	\$ 117.00	1.00	-	100.00%	\$ 117.00
TOTAL					\$ 956,686.70				\$ 601,046.55
									\$ 162,884.12
									\$ 683,932.67

LIQUIDACION DE LA PLANILLA			
VALOR DE LA PLANILLA	Esta Planilla	Anticipo	Multas
\$ 162,884.12	\$ 65,153.65	\$ -	\$ -
TOTAL PLANILLADO	222,306.11	222,306.11	222,306.11
DESCUENTOS			
ANTICIPO	40.00%	\$ 287,459.76	\$ -
MULTAS	0.10%	\$ 382,674.68	\$ -
TOTAL DE DESCUENTOS			
TOTAL A PAGARSE	\$ 65,153.65	\$ 95,214.92	\$ -
SON: NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA CON 47/100	\$ 97,730.47	\$ -	\$ -



JUAN MANUEL GUACHO
FISCALIZADOR

ING. JUAN GUACHO
FISCALIZADOR



KIMENA ALEXANDRA YEROVI MUNOZ
CONTRATISTA

ING. KIMENA ALEXANDRA YEROVI MUNOZ
CONTRATISTA



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
FISCALIZACION EXTERNA

PLANILLA DE EXCEDENTES DE OBRA N° 05

OBRA	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM. PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.	PARCIAL	ACUMULADO
FECHA DE CONTRATO	jueves, 30 de junio de 2022	\$	956,686.70
CONTRATISTA	ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ	\$	76,819.14
PLAZO	180		
AMPLIACIONES	0		
SUSPENSIÓN	0		
TOTAL	180		8.03%

FECHA DE PLANILLA:	5 de enero de 2023	V. CONTRATO:	
INICIO DEL PLAZO:	23 de agosto de 2022	V. PLANILLAS EXCEDENTES	
TERMINACIÓN DEL PLAZO:	19 de febrero de 2023	% DE AVANCE:	0.00%
PERÍODO:	1-dic-22		
	A		31/12/2022

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CONTRATO	TOTAL	CANTIDADES			IMPORTE			
						TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL EJECUCION	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
1	DESHROCE, DESHOSQUEY LIMPIEZA	Ha	1.80	\$ 550.36	\$ 990.65	-	-	-	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -
2	REPLANTEO Y NIVELACION A NIVEL DE ASFALTO	km	4.50	\$ 431.29	\$ 1,940.81	-	-	-	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -
3	REMOCION DE ALCANTARILLAS	m	76.00	\$ 12.71	\$ 965.96	-	-	-	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -
4	EXCAVACION PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	m³	1800.00	\$ 3.94	\$ 7,092.00	-	-	-	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -
5	EXCAVACION SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	m³	13176.98	\$ 0.97	\$ 12,781.67	23,627.02	-	23,627.02	179.31%	\$ 22,918.21	\$ -	\$ 22,918.21
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	m³	562.40	\$ 4.65	\$ 2,615.16	3,153.22	-	3,153.22	560.67%	\$ 14,662.47	\$ -	\$ 14,662.47
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	m³	1317.69	\$ 1.89	\$ 2,490.43	-	-	-	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -
8	TUBERIA DE ACERO CORRUGADO D= 120 m, E=2.5 mm, mP-100	m	75.00	\$ 364.44	\$ 27,333.00	22.00	-	22.00	29.33%	\$ 8,017.68	\$ -	\$ 8,017.68
9	TUBERIA DE ACERO CORRUGADO D= 150 m, E=2.5 mm, mP-100	m	36.00	\$ 482.97	\$ 17,386.92	-	-	-	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -
10	TUBERIA DE ACERO CORRUGADO D= 220 m, E=3.0 mm, mP-100	m	21.00	\$ 762.58	\$ 16,014.18	-	-	-	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -
11	MURO DE H.S. FC=180KG/Cm2 TIPO B(CABEZALES)	m³	235.20	\$ 186.57	\$ 44,351.66	12.91	-	12.91	5.49%	\$ 2,484.44	\$ -	\$ 2,484.44
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA, CARGADA Y .REGADA)	m³	8038.72	\$ 3.04	\$ 24,437.71	3,930.57	-	3,930.57	48.90%	\$ 11,948.93	\$ -	\$ 11,948.93
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	m³	5669.65	\$ 11.06	\$ 62,706.33	-	-	-	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	m³	3573.76	\$ 14.01	\$ 50,068.38	-	-	-	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -
15	TRANSPORTE MATERIAL PETRODE MEJORAMIENTO	m³-km	58927.27	\$ 0.63	\$ 33,911.16	26,726.05	-	26,726.05	49.65%	\$ 16,837.41	\$ -	\$ 16,837.41
16	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	m³-km	168569.40	\$ 0.32	\$ 52,342.21	-	-	-	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	m³-km	102102.97	\$ 0.32	\$ 32,992.95	-	-	-	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -
18	ASFALTO RC-250, PARA IMPRIMACION	l	37800.00	\$ 0.82	\$ 30,996.00	-	-	-	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -
19	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	m²	27000.00	\$ 9.04	\$ 244,080.00	-	-	-	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -
20	HORMIGON PARA CUNETAS (FC=180 KG/Cm)	m³	1443.20	\$ 187.09	\$ 270,008.29	-	-	-	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -
21	MARCAS EN PAVIMENTO - PINTURA ALTO TRAFICO	m	12600.00	\$ 0.60	\$ 7,560.00	-	-	-	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -
22	SENALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)m2	u	2.00	\$ 298.96	\$ 597.92	-	-	-	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -
23	SENALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)m2	u	5.00	\$ 298.96	\$ 1,494.80	-	-	-	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -



Nº	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	Valor Anticipo	Multas	% AVANCE ECONOMICO	Programado Ejecutado	Planillas Anteriores	Acumulado
24	SENALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)m2	u	5.00	\$ 124.59	\$ 622.95	-	-	0.00%	0.00%	-	\$ -
25	SENALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)m2	u	15.00	\$ 124.59	\$ 1,868.85	-	-	0.00%	0.00%	-	\$ -
26	SENALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60mX0.80m) Moviles	u	2.00	\$ 72.87	\$ 145.74	-	-	0.00%	0.00%	-	\$ -
27	SENALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22mX0.60m) mOVILES	u	2.00	\$ 147.11	\$ 294.22	-	-	0.00%	0.00%	-	\$ -
28	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	u	1125.00	\$ 5.71	\$ 6,423.75	-	-	0.00%	0.00%	-	\$ -
29	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	u	1.00	\$ 354.44	\$ 354.44	-	-	0.00%	0.00%	-	\$ -
30	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCION UV, 71cm INCLX. CINTA REFLECTIVA	u	8.00	\$ 21.69	\$ 173.52	-	-	0.00%	0.00%	-	\$ -
31	SUMINISTRO DE PALETA DE ALTO Y SIGA	u	2.00	\$ 28.25	\$ 56.50	-	-	0.00%	0.00%	-	\$ -
32	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	m	500.00	\$ 0.31	\$ 155.00	-	-	0.00%	0.00%	-	\$ -
33	CONTENEDORES METALICOS DE 55 GALLONES	u	2.00	\$ 17.31	\$ 34.62	-	-	0.00%	0.00%	-	\$ -
34	KIT ANTIDERRAMES	u	1.00	\$ 152.10	\$ 152.10	-	-	0.00%	0.00%	-	\$ -
35	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	u	20.00	\$ 44.69	\$ 893.80	-	-	0.00%	0.00%	-	\$ -
36	CAPACITACION SOBRE PRESERVACION DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	u	1.00	\$ 117.00	\$ 117.00	-	-	0.00%	0.00%	-	\$ -
37	CAPACITACION EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	u	1.00	\$ 117.00	\$ 117.00	-	-	0.00%	0.00%	-	\$ -
38	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	u	1.00	\$ 117.00	\$ 117.00	-	-	0.00%	0.00%	-	\$ -
TOTAL										\$ 76,819.14	\$ 76,819.14

VALOR DE LA PLANILLA		LIQUIDACION DE LA PLANILLA	
	\$	Deducciones	Anticipo
TOTAL PLANILLADO	\$ -	Esta Planilla	-
DESCUENTOS	\$ -	Total Anterior	-
ANTICIPO	40.00%	Total a la Fecha	-
MULTAS	0.10%	Valor anticipo	-
TOTAL DE DESCUENTOS	\$ -	Saldo Anticipo	-
SON: CERO CON 00/100	\$ -		



ING. JUAN GUACHO
FISCALIZADOR



ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUNOZ
CONTRATISTA



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
FISCALIZACION EXTERNA

CUADRO DE DIFERENCIA DE CANTIDADES (PLANILLA N°05)

OBRA: ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA #460 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.3KM. PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

FECHA DE CONTRATO: Jueves, 30 de junio de 2022

CONTRATISTA: ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ

PLAZO: 180

AMPLIACIONES: 0

SUSPENSION: 0

TOTAL: 180

FECHA DE PLANILLA: 5 de enero de 2022

INICIO DEL PLAZO: 23 de agosto de 2022

TERMINACION DEL PLAZO: 19 de febrero de 2023

PERIODO: 1-dic-22

Y. CONTRATO: \$

PARCIAL: \$

ACUMULADO: \$ 956.686.70

Días e partir de la orden de inicio

Días

Días

Días

A 31/12/2022

ITEMS	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO CONTRATO	TOTAL	CANTIDAD	EJECUTADO VALOR	%TOTAL	DIFERENCIAS	
									EXCEDENTES	POR EJECUTAR
1	Hr	DESROCE, DESBOSQUEY LIMPIEZA	1.80	\$ 500.36	\$ 900.65	1.80	\$ 900.65	100.00%	-	-
2	km	REPLANTEO Y NIVELACION A NIVEL DE ASFALTO	4.50	\$ 431.39	\$ 1,940.81	4.50	\$ 1,940.82	100.00%	-	-
3	m	Remocion de ALCANTARILLAS	76.00	\$ 12.71	\$ 965.96	67.00	\$ 851.57	88.16%	-	9.00
4	m³	EXCAVACION PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	1800.00	\$ 3.94	\$ 7,092.00	1,217.87	\$ 4,796.44	67.63%	-	582.63
5	m³	EXCAVACION SIN CLASIFICACION (OV. DE TIERRA)	13176.98	\$ 0.97	\$ 12,781.67	86,804.00	\$ 86,809.88	278.31%	28,027.02	\$ 22,915.21
6	m²	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	562.40	\$ 4.65	\$ 2,615.16	3,715.62	\$ 17,277.64	660.67%	3,153.22	\$ 14,662.47
7	m²	Lima PIEZA DE DERRUMBES	1317.69	\$ 1.89	\$ 2,490.43	1,317.69	\$ 2,490.43	100.00%	-	-
8	m	TUBERIA DE ACERO CORRUGADO D= 1.20 m. E=2.5 mm. mP=100	75.00	\$ 364.44	\$ 27,333.00	97.00	\$ 35,350.98	129.33%	22.00	\$ 8,017.68
9	m	TUBERIA DE ACERO CORRUGADO D= 1.60 m. E=2.5 mm. mP=100	36.00	\$ 482.97	\$ 17,386.92	36.00	\$ 17,386.92	100.00%	-	-
10	m	TUBERIA DE ACERO CORRUGADO D= 2.20 m. E=3.0 mm. mP=100	21.00	\$ 762.58	\$ 16,014.18	21.00	\$ 16,014.18	100.00%	-	-
11	m²	MURO DE H.S. FC=180KG./Cm2 TIPO ECABEZALES	285.20	\$ 188.57	\$ 44,931.66	248.11	\$ 46,786.10	105.49%	12.91	\$ 2,434.44
12	m²	MATERIAL PETRO D.F. MEJORAMIENTO (MINADA, CARGADA Y ARJADA)	8088.73	\$ 3.04	\$ 24,497.71	11,959.29	\$ 36,386.64	148.90%	3,990.57	\$ 11,948.93
13	m³	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	5669.65	\$ 11.06	\$ 62,706.33	5,080.03	\$ 56,185.13	89.60%	-	589.62
14	m³	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	3873.76	\$ 14.01	\$ 54,276.93	3,143.83	\$ 44,046.46	87.97%	-	429.83
15	m³-km	TRANSPORTE MATERIAL PETRO D.F. MEJORAMIENTO	5927.27	\$ 0.63	\$ 3,811.18	80,583.32	\$ 50,745.60	146.65%	26,725.05	\$ 16,837.41
16	m³-km	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	168569.40	\$ 0.32	\$ 52,942.31	146,555.86	\$ 46,898.83	86.69%	-	17,010.54
17	m³-km	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	103102.97	\$ 0.32	\$ 32,992.95	90,702.38	\$ 29,094.76	87.97%	-	12,400.59
18	l	ASFALTO RC-250, PARA IMPRIMACION	37500.00	\$ 0.82	\$ 30,896.00	33,738.73	\$ 27,655.76	89.26%	-	4,061.27
19	m³	C. RODADURA HOR.MIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	27000.00	\$ 9.04	\$ 244,080.00	24,089.09	\$ 217,855.77	89.26%	-	2,900.91
20	m²	HOR.MIGON PARA CUNETAS (FC=180 KG/Cm)	1443.20	\$ 187.09	\$ 270,000.29	265.87	\$ 49,741.62	18.42%	-	1,177.38
21	m	MARCAS EN PAVIMENTO - PINTURA ALTO TRAFICO	12800.00	\$ 0.60	\$ 7,680.00	-	\$ -	0.00%	-	12,600.00
22	u	SENALES BOTOLÓGICAS (2.4X1.22)m2	2.00	\$ 298.96	\$ 597.92	-	\$ -	0.00%	-	2.00
23	u	SENALES INFORMATIVAS (2.4X1.22)m2	5.00	\$ 298.96	\$ 1,494.80	-	\$ -	0.00%	-	5.00
24	u	SENALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)m2	5.00	\$ 124.59	\$ 622.95	-	\$ -	0.00%	-	5.00
25	u	SENALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)m2	15.00	\$ 124.59	\$ 1,868.85	-	\$ -	0.00%	-	15.00
26	u	SENALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60mX0.60m) Moviles	2.00	\$ 72.87	\$ 145.74	2.00	\$ 145.74	100.00%	-	-
27	u	SENALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22mX0.60m) MOVILES	2.00	\$ 147.11	\$ 294.22	2.00	\$ 294.22	100.00%	-	-
28	u	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	1125.00	\$ 5.71	\$ 6,423.75	-	\$ -	0.00%	-	1,125.00



29	PANCAJATA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETREAO)-CON ESTRUCTURA	u	1,00	\$ 354,44	\$ 354,44	354,44	1,00	\$ 354,44	100,00%	-	\$ -	\$ -
30	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCION UV, 71cm INCLY. CINTA REFLECTIVA	u	8,00	\$ 21,69	\$ 173,52	173,52	8,00	\$ 173,52	100,00%	-	\$ -	\$ -
31	SUMINISTRO DE PALETA DE ALTO Y SIGA	u	2,00	\$ 28,25	\$ 58,50	58,50	2,00	\$ 58,50	100,00%	-	\$ -	\$ -
32	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	m	500,00	\$ 0,31	\$ 155,00	155,00	500,00	\$ 155,00	100,00%	-	\$ -	\$ -
33	CONTENEDORES METALICOS DE 55 GALONES	u	2,00	\$ 17,31	\$ 34,62	34,62	2,00	\$ 34,62	100,00%	-	\$ -	\$ -
34	KIT ANTIDERRAMES	u	1,00	\$ 152,10	\$ 152,10	152,10	1,00	\$ 152,10	100,00%	-	\$ -	\$ -
35	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	u	20,00	\$ 44,69	\$ 893,80	893,80	20,00	\$ 893,80	100,00%	-	\$ -	\$ -
36	CAPACITACION SOBRE PRESERVACION DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	u	1,00	\$ 117,00	\$ 117,00	117,00	1,00	\$ 117,00	100,00%	-	\$ -	\$ -
37	CAPACITACION EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	u	1,00	\$ 117,00	\$ 117,00	117,00	1,00	\$ 117,00	100,00%	-	\$ -	\$ -
38	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	u	1,00	\$ 117,00	\$ 117,00	117,00	1,00	\$ 117,00	100,00%	-	\$ -	\$ -
									\$ 740,751.92		\$ 76,819.14	\$ 292,754.05



ING. JUAN MANUEL GUACHO
FISCALIZADOR



ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ
CONTRATISTA

ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ
CONTRATISTA

REAJUSTE PROVISIONAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 05

PROYECTO: ASFALTADO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.
CONTRATISTA: ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ

FECHA DE OFERTA : lunes, 9 de mayo de 2022
MES BASE PARA INDICE SUBCERO : ABRIL 2022
MES BASE PARA INDICE SUBUNO : NOVIEMBRE 2022
PLANILLA : PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 05
FECHA DE EJECUCION : DICIEMBRE 2022
MONTO PLANILLA MENOS 40% ANTICIPO \$ 97,730.47

CALCULO DE VALORES DE CUADRILLA TIPO:

[1] PERSONAL	[2] COEFICIENTE	ABRIL 2022	NOVIEMBRE 2022	ABRIL 2022	NOVIEMBRE 2022
		[3] S.R.H (0)	[4] S.R.H (1)	[5]=(2)*(3)	[6]=(2)*(4)
OPERADOR EQUIPO PESADO C1	0.041	4.290	4.290	0.176	0.176
OPERADOR EQUIPO PESADO C2	0.021	4.090	4.090	0.086	0.086
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3	0.000	4.300	4.300	0.000	0.000
CHOFER C1	0.119	5.620	5.620	0.669	0.669
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	0.051	4.290	4.290	0.219	0.219
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2	0.000	4.090	4.090	0.000	0.000
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	0.229	3.870	3.870	0.886	0.886
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	0.539	3.830	3.830	2.064	2.064
TOTAL :	1.000			4.100	4.100

CALCULO DE COEFICIENTES DE REAJUSTE:

[1] INSUMO	[2] COEFICIENTE	ABRIL 2022	NOVIEMBRE 2022	[5]=(4)/(3)	[6]=(5)*(2)
		[3] INDICE (0)	[4] INDICE (1)		
MANO DE OBRA	0.158	4.100	4.100	1.000	0.158
CEMENTO PORTLAND-SACOS	0.094	184.780	181.390	0.982	0.092
EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCC. VIAL	0.295	173.930	184.950	1.063	0.314
PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO	0.001	393.230	321.380	0.817	0.001
MADERA ASERRADA, CEPILLADA Y/O ESCUADRADA (PREPARADA)	0.055	516.920	512.780	0.992	0.055
BETÓN PETRÓLEO (ASFALTO) (O)	0.120	746.200	746.200	1.000	0.120
MATERIALES PÉTREOS-TUNGURAHUA	0.197	218.680	214.220	0.980	0.193
ALCANTARILLAS DE LÁMINA DE METAL Y ACC.	0.060	202.060	202.060	1.000	0.060
VARIOS IPC TUNGURAHUA	0.020	108.030	110.050	1.019	0.020
TOTAL :	1.000				1.013

VALOR DEL ANTICIPO (Po) :	\$ 97,730.47
COEFICIENTE DE REAJUSTE :	1.013
VALOR REAJUSTADO (Pr) :	\$ 99,000.97
VALOR DE REAJUSTE [Pr-Po] :	\$ 1,270.50
TOTAL A PAGARSE	\$ 1,270.50

SON: MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 50/100



Firmado electrónicamente por:
**XIMENA
 ALEXANDRA
 YEROVI MUÑOZ**

ING. XIMENA YEROVI MUÑOZ
CONTRATISTA:



Firmado electrónicamente por:
**JUAN MANUEL
 GUACHO GUACHO**

ING. JUAN GUACHO
FISCALIZADOR

ÍNDICES DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN

(BASE ABRIL/12 2000 = 100.00)

DENOMINACIÓN	2022												Nivel Nacional
	2021	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	
• Aceites, lubricantes, hidráulicos y afines	390.53	390.53	394.53	392.54	394.53	394.53	396.88	404.21	407.46	407.24	405.39	418.48	418.48
• Acero en barras	290.47	290.47	296.41	290.47	296.41	296.41	301.35	301.35	301.35	301.35	301.35	301.35	301.35
• Acero estructural para puentes	397.26	397.26	410.79	406.58	409.56	410.79	404.30	411.44	409.23	412.31	405.24	417.32	422.07
• Acefieno	250.34	250.34	255.28	255.28	255.28	255.28	255.28	255.28	255.28	255.28	258.39	258.39	258.39
• Aditivos para hormigones asfálticos 3/	240.55	240.55	241.88	241.50	243.82	255.48	253.86	259.90	269.30	269.44	266.46	261.97	252.73
• Alambres y cables para Inst. eléctricas	253.74	253.74	271.70	267.20	271.70	278.09	278.09	278.09	278.09	268.73	265.61	265.61	259.99
• Alambres y cables para Inst. telefónicas													
• Exteriores (1) 2/	254.72	254.72	271.30	254.85	267.72	271.30	274.48	272.46	258.42	259.15	256.24	255.74	257.57
• Interiores	358.97	358.97	362.68	360.02	360.02	362.68	362.68	362.68	362.68	359.98	355.87	355.87	339.79
• Alambres de metal	310.77	310.77	324.44	311.25	323.20	324.44	334.83	338.58	338.58	338.58	338.58	338.58	338.58
• Alcantarillas de láminas de metal y Acc.	138.93	138.93	202.06	202.06	202.06	202.06	202.06	202.06	202.06	202.06	202.06	202.06	202.06
• Arículos de soldadura	340.47	340.47	367.23	367.23	367.23	367.23	367.23	367.23	367.23	367.23	367.23	367.23	367.23
• Ascensores	146.13	146.13	150.68	148.25	149.29	150.68	151.41	151.41	151.20	151.33	152.47	153.41	153.38
• Azulejos, cerámicos vitrificados y porcelanatos	177.90	177.90	186.98	178.77	185.80	186.98	189.47	189.24	183.51	183.51	183.80	183.80	183.80
• Baldosas de vinil (1) 5/	109.71	109.71	111.08	109.71	111.08	111.08	111.08	114.56	114.56	114.56	116.38	116.38	117.38
• Betún petróleo (Asfalto) (O)	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20
• Bombas de Agua	173.65	173.65	182.89	180.66	183.20	182.89	183.73	185.82	192.19	192.19	192.50	193.96	193.81
• Calderas	197.49	197.49	222.47	212.45	212.45	222.47	218.74	218.74	223.91	221.04	221.04	221.04	222.55
• Cal química	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19
• Carpint. de hierro (puertas enrollables)	273.96	273.96	273.92	271.09	273.92	276.16	276.16	276.16	276.16	276.16	276.16	276.16	278.34
• Cementina	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31
• Cemento Portland	176.50	176.50	185.91	185.91	185.91	185.91	185.91	185.91	185.91	185.91	185.91	185.91	182.28
• Sacos	175.31	175.31	184.78	184.78	184.78	184.78	184.78	184.78	184.78	184.78	184.78	184.78	181.39
• Granel	182.20	182.20	191.24	191.24	191.24	191.24	191.24	191.24	191.24	191.24	191.24	191.24	186.22
• Centrales telefónicas	66.86	66.86	68.58	73.24	69.17	68.58	71.11	69.14	72.85	73.35	71.24	71.24	72.27
• Cerraduras y similares	412.14	412.14	437.45	437.45	437.45	437.45	437.45	437.45	437.45	437.45	437.45	437.45	437.45

* Índice provisional de noviembre 2022

ÍNDICES DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN
(BASE ABRIL/12 2000 = 100.00)

D E N O M I N A C I Ó N	2 0 2 2												Nivel Nacional	
	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
Ductos de planchas galvanizadas	543.66	543.66	564.66	575.16	575.16	575.16	575.16	575.16	575.16	575.16	575.16	575.16	575.16	575.16
Emulsiones asfálticas (1/)	234.53	234.53	234.53	234.53	269.06	289.06	289.06	271.76	280.83	280.83	280.83	280.83	280.83	280.83
Equipo de aire acondicionado	159.23	167.21	167.51	181.72	181.52	181.50	182.58	186.43	187.91	192.07	188.32	188.32	188.32	188.32
Equipo de circuito cerrado de televisión	135.06	136.03	136.46	141.85	140.96	141.82	141.42	142.03	142.13	145.70	144.81	144.81	144.81	144.81
Equipo para detección de incendios	102.23	109.35	109.35	109.45	109.45	109.45	109.45	109.45	109.45	109.45	109.45	109.45	109.45	109.45
Equipo para lavado y secado de ropa	112.35	118.61	122.38	122.38	121.93	123.76	123.76	123.55	125.72	125.35	127.73	127.73	127.73	127.73
Equipo para tratamiento de aguas residuales	167.76	170.84	171.66	175.81	175.50	180.95	182.03	185.24	185.80	185.62	186.69	186.69	186.69	186.69
Equipo y maquinaria de Construc. vial	170.19	175.19	171.95	171.79	173.93	177.21	179.69	179.72	184.35	184.59	184.99	184.99	184.99	184.99
Equipo y maquinaria para aseo de áreas y vías públicas	175.07	181.20	182.79	185.70	188.30	187.07	189.13	196.63	198.43	199.41	203.39	203.39	203.39	203.39
Explosivos y Aditamentos	280.53	280.53	280.53	280.53	280.53	350.52	350.52	350.52	350.52	388.44	388.44	388.44	388.44	388.44
Grifería y similares	263.40	263.40	263.40	263.40	263.40	263.40	263.40	263.40	263.40	263.40	263.40	263.40	263.40	263.40
Grupos electrogénos	172.97	177.02	179.84	180.63	182.23	183.13	184.21	187.51	188.22	191.31	191.20	191.20	191.20	191.20
Hidráulicos	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74
Hormigón premezclado	216.91	219.24	222.07	223.35	223.26	224.24	224.86	224.86	224.86	224.86	224.86	224.86	224.86	224.86
Instalaciones eléctricas (vivienda)	278.35	280.18	286.53	287.63	289.15	289.15	289.06	288.98	286.73	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00
Instalaciones sanitarias (vivienda)	249.38	249.54	249.13	251.60	251.83	254.53	253.64	253.08	252.36	250.17	250.59	250.59	250.59	250.59
Interruptores y tomacorrientes (tacos)	208.10	208.10	211.47	211.47	211.47	211.47	211.47	211.47	211.47	211.47	211.47	211.47	211.47	211.47
Ladrillos arcilla (prensados Huecos)	308.76	314.20	316.27	316.88	316.88	322.34	325.61	325.61	325.61	325.61	325.61	325.61	325.61	325.61
Láminas de acero de espesor mayor a 10 mm	195.02	206.03	208.34	206.68	208.03	207.76	207.76	208.98	208.42	208.42	209.20	209.20	209.20	209.20
Láminas y placas asfálticas	285.23	285.23	285.23	285.23	378.92	378.92	378.92	384.17	401.92	401.92	401.92	401.92	401.92	401.92
Láminas y planchas Galv. Pre pintadas moldeadas (cubiertas y recubrimientos)	168.00	170.55	170.55	170.55	170.55	170.55	170.55	160.92	145.66	145.66	145.66	145.66	145.66	145.66
Luminarias para lámparas, aparatos y Acc. Eléctricos	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70
Para alumbrado público	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01
Para interiores	514.38	514.38	514.38	516.92	516.92	519.64	516.32	516.32	512.78	512.78	512.78	512.78	512.78	512.78
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparada)	317.63	317.63	317.63	317.63	317.63	322.58	334.67	334.67	334.67	334.67	334.67	334.67	334.67	334.67
Madera tratada químicamente (postes)	342.85	344.92	344.92	348.14	360.49	371.83	376.95	376.95	376.95	376.95	376.95	376.95	376.95	376.95
Mallas diversas (tumbados)	343.76	345.06	345.06	344.60	344.03	351.41	358.32	358.32	358.32	358.32	358.32	358.32	358.32	358.32
Mallas metálicas (gaviones)	345.66	346.98	346.98	346.74	346.46	357.10	367.07	367.07	367.07	367.07	367.07	367.07	367.07	367.07
Mallas metálicas para cerramiento	149.86	149.86	150.84	164.86	164.61	164.59	164.31	166.12	165.92	165.92	160.18	160.18	160.18	160.18
Medidores y contadores de agua (1)														

* Índice provisional de noviembre 2022

ÍNDICES DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN

(BASE ABRIL/12 2000 = 100.00)

DENOMINACIÓN	2022												Nivel Nacional	
	2021 DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		
Oxígeno	*	143.07	147.20	147.20	147.20	147.20	147.20	147.20	147.20	152.86	152.86	152.86	152.86	152.86
Parquet	*	514.46	514.46	514.46	514.46	514.46	487.96	487.96	487.96	487.96	487.96	487.96	487.96	487.96
Perfiles de aluminio	*	227.35	230.56	231.17	234.19	237.02	239.90	239.90	239.90	239.90	239.90	239.90	239.90	235.83
Perfiles estructurales de acero	*	393.11	386.69	368.75	383.24	393.23	354.72	332.02	322.12	321.94	321.94	321.94	321.94	321.38
Piezas de hierro fundido	*	255.45	255.45	255.45	255.45	255.45	255.45	255.45	255.45	255.45	255.45	255.45	255.45	255.45
Piezas sanitarias de metal	EI/	153.31	153.31	153.31	153.31	153.31	153.31	153.31	153.31	153.31	153.31	153.31	153.31	153.31
Piezas sanitarias porcelana vitrificada	*	254.57	254.57	254.57	254.57	254.57	265.59	265.59	265.59	265.59	265.59	265.59	265.59	265.59
Inodoros	*	249.38	249.38	249.38	249.38	249.38	259.75	259.75	259.75	259.75	259.75	259.75	259.75	259.75
Lavamanos	*	268.70	268.70	268.70	268.70	268.70	281.32	281.32	281.32	281.32	281.32	281.32	281.32	281.32
Urinaríos	*	206.61	206.61	206.61	206.61	206.61	217.48	217.48	217.48	217.48	217.48	217.48	217.48	217.48
Pinturas al látex	*	255.63	259.20	264.67	264.67	265.87	268.23	269.79	270.23	270.93	270.93	271.21	271.21	271.21
Pinturas anticorrosivas	*	261.94	262.33	261.99	261.99	263.58	267.21	272.72	276.29	276.40	276.40	276.40	276.40	276.40
Placas de piedra (cortada a máquina)	*	170.21	170.21	170.21	170.21	176.90	180.25	180.25	180.25	180.25	180.25	180.25	180.25	180.25
Placas y adoquines de piedra (cortada manualmente)	*	612.85	612.85	612.85	612.85	612.85	612.85	612.85	612.85	612.85	612.85	612.85	612.85	612.85
Placas y piezas complementarias de fibra cemento	*	267.80	267.80	283.91	283.91	283.91	283.91	283.91	283.91	283.91	283.91	283.91	283.91	283.91
Postes de hormigón armado	*	287.74	287.74	287.74	287.74	287.97	288.35	288.35	288.35	288.35	288.35	288.35	288.35	288.35
Productos diversos de arcilla, gres (para recubrimiento y acabados)	*	321.42	328.31	331.04	331.04	331.04	340.89	346.82	346.82	346.82	346.82	346.82	346.82	346.82
Productos de vidrio (mosaicos)	*	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48
Productos geosintéticos	*	128.10	128.10	128.10	128.10	128.10	128.10	128.10	128.10	128.10	128.10	128.10	128.10	128.10
Productos metálicos estructurales electrosoldados	*	275.74	276.51	276.51	279.36	278.58	297.83	308.24	308.24	308.24	308.24	308.24	308.24	308.24
Productos para juntas y tapajuntas	*	321.20	364.04	364.04	364.04	391.34	391.34	392.91	398.14	398.14	398.14	398.14	398.14	479.69
Productos químicos para hormigón y morteros	*	233.31	247.38	247.38	247.38	247.38	247.38	247.38	247.38	247.38	247.38	247.38	247.38	265.23
Repuestos para maquinaria de construcción	*	154.16	155.62	158.41	158.69	160.75	161.26	160.76	166.01	166.76	169.69	171.31	172.44	172.44

* Índice provisional de noviembre 2022

EI/ Índice a eliminarse, por falta de información de empresas productoras

ÍNDICES DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN

(BASE ABRIL/12 2000 = 100.00)

D E N O M I N A C I Ó N	2 0 2 2											
	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
Adoquines de hormigón	262.56	263.05	262.89	262.89	263.38	263.43	263.43	264.00	264.08	264.08	264.08	264.08
Baldosas de hormigón	239.70	239.70	239.70	239.70	239.70	239.70	239.70	239.70	239.70	239.70	239.70	239.70
Bloques de hormigón	318.84	318.84	318.84	318.84	319.30	319.35	319.35	319.62	319.62	319.62	319.62	319.62
Ladrillos comunes de arcilla	362.05	362.05	362.05	362.05	362.05	362.05	362.05	362.05	362.05	362.05	362.05	362.05
Materiales pétreos	398.74	398.74	398.74	398.74	400.14	407.42	407.47	407.47	407.47	407.47	412.09	412.09
Tubos de hormigón simple y accesorios	296.65	296.65	296.65	296.65	296.65	296.65	307.41	307.41	307.41	307.41	307.41	307.41
Tubos de hormigón armado y accesorios	326.03	326.03	326.03	326.03	326.03	326.03	338.98	338.98	338.98	338.98	338.98	338.98

Pichincha

D E N O M I N A C I Ó N	2 0 2 2											
	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
Bloques de hormigón	103.06	103.64	104.56	104.56	104.56	104.56	104.56	104.56	104.56	104.56	104.56	104.56
Ladrillos comunes de arcilla	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Santa Elena

D E N O M I N A C I Ó N	2 0 2 1											
	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
Adoquines de hormigón	100.00	100.00	100.00	101.92	103.49	103.49	103.49	103.49	103.49	106.46	106.46	106.46
Bloques de hormigón	100.00	100.12	97.24	100.29	102.36	102.36	102.36	102.36	102.36	103.76	103.76	103.76
Materiales pétreos	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	101.53	102.96

Santo Domingo de los Tsáchilas

D E N O M I N A C I Ó N	2 0 2 1											
	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
Adoquines de hormigón	250.44	246.22	245.92	245.92	245.92	245.92	245.92	245.92	245.92	245.92	245.92	245.92
Bloques de hormigón	247.98	248.94	249.02	249.02	249.02	249.02	247.29	245.19	247.02	247.02	247.02	247.64
Ladrillos comunes de arcilla	204.54	204.54	204.54	204.54	204.54	204.54	204.54	204.54	204.54	204.54	204.54	204.54
Materiales pétreos	215.15	215.29	216.23	215.55	218.68	222.05	219.44	219.44	221.60	221.60	214.22	214.22
Tubos de hormigón simple y accesorios	281.77	283.72	286.74	286.74	286.74	295.12	295.12	295.12	295.12	295.12	295.12	295.12

Tungurahua

BOLETÍN INEC-IPCO No 272

se indaga el precio de contado que pagan los consumidores al momento de adquirir un bien o servicio, incluyendo el pago por concepto de impuestos que gravan al consumo como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), o el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) (SCN 2008).

Los índices y variaciones (mensual, anual y acumulada) del IPC se generan para todos los niveles de desagregación de la canasta de acuerdo a la Clasificación del Consumo Individual por Finalidades (CCIF): División, Grupo, Clase, Subclase y Producto; y, geográficamente a nivel: nacional; regional (Costa y Sierra); y para nueve ciudades auto-representadas (Quito, Ambato, Cuenca, Loja, Guayaquil, Esmeraldas, Manta, Machala y Santo Domingo de los Colorados).

Notas para el lector:

- La investigación mensual de precios se realiza en aproximadamente 5.273 establecimientos económicos y 3.942 viviendas alquiladas (casa, departamento o pieza) del área urbana, en 9 ciudades auto-representadas.
- El cambio de año base del IPC (Base: 2014=100), tiene como finalidad actualizar la estructura de consumo de los hogares ecuatorianos.
- A fin de contar con series históricas comparables en el tiempo, se realiza un proceso de empalme; que consiste en enlazar la serie de índices del IPC (Base: 2014=100) con la serie del IPC (Base: 2004=100). Para efectos del enlace, se requiere de los denominados "factores de empalme", los cuales se determinan para ciertos dominios geográficos y para ciertos niveles de agregación, según la estructura Clasificación del Consumo Individual por Finalidades (CCIF), considerando que existen importantes diferencias entre cada cambio de año base.

Principales resultados

1. Evolución del Índice de Precios al Consumidor y sus variaciones: estructura e incidencia nacional

En noviembre de 2022, el Índice de Precios al Consumidor se ubicó en 110,05. Con esto, la **inflación mensual** es de -0,01%, comparado con el mes anterior que fue de 0,12%, mientras que en noviembre de 2021 se ubicó en 0,36%.

Tabla 1. Índice de Precios al Consumidor y sus variaciones

Mes	Índice	Inflación Mensual	Inflación Anual	Inflación Acumulada
nov-21	106,18	0,36%	1,84%	1,87%
dic-21	106,26	0,07%	1,94%	1,94%
ene-22	107,02	0,72%	2,56%	0,72%
feb-22	107,27	0,23%	2,71%	0,96%
mar-22	107,39	0,11%	2,64%	1,07%
abr-22	108,03	0,59%	2,89%	1,67%
may-22	108,63	0,56%	3,38%	2,24%
jun-22	109,34	0,65%	4,23%	2,90%
jul-22	109,51	0,16%	3,86%	3,06%
ago-22	109,54	0,03%	3,77%	3,09%
sep-22	109,93	0,36%	4,12%	3,46%
oct-22	110,06	0,12%	4,02%	3,58%
nov-22	110,05	-0,01%	3,64%	3,57%

Fuente: Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Gráfico 1. Inflación mensual en los meses de noviembre



Fuente: Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Por su parte, la **inflación anual** en noviembre de 2022 fue de 3,64%, en el mes anterior fue de 4,02% y la de noviembre de 2021 se ubicó en 1,84%.

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA DE TRANSPORTE, VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y AEROPORTUARIA
ENERO A ————— DE 2022
(SALARIOS EN DÓLARES)

REAJUSTE DE PRECIOS
SALARIOS MÍNIMOS POR LEY

CATEGORÍAS OCUPACIONALES	SUELDO UNIFICADO	DÉCIMO TERCER	DÉCIMO CUARTO	TRANS- PORTE	APORTE PATRONAL	FONDO RESERVA	TOTAL ANUAL	JORNAL REAL	COSTO HORARIO
REMUNERACIÓN BÁSICA UNIFICADA MÍNIMA	425,00								
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS TÉCNICOS Y ARQUITECTÓNICOS									
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2									
Peón	436,05	436,05	425,00		635,76	436,05	7.165,46	30,62	3,83
Ayudante de albañil	436,05	436,05	425,00		635,76	436,05	7.165,46	30,62	3,83
Ayudante de carpintero	436,05	436,05	425,00		635,76	436,05	7.165,46	30,62	3,83
Ayudante de electricista	436,05	436,05	425,00		635,76	436,05	7.165,46	30,62	3,83
Ayudante de herrero	436,05	436,05	425,00		635,76	436,05	7.165,46	30,62	3,83
Ayudante de plomero	436,05	436,05	425,00		635,76	436,05	7.165,46	30,62	3,83
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2									
Ayudante de maquinaria	448,68	448,68	425,00		654,18	448,68	7.360,70	31,46	3,93
Albañil	441,73	441,73	425,00		644,04	441,73	7.253,26	31,00	3,87
Operador de equipo liviano	441,73	441,73	425,00		644,04	441,73	7.253,26	31,00	3,87
Pintor	441,73	441,73	425,00		644,04	441,73	7.253,26	31,00	3,87
Pintor de exteriores	441,73	441,73	425,00		644,04	441,73	7.253,26	31,00	3,87
Pintor empapelador	441,73	441,73	425,00		644,04	441,73	7.253,26	31,00	3,87
Herrero	441,73	441,73	425,00		644,04	441,73	7.253,26	31,00	3,87
Carpintero	441,73	441,73	425,00		644,04	441,73	7.253,26	31,00	3,87
Encofrador o carpintero de ribera	441,73	441,73	425,00		644,04	441,73	7.253,26	31,00	3,87
Plomero	441,73	441,73	425,00		644,04	441,73	7.253,26	31,00	3,87
Electricista o instalador de revestimiento en general	441,73	441,73	425,00		644,04	441,73	7.253,26	31,00	3,87
Ayudante de perforador	441,73	441,73	425,00		644,04	441,73	7.253,26	31,00	3,87
Cadenero	441,73	441,73	425,00		644,04	441,73	7.253,26	31,00	3,87
Mampostero	441,73	441,73	425,00		644,04	441,73	7.253,26	31,00	3,87
Enlucidor	441,73	441,73	425,00		644,04	441,73	7.253,26	31,00	3,87
Hojalatero	441,73	441,73	425,00		644,04	441,73	7.253,26	31,00	3,87
Técnico liniero eléctrico	441,73	441,73	425,00		644,04	441,73	7.253,26	31,00	3,87
Técnico en montaje de subestaciones	441,73	441,73	425,00		644,04	441,73	7.253,26	31,00	3,87
Técnico electromecánico de construcción	441,73	441,73	425,00		644,04	441,73	7.253,26	31,00	3,87
Obrero especializado en la elaboración de prefabricados de hormigón	441,73	441,73	425,00		644,04	441,73	7.253,26	31,00	3,87
Parqueteros y colocadores de pisos	441,73	441,73	425,00		644,04	441,73	7.253,26	31,00	3,87
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1									
Maestro eléctrico/liniero/subestaciones	492,49	492,49	425,00		718,05	492,49	8.037,91	34,35	4,29
Maestro mayor en ejecución de obras civiles	492,49	492,49	425,00		718,05	492,49	8.037,91	34,35	4,29
Maestro soldador especializado (En Construcción - Estr.Oc.C1)	492,49	492,49	425,00		718,05	492,49	8.037,91	34,35	4,29
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2									
Operador de perforador (En Construcción)	467,44	467,44	425,00		681,53	467,44	7.650,69	32,70	4,09
Perfilero (En Construcción)	467,44	467,44	425,00		681,53	467,44	7.650,69	32,70	4,09
Técnico en albañilería	467,44	467,44	425,00		681,53	467,44	7.650,69	32,70	4,09
Técnico en obras civiles	467,44	467,44	425,00		681,53	467,44	7.650,69	32,70	4,09
Maestro de obra	467,45	467,45	425,00		681,54	467,45	7.650,84	32,70	4,09
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3									
Inspector de obra	493,34	493,34	425,00		719,29	493,34	8.051,05	34,41	4,30
Supervisor eléctrico general	493,34	493,34	425,00		719,29	493,34	8.051,05	34,41	4,30
Supervisor sanitario general	493,34	493,34	425,00		719,29	493,34	8.051,05	34,41	4,30
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B1									
Ingeniero Eléctrico	494,61	494,61	425,00		721,14	494,61	8.070,68	34,49	4,31
Ingeniero Civil (Estructural, Hidráulico y Vial)	494,61	494,61	425,00		721,14	494,61	8.070,68	34,49	4,31
Residente de Obra	494,61	494,61	425,00		721,14	494,61	8.070,68	34,49	4,31
LABORATORIO									
Laboratorista (En Construcción - Estr.Oc.C1)	492,49	492,49	425,00		718,05	492,49	8.037,91	34,35	4,29
TOPOGRAFÍA									
Topógrafo (En Construcción - Estr.Oc.C1)	492,49	492,49	425,00		718,05	492,49	8.037,91	34,35	4,29
DIBUJANTES									
Dibujante (En Construcción - Estr.Oc.C2)	467,44	467,44	425,00		681,53	467,44	7.650,69	32,70	4,09
OPERADORES Y MECÁNICOS DE EQUIPO PESADO Y CAMINERO DE EXCAVACIÓN, CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA Y OTRAS SIMILARES									
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1									
Motoveladora	492,49	492,49	425,00		718,05	492,49	8.037,91	34,35	4,29
Excavadora	492,49	492,49	425,00		718,05	492,49	8.037,91	34,35	4,29
Grúa puente de elevación	492,49	492,49	425,00		718,05	492,49	8.037,91	34,35	4,29
Pala de castillo	492,49	492,49	425,00		718,05	492,49	8.037,91	34,35	4,29
Grúa estacionaria	492,49	492,49	425,00		718,05	492,49	8.037,91	34,35	4,29
Draga/Draglino	492,49	492,49	425,00		718,05	492,49	8.037,91	34,35	4,29
Tractor de carriles o ruedas (bulldozer, topador, roturador, malacate, tralle)	492,49	492,49	425,00		718,05	492,49	8.037,91	34,35	4,29
Tractor tiende tubos (side bone)	492,49	492,49	425,00		718,05	492,49	8.037,91	34,35	4,29
Mototralla	492,49	492,49	425,00		718,05	492,49	8.037,91	34,35	4,29
Cargadora frontal (Payloader, sobre ruedas u orugas)	492,49	492,49	425,00		718,05	492,49	8.037,91	34,35	4,29
Retroexcavadora	492,49	492,49	425,00		718,05	492,49	8.037,91	34,35	4,29
Auto-tren cama baja (trayler)	492,49	492,49	425,00		718,05	492,49	8.037,91	34,35	4,29
Fresadora de pavimento asfáltico / Rotomil	492,49	492,49	425,00		718,05	492,49	8.037,91	34,35	4,29
Recicladora de pavimento asfáltico / Rotomil	492,49	492,49	425,00		718,05	492,49	8.037,91	34,35	4,29
Planta de emulsión asfáltica	492,49	492,49	425,00		718,05	492,49	8.037,91	34,35	4,29
Máquina para sellos asfálticos	492,49	492,49	425,00		718,05	492,49	8.037,91	34,35	4,29
Squidder	492,49	492,49	425,00		718,05	492,49	8.037,91	34,35	4,29
Camión articulado con volteo (En Construcción)	492,49	492,49	425,00		718,05	492,49	8.037,91	34,35	4,29
Camión mezclador para micropavimentos	492,49	492,49	425,00		718,05	492,49	8.037,91	34,35	4,29
Camión sistema para cemento y asfalto (Adicional al traslado debe conectar los equipos para embarque y desembarque, montrear equipo de presión)	492,49	492,49	425,00		718,05	492,49	8.037,91	34,35	4,29
Perforadora de brazos múltiples (lumbo)	492,49	492,49	425,00		718,05	492,49	8.037,91	34,35	4,29
Máquina tuneladora (topo)	492,49	492,49	425,00		718,05	492,49	8.037,91	34,35	4,29
Concretera rodante / migser (sic)	492,49	492,49	425,00		718,05	492,49	8.037,91	34,35	4,29
Máquina extendidora de adoquín	492,49	492,49	425,00		718,05	492,49	8.037,91	34,35	4,29
Máquina zanjadora	492,49	492,49	425,00		718,05	492,49	8.037,91	34,35	4,29

Nota: El listado corresponde exclusivamente a las estructuras ocupacionales que constan en la publicación de los salarios de las Comisiones Sectoriales del Ministerio del Trabajo, en los Acuerdos Ministeriales MDT-2021-276 y MDT-2021-277 de 21 y 22 de diciembre de 2021, respectivamente, que están en vigencia a partir del 1 de enero de 2022.

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA DE TRANSPORTE, VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y AEROPORTUARIA
ENERO A ----- DE 2022
(SALARIOS EN DÓLARES)

REAJUSTE DE PRECIOS
SALARIOS MÍNIMOS POR LEY

CATEGORÍAS OCUPACIONALES	SUELDO UNIFICADO	DÉCIMO TERCER	DÉCIMO CUARTO	TRANS- PORTE	APORTE PATRONAL	FONDO RESERVA	TOTAL ANUAL	JORNAL REAL	COSTO HORARIO
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2									
Operador responsable de planta homigonera	467,44	467,44	425,00		681,53	467,44	7.650,69	32,70	4,09
Operador responsable de planta trituradora	467,44	467,44	425,00		681,53	467,44	7.650,69	32,70	4,09
Operador responsable de planta asfáltica	467,44	467,44	425,00		681,53	467,44	7.650,69	32,70	4,09
Operador de track drill	467,44	467,44	425,00		681,53	467,44	7.650,69	32,70	4,09
Operador de rodillo autopropulsado	467,44	467,44	425,00		681,53	467,44	7.650,69	32,70	4,09
Operador de distribuidor de asfalto	467,44	467,44	425,00		681,53	467,44	7.650,69	32,70	4,09
Operador de distribuidor de agregados	467,44	467,44	425,00		681,53	467,44	7.650,69	32,70	4,09
Operador de acabadora de pavimento de hormigón	467,44	467,44	425,00		681,53	467,44	7.650,69	32,70	4,09
Operador de acabadora de pavimento asfáltico	467,44	467,44	425,00		681,53	467,44	7.650,69	32,70	4,09
Operador de grada elevadora / canastilla elevadora	467,44	467,44	425,00		681,53	467,44	7.650,69	32,70	4,09
Operador de bomba impulsadora de hormigón, equipos móviles de planta, molino de amianto, planta dosificadora de hormigón, productos terminados (tanques moldeados, postes de alumbrado eléctrico, acabados de piezas afines)	467,44	467,44	425,00		681,53	467,44	7.650,69	32,70	4,09
Operador de tractor de ruedas (barredora, cegadora, rodillo remolcado, franjeadora)	467,44	467,44	425,00		681,53	467,44	7.650,69	32,70	4,09
Operador de caldero planta asfáltica	467,44	467,44	425,00		681,53	467,44	7.650,69	32,70	4,09
Operador de barredora autopropulsada	467,44	467,44	425,00		681,53	467,44	7.650,69	32,70	4,09
Operador de punzón neumático	467,44	467,44	425,00		681,53	467,44	7.650,69	32,70	4,09
Operador compresor	467,44	467,44	425,00		681,53	467,44	7.650,69	32,70	4,09
Camión de carga frontal (En Construcción)	467,44	467,44	425,00		681,53	467,44	7.650,69	32,70	4,09
Operador de camión de volteo con o sin articulación / Dumper (En Construcción)	467,44	467,44	425,00		681,53	467,44	7.650,69	32,70	4,09
Operador miniexcavadora/minicargadora con sus aditamentos	467,44	467,44	425,00		681,53	467,44	7.650,69	32,70	4,09
Operador termoformado	467,44	467,44	425,00		681,53	467,44	7.650,69	32,70	4,09
Técnico en carpintería	467,44	467,44	425,00		681,53	467,44	7.650,69	32,70	4,09
Técnico en mantenimiento de viviendas y edificios	467,44	467,44	425,00		681,53	467,44	7.650,69	32,70	4,09
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C3									
Operador máquina estacionaria clasificadora de material	448,68	448,68	425,00		654,18	448,68	7.360,70	31,46	3,93
Soldador en construcción	448,68	448,68	425,00		654,18	448,68	7.360,70	31,46	3,93
MECÁNICOS									
Mecánico de equipo pesado caminero (En Construcción - Estr.Oc.C1)	492,49	492,49	425,00		718,05	492,49	8.037,91	34,35	4,29
Mecánico de equipo liviano (Estr.Oc.C3)	448,68	448,68	425,00		654,18	448,68	7.360,70	31,46	3,93
SIN TÍTULO									
Engrasador o abastecedor responsable en construcción (En Construcción - Estr.Oc.D2)	441,73	441,73	425,00		644,05	441,73	7.253,33	31,00	3,87
CHOFERES PROFESIONALES									
CHOFER: De vehículos de emergencia (Ambulancia, motobomba, carro cisterna, entre otros - Estr.Oc.C1)	653,27	653,27	425,00		952,47	653,27	10.523,25	44,87	5,62
CHOFER: Para camiones pasados y extra pasados con o sin remolque de más de 3.5 toneladas (Estr.Oc.C1)	653,27	653,27	425,00		952,47	653,27	10.523,25	44,87	5,62
CHOFER: Tráiler (Estr.Oc.C1)	653,27	653,27	425,00		952,47	653,27	10.523,25	44,87	5,62
CHOFER: Vokquetas (Estr.Oc.C1)	653,27	653,27	425,00		952,47	653,27	10.523,25	44,87	5,62
CHOFER: Tanqueros (Estr.Oc.C1)	653,27	653,27	425,00		952,47	653,27	10.523,25	44,87	5,62
CHOFER: Plataformas (Estr.Oc.C1)	653,27	653,27	425,00		952,47	653,27	10.523,25	44,87	5,62
CHOFER: Otros camiones (Estr.Oc.C1)	653,27	653,27	425,00		952,47	653,27	10.523,25	44,87	5,62
CHOFER: Para ferrocarriles (Estr.Oc.C1)	653,27	653,27	425,00		952,47	653,27	10.523,25	44,87	5,62
CHOFER: Para auto ferros (Estr.Oc.C1)	653,27	653,27	425,00		952,47	653,27	10.523,25	44,87	5,62
CHOFER: Camiones para transportar mercancías o sustancias peligrosas y otros vehículos especiales (Estr.Oc.C1)	653,27	653,27	425,00		952,47	653,27	10.523,25	44,87	5,62
CHOFER: Para transporte Escolares-Personal y turismo, hasta 45 pasajeros (Estr.Oc.C2)	646,41	646,41	425,00		942,47	646,41	10.417,21	44,52	5,56
CHOFER: Para camiones sin acoplados (Estr.Oc.C3)	631,19	631,19	425,00		920,28	631,19	10.181,94	43,51	5,44
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2									
Operador de bomba lanzadora de concreto	467,44	467,44	425,00		681,53	467,44	7.650,69	32,70	4,09
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2									
Preparador de mezcla de materias primas	441,73	441,73	425,00		644,04	441,73	7.253,26	31,00	3,87
Tubero (En Construcción)	441,73	441,73	425,00		644,04	441,73	7.253,26	31,00	3,87
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2									
Resanador en general (En Construcción)	436,05	436,05	425,00		635,76	436,05	7.165,46	30,62	3,83
Tinero de pasta de amianto	436,05	436,05	425,00		635,76	436,05	7.165,46	30,62	3,83
OPERADORES Y MECÁNICOS DE EQUIPO PESADO EN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES									
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2									
Excavadora Grúa (Grupo A: operadores tabla 1)	441,35	441,35	425,00		643,49	441,35	7.247,39	30,97	3,87
Perforadora de pozos profundos o rodantes (Grupo A: operadores tabla 1)	441,35	441,35	425,00		643,49	441,35	7.247,39	30,97	3,87
Nota: El listado corresponde exclusivamente a las estructuras ocupacionales que constan en la publicación de los salarios de las Comisiones Sectoriales del Ministerio del Trabajo, en los Acuerdos Ministeriales MDT-2021-276 y MDT-2021-277 de 21 y 22 de diciembre de 2021, respectivamente; que están en vigencia a partir del 1 de enero de 2022.									

ANEXOS GRÁFICOS DE VOLÚMENES DE OBRA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL PASTAZA



ANEXOS DE VOLUMENES DE OBRA



OBRA	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CONTRATISTA:	FECHA:	PLANILLA Nº
		ING. XIMENA YEROVI	5/1/2023	AVANCE 05
RUBRO	EXCAVACION PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO			UNIDAD:
4				m3

CALCULO

ABSCISAS	DISTANCIA (m)	AREA DE EXCAVACION PARA CUNETAS (m ²)	Nº ELEMENTOS	TOTAL (m ³)	OBSERVACIONES
0+000					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+020					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+040					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+060					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+080					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+100					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+120					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+140					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+160					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+180					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+200					
	20.00	0.00	2.00	0.00	TRAMO PUENTE 1
0+220					
	10.51	0.00	2.00	0.00	TRAMO PUENTE 1
0+231					
	9.49	0.27	2.00	5.12	
0+240					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+260					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+280					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+300					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+320					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+340					
	13.15	0.27	2.00	7.10	
0+353					
	6.85	0.00	2.00	0.00	TRAMO PUENTE 2
0+360					
	13.10	0.00	2.00	0.00	TRAMO PUENTE 2
0+373					
	6.90	0.27	2.00	3.73	
0+380					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+400					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+420					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+440					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+460					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+480					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+500					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+520					
SUBTOTAL 1				253.55	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL PASTAZA



ANEXOS DE VOLUMENES DE OBRA



OBRA	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CONTRATISTA:	FECHA:	PLANILLA N°
		ING. XIMENA YEROVI	5/1/2023	AVANCE 05
RUBRO	EXCAVACION PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO			UNIDAD:
4				m3

CÁLCULO

ABSCISAS	DISTANCIA (m)	AREA DE EXCAVACION PARA CUNETAS (m ²)	N° ELEMENTOS	TOTAL (m ³)	OBSERVACIONES
0+520					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+540					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+560					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+580					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+600					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+620					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+640					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+660					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+680					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+700					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+720					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+740					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+760					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+780					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+800					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+820					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+840					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+860					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+880					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+900					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+920					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+940					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+960					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
0+980					
	20.00	0.27	2.00	10.80	
1+000					
SUBTOTAL 2				259.20	

TOTAL CONTRATADO	1,800.00	m3
TOTAL EJECUTADO	512.75	m3



Firmado electrónicamente por:
XIMENA
ALEXANDRA
YEROVI MUÑOZ

ING. XIMENA YEROVI
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
JUAN MANUEL
GUACHO GUACHO

ING. JUAN GUACHO
FISCALIZACION

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL PASTAZA




ANEXOS DE VOLUMENES DE OBRA



OBRA	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CONTRATISTA:	FECHA:	PLANILLA N°
		ING. XIMENA YEROVI	5/1/2023	AVANCE 05
RUBRO	EXCAVACION PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO			UNIDAD:
4				m3

GRÁFICO

CUNETA LATERAL
SECCION TIPO



AREA 1= 1.00*0.40=0.40 m²

AREA 2= (0.85*0.30)/2=0.13 m²

AREA EXCAVACIÓN= AREA1 - AREA 2

AREA EXCAVACIÓN= 0.27 m²

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL PASTAZA



ANEXOS DE VOLUMENES DE OBRA



OBRA	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CONTRATISTA:	FECHA:	PLANILLA N°
		ING. XIMENA YEROVI	5/1/2023	AVANCE 05
RUBRO	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3			UNIDAD:
13				m3

CÁLCULO

ABSCISAS	DISTANCIA	ANCHO BASE (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m³)	TOTAL (m³)	OBSERVACIONES
4+000						
4+020	20.00	8.00	0.15	24.00	24.00	
4+040	20.00	8.00	0.15	24.00	24.00	
4+060	20.00	8.00	0.15	24.00	24.00	
4+080	20.00	8.00	0.15	24.00	24.00	
4+090	9.77	8.00	0.15	11.72	11.72	
4+100	10.23	8.30	0.15	12.74	12.74	
4+120	20.00	8.40	0.15	25.20	25.20	
4+140	20.00	8.30	0.15	24.90	24.90	
4+150	10.30	8.00	0.15	12.36	12.36	
4+160	9.70	8.30	0.15	12.08	12.08	
4+175	14.96	8.40	0.15	18.85	18.85	
4+180	5.04	8.30	0.15	6.27	6.27	
4+200	20.00	8.00	0.15	24.00	24.00	
4+220	20.00	8.00	0.15	24.00	24.00	
4+240	20.00	8.00	0.15	24.00	24.00	
4+260	20.00	8.00	0.15	24.00	24.00	
4+280	20.00	8.00	0.15	24.00	24.00	
4+300	20.00	8.00	0.15	24.00	24.00	
4+309	8.83	8.00	0.15	10.60	10.60	
4+320	11.17	8.30	0.15	13.91	13.91	
4+332	12.26	8.40	0.15	15.45	15.45	
4+340	7.74	8.30	0.15	9.64	9.64	
4+360	20.00	8.00	0.15	24.00	24.00	
4+380	20.00	8.00	0.15	24.00	24.00	
4+400	20.00	8.00	0.15	24.00	24.00	
4+420	20.00	8.00	0.15	24.00	24.00	
4+440	20.00	8.00	0.15	24.00	24.00	
4+460	20.00	8.00	0.15	24.00	24.00	
4+480	20.00	8.00	0.15	24.00	24.00	
4+500	20.00	8.00	0.15	24.00	24.00	
				SUBTOTAL 1	485.72	

TOTAL CONTRATADO	5,669.65	m3
TOTAL EJECUTADO	485.72	m3



Firmado electrónicamente por:
XIMENA
ALEXANDRA
YEROVI MUNOZ

ING. XIMENA YEROVI
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
JUAN MANUEL
GUACHO GUACHO

ING. JUAN GUACHO
FISCALIZACION

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL PASTAZA



ANEXOS DE VOLUMENES DE OBRA



OBRA	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CONTRATISTA:	FECHA:	PLANILLA N°
		ING. XIMENA YEROVI	5/1/2023	AVANCE 05
RUBRO	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	UNIDAD:		
14		m3		

CÁLCULO

ABSCISAS	DISTANCIA	ANCHO BASE (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m³)	TOTAL (m³)	OBSERVACIONES
4+000						
	20.00	7.00	0.10	14.00	14.00	
4+020						
	20.00	7.00	0.10	14.00	14.00	
4+040						
	20.00	7.00	0.10	14.00	14.00	
4+060						
	20.00	7.00	0.10	14.00	14.00	
4+080						
	9.77	7.00	0.10	6.84	6.84	
4+090						
	10.23	7.30	0.10	7.47	7.47	
4+100						
	20.00	7.40	0.10	14.80	14.80	
4+120						
	20.00	7.30	0.10	14.60	14.60	
4+140						
	10.30	7.00	0.10	7.21	7.21	
4+150						
	9.70	7.30	0.10	7.08	7.08	
4+160						
	14.96	7.40	0.10	11.07	11.07	
4+175						
	5.04	7.30	0.10	3.68	3.68	
4+180						
	20.00	7.00	0.10	14.00	14.00	
4+200						
	20.00	7.00	0.10	14.00	14.00	
4+220						
	20.00	7.00	0.10	14.00	14.00	
4+240						
	20.00	7.00	0.10	14.00	14.00	
4+260						
	20.00	7.00	0.10	14.00	14.00	
4+280						
	20.00	7.00	0.10	14.00	14.00	
4+300						
	8.83	7.00	0.10	6.18	6.18	
4+309						
	11.17	7.30	0.10	8.15	8.15	
4+320						
	12.26	7.40	0.10	9.07	9.07	
4+332						
	7.74	7.30	0.10	5.65	5.65	
4+340						
	20.00	7.00	0.10	14.00	14.00	
4+360						
	20.00	7.00	0.10	14.00	14.00	
4+380						
	20.00	7.00	0.10	14.00	14.00	
4+400						
	20.00	7.00	0.10	14.00	14.00	
4+420						
	20.00	7.00	0.10	14.00	14.00	
4+440						
	20.00	7.00	0.10	14.00	14.00	
4+460						
	20.00	7.00	0.10	14.00	14.00	
4+480						
	20.00	7.00	0.10	14.00	14.00	
4+500						
SUBTOTAL 1					353.80	

TOTAL CONTRATADO	3,573.76	m3
TOTAL EJECUTADO	353.80	m3



Firmado electrónicamente por:

XIMENA
ALEXANDRA
YEROVI MUNOZ

ING. XIMENA YEROVI
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:

JUAN MANUEL
GUACHO GUACHO

ING. JUAN GUACHO
FISCALIZACION

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL PASTAZA



ANEXOS DE VOLUMENES DE OBRA



OBRA	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CONTRATISTA:	FECHA:	PLANILLA N°
		ING. XIMENA YEROVI	5/1/2023	AVANCE 05
RUBRO	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3			UNIDAD:
16				m3-km

GRÁFICOS



CÁLCULO

DESCRIPCION	CANTIDAD (m3)	LARGO (m)	ANCHO (m)	DISTANCIA MEDIA (km)	TOTAL (m3-km)	OBSERVACIONES
Transporte de material Subbase 3	485.72	-	-	28.85	14013.02	ABSCISA 4+000 A 4+500
TOTAL					14013.02	

TOTAL CONTRATADO	163,569.40	m3-km
TOTAL EJECUTADO	14,013.02	m3-km



Firmado electrónicamente por:
XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUNOZ

ING. XIMENA YEROVI
 CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
JUAN MANUEL GUACHO GUACHO

ING. JUAN GUACHO
 FISCALIZACION

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL PASTAZA



Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL


ANEXOS DE VOLUMENES DE OBRA



HESVIAL
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

OBRA	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CONTRATISTA:	FECHA:	PLANILLA N°
		ING. XIMENA YEROVI	5/1/2023	AVANCE 05
RUBRO	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	UNIDAD:		
17		m3-km		

GRÁFICOS

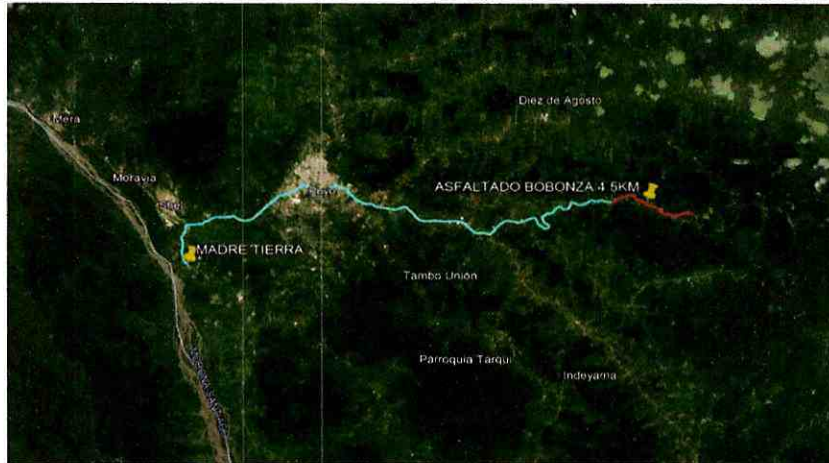

CÁLCULO

DESCRIPCION	CANTIDAD (m3)	LARGO (m)	ANCHO (m)	DISTANCIA MEDIA (km)	TOTAL (m3-km)	OBSERVACIONES
Transporte de material Base	353.80	-	-	28.85	10207.13	ABSCISA 4+000 A 4+500
TOTAL					10207.13	

TOTAL CONTRATADO	103,102.97	m3-km
TOTAL EJECUTADO	10,207.13	m3-km



Firmado electrónicamente por:
**XIMENA
ALEXANDRA
YEROVI MUNOZ**

ING. XIMENA YEROVI
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
**JUAN MANUEL
GUACHO GUACHO**

ING. JUAN GUACHO
FISCALIZACION

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL PASTAZA



ANEXOS DE VOLUMENES DE OBRA



OBRA	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CONTRATISTA:	FECHA:	PLANILLA N°
		ING. XIMENA YEROVI	5/1/2023	AVANCE 05
RUBRO	ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACION	UNIDAD:		
18		I		

CALCULO

ABSCISAS	DISTANCIA	ANCHO ASFALTO (m)	IMPRIMACION (l/m ²)	CANTIDAD (l)	TOTAL (l)	OBSERVACIONES
2+910						
	7.97	6.30	1.40	70.30	70.30	
2+918						
	1.90	6.30	1.40	16.76	16.76	
2+920						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
2+940						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
2+960						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
2+980						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+000						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+020						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+040						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+060						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+080						
	6.61	6.00	1.40	55.52	55.52	
3+087						
	13.39	6.40	1.40	119.97	119.97	
3+100						
	10.86	6.50	1.40	98.83	98.83	
3+111						
	9.14	6.50	1.40	83.17	83.17	
3+120						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+140						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+160						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+180						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+200						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+220						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+240						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+260						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+280						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+300						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+320						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+340						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+360						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+380						
	6.76	6.00	1.40	56.78	56.78	
3+387						
	13.24	6.40	1.40	118.63	118.63	
3+400						
SUBTOTAL 2					4147.96	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL PASTAZA



ANEXOS DE VOLUMENES DE OBRA



OBRA	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CONTRATISTA:	FECHA:	PLANILLA Nº
		ING. XIMENA YEROVI	5/1/2023	AVANCE 05
RUBRO	ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACION	UNIDAD:		
18		I		

CÁLCULO

ABSCISAS	DISTANCIA	ANCHO ASFALTO (m)	IMPRIMACION (l/m ²)	CANTIDAD (l)	TOTAL (l)	OBSERVACIONES
3+400						
	20.00	6.50	1.40	182.00	182.00	
3+420						
	1.33	6.40	1.40	11.92	11.92	
3+421						
	18.67	6.00	1.40	156.83	156.83	
3+440						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+460						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+480						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+500						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+520						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+540						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+560						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+580						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+600						
	7.43	6.00	1.40	62.41	62.41	
3+607						
	12.57	6.30	1.40	110.87	110.87	
3+620						
	9.28	6.40	1.40	83.15	83.15	
3+629						
	10.72	6.30	1.40	94.55	94.55	
3+640						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+660						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+680						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+700						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+720						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+740						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+760						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+780						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+800						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+820						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+840						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+860						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+880						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+900						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+920						
SUBTOTAL 3					4397.73	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL PASTAZA



ANEXOS DE VOLUMENES DE OBRA



OBRA	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CONTRATISTA:	FECHA:	PLANILLA N°
		ING. XIMENA YEROVI	5/1/2023	AVANCE 05
RUBRO	ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACION			UNIDAD:
18				1

CALCULO

ABSCISAS	DISTANCIA	ANCHO ASFALTO (m)	IMPRIMACION (l/m ²)	CANTIDAD (l)	TOTAL (l)	OBSERVACIONES
3+920						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
3+940						
	8.44	6.00	1.40	70.90	70.90	
3+948						
	11.56	6.30	1.40	101.96	101.96	
3+960						
	9.18	6.40	1.40	82.25	82.25	
3+969						
	10.82	6.30	1.40	95.43	95.43	
3+980						
	20.00	6.00	1.40	168.00	168.00	
4+000						
SUBTOTAL 4					686.54	

TOTAL CONTRATADO	37,800.00	1
TOTAL EJECUTADO	12,785.63	1



Firmado electrónicamente por:
XIMENA
ALEXANDRA
YEROVI MUNOZ

ING. XIMENA YEROVI
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
JUAN MANUEL
GUACHO GUACHO

ING. JUAN GUACHO
FISCALIZACION

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL PASTAZA



ANEXOS DE VOLUMENES DE OBRA



OBRA	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CONTRATISTA:	FECHA:	PLANILLA Nº
		ING. XIMENA YEROVI	5/1/2023	AVANCE 05
RUBRO	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"			UNIDAD:
19				m2

CÁLCULO

ABSCISAS	DISTANCIA	ANCHO ASFALTO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m ²)	TOTAL (m2)	OBSERVACIONES
2+500						
	19.25	6.00	0.05	115.50	115.50	
2+519						
	0.75	6.40	0.05	4.80	4.80	
2+520						
	14.57	6.40	0.05	93.25	93.25	
2+535						
	5.43	6.00	0.05	32.58	32.58	
2+540						
	20.00	6.00	0.05	120.00	120.00	
2+560						
	17.73	6.00	0.05	106.38	106.38	
2+578						
	2.27	6.30	0.05	14.30	14.30	
2+580						
	20.00	6.30	0.05	126.00	126.00	
2+600						
	20.00	6.40	0.05	128.00	128.00	
2+620						
	20.00	6.50	0.05	130.00	130.00	
2+640						
	20.00	6.40	0.05	128.00	128.00	
2+660						
	2.14	6.30	0.05	13.48	13.48	
2+662						
	17.86	6.00	0.05	107.16	107.16	
2+680						
	20.00	6.00	0.05	120.00	120.00	
2+700						
	20.00	6.00	0.05	120.00	120.00	
2+720						
	6.40	6.00	0.05	38.40	38.40	
2+726						
	13.60	6.30	0.05	85.68	85.68	
2+740						
	20.00	6.40	0.05	128.00	128.00	
2+760						
	13.56	6.40	0.05	86.78	86.78	
2+774						
	6.44	6.30	0.05	40.57	40.57	
2+780						
	20.00	6.00	0.05	120.00	120.00	
2+800						
	20.00	6.00	0.05	120.00	120.00	
2+820						
	11.13	6.00	0.05	66.78	66.78	
2+831						
	8.87	6.30	0.05	55.88	55.88	
2+840						
	20.00	6.35	0.05	127.00	127.00	
2+860						
	18.26	6.45	0.05	117.78	117.78	
2+878						
	1.74	6.35	0.05	11.05	11.05	
2+880						
	20.00	6.00	0.05	120.00	120.00	
2+900						
	10.13	6.00	0.05	60.78	60.78	
2+910						
SUBTOTAL 1					2538.15	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL PASTAZA



ANEXOS DE VOLUMENES DE OBRA



OBRA	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CONTRATISTA:	FECHA:	PLANILLA Nº
		ING. XIMENA YEROVI	5/1/2023	AVANCE 05
RUBRO	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"			UNIDAD:
19				m2

CÁLCULO

ABSCISAS	DISTANCIA	ANCHO ASFALTO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m ²)	TOTAL (m2)	OBSERVACIONES
2+910						
	7.97	6.30	0.05	50.21	50.21	
2+918						
	1.90	6.30	0.05	11.97	11.97	
2+920						
	20.00	6.00	0.05	120.00	120.00	
2+940						
	20.00	6.00	0.05	120.00	120.00	
2+960						
	20.00	6.00	0.05	120.00	120.00	
2+980						
	20.00	6.00	0.05	120.00	120.00	
3+000						
	20.00	6.00	0.05	120.00	120.00	
3+020						
	20.00	6.00	0.05	120.00	120.00	
3+040						
	20.00	6.00	0.05	120.00	120.00	
3+060						
	20.00	6.00	0.05	120.00	120.00	
3+080						
	6.61	6.00	0.05	39.66	39.66	
3+087						
	13.39	6.40	0.05	85.70	85.70	
3+100						
	10.86	6.50	0.05	70.59	70.59	
3+111						
	9.14	6.50	0.05	59.41	59.41	
3+120						
	20.00	6.00	0.05	120.00	120.00	
3+140						
	20.00	6.00	0.05	120.00	120.00	
3+160						
	20.00	6.00	0.05	120.00	120.00	
3+180						
	20.00	6.00	0.05	120.00	120.00	
3+200						
	20.00	6.00	0.05	120.00	120.00	
3+220						
	20.00	6.00	0.05	120.00	120.00	
3+240						
	20.00	6.00	0.05	120.00	120.00	
3+260						
	20.00	6.00	0.05	120.00	120.00	
3+280						
	20.00	6.00	0.05	120.00	120.00	
3+300						
	20.00	6.00	0.05	120.00	120.00	
3+320						
	20.00	6.00	0.05	120.00	120.00	
3+340						
	20.00	6.00	0.05	120.00	120.00	
3+360						
	20.00	6.00	0.05	120.00	120.00	
3+380						
	6.76	6.00	0.05	40.56	40.56	
3+387						
	13.24	6.40	0.05	84.74	84.74	
3+400						
SUBTOTAL 2					2962.84	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL PASTAZA



ANEXOS DE VOLUMENES DE OBRA



OBRA	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CONTRATISTA:	FECHA:	PLANILLA Nº
		ING. XIMENA YEROVI	5/1/2023	AVANCE 05
RUBRO	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"			UNIDAD:
19				m2

CÁLCULO

ABSCISAS	DISTANCIA	ANCHO ASFALTO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m ²)	TOTAL (m2)	OBSERVACIONES
3+920						
	20.00	6.00	0.05	120.00	120.00	
3+940						
	8.44	6.00	0.05	50.64	50.64	
3+948						
	11.56	6.30	0.05	72.83	72.83	
3+960						
	9.18	6.40	0.05	58.75	58.75	
3+969						
	10.82	6.30	0.05	68.17	68.17	
3+980						
	20.00	6.00	0.05	120.00	120.00	
4+000						
SUBTOTAL 4					490.39	

TOTAL CONTRATADO	27,000.00	m2
TOTAL EJECUTADO	9,132.61	m2



Firmado electrónicamente por:

XIMENA
ALEXANDRA
YEROVI MUNOZ

ING. XIMENA YEROVI
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:

JUAN MANUEL
GUACHO GUACHO

ING. JUAN GUACHO
FISCALIZACION

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL PASTAZA



ANEXOS DE VOLUMENES DE OBRA



OBRA	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CONTRATISTA:	FECHA:	PLANILLA Nº
		ING. XIMENA YEROVI	5/1/2023	AVANCE 05
RUBRO	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM2)	UNIDAD:		
20		m3		

CALCULO

ABSCISAS	DISTANCIA (m)	AREA SECCION DE CUNETA (m²)	Nº ELEMENTOS	TOTAL (m³)	OBSERVACIONES
0+000					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+020					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+040					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+060					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+080					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+100					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+120					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+140					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+160					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+180					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+200					
	20.00	0.00	2.00	0.00	TRAMO PUENTE 1
0+220					
	10.51	0.00	2.00	0.00	TRAMO PUENTE 1
0+231					
	9.49	0.14	2.00	2.66	
0+240					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+260					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+280					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+300					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+320					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+340					
	13.15	0.14	2.00	3.68	
0+353					
	6.85	0.00	2.00	0.00	TRAMO PUENTE 2
0+360					
	13.10	0.00	2.00	0.00	TRAMO PUENTE 2
0+373					
	6.90	0.14	2.00	1.93	
0+380					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+400					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+420					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+440					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+460					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+480					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+500					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+520					
SUBTOTAL 1				131.47	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL PASTAZA



ANEXOS DE VOLUMENES DE OBRA



OBRA	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CONTRATISTA:	FECHA:	PLANILLA N°
		ING. XIMENA YEROVI	5/1/2023	AVANCE 05
RUBRO	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM2)	UNIDAD:		
20		m3		

CÁLCULO

ABSCISAS	DISTANCIA (m)	AREA SECCION DE CUNETA (m ²)	N° ELEMENTOS	TOTAL (m ³)	OBSERVACIONES
0+520					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+540					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+560					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+580					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+600					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+620					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+640					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+660					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+680					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+700					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+720					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+740					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+760					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+780					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+800					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+820					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+840					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+860					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+880					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+900					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+920					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+940					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+960					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
0+980					
	20.00	0.14	2.00	5.60	
1+000					
SUBTOTAL 2				134.40	

TOTAL CONTRATADO	1,443.20	UNIDAD:
TOTAL EJECUTADO	265.87	UNIDAD:



Firmado electrónicamente por:
XIMENA
ALEXANDRA
YEROVI MUNOZ

ING. XIMENA YEROVI
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
JUAN MANUEL
GUACHO GUACHO

ING. JUAN GUACHO
FISCALIZACION

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL PASTAZA




ANEXOS DE VOLUMENES DE OBRA



OBRA	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CONTRATISTA:	FECHA:	PLANILLA N°
		ING. XIMENA YEROVI	5/1/2023	AVANCE 05
RUBRO	HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM2)	UNIDAD:		
20		m3		

GRÁFICO

CUNETA LATERAL SECCION TIPO

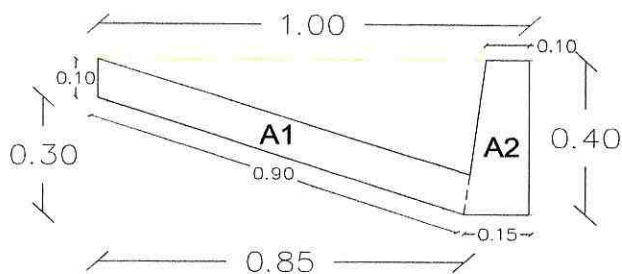

$$A1 = 0.90 \times 0.10 = 0.90 \text{ m}^2$$

$$A2 = (0.15 + 0.10) / 2 \times 0.40 = 0.05 \text{ m}^2$$

$$\text{AREA HORMIGÓN} = A1 + A2$$

$$\text{AREA DE HORMIGON} = 0.14 \text{ m}^2$$

ANEXO FOTOGRAFICO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA



ANEXO FOTOGRÁFICO



CONTRATO:	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.		
CONTRATISTA:	FISCALIZADOR:	PLANILLA No	05
ING. XIMENA YEROVI	ING. JUAN GUACHO	UBICACIÓN:	Provincia: PASTAZA Cantón: PASTAZA
MONTO DEL CONTRATO:	PERIODO:	FECHA INICIO DE OBRA:	FECHA DE VENCIMIENTO:
\$ 956.686,70	01/12/2022 A 31/12/2022	23/08/2022	19/02/2023

RUBRO No 04: EXCAVACION PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA



ANEXO FOTOGRÁFICO



CONTRATO:	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.		
CONTRATISTA:	FISCALIZADOR:	PLANILLA No	05
ING. XIMENA YEROVI	ING. JUAN GUACHO	UBICACIÓN:	Provincia: PASTAZA Cantón: PASTAZA
MONTO DEL CONTRATO:	PERIODO:	FECHA INICIO DE OBRA:	FECHA DE VENCIMIENTO:
\$ 956.686,70	01/12/2022 A 31/12/2022	23/08/2022	19/02/2023

RUBRO No 13: MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA



ANEXO FOTOGRÁFICO



CONTRATO:	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.		
CONTRATISTA:	FISCALIZADOR:	PLANILLA No	05
ING. XIMENA YEROVI	ING. JUAN GUACHO	UBICACIÓN:	Provincia: PASTAZA Cantón: PASTAZA
MONTO DEL CONTRATO:	PERIODO:	FECHA INICIO DE OBRA:	FECHA DE VENCIMIENTO:
\$ 956.686,70	01/12/2022 A 31/12/2022	23/08/2022	19/02/2023

RUBRO No 14: MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA



ANEXO FOTOGRÁFICO



CONTRATO:	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.		
CONTRATISTA:	FISCALIZADOR:	PLANILLA No	05
ING. XIMENA YEROVI	ING. JUAN GUACHO	UBICACIÓN:	Provincia: PASTAZA Cantón: PASTAZA
MONTO DEL CONTRATO:	PERIODO:	FECHA INICIO DE OBRA:	FECHA DE VENCIMIENTO:
\$ 956.686,70	01/12/2022 A 31/12/2022	23/08/2022	19/02/2023

RUBRO No 16: TRANSPORTE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA



ANEXO FOTOGRÁFICO



CONTRATO:	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.		
CONTRATISTA:	FISCALIZADOR:	PLANILLA No	05
ING. XIMENA YEROVI	ING. JUAN GUACHO	UBICACIÓN:	Provincia: PASTAZA Cantón: PASTAZA
MONTO DEL CONTRATO:	PERIODO:	FECHA INICIO DE OBRA:	FECHA DE VENCIMIENTO:
\$ 956.686,70	01/12/2022 A 31/12/2022	23/08/2022	19/02/2023

RUBRO No 17: TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA



ANEXO FOTOGRÁFICO



CONTRATO:	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.		
CONTRATISTA:	FISCALIZADOR:	PLANILLA No	05
ING. XIMENA YEROVI	ING. JUAN GUACHO	UBICACIÓN:	Provincia: PASTAZA Cantón: PASTAZA
MONTO DEL CONTRATO:	PERIODO:	FECHA INICIO DE OBRA:	FECHA DE VENCIMIENTO:
\$ 956.686,70	01/12/2022 A 31/12/2022	23/08/2022	19/02/2023

RUBRO No 18: ASFALTO RC-250, PARA IMPRIMACION



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA




ANEXO FOTOGRÁFICO



CONTRATO:	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.		
CONTRATISTA:	FISCALIZADOR:	PLANILLA No	05
ING. XIMENA YEROVI	ING. JUAN GUACHO	UBICACIÓN:	Provincia: PASTAZA Cantón: PASTAZA
MONTO DEL CONTRATO:	PERIODO:	FECHA INICIO DE OBRA:	FECHA DE VENCIMIENTO:
\$ 956.686,70	01/12/2022 A 31/12/2022	23/08/2022	19/02/2023

RUBRO No 19: C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"

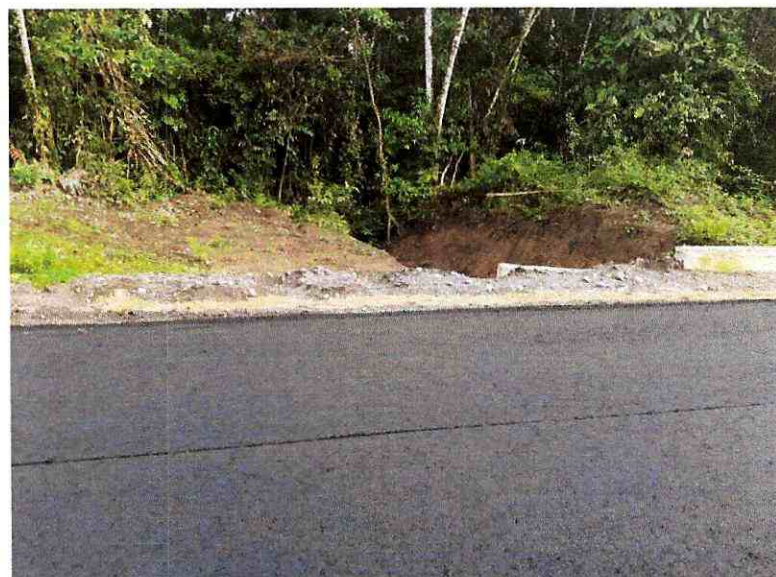

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA



ANEXO FOTOGRÁFICO



CONTRATO:	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.		
CONTRATISTA:	FISCALIZADOR:	PLANILLA No	05
ING. XIMENA YEROVI	ING. JUAN GUACHO	UBICACIÓN:	Provincia: PASTAZA Cantón: PASTAZA
MONTO DEL CONTRATO:	PERIODO:	FECHA INICIO DE OBRA:	FECHA DE VENCIMIENTO:
\$ 956.686,70	01/12/2022 A 31/12/2022	23/08/2022	19/02/2023

RUBRO No 20: HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM2)



LIBRO DE OBRA

PROYECTO: "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASATAZA"

CONTRATISTA: ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ

N° 90

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN: ING. JUAN MANUEL GUACHO G.

FECHA: 1 DE DICIEMBRE DEL 2022

LIBRO DE OBRA

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

Excavación de cunetas
Hormigón $f'c = 180 \text{ kg/cm}^2$ en cunetas

PERSONAL:		EQUIPO Y MAQUINARIA		ESTADO DEL TIEMPO
Topógrafo	1	Equipo Topográfico	1	BUENO ✓
Operadores	3	Excavadoras	3	LLOVIZNA
Choferes	6	Volquetas	6	LLUVIA
Residente	1	Motoniveladora		OTRO:
Superintendente	1	Rodillo		
M. Mayor	1	Tanquero		
Albañil	2			
Peón	3			

CONSULTAS:





ESPACIO PARA LA FISCALIZACION:

INSTRUCCIONES:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERINTENDENTE	RESIDENTE	FISCALIZADOR
			

PROYECTO: "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASATAZA"

CONTRATISTA: ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ

Nº 91

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN: ING. JUAN MANUEL GUACHO G.

FECHA: 2 DE DICIEMBRE DE 2022

LIBRO DE OBRA

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

Excavación de cunetas
 Encobrido de cunetas
 Hormigón para cunetas $f_c = 180 \text{ Kg/cm}^2$

PERSONAL:

EQUIPO Y MAQUINARIA

ESTADO DEL TIEMPO

Topógrafo	1	Equipo Topográfico	1	BUENO ✓
Operadores	3	Excavadoras	3	LLOVIZNA
Choferes	6	Volquetas	6	LLUVIA
Residente	1	Motoniveladora		OTRO:
Superintendente	1	Rodillo		
M. Mayor	1	Tanquero		
Albañil	2			
Peón	3			

CONSULTAS:





ESPACIO PARA LA FISCALIZACION:

INSTRUCCIONES:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERINTENDENTE	RESIDENTE	FISCALIZADOR
			

PROYECTO: "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASATAZA"

CONTRATISTA: ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ

N° 92

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN: ING. JUAN MANUEL GUACHO G.

FECHA: 3 DE DICIEMBRE DE 2022

LIBRO DE OBRA

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

EXCAVACION DE CUNETAS
 ENCOFRADO DE CUNETAS
 HORMIGON PARA CUNETAS $\rho_c = 180 \text{ KG/cm}^3$

PERSONAL:		EQUIPO Y MAQUINARIA		ESTADO DEL TIEMPO
Topógrafo	1	Equipo Topográfico	1	BUENO
Operadores	3	Excavadoras	3	LLOVIZNA ✓
Choferes	6	Volquetas	6	LLUVIA
Residente	1	Motoniveladora		OTRO:
Superintendente	1	Rodillo		
M. Mayor	1	Tanquero		
Albañil	2			
Peón	3			

CONSULTAS:





ESPACIO PARA LA FISCALIZACION:

INSTRUCCIONES:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERINTENDENTE	RESIDENTE	FISCALIZADOR
			

PROYECTO: "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASATAZA"

CONTRATISTA: ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ

N° 93

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN: ING. JUAN MANUEL GUACHO G.

FECHA: 5 DE DICIEMBRE DE 2022

LIBRO DE OBRA

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

EXCAVACIÓN DE CUNETAS
ENCOFRADO DE CUNETAS.
HORMIGÓN PARA CUNETAS $f_c = 180 \text{ kg/cm}^2$

PERSONAL:		EQUIPO Y MAQUINARIA		ESTADO DEL TIEMPO
Topógrafo	1	Equipo Topográfico	1	BUENO
Operadores	3	Excavadoras	3	LLOVIZNA ✓
Choferes	6	Volquetas	6	LLUVIA
Residente	1	Motoniveladora		OTRO:
Superintendente	1	Rodillo		
M. Mayor	1	Tanquero		
Albañil	2			
Peón	3			

CONSULTAS:





ESPACIO PARA LA FISCALIZACION:

INSTRUCCIONES:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERINTENDENTE	RESIDENTE	FISCALIZADOR
			

PROYECTO: "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASATAZA"

CONTRATISTA: ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ

N° 94

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN: ING. JUAN MANUEL GUACHO G.

FECHA: 6 DE DICIEMBRE DE 2022

LIBRO DE OBRA

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

REPLANTEO Y NIVEZACIÓN

TRANSPORTE DE MATERIAL SUBBASE CLASE 3

TENDIDO Y COMPACTADO DE SUBBASE.

PERSONAL:	EQUIPO Y MAQUINARIA	ESTADO DEL TIEMPO
Topógrafo 1	Equipo Topográfico 1	BUENO ✓
Operadores 3	Excavadoras 3	LLOVIZNA
Choferes 6	Volquetas 6	LLUVIA
Residente 1	Motoniveladora 1	OTRO:
Superintendente 1	Rodillo 1	
M. Mayor 1	Tanquero 1	
Albañil 2		
Peón 3		

CONSULTAS:





ESPACIO PARA LA FISCALIZACION:

INSTRUCCIONES:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERINTENDENTE	RESIDENTE	FISCALIZADOR
			

PROYECTO: "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASATAZA"

CONTRATISTA: ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ

Nº 95

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN: ING. JUAN MANUEL GUACHO G.

FECHA: 7 DE DICIEMBRE DE 2022

LIBRO DE OBRA

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

- Replanteo y nivelación
- Transporte de material subbase clase 3
- Tendido y compactado de subbase.

PERSONAL:		EQUIPO Y MAQUINARIA		ESTADO DEL TIEMPO
Topógrafo	1	Equipo Topográfico	1	BUENO ✓
Operadores	3	Excavadoras	3	LLOVIZNA
Choferes	6	Volquetas	6	LLUVIA
Residente	1	Motoniveladora	1	OTRO:
Superintendente	1	Rodillo	1	
M. Mayor	1	Tanquero	1	
Albañil	2			
Peón	3			

CONSULTAS:





ESPACIO PARA LA FISCALIZACION:

INSTRUCCIONES:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERINTENDENTE	RESIDENTE	FISCALIZADOR
			

PROYECTO: "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASATAZA"

CONTRATISTA: ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ

Nº 96

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN: ING. JUAN MANUEL GUACHO G.

FECHA: 8 DE DICIEMBRE DE 2022.

LIBRO DE OBRA

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

- REPLANTEO Y NIVELACIÓN
- TRANSPORTE DE MATERIAL SUBBASE CLASE 3
- TENDIDO Y COMPACTADO DE SUBBASE

PERSONAL:		EQUIPO Y MAQUINARIA		ESTADO DEL TIEMPO
Topógrafo	1	Equipo Topográfico	1	BUENO ✓
Operadores	3	Excavadoras	3	LLOVIZNA
Choferes	6	Volquetas	6	LLUVIA
Residente	1	Motoniveladora	1	OTRO:
Superintendente	1	Rodillo	1	
M. Mayor	1	Tanquero	1	
Albañil	2			
Peón	3			

CONSULTAS:





ESPACIO PARA LA FISCALIZACION:

INSTRUCCIONES:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERINTENDENTE	RESIDENTE	FISCALIZADOR
			



PROYECTO: "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASATAZA"

CONTRATISTA: ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ

Nº 97

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN: ING. JUAN MANUEL GUACHO G.

FECHA: 9 DE DICIEMBRE DE 2022

LIBRO DE OBRA

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

- REPLANTEO y NIVELACIÓN
- TRANSPORTE DE MATERIAL SUBBASE CLASE 3
- TENDIDO Y COMPACTADO DE SUBBASE

PERSONAL:		EQUIPO Y MAQUINARIA		ESTADO DEL TIEMPO
Topógrafo	1	Equipo Topográfico	1	BUENO
Operadores	3	Excavadoras	3	LLOVIZNA ✓
Choferes	6	Volquetas	6	LLUVIA
Residente	1	Motoniveladora	1	OTRO:
Superintendente	1	Rodillo	1	
M. Mayor	1	Tanquero	1	
Albañil	2			
Peón	3			

CONSULTAS:

ESPACIO PARA LA FISCALIZACION:

INSTRUCCIONES:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERINTENDENTE	RESIDENTE	FISCALIZADOR

PROYECTO: "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASATAZA"

CONTRATISTA: ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ

Nº 98

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN: ING. JUAN MANUEL GUACHO G.

FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2022

LIBRO DE OBRA

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

NO SE REALIZAN TRABAJOS DEBIDO AL MAL TIEMPO

PERSONAL:

Topógrafo 1
Operadores 3
Choferes 6
Residente 1
Superintendente 1
M. Mayor 1
Albañil 2
Peón 3

EQUIPO Y MAQUINARIA

Equipo Topográfico 1
Excavadoras 3
Volquetas 6
Motoniveladora 1
Rodillo 1
Tanquero 1

ESTADO DEL TIEMPO

BUENO
LLOVIZNA ✓
LLUVIA ✓
OTRO:

CONSULTAS:

ESPACIO PARA LA FISCALIZACION:

INSTRUCCIONES:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA



SUPERINTENDENTE



RESIDENTE



FISCALIZADOR



PROYECTO: "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASATAZA"

CONTRATISTA: ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ

Nº 99

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN: ING. JUAN MANUEL GUACHO G.

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2022

LIBRO DE OBRA

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

REPLANTEO Y NIVELACION.
TRANSPORTE DE MATERIAL BASE
TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE

PERSONAL:		EQUIPO Y MAQUINARIA		ESTADO DEL TIEMPO
Topógrafo	1	Equipo Topográfico	1	BUENO
Operadores	3	Excavadoras	3	LLOVIZNA ✓
Choferes	6	Volquetas	6	LLUVIA
Residente	1	Motoniveladora	1	OTRO:
Superintendente	1	Rodillo	1	
M. Mayor	1	Tanquero	1	
Albañil	2			
Peón	3			

CONSULTAS:





ESPACIO PARA LA FISCALIZACION:

INSTRUCCIONES:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERINTENDENTE	RESIDENTE	FISCALIZADOR
			

PROYECTO: "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASATAZA"

CONTRATISTA: ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ

Nº 100

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN: ING. JUAN MANUEL GUACHO G.

FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2022

LIBRO DE OBRA

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

Replanteo y nivelación
Transporte de material base
Tendido y compactado de la base

PERSONAL:

Topógrafo 1
Operadores 3
Choferes 6
Residente 1
Superintendente 1
M. Mayor 1
Albañil 2
Peón 3

EQUIPO Y MAQUINARIA

Equipo Topográfico 1
Excavadoras 3
Volquetas 6
Motoniveladora 1
Rodillo 1
Tanquero 1

ESTADO DEL TIEMPO

BUENO
LLOVIZNA ✓
LLUVIA
OTRO:

CONSULTAS:

ESPACIO PARA LA FISCALIZACION:

INSTRUCCIONES:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:


CONTRATISTA



SUPERINTENDENTE



RESIDENTE



FISCALIZADOR





PROYECTO: "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASATAZA"

CONTRATISTA: ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN: ING. JUAN MANUEL GUACHO G.

Nº 101

FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 2022

LIBRO DE OBRA

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

Replanteo y nivelación
Transporte de material base
Tendido y compactado de la base

Table with 3 columns: PERSONAL, EQUIPO Y MAQUINARIA, ESTADO DEL TIEMPO. Rows include Topógrafo, Operadores, Choferes, Residente, Superintendente, M. Mayor, Albañil, Peón and their respective equipment and status.

CONSULTAS:

ESPACIO PARA LA FISCALIZACION:

INSTRUCCIONES:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:

Signature table with columns: CONTRATISTA, SUPERINTENDENTE, RESIDENTE, FISCALIZADOR. Each column contains a handwritten signature.

PROYECTO: "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASATAZA"

CONTRATISTA: ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ

N° 102

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN: ING. JUAN MANUEL GUACHO G.

FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2022

LIBRO DE OBRA

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

Replanteo y nivelación
Transporte de material base
Tendido y compactado de la base

PERSONAL:		EQUIPO Y MAQUINARIA		ESTADO DEL TIEMPO
Topógrafo	1	Equipo Topográfico	1	BUENO
Operadores	3	Excavadoras	3	LLOVIZNA ✓
Choferes	6	Volquetas	6	LLUVIA
Residente	1	Motoniveladora	1	OTRO:
Superintendente	1	Rodillo	1	
M. Mayor	1	Tanquero	1	
Albañil	2			
Peón	3			

CONSULTAS:

ESPACIO PARA LA FISCALIZACION:

INSTRUCCIONES:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:


CONTRATISTA



SUPERINTENDENTE



RESIDENTE



FISCALIZADOR



PROYECTO: "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASATAZA"

CONTRATISTA: ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ

N° 103

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN: ING. JUAN MANUEL GUACHO G.

FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2022

LIBRO DE OBRA

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

• NO SE REALIZAN TRABAJOS DEBIDO AL MAL TIEMPO

PERSONAL:		EQUIPO Y MAQUINARIA		ESTADO DEL TIEMPO
Topógrafo	1	Equipo Topográfico	1	BUENO
Operadores	3	Excavadoras	3	LLOVIZNA
Choferes	6	Volquetas	6	LLUVIA ✓
Residente	1	Motoniveladora	1	OTRO:
Superintendente	1	Rodillo	1	
M. Mayor	1	Tanquero	1	
Albañil	2			
Peón	3			

CONSULTAS:





ESPACIO PARA LA FISCALIZACION:

INSTRUCCIONES:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERINTENDENTE	RESIDENTE	FISCALIZADOR
			

PROYECTO: "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASATAZA"

CONTRATISTA: ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ

N° 104

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN: ING. JUAN MANUEL GUACHO G.

FECHA: 17 DE DICIEMBRE DE 2022.

LIBRO DE OBRA

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

REPLANTEO Y NIVELACIÓN
IMPRIMACION RC 250
C. RODADURA HORMIGÓN ASFÁLTICO, REZCLADO EN PLANTA

PERSONAL:	EQUIPO Y MAQUINARIA	ESTADO DEL TIEMPO
Topógrafo 1	Equipo Topográfico 1	BUENO ✓
Operadores	Excavadoras	LLOVIZNA
Choferes 6	Volquetas 6	LLUVIA
Residente 1	Motoniveladora	OTRO:
Superintendente 1	Rodillo	
M. Mayor 1	Tanquero	
Albañil 2	Equipo Asfalto 1	
Peón 3		

CONSULTAS:





ESPACIO PARA LA FISCALIZACIÓN:

INSTRUCCIONES:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERINTENDENTE	RESIDENTE	FISCALIZADOR
			



PROYECTO: "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASATAZA"

CONTRATISTA: ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ

Nº 105

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN: ING. JUAN MANUEL GUACHO G.

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2022

LIBRO DE OBRA

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

- REPLANTEO Y NIVELACIÓN
- IMPRIMACION RC250
- C. RODADURA HORMIGÓN ASFALTICO, MEZCLADO EN PLANTA

PERSONAL:		EQUIPO Y MAQUINARIA		ESTADO DEL TIEMPO
Topógrafo	1	Equipo Topográfico	1	BUENO ✓
Operadores		Excavadoras		LLOVIZNA
Choferes	6	Volquetas	6	LLUVIA
Residente	1	Motoniveladora		OTRO:
Superintendente	1	Rodillo		
M. Mayor	1	Tanquero		
Albañil	2	Equipo Asfalto	1	
Peón	3			

CONSULTAS:

ESPACIO PARA LA FISCALIZACION:

INSTRUCCIONES:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERINTENDENTE	RESIDENTE	FISCALIZADOR

PROYECTO: "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASATAZA"

CONTRATISTA: ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ

Nº 107

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN: ING. JUAN MANUEL GUACHO G.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2022

LIBRO DE OBRA

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

- REPLANTEO Y NIVELACIÓN
- IMPRIMACIÓN PC 250
- C. RODADURA HORMIGÓN ASFALTICO, MEZCLADO EN PLANTA

PERSONAL:		EQUIPO Y MAQUINARIA		ESTADO DEL TIEMPO
Topógrafo	1	Equipo Topográfico	1	BUENO ✓
Operadores		Excavadoras		LLOVIZNA
Choferes	6	Volquetas	6	LLUVIA
Residente	1	Motoniveladora		OTRO:
Superintendente	1	Rodillo		
M. Mayor	1	Tanquero		
Albañil	2	Equipo Asfalto	1	
Peón	3			

CONSULTAS:





ESPACIO PARA LA FISCALIZACION:

INSTRUCCIONES:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERINTENDENTE	RESIDENTE	FISCALIZADOR
			

PROYECTO: "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASATAZA"

CONTRATISTA: ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ

N° 108

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN: ING. JUAN MANUEL GUACHO G.

FECHA: 22 DE DICIEMBRE DE 2022

LIBRO DE OBRA

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

• Replanteo y Nivelación
• Impresión RC 250
• C. Rodadura Hormigón asfáltico, Mezclado en Planta.

PERSONAL:		EQUIPO Y MAQUINARIA		ESTADO DEL TIEMPO
Topógrafo	1	Equipo Topográfico	1	BUENO ✓
Operadores		Excavadoras		LLOVIZNA
Choferes	6	Volquetas	6	LLUVIA
Residente	1	Motoniveladora		OTRO:
Superintendente	1	Rodillo		
M. Mayor	1	Tanquero		
Albañil	2	Equipo Asfalto	1	
Peón	3			

CONSULTAS:





ESPACIO PARA LA FISCALIZACION:

INSTRUCCIONES:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERINTENDENTE	RESIDENTE	FISCALIZADOR
			

PROYECTO: "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASATAZA"

CONTRATISTA: ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ

N° 109

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN: ING. JUAN MANUEL GUACHO G.

FECHA: 23 DE DICIEMBRE DE 2022

LIBRO DE OBRA

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

- TRANSPORTE DE MATERIAL SUBBASE Y BASE
- RECONFORMACION DE LA U1A

PERSONAL:		EQUIPO Y MAQUINARIA		ESTADO DEL TIEMPO
Topógrafo	1	Equipo Topográfico	1	BUENO
Operadores	3	Excavadoras	3	LLOVIZNA ✓
Choferes	6	Volquetas	6	LLUVIA
Residente	1	Motoniveladora	1	OTRO:
Superintendente	1	Rodillo	1	
M. Mayor	1	Tanquero	1	
Albañil	2			
Peón	3			

CONSULTAS:





ESPACIO PARA LA FISCALIZACION:

INSTRUCCIONES:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERINTENDENTE	RESIDENTE	FISCALIZADOR
			

PROYECTO: "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASATAZA"

CONTRATISTA: ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ

N° 110

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN: ING. JUAN MANUEL GUACHO G.

FECHA: 24 DE DICIEMBRE DE 2022

LIBRO DE OBRA

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

- TRANSPORTE DE MATERIAL SUBBASE Y BASE
- RECONFORMACIÓN DE LA VÍA.

PERSONAL:	EQUIPO Y MAQUINARIA	ESTADO DEL TIEMPO
Topógrafo 1	Equipo Topográfico 1	BUENO ✓
Operadores 3	Excavadoras 3	LLOVIZNA
Choferes 6	Volquetas 6	LLUVIA
Residente 1	Motoniveladora 1	OTRO:
Superintendente 1	Rodillo 1	
M. Mayor 1	Tanquero 1	
Albañil 2		
Peón 3		

CONSULTAS:

ESPACIO PARA LA FISCALIZACION:

INSTRUCCIONES:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERINTENDENTE	RESIDENTE	FISCALIZADOR
			

PROYECTO: "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASATAZA"

CONTRATISTA: ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ

N° 111

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN: ING. JUAN MANUEL GUACHO G.

FECHA: 26 DE DICIEMBRE DE 2022

LIBRO DE OBRA

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

- Excavación de cunetas
- Encofrado de cunetas
- Hormigón para cunetas $f_c = 180 \text{ kg/cm}^2$

PERSONAL:	EQUIPO Y MAQUINARIA	ESTADO DEL TIEMPO
Topógrafo 1	Equipo Topográfico 1	BUENO
Operadores	Excavadoras	LLOVIZNA ✓
Choferes	Volquetas	LLUVIA
Residente 1	Motoniveladora	OTRO:
Superintendente 1	Rodillo	
M. Mayor 1	Tanquero	
Albañil 2		
Peón 3		

CONSULTAS:





ESPACIO PARA LA FISCALIZACIÓN:

INSTRUCCIONES:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERINTENDENTE	RESIDENTE	FISCALIZADOR
			

PROYECTO: "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASATAZA"

CONTRATISTA: ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ

Nº 112

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN: ING. JUAN MANUEL GUACHO G.

FECHA: 27 DE DICIEMBRE DE 2022

LIBRO DE OBRA

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

EXCAVACION DE CUNETAS
ENCOFRADO DE CUNETAS
HORMIGON PARA CUNETAS FC=180 KG/CM2

PERSONAL:	EQUIPO Y MAQUINARIA	ESTADO DEL TIEMPO
Topógrafo 1	Equipo Topográfico 1	BUENO ✓
Operadores	Excavadoras	LLOVIZNA
Choferes	Volquetas	LLUVIA
Residente 1	Motoniveladora	OTRO:
Superintendente 1	Rodillo	
M. Mayor 1	Tanquero	
Albañil 2		
Peón 3		

CONSULTAS:





ESPACIO PARA LA FISCALIZACION:

INSTRUCCIONES:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERINTENDENTE	RESIDENTE	FISCALIZADOR
			

PROYECTO: "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASATAZA"

CONTRATISTA: ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ

Nº 113

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN: ING. JUAN MANUEL GUACHO G.

FECHA: 28 DE DICIEMBRE DE 2022

LIBRO DE OBRA

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

EXCAVACION DE CUNETAS

ENCOFRADO DE CUNETAS

HORMIGÓN PARA CUNETAS f'c = 180 KG/CM²

PERSONAL:	EQUIPO Y MAQUINARIA	ESTADO DEL TIEMPO
Topógrafo /	Equipo Topográfico /	BUENO
Operadores	Excavadoras	LLOVIZNA ✓
Choferes	Volquetas	LLUVIA
Residente /	Motoniveladora	OTRO:
Superintendente /	Rodillo	
M. Mayor /	Tanquero	
Albañil 2		
Peón 3		

CONSULTAS:





ESPACIO PARA LA FISCALIZACION:

INSTRUCCIONES:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERINTENDENTE	RESIDENTE	FISCALIZADOR
			

PROYECTO: "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASATAZA"

CONTRATISTA: ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ

Nº 116

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN: ING. JUAN MANUEL GUACHO G.

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

LIBRO DE OBRA

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

Excavación de cunetas
Encofrado de cunetas
Hormigón para cunetas $f'c = 180 \text{ Kg/cm}^2$

PERSONAL:	EQUIPO Y MAQUINARIA	ESTADO DEL TIEMPO
Topógrafo 1	Equipo Topográfico 1	BUENO ✓
Operadores	Excavadoras	LLOVIZNA
Choferes	Volquetas	LLUVIA
Residente 1	Motoniveladora	OTRO:
Superintendente 1	Rodillo	
M. Mayor 1	Tanquero	
Albañil 2		
Peón 3		

CONSULTAS:





ESPACIO PARA LA FISCALIZACION:

INSTRUCCIONES:

F. CONFORME

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	SUPERINTENDENTE	RESIDENTE	FISCALIZADOR
			

IESS

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA, representante legal de la empresa YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA con RUC Nro. 1600789133001 y dirección BARRIO LIBERTAD, LIBERTAD JAVIER VARGAS FRANCISCO DE ORELLANA . SN. FRANCISCO DE ORELLANA. FRENTE HOSTERIA TUR., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Firmado electrónicamente por:

**KARLA DENISSE
BERMUDEZ ROLDAN**

Abg. Karla Denisse Bermúdez Roldán

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 05 de enero de 2023

Validez del Certificado 30 días



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA

enero 05 del 2023 16:59

YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(DEPOSITADO)


(REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE)

No. Comprobante: 000000165283885

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en: 2023-01-04
No. RUC / REGISTRO: 1600789133001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago: 2023-01-16
Nombre / Razón Social / Organización:	YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA - YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA
Periodo de Pago:	2022 - 12
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2022 - 12	06	1600597601	RAMIREZ RAMIREZ SARA VERONICA	113.34	8	NNA	23.35	0.00
2022 - 12	16	0922862834	IBARRA RIVERA JHESLY SARAY	250.00	15	NNA	51.50	10.79
2022 - 12	35	1600175812	CARRION CARRION VICENTE ARMANDO	436.05	30	NNA	89.83	0.00
2022 - 12	35	0604195263	FLOR PADILLA SOFIA LISBETH	494.61	30	NNA	101.89	0.00
2022 - 12	35	0603836305	LOPEZ BARRETO MAURICIO DEIDAN	436.05	30	NNA	89.83	0.00
2022 - 12	35	1600606972	RAMOS SILVA LUIS HUMBERTO	493.34	30	NNA	101.63	0.00
2022 - 12	68	1600789133	YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA	425.00	30	NNA	74.80	0.00
				2648.39			532.83	10.79



Valor	555.06
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	10.79
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	555.06
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	565.85

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.


*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmege

*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a LOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.





Constancia



Pago exitoso!

Cuenta origen	CACPE PASTAZA - YEROVI MUNOZ XIMENA ALEXANDRA - #17*****66
Cuenta destino	IESS (PLANI)-PAGO DE PLANILLAS (Empleado res-Afiliados) - (09012) - (OBLIGACIONES PATRONALES) - YEROVI MUNOZ XIMENA ALEXANDRA - #165283885
Número de transferencia	#0193488673
Monto	566.15
Fecha	2023-01-05 16:27:39

Para descargar la factura electrónica, revise la página web de IESS (PLANI)-PAGO DE PLANILLAS (Empleadores-Afiliados) - (09012) - (OBLIGACIONES PATRONALES)

[Enviar comprobante \(no](#)

DOCUMENTACION CRUZADA

Oficio ACB-047-2023

Puyo, 09 de febrero de 2023

Ingeniero
JUAN MANUEL GUACHO G.
FISCALIZADOR EXTERNO DEL PROYECTO
Presente

De mi consideración,

A través del presente, me dirijo a usted para expresarle un cordial saludo y desearle el mejor de los éxitos en las funciones que viene desarrollando.

En mi calidad de contratista del Proyecto: **ASFALTADO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASATAZA**, con código **COTO-GADPPz-004-2022**; tengo a bien remitirle a usted la Planilla Física de Avance N° 05 correspondiente al mes de diciembre del 2022 subsanadas las observaciones detalladas en su oficio N° 0035-FIBO-JB-2022.

Pongo a su conocimiento para la revisión correspondiente para su aprobación y trámite correspondiente.

Por la gentil atención al presente, reitero mis sinceros agradecimientos.

Atentamente



Firmado electrónicamente por:
**XIMENA ALEXANDRA
YEROVI MUNOZ**

Ing. Ximena Yerovi Muñoz
CONSTRATISTA
Correo: xym8alex@gmail.com

Recibido
9 Febrero 2023

Jez



OFICIO: 035-FIBO-JG-2023

Puyo, 08 de Febrero 2023

Ingeniera

XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ

CONTRATISTA DEL PROYECTO "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."

Presente

De mi consideración,

Reciba un cordial y atento saludo, a la vez deseándole éxitos en sus funciones. En relación a la obra: **"ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."**, numero de proceso: **CDC-GADPPz-015-2022**, con respecto a las observaciones y correcciones de la planilla 5, mediante Oficio N°009-V.A. BOBONAZA-2023, se entregó un modelo de presentación de Informes:

- Presentar planilla de avance de obra consolidado.
- Presentar planilla al 100% ejecutado.
- Presentar planilla de excedentes de obra.
- Presentar cuadro de diferencia de cantidades de obra.

Por tal motivo solicito que se presente la planilla # 5 con las respectivas correcciones.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, anticipo mi más sincero agradecimiento.

Atentamente,



JUAN MANUEL GUACHO
GUACHO

ING. JUAN MANUEL GUACHO


FISCALIZADOR EXTERNO

CORREO: jguacho68@gmail.com

TELÉFONO: 0999985643

cc./archivo

08-02-2023


SOFIA FLOR

Puyo, 03 de febrero de 2023
Oficio N°009-V.A. BOBONAZA-2023

ING.
JUAN MANUEL GUACHO GUACHO
FISCALIZADOR EXTERNO - CONTRATISTA

ASUNTO: OBSERVACIONES Y CORRECCIONES DE LA PLANILLA # 5 DEL CONTRATISTA Y FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

De mi consideración:

En reunión mantenida con los señores del Banco del Estado conjuntamente con los Fiscalizadores, Administradores y Director de Fiscalización se entregó un modelo de presentación de Informes correspondientes de Obra y Fiscalización, por tal motivo solicito que se presente la planilla # 5 y las subsiguientes, así como las planillas desglosadas como se indica a continuación:

Planillas de Obra:

- Presentar planilla de avance de obra consolidado.
- Presentar planilla al 100% ejecutado.
- Presentar planilla de excedentes de obra.
- Presentar cuadro de diferencia de cantidades de obra.

Planillas de Fiscalización:

- Presentar planilla de Fiscalización de avance consolidado.
- Presentar planilla de Fiscalización al 100%.
- Presentar planilla de Fiscalización de excedentes.

Particular que pongo en su conocimiento.

Atentamente,



Ing. Hector Vinicio Alarcón Yépez
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

*Recibido
3 Febrero 2023
Jel*

Oficio ACB-039-2023

Puyo, 10 de enero de 2023

Ingeniero
JUAN MANUEL GUACHO G.
FISCALIZADOR EXTERNO DEL PROYECTO
Presente

De mi consideración,

A través del presente, me dirijo a usted para expresarle un cordial saludo y desearle el mejor de los éxitos en las funciones que viene desarrollando.

En mi calidad de contratista del Proyecto: **ASFALTADO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASATAZA**, con código **COTO-GADPPz-004-2022**; tengo a bien remitirle a usted la Planilla Física de Avance N° 05/correspondiente al mes de diciembre del 2022 subsanadas las observaciones detalladas en su oficio N° 0031-FIBO-JB-2022.

Pongo a su conocimiento para la revisión correspondiente para su aprobación y trámite correspondiente.

Por la gentil atención al presente, reitero mis sinceros agradecimientos.

Atentamente



Firmado electrónicamente por:
XIMENA
ALEXANDRA
YEROVI MUNOZ

Ing. Ximena Yerovi Muñoz
CONSTRATISTA
Correo: xym8alex@gmail.com

RECIBIDO
10-01-2023
JMG

OFICIO: 031-FIBO-JG-2022

Puyo, 6 de enero 2023

Ingeniera

XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ

CONTRATISTA DEL PROYECTO "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."

Presente.

De mi consideración,

Reciba un cordial y atento saludo, a la vez deseándole éxitos en sus funciones. En relación a la obra: **"ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."**, número de proceso: **COTO-GADPPz-004-2022**, hago la entrega a usted la devolución de la **PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°5** con las siguientes observaciones:

- Falta anexar la planilla del IESS.
- Anexar facturas.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, anticipo mi más sincero agradecimiento.



Firmado electrónicamente por:
**ING. MANUEL
GUACHO GUACHO**

ING. JUAN MANUEL GUACHO

FISCALIZADOR EXTERNO

CORREO: jguacho68@gmail.com

TELÉFONO: 0999985643

cc./archivo

Recibido
06-01-2023


Oficio ACB-038-2023
Puyo, 05 de enero de 2023

Ingeniero
Juan Guacho Guacho
FISCALIZADOR EXTERNO
Presente

De mi consideración,

A través del presente, me dirijo a usted para expresarle un cordial saludo y desearle el mejor de los éxitos en las funciones que viene desarrollando.

En mi calidad de contratista del Proyecto: **ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**, con código **COTO-GADPPz-004-2022**; tengo a bien remitirle a usted la Planilla Fisca de Avance N 05 correspondiente al mes de diciembre de 2022.

Pongo a su conocimiento para la revisión correspondiente para su aprobación y tramite correspondiente.

Por la gentil atención al presente, reitero mis sinceros agradecimientos.

Atentamente



Ing. Ximena Yerovi Muñoz
CONTRATISTA
Correo: xym8alex@gmail.com


Recibido
05/01/2023

Oficio ACB-036-2022

Puyo, 29 de diciembre de 2022

Ingeniero.

Juan Guacho

FISCALIZADOR EXTERNO

Proyecto: **ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.** Contrato: Coto-GADPPz 004-2022.

Presente;

Reciba un cordial y atento saludo, mediante la presente la Srta. Ing. Ximena Yerovi hace la entrega del Informe Ambiental de Cumplimiento correspondiente a la planilla #5 periodo 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del proyecto: **ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.**

El informe fue realizado con base a las observaciones emitidas por el técnico ambiental de fiscalización, considerando los lineamientos indicados, siendo esta la primera versión a entregar para su respectiva revisión y aprobación.

Se encuentra adjunto el siguiente documento:

- o Informe Ambiental de Cumplimiento (digital)

Le antemano anticipo mis agradecimientos por la atención prestada.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**XIMENA
ALEXANDRA
YEROVI MUNOZ**

Ing. Ximena Yerovi Muñoz

CONTRATISTA

Correo: xym8alex@gmail.com


29/12/2022
Recibido

OFICIO: 026-FIBO-JG-2022
Puyo, 07 de diciembre 2022

Ingeniera

Ximena Yerovi Muñoz


CONTRATISTA DEL PROYECTO "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA." Presente.

De mi consideración,

En respuesta al oficio **ACB-028-2022** emitido con fecha 24 de octubre de 2022 y al oficio **ACB-032-2022** emitido con fecha 28 de noviembre de 2022, en el cual se solicita la autorización de las escombreras establecida en los predios de los moradores del área de influencia del proyecto: **ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.**

Por lo antes mencionado se realizó una inspección de campo por parte del equipo de fiscalización externa en el cual se constató lo solicitado de manera verbal y física a los propietarios de los predios, además se verificó que el lugar es plano y sin ningún inconveniente para depositar el material de desalojo de excavaciones. Por lo tanto, se **AUTORIZA** usar estos espacios como escombreras.

Atentamente,



ING. JUAN MANUEL GUACHO **FISCALIZADOR**

CORREO: jguacho68@gmail.com

TELÉFONO: 0999985643

cc./archivo

Recibido
07-12-2022


Oficio ACB-032-2022

Puyo, 28 de noviembre de 2022

Ingeniero.

Juan Guacho

FISCALIZADOR EXTERNO

Proyecto: ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

Presente;

Reciba un cordial y atento saludo, adjunto al presente los oficios de las autorizaciones correspondientes a las escombreras establecida en los predios de los moradores del área de influencia del proyecto: **ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.** Los mismos que mediante solicitud verbal y física, y previo a las inspecciones realizadas en campo han autorizado que el material proveniente de los trabajos realizados de excavación sea desalojado

Por la gentil atención al presente, reitero mis sinceros agradecimientos.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**XIMENA
ALEXANDRA
YEROVI MUNOZ**

Ing. Ximena Yerovi Muñoz

CONTRATISTA

Correo: xym8alex@gmail.com

Recibido
28-11-2022


Oficio ACB-028-2022

Puyo, 24 de octubre de 2022

Ingeniero.

Juan Guacho

FISCALIZADOR EXTERNO

Proyecto: ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

Presente;

Reciba un cordial y atento saludo, adjunto al presente los oficios de las autorizaciones correspondientes a las escombreras establecida en los predios de los moradores del área de influencia del proyecto: **ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.** Los mismos que mediante solicitud verbal y física, y previo a las inspecciones realizadas en campo han autorizado que el material proveniente de los trabajos realizados de excavación sea desalojado

Por la gentil atención al presente, reitero mis sinceros agradecimientos.

Atentamente,



firmado electrónicamente por:
**XIMENA
ALEXANDRA
YEROVI MUNOZ**

Ing. Ximena Yerovi Muñoz

CONTRATISTA

Correo: xym8alex@gmail.com

Recibido: 24-10-2022
[Handwritten signature]

Oficio ACB-034-2022

Puyo, 05 de diciembre de 2022

Ingeniero
JUAN MANUEL GUACHO G.
FISCALIZADOR EXTERNO DEL PROYECTO
Presente

De mi consideración,

A través del presente, me dirijo a usted para expresarle un cordial saludo y desearle el mejor de los éxitos en las funciones que viene desarrollando.

En mi calidad de contratista del Proyecto: **ASFALTADO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASATAZA**, con código **COTO-GADPPz-004-2022**; tengo a bien remitirle a usted la Planilla Física de Avance N° 04 correspondiente al mes de noviembre del 2022.

Pongo a su conocimiento para la revisión correspondiente para su aprobación y trámite correspondiente.

Por la gentil atención al presente, reitero mis sinceros agradecimientos.

Atentamente



Firmado electrónicamente por:
**XIMENA
ALEXANDRA
YEROVI MUNOZ**

Ing. Ximena Yerovi
CONTRATISTA
Correo: xym8alex@gmail.com

*Recibido
05/12/2022*

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO

REPROGRAMACIÓN

PROYECTO: ASFALTADO VIA CABECERAS DE BOLONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULUNUISCSA #4000 HASTA ABISCSA, 13.1100|-4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	PERIODOS (MESES/SEMANAS)																											
						1 MES			2 MES			3 MES			4 MES			5 MES			6 MES												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
1	DESBRUCE, DESBROSE Y LIMPIEZA	m ²	1,90	350.38	665.72																												
2	REPUNTO Y INVELACION ANILLO DE	km	4.50	431.20	1,940.81					388.16				388.16				388.16				388.16											
3	RELOCACION DE ALICANTARILLAS	m	75.00	12.71	953.25					965.96																							
4	EXCAVACION PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	m ³	1,800.00	3.84	6,912.00					7,092.00				7,092.00				7,092.00				7,092.00											
5	EXCAVACION SIN CLASIFICAR (MOV. DE TIERRA)	m ³	13,176.98	0.97	12,771.67					12,771.67				12,771.67				12,771.67				12,771.67											
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS PEQUEÑAS	m ³	652.40	4.55	2,968.42					2,968.42				2,968.42				2,968.42				2,968.42											
7	TIPO DE ACERO CORRUGADO D=1.20 m E=2.5 mm, MP-100	m	75.00	384.44	28,833.00					28,833.00				28,833.00				28,833.00				28,833.00											
9	TUBERIA DE ACERO CORRUGADO D= 1.50 m, E=2.5 mm, MP-100	m	36.00	482.97	17,386.92					17,386.92				17,386.92				17,386.92				17,386.92											
10	TUBERIA DE ACERO CORRUGADO D= 2.20 m E=3.0 mm, MP-100	m	21.00	792.58	16,644.18					16,644.18				16,644.18				16,644.18				16,644.18											
11	MURO DE H.S. P.C. 180KG/Cm ² TIPO CUBIERTA	m ³	235.20	188.57	44,351.96					44,351.96				44,351.96				44,351.96				44,351.96											
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO, MINADA, CARGADA Y REGADA)	m ³	8,038.72	3.04	24,437.71					24,437.71				24,437.71				24,437.71				24,437.71											
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	m ³	5,869.65	11.06	62,766.33					62,766.33				62,766.33				62,766.33				62,766.33											
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	m ³	3,672.76	14.01	51,445.38					51,445.38				51,445.38				51,445.38				51,445.38											
15	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	m ³ km	53,827.27	0.63	33,911.16					33,911.16				33,911.16				33,911.16				33,911.16											
16	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	m ³ km	183,069.40	0.32	58,582.21					58,582.21				58,582.21				58,582.21				58,582.21											
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	m ³ km	103,102.97	0.32	32,992.95					32,992.95				32,992.95				32,992.95				32,992.95											
18	ASFALTO RC-250, PARA IMPRIMACION	l	37,800.00	0.82	30,996.00					30,996.00				30,996.00				30,996.00				30,996.00											
19	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	m ²	27,000.00	9.04	244,060.00					244,060.00				244,060.00				244,060.00				244,060.00											
20	HORMIGON PARA CUNETAS (F/C=180 KG/Cm ³)	m ³	1,443.20	187.09	269,180.29					269,180.29				269,180.29				269,180.29				269,180.29											
21	TRAFICO	m	12,600.00	0.80	10,080.00					10,080.00				10,080.00				10,080.00				10,080.00											
22	SENALES ECOLOGICAS (2.4X1.22)M ²	u	2,000	298.96	597.92					597.92				597.92				597.92				597.92											
23	SENALES INFORMATIVAS (2.4X1.22)M ²	u	5,000	124.59	622.95					622.95				622.95				622.95				622.95											
24	SENALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)M ²	u	15,000	124.59	1,868.85					1,868.85				1,868.85				1,868.85				1,868.85											
25	SENALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)M ²	u	2,000	72.87	145.74					145.74				145.74				145.74				145.74											
26	SENALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (0.90X0.90)M ²	u	2,000	147.11	294.22					294.22				294.22				294.22				294.22											
27	SENALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.20X0.90)M ²	u	2,000	147.11	294.22					294.22				294.22				294.22				294.22											
28	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	u	1,125.00	5.71	6,423.75					6,423.75				6,423.75				6,423.75				6,423.75											
29	PANFARDA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO) CON ESTRUCTURA	u	1.00	354.44	354.44					354.44				354.44				354.44				354.44											
30	S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCION UV, 71cm INCL. CINTA REFLECTIVA	u	8.00	21.89	175.12					175.12				175.12				175.12				175.12											
31	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PINTADO DE COLORES INTENSOS (MAT. POLIURETANO)	u	2.00	26.25	52.50					52.50				52.50				52.50				52.50											
32	CONTENEDORES METALICOS DE 65 GALONES	m	500.00	0.31	155.00					155.00				155.00				155.00				155.00											
33	KIT ANTIDERRAMES	u	2.00	17.31	34.62					34.62				34.62				34.62				34.62											
34	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	u	20.00	44.89	897.80					897.80				897.80				897.80				897.80											
35	CAPACITACION SOBRE PRESERVACION DE RECURSOS AMBIENTALES (PREVENCIÓN DE PELIGROSOS DE 2 A 3 HORAS)	u	1.00	117.00	117.00					117.00				117.00				117.00				117.00											
36	RECURSOS AMBIENTALES (PREVENCIÓN DE PELIGROSOS DE 2 A 3 HORAS)	u	1.00	117.00	117.00					117.00				117.00				117.00				117.00											
37	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	u	1.00	117.00	117.00					117.00				117.00				117.00				117.00											
38	INVERSION MENSUAL AVANCE MENSUAL (%)	u	1.00	117.00	117.00					117.00				117.00				117.00				117.00											
INVERSION ACUMULADA AL 100% (hasta emp)						586,886.70	16,391.16	1.71	1.71	96,338.80	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70				
INVERSION ACUMULADA AL 100% (hasta emp)						586,886.70	16,391.16	1.71	1.71	96,338.80	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70			
INVERSION ACUMULADA AL 100% (hasta emp)						586,886.70	16,391.16	1.71	1.71	96,338.80	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70		
INVERSION ACUMULADA AL 100% (hasta emp)						586,886.70	16,391.16	1.71	1.71	96,338.80	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	
INVERSION ACUMULADA AL 100% (hasta emp)						586,886.70	16,391.16	1.71	1.71	96,338.80	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	
INVERSION ACUMULADA AL 100% (hasta emp)						586,886.70	16,391.16	1.71	1.71	96,338.80	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70
INVERSION ACUMULADA AL 100% (hasta emp)						586,886.70	16,391.16	1.71	1.71	96,338.80	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70
INVERSION ACUMULADA AL 100% (hasta emp)						586,886.70	16,391.16	1.71	1.71	96,338.80	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70
INVERSION ACUMULADA AL 100% (hasta emp)						586,886.70	16,391.16	1.71	1.71	96,338.80	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70
INVERSION ACUMULADA AL 100% (hasta emp)						586,886.70	16,391.16	1.71	1.71	96,338.80	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70
INVERSION ACUMULADA AL 100% (hasta emp)						586,886.70	16,391.16	1.71	1.71	9																							

INFORME DE FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

**ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN
(ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ,
CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.**

FISCALIZADOR EXTERNO

**INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA
FISCALIZACION
PLANILLA No 05**

PROYECTO:

*Asfaltado vía cabeceras del Bobonaza hasta la comunidad Taculin
(abscisa 8+600 hasta abscisa 13+100) L=4,5 km, parroquia Veracruz,
cantón Pastaza, provincia de Pastaza.*

CONTRATISTA:

Ing. Ximena Alexandra Yerovi Muñoz

MONTO DEL CONTRATO:

\$ 956 686,70 USD sin incluir IVA

ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRA:

Ing. Vinicio Alarcón Yépez

FISCALIZADOR:

Ing. Juan Manuel Guacho

DIRECCION DE FISCALIZACION:

Ing. Álvaro Sosa

PERIODO DEL INFORME:

1 de diciembre al 31 de diciembre de 2022

FECHA DE ELABORACION:

05 de enero del 2023

1. ÍNDICE

1.	DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN.....	1
2.	DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN.....	1
3.	PERÍODO DEL INFORME.....	2
4.	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE PERÍODO	3
-	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE LOS DISTINTOS FRENTE DE TRABAJO:.....	4
-	CONTROL DE CALIDAD:.....	4
-	INFORME DE LAS CONDICIONES DEL CLIMA:.....	4
-	ACTIVIDADES DE LA PLANIFICACIÓN MENSUAL:.....	4
5.	AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO.....	5
6.	CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS.....	5
7.	PLANILLAS DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS	6
-	RESUMEN DE PLANILLAS	6
8.	TIEMPO UTILIZADO DESDE LA FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO.....	6
9.	RESUMEN DE MONTOS EJECUTADOS PLANILLAS CONTRACTUALES.....	7
10.	RESUMEN A LA FECHA DEL PROYECTO.....	7
11.	GESTION DE LA FISCALIZACIÓN	7
12.	VERIFICACIONES REALIZADAS	10
-	VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL TÉCNICO EN OBRA.....	10
-	VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA DE ACUERDO A RUBROS EJECUTADOS	10
-	VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA OFERTADA, DE ACUERDO A RUBROS EJECUTADOS.....	11
-	INFORME DEL PERSONAL TÉCNICO POR PARTE DEL CONSULTOR	11
-	ANÁLISIS DE RENDIMIENTO.....	12
-	INCIDENCIAS CLIMATICAS PRODUCIDAS EN LA OBRA	12
-	DOCUMENTACION EMITIDA POR FISCALIZACION EXTERNA Y CONTRATISTA.....	13
-	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES.....	13
-	ENSAYOS Y PRUEBAS.....	14
13.	MULTAS, SANCIONES Y SUSPENSIONES.....	14
14.	CONCLUSIONES.....	14
15.	RECOMENDACIONES.....	14
16.	ANEXOS.....	14
17.	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME	15

INDICE DE GRAFICOS

Gráfico 1 Monitoreo Económico Parcial	9
Gráfico 2 Monitoreo Económico Acumulado	10

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

Objeto del contrato	<i>Asfaltado vía Cabeceras del Bobonaza hasta la comunidad Taculin (abscisa 8+600 hasta abscisa 13+100) L=4.5 km, parroquia Veracruz, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.</i>
Código del proceso	<i>COTO-GADPPz-004-2022</i>
Monto del contrato	<i>\$ 956 686,70 USD sin incluir IVA</i>
Fuente de financiación	<i>Banco de Desarrollo del Ecuador</i>
Fecha de suscripción	<i>30 de junio del 2022</i>
Plazo contractual	<i>180 días</i>
Monto del anticipo	<i>\$ 382 674,68 USD</i>
Fecha de entrega del anticipo	<i>20 de julio del 2022</i>
Fecha de inicio de plazo	<i>23 de agosto del 2022</i>
Fecha de terminación contractual	<i>19 de febrero del 2023</i>
Suspensión de trabajo	<i>-</i>
Ampliación de plazo	<i>-</i>
Contratista	<i>Ing. Ximena Alexandra Yerovi Muñoz</i>
Administrador de Contrato	<i>Ing. Vinicio Alarcón Yépez</i>

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN

Objeto del contrato	<i>Fiscalización externa para el Asfaltado vía Cabeceras del Bobonaza hasta la comunidad Taculin (abscisa 8+600 hasta abscisa 13+100) L=4.5 km, parroquia Veracruz, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.</i>
Código del proceso	<i>CDC-GADPPz-015-2022</i>
Monto del contrato	<i>\$ 48 891,62 USD sin incluir IVA</i>
Fecha de suscripción contrato principal	<i>25 de julio del 2022</i>
Fecha de suscripción contrato modificadorio	<i>17 de agosto del 2022</i>
Plazo contractual	<i>180 días</i>
Monto del anticipo	<i>\$ 19 556,65</i>
Fecha de entrega del anticipo	<i>22 de agosto del 2022</i>
Fecha de inicio de trabajo	<i>23 de agosto del 2022</i>
Fecha de terminación contractual	<i>19 de febrero del 2023</i>
Suspensión de trabajo	<i>-</i>
Ampliación de plazo	<i>-</i>
Contratista	<i>Ing. Juan Manuel Guacho</i>
Administrador de Contrato	<i>Ing. Vinicio Alarcón Yépez</i>

3. PERÍODO DEL INFORME

Para el periodo mensual correspondiente desde el 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2022, para lo cual el administrador del contrato junto con fiscalización solicitó al contratista la programación inicial presentada y aprobada con fecha 23 de agosto de 2022, misma que no ha tenido ninguna modificación. Considerando los 8 días del mes de agosto dentro la planilla de avance de obra No 01, del 1 de septiembre al 30 de septiembre correspondiente a la planilla de avance de obra No02, del 1 de octubre al 31 de octubre del 2022 correspondiente a la planilla de avance de obra No03, del 1 de noviembre al 30 de noviembre del 2022 corresponde a la planilla de avance de obra No04 y para el presente periodo del 1 diciembre al 31 de diciembre del 2022 correspondiente a la planilla de avance de obra No 05, donde el porcentaje acumulado programado es de 69.59% con una inversión aproximada de \$665 804.96. Sin embargo, en el presente periodo se tiene una inversión de \$162 884.12 misma que representa un porcentaje de avance de obra de 17.03% y una inversión programada de \$740 751.82 superando el porcentaje acumulado programado.

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CONTRATO	TOTAL	PRESENTE PLANILLA	
						CANTIDAD	COSTO
1	DESBROCE, DESBOSQUEY LIMPIEZA	Ha	1.80	\$ 550.36	\$ 990.65	-	\$ -
2	REPLANTEO Y NIVELACION A NIVEL DE ASFALTO	km	4.50	\$ 431.29	\$ 1,940.81	-	\$ -
3	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m	76.00	\$ 12.71	\$ 965.96	-	\$ -
4	EXCAVACION PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	m³	1800.00	\$ 3.94	\$ 7,092.00	512.75	\$ 2,020.24
5	EXCAVACION SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)	m³	13176.98	\$ 0.97	\$ 12,781.67	-	\$ -
6	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	m³	562.40	\$ 4.65	\$ 2,615.16	-	\$ -
7	LIMPIEZA DE DERRUMBES	m³	1317.69	\$ 1.89	\$ 2,490.43	-	\$ -
8	TUBERIA DE ACERO CORRUGADO D= 1.20 m, E=2.5 mm, mP-100	m	75.00	\$ 364.44	\$ 27,333.00	-	\$ -
9	TUBERIA DE ACERO CORRUGADO D= 1.50 m, E=2.5 mm, mP-100	m	36.00	\$ 482.97	\$ 17,386.92	-	\$ -
10	TUBERIA DE ACERO CORRUGADO D= 2.20 m, E=3.0 mm, mP-100	m	21.00	\$ 762.58	\$ 16,014.18	-	\$ -
11	MURO DE H.S. FC=180KG/Cm2 TIPO B(CABEZALES)	m²	235.20	\$ 188.57	\$ 44,351.66	-	\$ -
12	MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO(MINADA, CARGADA Y REGADA)	m³	8038.72	\$ 3.04	\$ 24,437.71	-	\$ -
13	MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	m³	5669.65	\$ 11.06	\$ 62,706.33	485.72	\$ 5,372.06
14	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	m³	3573.76	\$ 14.01	\$ 50,068.38	353.80	\$ 4,956.74
15	TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO	m³-km	53827.27	\$ 0.63	\$ 33,911.18	-	\$ -
16	TRANSPORTE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3	m³-km	163569.40	\$ 0.32	\$ 52,342.21	14,013.02	\$ 4,484.17
17	TRANSPORTE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	m³-km	103102.97	\$ 0.32	\$ 32,992.96	10,207.13	\$ 3,266.28
18	ASFALTO RC-260, PARA IMPRIMACION	l	37800.00	\$ 0.82	\$ 30,996.00	12,785.63	\$ 10,484.22
19	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"	m²	27000.00	\$ 9.04	\$ 244,080.00	9,132.61	\$ 82,568.79
20	HORMIGON PARA CUNETAS (FC=180 KG/Cm)	m³	1443.20	\$ 187.09	\$ 270,008.29	265.87	\$ 49,741.62
21	MARCAS EN PAVIMENTO - PINTURA ALTO TRAFICO	m	13600.00	\$ 0.60	\$ 7,560.00	-	\$ -
22	SENALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)m2	u	2.00	\$ 298.96	\$ 597.92	-	\$ -
23	SENALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)m2	u	5.00	\$ 298.96	\$ 1,494.80	-	\$ -
24	SENALES REGLAMENTARIAS (0.75 X 0.75)m2	u	5.00	\$ 124.59	\$ 622.95	-	\$ -
25	SENALES PREVENTIVAS (0.75 X 0.75)m2	u	15.00	\$ 124.59	\$ 1,868.85	-	\$ -
26	SENALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60mX0.80m) Moviles	u	2.00	\$ 72.87	\$ 145.74	-	\$ -
27	SENALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22mX0.60m) MOVILES	u	2.00	\$ 147.11	\$ 294.22	-	\$ -
28	MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES)	u	1125.00	\$ 5.71	\$ 6,423.75	-	\$ -
29	PANCARTA INFORMATIVA DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	u	1.00	\$ 354.44	\$ 354.44	-	\$ -
30	SICONO DE SEGURIDAD CON PROTECCION UV, 71 Cm INCLY. CINTA REFLECTIVA	u	8.00	\$ 21.69	\$ 173.52	-	\$ -
31	SUMINISTRO DE PALETA DE ALTO Y SIGA	u	2.00	\$ 29.25	\$ 58.50	-	\$ -
32	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	m	500.00	\$ 0.31	\$ 155.00	-	\$ -
33	CONTENEDORES METALICOS DE 55 GALONES	u	2.00	\$ 17.31	\$ 34.62	-	\$ -
34	KIT ANTIDERRAMES	u	1.00	\$ 152.10	\$ 152.10	-	\$ -
35	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES	u	20.00	\$ 44.60	\$ 893.80	-	\$ -
36	CAPACITACION SOBRE PRESERVACION DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS)	u	1.00	\$ 117.00	\$ 117.00	-	\$ -
37	CAPACITACION EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)	u	1.00	\$ 117.00	\$ 117.00	-	\$ -
38	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)	u	1.00	\$ 117.00	\$ 117.00	-	\$ -
					\$ 956,686.70		\$ 162,884.12

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE PERÍODO

ACTIVIDADES SEGÚN TABLA DE CANTIDADES Y RUBROS	
RUBRO	ACTIVIDAD
<i>Excavación para cuentas y encauzamientos.</i>	<i>Para esta actividad se consideró los lineamientos de los estudios y ensanche de la vía, para lo cual nos apoyamos de equipo topográfico, en ciertos tramos se procedió a trasladar el eje debido a derrumbes en la mesa del camino.</i>
<i>Material de subbase clase 3.</i>	<i>Se controló en la extracción, transporte para su posterior colocación en sitio del material de mejoramiento de la mina otorgada por la entidad, cumpliendo las normas ambientales y mineras en cada uno de sus procesos.</i>
<i>Trasporte de material de subbase clase 3</i>	<i>Consiste en el transporte de material desde la mina otorgada por la entidad hasta el proyecto, tomando en cuenta las medidas de seguridad y ambiente evitando la contaminación con desperdicios.</i>
<i>Material de base de agregados pétreos.</i>	<i>Se controló en la extracción, transporte para su posterior colocación en sitio del material de mejoramiento de la mina otorgada por la entidad, cumpliendo las normas ambientales y mineras en cada uno de sus procesos.</i>
<i>Trasporte de material de base granular de agregados</i>	<i>Consiste en el transporte de material desde la mina otorgada por la entidad hasta el proyecto, tomando en cuenta las medidas de seguridad y ambiente evitando la contaminación con desperdicios.</i>
<i>Asfalto RC-250, para imprimación</i>	<i>Se constato que la imprimación se colocó una vez verificados los trabajos de tendido de base, así como los requerimientos de densidades, temperatura de asfalto y limpieza de la superficie.</i>
<i>C. Rodadura hormigón asf. Mezclado en planta, e=2"</i>	<i>Se verificó el espesor de la capa de rodadura, la calidad del material bituminoso, temperatura de la mezcla asfáltica, una correcta imprimación y compactación adecuada que cumplan con los requerimientos solicitados.</i>
<i>Hormigón para cunetas (F'c=180Kg/cm2)</i>	<i>Se procedió a la verificación de los materiales y al proceso de fundición,</i>

	además se eso se extrajo muestras con el fin de comprobar la resistencia requerida.
--	---

- **CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE LOS DISTINTOS FRENTE DE TRABAJO:**

- *En base la oferta presentada y cuyo formulario de cumplimiento exige la presentación de una metodología de construcción y organigrama de trabajo, se exige el cumplimiento de dicho programa adicionalmente se procura con el fin de mantener el buen avance físico del proyecto el control de los frentes de trabajo que básicamente se divide en:*

FRENTE DE MAQUINARIA	OPERADORES AYUDANTES TIQUETERA CHOFERES
FRENTE DE OBRA CIVIL	MAESTRO MAYOR ALBAÑILES PEONES
FRENTE DE CONTROL	SUPERINTENDENTE RESIDENTES TOPOGRAFO

- **CONTROL DE CALIDAD:**

- *Se realizó por parte del equipo de fiscalización un seguimiento constante de las actividades ejecutadas durante el presente periodo procurando realizar las respectivas recomendaciones de ser el caso, controlando así que cada una de las actividades cumplan con las especificaciones técnicas entregadas por la entidad Contratante además de los códigos y reglamentos de construcción vigentes.*
- *Dentro de la ejecución in situ de cada rubro, se procedió a verificar la disponibilidad del equipo ofertado, metodología de buenas prácticas de ejecución de obra, además de que se cuente con el personal necesario y de ser el caso el incremento del mismo.*

- **INFORME DE LAS CONDICIONES DEL CLIMA:**

- *En cuanto al comportamiento climático durante el presente periodo se ha dispuesto el seguimiento del mismo con información de hora de eventualidad y si tuvo o no incidencia dentro de la ejecución del proyecto.*

- **ACTIVIDADES DE LA PLANIFICACIÓN MENSUAL:**

- *Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo:*

- Exigencia permanente que todo el personal cuente con el equipo de protección personal (EPP).
- Acciones de control:
 - Verificación de la ejecución de todos los rubros, de acuerdo con la programación presentada por el Contratista.
- Entre las tareas proyectadas por Fiscalización son:
 - Control del Libro de Obra
 - Control de calidad de los materiales a ser utilizados por el constructor
 - Control de la supervisión continua de los equipos y materiales
 - Atención oportuna de las consultas del constructor.
 - Exigir al constructor el cumplimiento de las leyes laborales con sus trabajadores.
 - Exigir al constructor el uso de elementos de seguridad de los obreros a su mando.
 - Verificar que el Residente de obra este continuamente en la obra.
 - Vigilar que se cumplan las cláusulas del contrato.

5. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

El monto total del proyecto alcanza la suma de \$ 956 686,70 USD sin incluir IVA (NOVECIENTOS CIENTO Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 70/100 DÓLARES) para el Asfaltado vía cabeceras del Bobonaza hasta la comunidad Taculin (abscisa 8+600 hasta abscisa 13+100) L=4.5 km, parroquia Veracruz, cantón Pastaza, provincia de Pastaza. En el presente periodo de acuerdo a la programación inicial del cronograma valorado de trabajo, la ejecución del proyecto debería alcanzar un valor de USD. 273 327.02; correspondientes al 28.57% del monto del contrato original sin reajuste de precios. En el periodo en mención la inversión económica alcanzada del proyecto es de USD 162 884.12; correspondientes a un avance de obra del 17.03%, es decir, no cumple con el porcentaje de avance programado para este periodo. Sin embargo, el avance acumulado programado ejecutado es de \$740 751.82 y un porcentaje del 77.43% en cambio el avance acumulado programado es de \$665 804.96 y un porcentaje de 69.59%. Por esta razón, supera la expectativa de inversión acumulada económica correspondiente para el presente periodo.

6. CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

RESUMEN DE MONTOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS MENSUALMENTE							
MONTO PROGRAMADO				MONTO EJECUTADO			
ESTE PERÍODO	%	ACUMULADO	%	ESTE PERÍODO	%	ACUMULADO	%
273 327.02	28.57	665 804.96	69.59	162 884.12	17.03	740 751.82	77.43

7. PLANILLAS DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS

DESCRIPCIÓN	VALORES					PORCENTAJES			
	MONTO PROGRAMADO		MONTO PLANILLADO			AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL	
	MES	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO
PLANILLAS	273 327.02	665 804.96	577 867.70	162 884.12	740 751.82	28.57%	69.59%	17.03%	77.43%
OBRA CIVIL EXCEDENTES									
OBRA CIVIL RUBROS NUEVOS									
TOTALES	273 327.02	665 804.96	577 867.70	162 884.12	740 751.82	28.57%	69.59%	17.03%	77.43%

ANTICIPO RECIBIDO	382 674,68
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ESTA PLANILLA	65 153,65
AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPO	296 300,73
SALDO ANTICIPO POR DEVENGAR	86 373,95

EXCEDENTE DE OBRA CIVIL	-
PORCENTAJE DE EXCEDENTE DE OBRA	-
PORCENTAJE DE DECREMENTOS A LA FECHA	-
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA SIN INCREMENTOS	-

- RESUMEN DE PLANILLAS

DESCRIPCIÓN	EJECUTADO		PLANILLA AL 100%		INCREMENTOS	
	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
PLANILLA No 1	113 118,05	11,82%	112 332,01	11,74%	786,04	0,08%
PLANILLA No 2	106 500,95	11,13%	96 532,26	10,09%	9 968,69	1,04%
PLANILLA No 3	147 769,15	15,45%	103 807,15	10,85%	43 962,00	4,60%
PLANILLA No 4	210 479,55	22,00%	188 377,13	19,69%	22 102,42	2,31%
PLANILLA No 5	162 884,12	17,03%	162 884,12	17,03%	-	-
TOTALES	740 751,82	77,43%	663 932,67	69,40%	76 819,15	8,03%

8. TIEMPO UTILIZADO DESDE LA FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO

Con un plazo de 180 días, el 23 de agosto del 2022 se entrega los planos, estudios y diseños del proyecto; para los trabajos en obra se realiza las verificaciones en campo correspondientes, las actividades para el periodo, 23 de agosto de 2022 al 31 de agosto de 2022, concerniente a la Planilla No.1 de avance de obra, del 1 de septiembre al 30 de septiembre correspondiente a la planilla de avance de obra No02, del 1 de octubre al 31 de octubre del 2022 correspondiente a la planilla de avance de obra No03, del 1 de noviembre al 30 de noviembre del 2022 corresponde a la planilla de avance de obra No04 y para el presente periodo del 1 diciembre al 31 de diciembre del 2022 correspondiente a la planilla de avance de obra No 05.

	PLAZO (DIAS)	PORCENTAJE (%)
DIAS UTILIZADOS	180	100,00%
DÍAS UTILIZADOS PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No1	8	4,44 %
DÍAS UTILIZADOS PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No2	30	16,67%
DÍAS UTILIZADOS PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No3	31	17.22%

DÍAS UTILIZADOS PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No4	30	16.67%
DÍAS UTILIZADOS PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No5	31	17.22%

Porcentaje utilizado en el presente periodo 72.22%.

9. RESUMEN DE MONTOS EJECUTADOS PLANILLAS CONTRACTUALES

PLANILLA	MES	MONTO DE OBRA PROGRAMADO	PORCENTAJE DE OBRA PROGRAMADO	MONTO DE OBRA EJECUTADO	PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO
1	23 de agosto / 31 de agosto del 2022	16 391,16	1,71%	113 118,05	11,82%
2	1 de septiembre/30 de septiembre del 2022	96 339,80	10,07%	106 500,95	11,13%
3	1 de octubre/31 de octubre del 2022	138 605.19	14.49%	147 769.15	15.45%
4	1 de noviembre/30 de noviembre del 2022	141 141.80	14.78%	210 479.55	22.00%
5	1 de diciembre/31 de diciembre del 2022	273 327.02	28.57%	162 884.12	17.03%
TOTAL		665 804.96	69.59%	740 751.82	77.43%

10. RESUMEN A LA FECHA DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	MONTO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
MONTO DEL CONTRATO	956 686,70	100%	
CONTRATO COMPLEMENTARIO	0.00	0.00%	
COSTO + PORCENTAJE	0.00	0.00%	
MONTO EJECUTADO A DICIEMBRE DEL 2022	162 884.12	17.03%	Informe mensual de acuerdo con el cronograma valorado de trabajo y programación inicial.

11. GESTION DE LA FISCALIZACIÓN

Dentro de las competencias concernientes al equipo de Fiscalización del Proyecto que están determinadas por el contrato de Consultoría y por los términos de referencia mismas que se realizan en forma permanente y rutinaria y están

enfocadas básicamente a: control de la calidad de los materiales y de la ejecución de los rubros que se incorporan al proyecto; estado y número de maquinaria disponible en la ejecución de los trabajos; número y desempeño del personal del contratista; solución oportuna a los problemas que afecten a la obra, trámite de los aspectos administrativos vinculados al proyecto y rediseños según el criterio de los profesionales a cargo, informando de cada una de ellas a la entidad a través del administrador de contrato.

Entre las diferentes actividades relacionadas a la fiscalización se realizaron las siguientes:

Control Técnico

➤ *Control de Ejecución de la obra (proceso constructivo)*

Se analiza una coherencia entre la metodología del contratista, especificaciones técnicas y normas vigentes de construcción que van relacionadas a un buen avance porcentual según el cronograma de avance de obra.

➤ *Control de calidad de obra (materiales y acabados)*

Se verifico cada uno de las actividades y sus componentes en este caso materiales para lo cual aquellos que son elaborados en obra son examinados en laboratorios a través de muestras y los adquiridos se exige una certificación de calidad emitido por el fabricante.

➤ *Calidad de materiales (especificaciones técnicas)*

Los materiales utilizados en el presente periodo son: material pétreo de mejoramiento. Fiscalización acatando lo solicitado en las especificaciones técnicas verifico que la extracción del material es de la mina Sata.

➤ *Seguridad en obra (plan de seguridad)*

Se realiza el control diario conjuntamente el residente de obra, el Ing. Ambiental y el encargado de seguridad industrial asignado al proyecto, tomando en cuenta los parámetros de verificación de la normativa de seguridad Industrial y salud ocupacional; y la normativa ambiental vigente. Se adjunto el informe respectivo.

➤ *Conservación del ambiente (pma)*

El control para la conservación del ambiente se ejecutará conjuntamente con los lineamientos de la dirección de gestión del ambiente del GADP Pastaza, de la cual en el proyecto en mención se evitará la tala excesiva de árboles, comprendido en el rubro de desbroce y desbosque, respetando los anchos de la vía. Así también controlando el uso de equipo adecuado para el mantenimiento de maquinaria y el depósito de desechos

generados en obra en lugares adecuados, evitando la contaminación del suelo.

➤ *Relacionamiento comunitario (prc)*

En el proceso constructivo Fiscalización con el propósito de precautelar el buen desenvolvimiento del proyecto mediante su equipo técnico realiza la socialización conforme avanza la ejecución de la obra con los propietarios de los terrenos aledaños y moradores de los sectores con el fin de informar los acontecimientos y cumplimiento de los planes de trabajos.

➤ *Control Económico*

En el presente periodo de acuerdo a la programación inicial del cronograma valorado de trabajo la ejecución del proyecto debería alcanzar un valor de USD. 273 327.02; correspondiente al 28.57% del monto del contrato original sin reajuste de precios. En el periodo en mención la inversión económica alcanzada del proyecto es de USD 162884.12; correspondientes a un avance de obra del 17.02%, es decir, no cumple con el porcentaje de avance programado para este periodo. Sin embargo, el avance acumulado programado ejecutado es de \$740 751.82 y un porcentaje del 77.43% en cambio el avance acumulado programado es de \$665 804.96 y un porcentaje de 69.59%. Por esta razón, supera la expectativa de inversión acumulada económica correspondiente para el presente periodo.

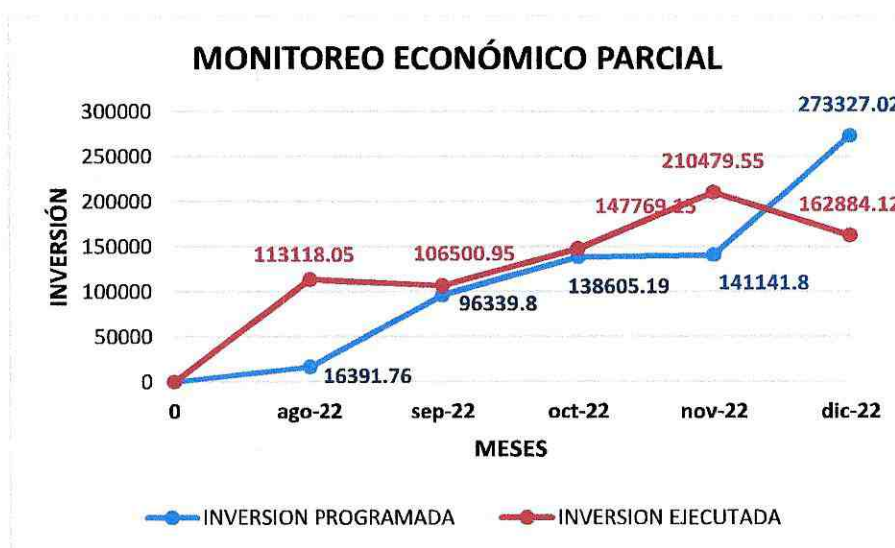


Gráfico 1 Monitoreo Económico Parcial

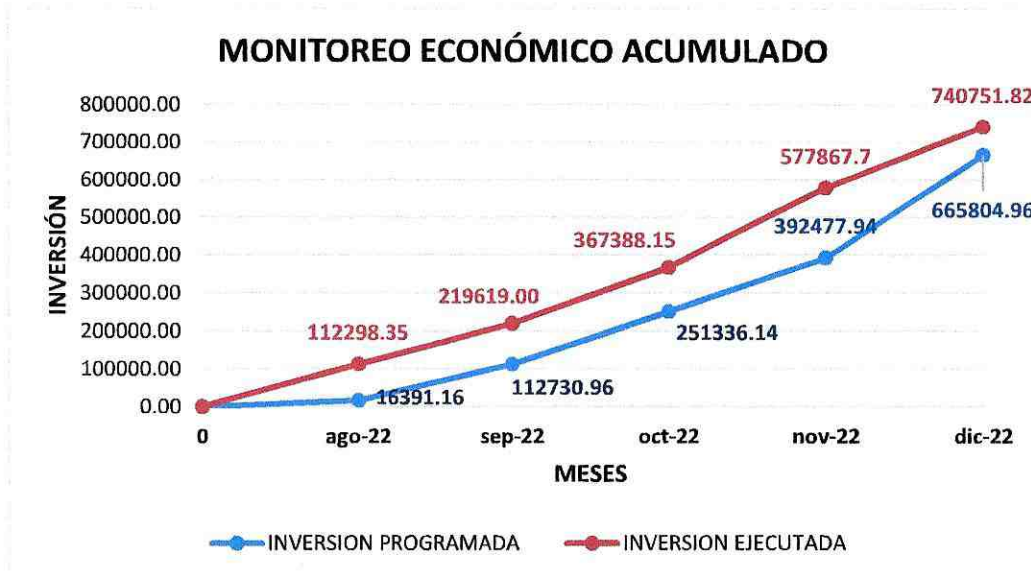


Gráfico 2 Monitoreo Económico Acumulado

➤ **Control administrativo y legal**

El libro de obra es la herramienta legal que mantiene las anotaciones de las actividades diarias realizadas en Obra. Se ha verificado el cumplimiento de mantener en obra todos los documentos establecidos en el contrato de acuerdo a los parámetros de contratación. Durante el proceso constructivo se ha verificado que el equipo técnico se mantenga en obra.

12. VERIFICACIONES REALIZADAS

- **VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL TÉCNICO EN OBRA**

PERSONAL OFERTADO	CHECK LIST
SUPERINTENDENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
RESIDENTE DE OBRA	<input checked="" type="checkbox"/>
INGENIERO AMBIENTAL	<input checked="" type="checkbox"/>
INGENIERO INDUSTRIAL	<input checked="" type="checkbox"/>
TOPÓGRAFO	<input checked="" type="checkbox"/>

- **VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA DE ACUERDO A RUBROS EJECUTADOS**

PERSONAL OFERTADO	PERSONAL PRESENTE EN OBRA	HORAS TRABAJADAS	CHECK LIST
OPERADOR DE EQUIPO PESADO G1 (OP C1)	Operador excavador (3)	248	<input checked="" type="checkbox"/>
OPERADOR DE EQUIPO C1 (GRUPO I)	Operador motoniveladora (1)	248	<input checked="" type="checkbox"/>
EQUIPO DE EQUIPO C2 (GRUPO II)	Operador rodillo liso vibratorio (1)	248	<input checked="" type="checkbox"/>

AYUDANTE MAQUINARIA (EO D2)	Ayudante de Excavadora (3)	248	<input checked="" type="checkbox"/>
MAESTRO MAYOR (EO C1)	Maestro de obra (1)	248	<input checked="" type="checkbox"/>
ALBAÑIL (EO D2)	Albañil (2)	248	<input checked="" type="checkbox"/>
PEON (EO E2)	Despachador (1), anotador (1), construcción (8)	248	<input checked="" type="checkbox"/>
CHOFER DE VOLQUETAS (CH C1)	Chofer de Volquetes con licencia tipo E (5)	248	<input checked="" type="checkbox"/>
TOPÓGRAFO (EO C1)	Topógrafo (1)	248	<input checked="" type="checkbox"/>
CADENERO (EO D2)	Cadenero (1)	248	<input checked="" type="checkbox"/>
CHOFER DE CAMION (CH C1)	Chofer camión abasto (1)	248	<input checked="" type="checkbox"/>

- VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA OFERTADA, DE ACUERDO A RUBROS EJECUTADOS

EQUIPO Y MAQUINARIA OFERTADO	EQUIPO Y MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA	HORAS TRABAJADAS	CHECK LIST
VOLQUETAS (5)	Volquetas Beiben (1), hino(2), chevrolet (1) y hino (2).	248	<input checked="" type="checkbox"/>
EXCAVADORAS (3)	Excavadoras Hyundai 148 HP (1), Sany 153 HP (1) y caterpillar 230 HP (1).	248	<input checked="" type="checkbox"/>
MOTONIVELADORA	Motoniveladora	248	<input checked="" type="checkbox"/>
RODILLO LISO VIBRATORIO	Rodillo liso vibratorio	248	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTACIÓN TOTAL (1)	Estación total Trimble M3 (1)	248	<input checked="" type="checkbox"/>
CONCRETERA 1 SACO (2)	Concretera 1 saco (2)	248	<input checked="" type="checkbox"/>
	Herramienta menor	248	<input checked="" type="checkbox"/>

- INFORME DEL PERSONAL TÉCNICO POR PARTE DEL CONSULTOR

NOMBRE	CEDULA	CARGO	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIONES
Guacho Guacho Juan Manuel	0604955575	Fiscalizador-director de Fiscalización	23-agos-2022	-----	AFILIADO
Pucha Amancha Álvaro Vladimir	060455108	Residente de Fiscalización	23-agos-2022	-----	AFILIADO
Diaz Villarruel Alex Gary	1600655862	Residente de Fiscalización-Ambiental	23-agos-2022	-----	AFILIADO
De La Torre	0604221515	Chofer	23-agos-2022	-----	AFILIADO

Henry Geovanny					
Alvarado Liliana	1600561060	Secretaria	23-agos-2022	-----	AFILIADO

- **ANÁLISIS DE RENDIMIENTO**

Rubros más incidentes del periodo.

DICIEMBRE 2022

No.	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	TIEMPO EMPLEADO		RENDIMIENTO HORAS	
				No DIAS	No HORAS	OFERTADO	EJECUTADO
18	Asfalto RC-250 para imprimación	L	10 484.22	31	8,00	0,001	0,0236
19	C. rodadura hormigón asf. mezclado en planta, e=2"	M2	82 558.79	31	8,00	0,005	0.0006

- **INCIDENCIAS CLIMATICAS PRODUCIDAS EN LA OBRA**

El efecto climático dentro del proyecto no ha sido incidente a excepción de aquellas precipitaciones que provocaron derrumbes, no han existido afectaciones críticas dentro del proyecto ni paralizaciones por este motivo, el clima lluvioso nos ha ayudado a detectar puntos importantes de escorrentía, afluentes y crecientes para de esta manera controlarlas evitando afectaciones futuras; el monitoreo de las mismas se lleva a través de una hoja de campo que tiene concordancia con el libro de obra misma que se muestra a continuación.

REGISTRO DE PRECIPITACIONES (DICIEMBRE 2022)				
"ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."				 JUAN GUACHO <small>INGENIERO CIVIL</small>
Día de la semana	Fecha	Mañana (M) Tarde (T) Noche (N)	Precipitación (Sí/No)	Observaciones
Primera Semana				
Jueves	1		NO	Soleado
Viernes	2		NO	Soleado
Sábado	3		NO	Soleado
Domingo	4		NO	Soleado
Segunda Semana				
Lunes	5		NO	Soleado
Martes	6		NO	Soleado
Miércoles	7		NO	Soleado
Jueves	8		NO	Soleado

Viernes	9		NO	Soleado
Sábado	10		NO	Soleado
Domingo	11		NO	Soleado
Tercera Semana				
Lunes	12		NO	Soleado
Martes	13		NO	Soleado
Miércoles	14		NO	Soleado
Jueves	15		NO	Soleado
Viernes	16		NO	Soleado
Sábado	17		NO	Soleado
Domingo	18		NO	Soleado
Cuarta Semana				
Lunes	19		NO	Soleado
Martes	20		NO	Soleado
Miércoles	21		NO	Soleado
Jueves	22		NO	Soleado
Viernes	23		NO	Soleado
Sábado	24		NO	Soleado
Domingo	25		NO	Soleado
Quinta Semana				
Lunes	26		NO	Soleado
Martes	27		NO	Soleado
Miércoles	28		SI	Lluvia
Jueves	29		NO	Soleado
Viernes	30		NO	Soleado
Sábado	31		NO	Soleado

- **DOCUMENTACION EMITIDA POR FISCALIZACION EXTERNA Y CONTRATISTA**

# DE OFICIO	ASUNTO	OBSERVACIONES
<i>OFICIO No ACB-036-2022</i>	<i>ENTREGA DE INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMINETO DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No5</i>	<i>EMITE CONTRATISTA A FISCALIZADOR.</i>
<i>OFICIO No 027-FIBO-JG-2022</i>	<i>ENTREGA DE CONFORMIDAD AMBIENTAL.</i>	<i>EMITE FISCALIZADOR A DIRECTOR DE FISCALIZACION.</i>
<i>OFICIO No ACB-038-2022</i>	<i>ENTREGA DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No5</i>	<i>EMITE CONTRATISTA A FISCALIZADOR.</i>

- **CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES**

Uno de los principales objetivos de la Fiscalización es el control de la calidad de los materiales que intervienen en los diferentes rubros, así como el cumplimiento de las especificaciones para la ejecución de los mismos.

- ENSAYOS Y PRUEBAS

En la presente planilla existen ensayos de compresión de cilindros de hormigón (ver anexo 1). Así como también ensayos de compresión y granulometría en el material de subbase y base granular de agregados.

13. MULTAS, SANCIONES Y SUSPENSIONES

- ✓ *En el periodo en mención no se han considerado multas.*

14. CONCLUSIONES

- ✓ *La Planilla de Avance de obra No 05 se aprueba por parte de fiscalización externa por un valor de \$162 884,12 (ciento sesenta y dos mil ochocientos ochenta y cuatro dólares con 12/100).*
- ✓ *En el periodo en ejecución se determina un avance de obra acumulado de 77.43%, en comparación con la programación inicial aprobada por el Administrador del Contrato y fiscalización, que para el presente periodo es del 69.59%, sobrepasando el porcentaje acumulado programado.*
- ✓ *La planilla de avance de obra No. 5 correspondiente al mes de diciembre, se encuentra verificada en campo, cumpliendo con los parámetros de calidad y cantidad de acuerdo a la planificación mensual aprobada, por lo que es pertinente continuar con el trámite respectivo.*
- ✓ *De acuerdo al oficio N. 008-V.A. BOBONAZA-2022, se notificó a fiscalización por parte del administrador de contrato, con fecha 27 de octubre la autorización de cambio de mina, donde empieza los trámites para la autorización de un contrato complementario. Por esta razón, en el presente periodo el rubro 12 material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada) y el rubro 15 transporte de material de mejoramiento y para poder cumplir con el objeto del contrato, estos rubros quedan como antecedente y los mismos serán pagados una vez el contrato complementario sea aprobado.*

15. RECOMENDACIONES

- ✓ *Es necesario realizar reuniones periódicas con el propósito de establecer metas a corto plazo y verificar los cumplimientos de los objetivos adquiridos entre las partes para que exista una mejor fluidez de la información concerniente al proyecto.*
- ✓ *Realizar la entrega de planillas mensuales durante los primeros 5 días de cada mes, para su respectivo análisis y aprobación.*

16. ANEXOS

✓ ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Se anexa las fotografías detalladas en cada frente de trabajo con el propósito de observar de una manera contundente el trabajo desarrollado en este periodo.

17. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME

NOMBRE: Ing. Juan Manuel Guacho

DIRECCIÓN DOMICILIO: La Primavera Calle Calpi 18 Ilapo

CIUDAD DOMICILIO: Riobamba

TELÉFONO- FAX: 032612003

CELULAR: 0999985643

CORREO ELECTRÓNICO: j.guacho@yahoo.com



Firma de Juan Manuel Guacho
JUAN MANUEL GUACHO
GUACHO

Firma: Ing. Juan Manuel Guacho.
FISCALIZADOR

ENSAYOS DE LABORATORIO


HORMIGONES



ENSAYO DE CILINDROS A LA COMPRESION

DATOS PROYECTO		DATOS MUESTRA	
SOLICITADO POR:	ING. JUMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ	NORMA:	ASTM C-39
FISCALIZACIÓN:	ING. JUAN MANUEL GUACHO		
PROYECTO:	ASFALTADO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA #+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 Km, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	f c	180 kg/cm ²
		FECHA DE ENTREGA:	ENERO 2023

CILINDRO No.	Cl.	No.	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD EN DIAS	IDENTIFICACION	CARGA (kg)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm ²)	RESISTENCIA (kg/cm ²)	f c	EFICIENCIA %	PROMEDIO
1				08-dic	7	CUNETAS	21498	15.2	181	129	180	72	
2				08-dic	7		22926	15.2	181	127	180	70	
3			01-dic-22	08-dic	7		22987	15.2	181	127	180	70	
4				29-dic	28	HORMICON	33164	15.2	181	183	180	102	
5				29-dic	28		32849	15.2	181	181	180	101	
6				29-dic	28		32768	15.2	181	181	180	100	

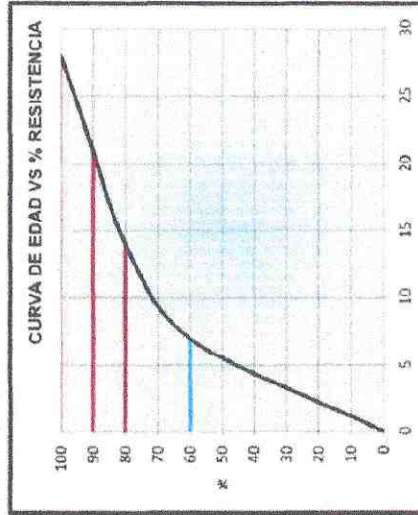

DIAS	EFICIENCIA (%)
7	60-70
14	80
21	90
28	100

OBSERVACIONES: Los matrices de hormigon son proporcionadas por el contratista

LABORATORIO DE CAMPO

LABSUEL - CONTROL OBRA CIVIL




ASROBADO POR
LABSUEL - LABORATORIO



ENSAYO DE CILINDROS A LA COMPRESION

DATOS PROYECTO		DATOS MUESTRA	
SOLICITADO POR:	ING. XIMEIA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ	NORMA:	ASTM C-39
FISCALIZACIÓN:	ING. JUAN MANUEL GUACHO		
PROYECTO:	ASFALTADO VÍA CABEZERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÉN ABSICISA 84000 HASTA ABSICISA 13+100 L=4.5 Cm., PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	f c	180 kg/cm2
		FECHA DE ENTREGA:	ENERO 2023

CILINDRO No.	CIA No.	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD DIAS	IDENTIFICACION	CARGA (kg)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm ²)	RESISTENCIA (kg/cm ²)	f c	EFICIENCIA %	PROMEDIO
1			09-dic	7	CUNETAS	25516	15.2	181	130	180	72	
2			09-dic	7		23402	15.2	181	129	180	72	
3			09-dic	7		23185	15.2	181	128	180	71	
1			02-dic-22	28	BORMIGON	32937	15.2	181	182	180	101	
2			30-dic	28		33074	15.2	181	182	180	101	
3			30-dic	28		33163	15.2	181	183	180	102	

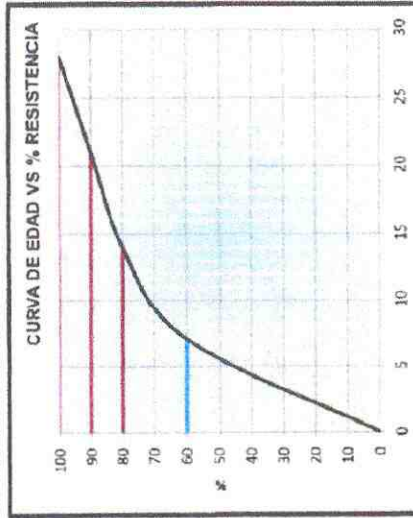

DIAS	EFICIENCIA (%)
7	60-70
14	80
21	90
28	100

OBSERVACIONES: Las muestras de bormigon son preparadas por el contratista

LABORATORIO DE CAMPO
LABSUEL - CONTROL OBRA CIVIL


APROBADO POR
LABSUEL - LABORATORIO



ENSAYO DE CILINDROS A LA COMPRESION

DATOS PROYECTO		DATOS MUESTRA	
SOLICITADO POR: ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ		NORMA: ASTM C-39	
FISCALIZACIÓN: ING. JUAN MANUEL GUACHO		Fc	180 kg/cm ²
PROYECTO: ASFALTADO VIA CABEZERAS DEL BOBOMAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 9+000 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 Km, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		FECHA DE ENTREGA:	ENERO 2023

CILINDRO No.	CIA No.	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD DIAS	IDENTIFICACION	CARGA (kg)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm ²)	RESISTENCIA (kg/cm ²)	Fc	EFICIENCIA %	PROBIDAD
1			10-dic	7	CUNETAS	23681	15.2	181	127	180	71	
2			10-dic	7		21172	15.2	181	128	180	71	
3			10-dic	7		21268	15.2	181	129	180	72	
1		03-dic-22	31-dic	28	BARRIGON	33679	15.2	181	182	180	101	
2			31-dic	28		32974	15.2	181	182	180	101	
3			31-dic	28		33166	15.2	181	183	180	102	

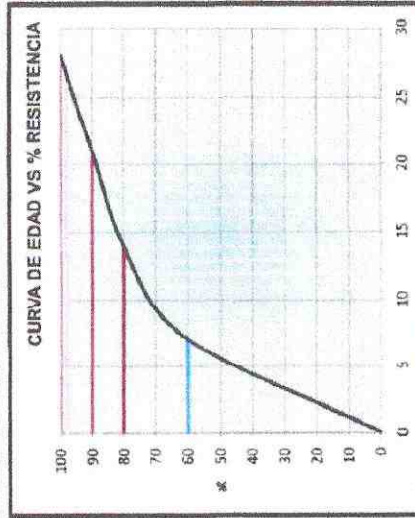

DIAS	EFICIENCIA (%)
7	60-70
14	80
21	90
28	100

OBSERVACIONES: Las muestras de formación son proporcionadas por el contratista



LABORATORIO DE CAMPO
LABSUEL - CONTROL OBRA CIVIL


APROBADO POR
[Firma]
LABSUEL - LABORATORIO



ENSAYO DE CILINDROS A LA COMPRESION

DATOS PROYECTO		DATOS MUESTRA	
SOLICITADO POR:	ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ	NORMA:	ASTM C-39
FISCALIZACIÓN:	ING. JUAN MANUEL GUACHO	f'c	180 kg/cm ²
PROYECTO:	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULJIN (ABSCISA 8+800 HASTA ABSCISA 13+100) L+4.5 Km., PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	FECHA DE ENTREGA:	ENERO 2023

CILINDRO N°	CIA N°	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD DIAS	IDENTIFICACION	CARGA (kg)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm ²)	RESISTENCIA (kg/cm ²)	f'c	EFICIENCIA %	PROMEDIO
1			11-dic	7	CUNETAS	2795	15.2	181	127	180	70	
2			11-dic	7		2174	15.2	181	128	180	71	
3			11-dic	7		2274	15.2	181	128	180	71	
1		04-dic-22	01-ene	28	DERMIGON	3175	15.2	181	183	180	102	
2			01-ene	28		3098	15.2	181	182	180	101	
3			01-ene	28		3261	15.2	181	182	180	102	

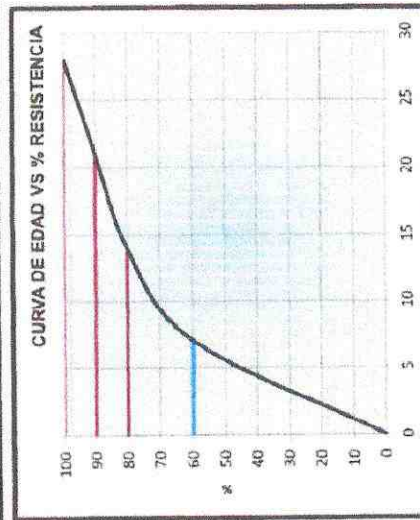

DIAS	EFICIENCIA (%)
7	60-70
14	80
21	90
28	100

OBSERVACIONES: Las muestras de hormigón son representativas de el camiónista

LABORATORIO DE CAMPO
LABSUEL - CONTROL OBRA CIVIL


APROBADO POR
LABSUEL - LABORATORIO



ENSAYO DE CILINDROS A LA COMPRESION

DATOS PROYECTO		DATOS MUESTRA	
SOLICITADO POR:	ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ	NORMA:	ASTM C-39
FISCALIZACIÓN:	ING. JUAN MANUEL GUACHO		
PROYECTO:	ASFALTADO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 Km, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	f/c	180 kg/cm ²
		FECHA DE ENTREGA:	ENERO 2023

CILINDRO No.	CIA No.	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD DIAS	DISTRIBUCIÓN	CARGA (kg)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm ²)	RESISTENCIA (kg/cm ²)	f _c	EFICIENCIA %	PROMEDIO
1			12-dic	7	CUNETAS	29888	15.2	181	127	180	71	
2			12-dic	7		29000	15.2	181	127	180	70	
3			12-dic	7		29175	15.2	181	128	180	71	
1		05-dic-22	02-ene	28	HERMIGON	31162	15.2	181	183	180	102	
2			02-ene	28		31266	15.2	181	183	180	102	
3			02-ene	28		31300	15.2	181	184	180	102	

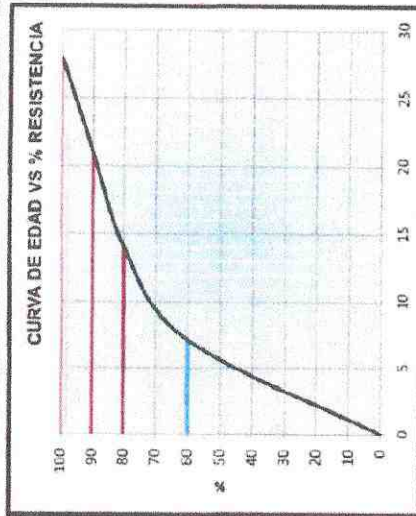

DIAS	EFICIENCIA (%)
7	69-70
14	80
21	90
28	100

Observaciones: Los muestreos de hormigón son proporcionalmente por el contratista



LABORATORIO DE CAMPO
LABSUEL - CONTROL OBRA CIVIL

APROBADO POR
INGENIERO TÉCNICO
LABSUEL - LABORATORIO

SUBBASE CLASE 3



LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGONES
DENSIDADES DE CAMPO METODO DENSIMETRO NUCLEAR

DATOS PROYECTO		DATOS MUESTRA	
SOLICITADO POR:	ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ	NORMA:	ASTM D 2922- ASTM D 2959
FISCALIZACIÓN:	ING. JUAN MANUEL GUACHO	MUESTRA:	MATERIAL SUB - BASE CLASE 3
PROYECTO:	ASFALTADO VI CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+460 HASTA ABSCISA (13+196) L=4,5 Km. PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	EQUIPO:	TROXLER 3430
		FECHA DE ENSAYO:	DICIEMBRE 2022
		FECHA DE ENTREGA:	DICIEMBRE 2022

DETALLE:	RELLENO CON MATERIAL DE SUB-BASE CLASE 3
CAPA:	MATERIAL DE SUB - BASE CALSE 3
ENSAYO PROCTOR:	Modificado
Tipo:	C
Densidad Máxima (kg/m ³) =	2120
Humedad óptima (%) =	7.6

FECHA DE ENSAYO	09/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
ENSAYO No.	1	2	3	4	5	6
ABSCISA	4+400	4+100	4+200	4+300	4+400	4+500
CAPA	SUB-BASE	SUB-BASE	SUB-BASE	SUB-BASE	SUB-BASE	SUB-BASE
Profundidad prueba (cm)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Humedad (%)	5.30	4.20	4.80	5.40	5.60	4.90
Densidad Humeda (kg/m ³)	2236	2227	2249	2231	2238	2231
Densidad Seca (kg/m ³)	2123	2137	2146	2117	2119	2127
Densidad Mlar Proctor (kg/m ³)	2120	2120	2120	2120	2120	2120
Humedad Óptima (%)	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60
(%) DE COMPACTACION	100	101	101	100	100	100

OBSERVACIONES:

LABORATORIO DE CAMPO
LABSUEL - CONTROL OBRA CIVIL



APROBADO POR
GERENTE TÉCNICO
LABSUEL - LABORATORIO

BASE GRANULAR



LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGONES
DENSIDADES DE CAMPO METODO DENSIMETRO NUCLEAR

DATOS PROYECTO		DATOS MUESTRA	
SOLICITADO POR:	ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ	NORMA:	ASTM D 2922 - ASTM D 2959
FISCALIZACIÓN:	ING. JUAN MANUEL GUANCHO	MUESTRA:	MATERIAL BASE CLASE 2
PROYECTO:	ASFALTADO VI CABECERAS DEL BOBOMAZA HASTA LA COMUNICACION TACULI (ABSCISA 8+60 HASTA ABSCISA 13+180) L=4.5 Km. PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	EQUIPO:	TROXLER 3430
		FECHA DE ENSAYO:	DICIEMBRE 2022
		FECHA DE ENTREGA:	DICIEMBRE 2022

DETALLE:	RELLENO CON MATERIAL DE BASE CLASE 2
CAPA:	MATERIAL DE BASE CLASE 2
ENSAYO PROCTOR:	Modificado
Tipo:	G
Densidad Máxima (Kg/m ³) =	2080
Humedad óptima (%) =	7.7

FECHA DE ENSAYO	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
ENSAYO No.	1	2	3	4	5	6
ABSCISA	4+100	4+100	4+200	4+300	4+400	4+500
CAPA	BASE	BASE	BASE	BASE	BASE	BASE
Profundidad prueba (cm)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Humedad (%)	5.30	5.80	5.20	4.80	5.50	6.20
Densidad (Kg/m ³)	2188	2192	2200	2169	2192	2204
Densidad Seca (Kg/m ³)	2076	2070	2091	2070	2078	2075
Densidad Max Proctor (Kg/m ³)	2080	2080	2080	2080	2080	2080
Humedad Óptima (%)	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70
(%) DE COMPACTACION	100	100	101	100	100	100

OBSERVACIONES:

LABORATORIO DE CAMPO

LABSUEL - CONTROL OBRA CIVIL




APROBADO POR
GERENTE TÉCNICO
LABSUEL - LABORATORIO

ASFALTO



DATOS DEL PROYECTO		DATOS MUESTRA	
PROYECTO:	ASFALTADO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L= 4,5 km, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
SOLICITADO POR:	ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑO	MUESTRA:	CARPETA ASFALTICA
UBICACIÓN:	PASTAZA		
FISCALIZADO POR:	ING. JUAN MANUEL GUACHO	FECHA DE ENSAYO:	17.DICIEMBRE.2022

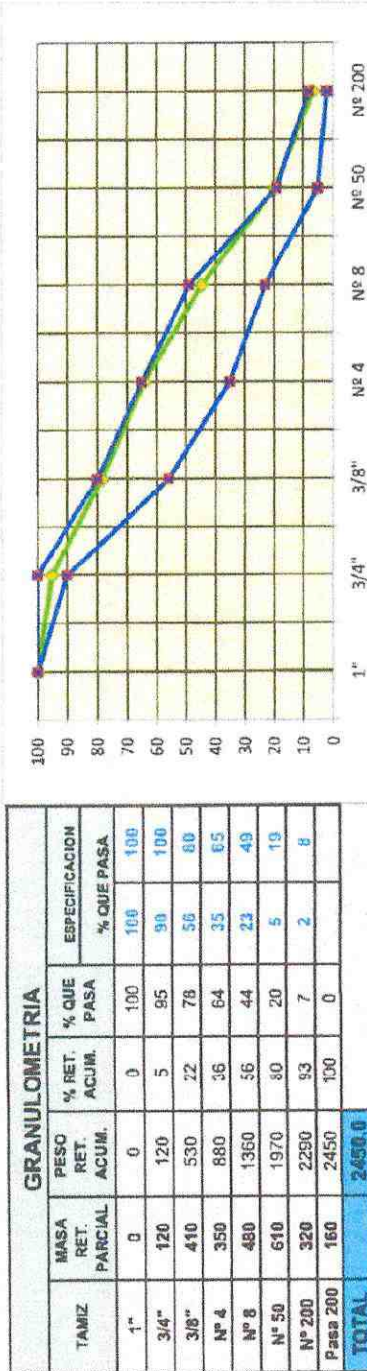

Nº	% C.A.		PESO MUESTRA		VOLUMEN		DENSIDAD		% EN VOLUMEN		FACTOR DE CORRECC.	ESTABILIDAD (lbs)		FLUJO 1/100
	AIRE	AGUA	S.S.S.	cc³	BULK	RICE	ASFALT	AGREG.	VACIOS	DIAL		Lb f		
1	1198	650	1200	540	2219						0.93	2218	2063	12
2	1200	668	1202	534	2247						0.96	2187	2100	13
3	1221	673	1223	550	2220						0.89	2283	2032	12
ESPECIFICACION:												2065	2032	12.33
												14.24	57.83	
												16.76	4.59	
												3-3	5-14	55-75
												> 1000	8-14	




LABS

LABSUEL - CONTROL OBRA CIVIL

Edgar Zabala
GERENTE TECNICO
LABSUEL - LABORATORIO



DATOS DEL PROYECTO		DATOS MUESTRA	
PROYECTO:	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L= 4,5 km, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
SOLICITADO POR:	ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑO MUESTRA:		CARPETA ASFALTICA
UBICACIÓN:	PASTAZA		
FISCALIZADO POR:	ING. JUAN MANUEL GUACHO	FECHA DE ENSAYO:	18.DICIEMBRE.2022

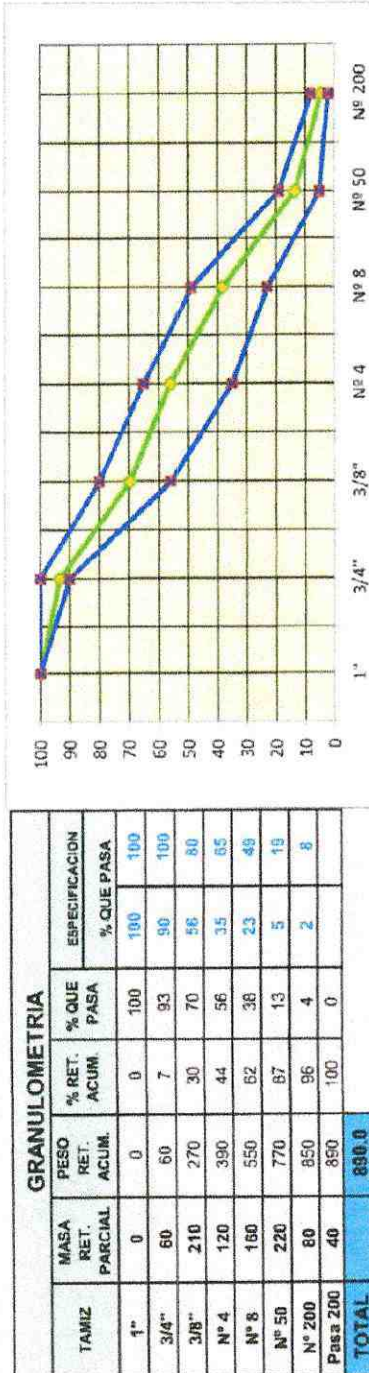

Nº	% C.A.	PESO MUESTRA		VOLUMEN cc ³	DENSIDAD	% EN VOLUMEN		V.A.M. %	V.F.A. %	FACTOR DE CORRECC.	ESTABILIDAD (lbs)		FLUJO 1/100				
		AIRE	AGUA			ASFALT	AGREG.				DIAL	Lb f					
1		1263	697	1265	2224					0.86	2552	2195	11				
2	6.08	1276	706	1278	2239					0.86	2696	2320	13				
3		1296	714	1300	2212					0.81	2849	2308	12				
											2274	12.00					
											9.65	85.60	4.75	14.40	67.00	> 1800	0 - 14
											3 - 5	> 14	69 - 75				
ESPECIFICACIÓN:																	




LABSUEL - LABORATORIO

LABSUEL - CONTROL OBRA CIVIL



DATOS DEL PROYECTO		DOS MUESTRA	
PROYECTO:	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L= 4,5 km, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
SOLICITADO POR:	ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ	MUESTRA:	CARPETA ASFALTICA
UBICACIÓN:	PASTAZA	FECHA DE ENSAYO:	19.DICIEMBRE.2022
FISCALIZADO POR:	ING. JUAN MANUEL GUACHO		

TAMIZ	MASA RET. PARCIAL	PESO RET. ACUM.	% RET. ACUM.	% QUE PASA	ESPECIFICACION	
					% QUE PASA	% QUE PASA
1"	0	0	0	100	100	100
3/4"	190	190	4	96	90	100
3/8"	1140	1330	27	73	56	80
Nº 4	840	2170	44	56	35	85
Nº 8	820	2990	61	39	23	49
Nº 50	1310	4300	87	13	5	19
Nº 200	450	4750	96	4	2	8
Pasa 200	190	4940	100	0		
TOTAL		4940.0				

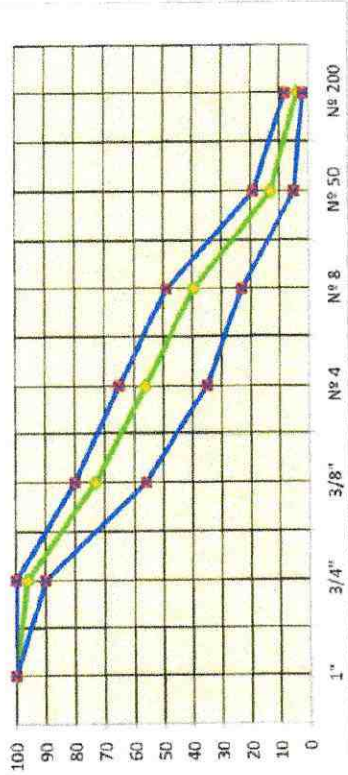

Nº	% C.A.	PESO MUESTRA			VOLUMEN cc ³	DENSIDAD		% ENVOLVIMEN			FACTOR DE CORRECC.	ESTABILIDAD (lbs)		FLUJO 1/100
		AIRE	AGUA	S.S.S.		BULK	RICE	ASFALT	AGREG.	VACIOS		DIAL	LD 1	
1		1230	680	1240	560	2196					0.86	2625	2258	12
2	6.09	1330	710	1310	600	2217					0.78	2856	2228	13
3		1230	680	1234	544	2261					0.93	2373	2207	11
ESPECIFICACIÓN:												2231	12.00	
												9.65	85.80	
												4.75	14.40	
												67.00	67.00	
												3 - 5	> 14	
												65 - 75	6 - 14	




Eduardo
GERENTE TÉCNICO
LABSUEL - LABORATORIO

JM
LABSUEL - CONTROL OBRA CIVIL



DATOS DEL PROYECTO		LOS MUESTRA	
PROYECTO:	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L= 4.5 km, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
SOLICITADO POR:	ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ	MUESTRA:	CARPETA ASFALTICA
UBICACIÓN:	PASTAZA		
FISCALIZADO POR:	ING. JUAN MANUEL GUACHO	FECHA DE ENSAYO:	20.DICIEMBRE.2022

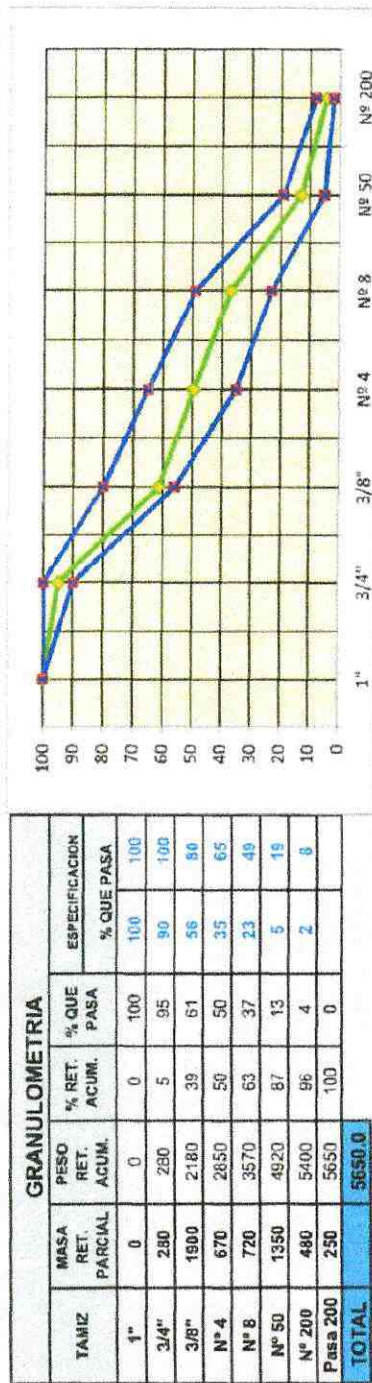

Nº	% C.A.	PESO MUESTRA		VOLUM. cc	DENSIDAD	% EN VOLUMEN		V.A.M. %	V.F.A. %	FACTOR DE CORRECC.	ESTABILIDAD (lbs)		FLUJO 1/100
		AIRE	AGUA			ASFALT	AGREG. VACIOS				DIAL	Lb 1	
1		1154	632	524	2202					0.96	2462	2364	10
2	6.09	1167	648	521	2240					1.00	2511	2511	13
3		1173	652	523	2243					0.96	2537	2436	11
					2228	2336	9.66	85.72	4.62	14.28	67.62	2437	11.33
					ESPECIFICACIÓN:		3 - 5	> 14	65 - 75			> 1800	8 - 14




LABSUEL - CONTROL OBRA CIVIL

LABSUEL - LABORATORIC



DATOS DEL PROYECTO		DATOS MUESTRA	
PROYECTO: ASFALTADO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L= 4,5 km, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		FECHA DE ENSAYO: 21.DICIEMBRE.2022	
SOLICITADO POR: ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ		MUESTRA: CARPETA ASFALTICA	
UBICACIÓN: PASTAZA			
FISCALIZADO POR: ING. JUAN MANUEL GUACHO			

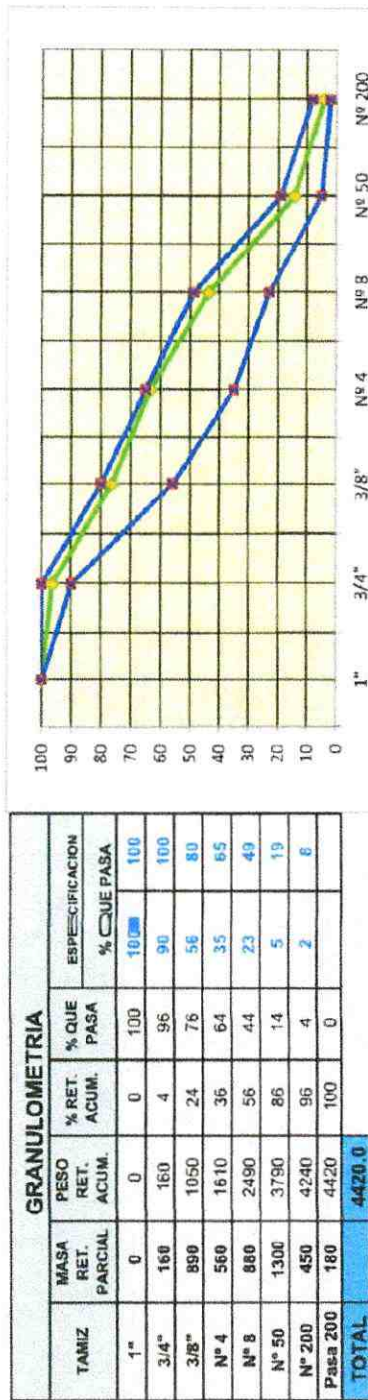

Nº	% C.A.	PESO MUESTRA			VOLU. M. cc	DENSIDAD		% EN VOLUMEN			FACTOR DE CORRECC.	ESTABILIDAD (lbs)		FLUJO 1/100
		AIRE	AGUA	S.S.S.		BULK	RICE	ASFALT	AGREG.	VACIOS		V.A.M. %	V.F.A. %	
1		1134	630	1136	50ES	2241					1.04	2318	2411	10
2	6.09	1142	633	1144	51M	2235					1.00	2365	2365	13
3		1150	637	1152	51ES	2233					1.00	2657	2657	11
						2236	2336	9.89	86.03	4.28	13.97	69.36	2478	11.33
					ESPECIFICACION:			3 - 5	> 14	65 - 75		> 1800	8 - 14	


Eduardo
 GERENTE TECNICO
 LABSUEL - LABORATORIC



U.S.
 LABSUEL - CONTROL OBRA CIVIL



DATOS DEL PROYECTO		DATOS MUESTRA	
PROYECTO:	ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L= 4,5 km, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
SOLICITADO POR:	ING. XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ	MUESTRA:	CARPETA ASFALTICA
UBICACIÓN:	PASTAZA		
FISCALIZADO POR:	ING. JUAN MANUEL GUACHO	FECHA DE ENSAYO:	22.DICIEMBRE.2022

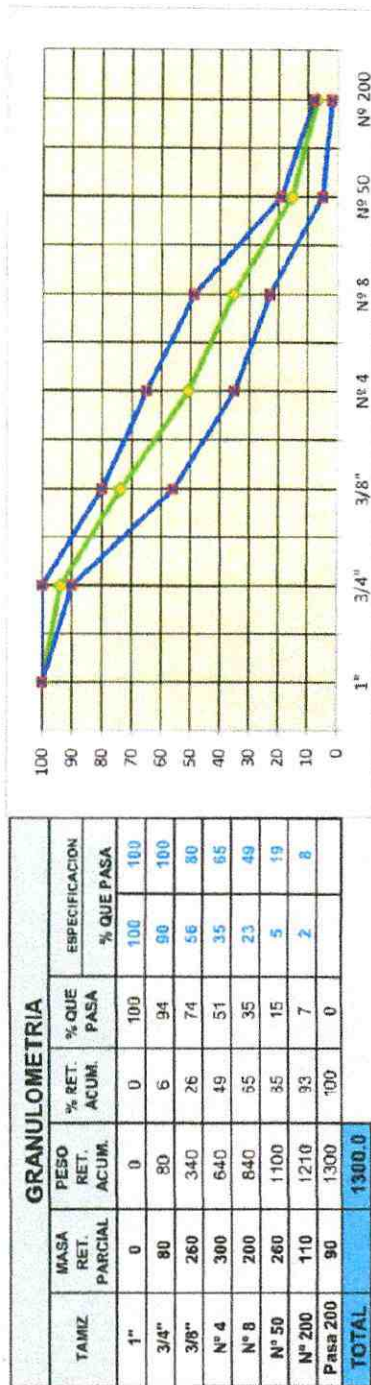

Nº	PESO MUESTRA		VOLUMEN	DENSIDAD	% EN VOLUMEN			FACT. DE CORRECC.	ESTABILIDAD (lbs)		FLUJO 1/100	
	AIRE	AGUA			S.S.S.	BULK	RICE		ASFALT	AGREG.		VACIOS
1	1160	655	1163	2283				1.04	2660	2798	11	
2	1180	631	1182	2142				0.89	2832	2520	10	
3	1193	668	1195	2264				0.96	2768	2676	13	
				2230	2336	9.67	85.79	4.54	14.21	68.07	2665	11.33
				ESPECIFICACION:			3 - 5	> 14	65 - 75	> 1600	8 - 14	



Eduardo
GERENTE TECNICO

LABSUEL - LABORATORIO

UD

LABSUEL - CONTROL OBRA CIVIL

CONFORMIDAD AMBIENTAL



JUAN GUACHO
INGENIERO CIVIL



INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE FISCALIZACIÓN EXTERNA



Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

PROYECTO: ““ASFALTADO VÍAL CABECERAS
DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD
TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA
13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ,
CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.””

PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PASTAZA-ECUADOR



ÍNDICE

1. ANTECEDENTES	2
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	4
3. OBJETIVOS	5
a. OBJETIVO GENERAL.....	5
b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
4. MARCO LEGAL APLICABLE.....	5
8. MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.....	10
9. ANÁLISIS A LA EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	13
10. CONCLUSIONES	14
11. RECOMENDACIONES.....	14
12. ANEXOS.....	14
ANEXO 1. CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE	15
ANEXO 2. PERMISO AMBIENTAL DEL PROYECTO.....	17
ANEXO 3. SEÑALÉTICA.....	18
ANEXO 4. ÁREA PARA EL ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE DESECHOS Y/O RESIDUOS COMUNES	19
ANEXO 5. ZONIFICACIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS	20
ANEXO 6 ENTREGA Y USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.....	21
ANEXO 7. VÍAS DESPEJADAS.....	24
ANEXO 8. CERTIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y/O MAQUINARIA Y EQUIPOS. .25	
ANEXO 9. INFORME DE NO EXISTIR INCIDENTES EN EL PROYECTO	28
ANEXO 10. EXTINTORES	31
ANEXO 11. BOTIQUÍN	32
ANEXO 12. LIMPIEZA DE ÁREAS	33
ANEXO 13. CHECK LIST DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	34
ANEXO 14. OFICIO DE APROBACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EMITIDO POR EL MAATE	35
ANEXO 15. INFORME DE ACCIDENTES DE FISCALIZACION EXTERNA	37



1. ANTECEDENTES

Con fecha veinte y cinco (25) de julio del año dos mil veinte y dos, se suscribe el Contrato entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, representado legalmente por el Ingeniero, Jaime Patricio Guevara Blaschke, Prefecto Provincial y el Ing. Juan Manuel Guacho Guacho, para la “FISCALIZACION EXTERNA PARA EL ASFALTADO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD DE TACULIN ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100 L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA”; por un monto de USD \$48.891,62 (CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 62/100) dólares de los Estados Unidos de América; sin incluir IVA, con un plazo de ciento ochenta (180) días, contados desde la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible. Se otorgará un anticipo de 40%, previo a la presentación de las garantías establecidas en la LOSNCP, y con una forma de pago por planilla de 60%, pago contra presentación de planillas mensuales (30 días), debidamente aprobadas y autorizadas por el administrador del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del contrato.

El GAD Provincial de la provincia de Pastaza, en cumplimiento con su compromiso con la ciudadanía de toda la geografía política-administrativa, y en su afán de cumplir con el progreso de la provincia y de sus áreas de investigación y servicios, ha procedido a celebrar el contrato entre El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza y la contratista Ing. Ximena Yerovi para el “ASFALTADO VIAL CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.”, firmado a los treinta días del mes de junio del año 2022. El proyecto comprende el asfaltado vial Cabeceras del Bobonaza hasta la comunidad del Taculín, parroquia Veracruz, cantón Pastaza, provincia de Pastaza, tramo que permite la conectividad a comunidades de esta parroquia y beneficia indirectamente a otras. En cumplimiento con la legislación ambiental, las actividades que se realizan en el proyecto deben enmarcarse en las buenas prácticas ambientales, de acuerdo con lo PROYECTO: “ASFALTADO VIAL CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.” dictado en sus normas y la responsabilidad institucional y compromisos asumidos por parte del contratista en el presente proyecto.

Con base al informe técnico N. 029-2022-CV-UCA-OTP-DZ3-MAAE remitido mediante memorando Nro. MAAE-OTPA-DZ3-2022-0210-M de fecha 16 de marzo de 2022, determina aprobar el Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto: Construcción del proyecto:



Asfaltado de la vía desde el Calvario a la comunidad de Taculín, periodo julio 2016 – julio 2018. Por lo tanto, desde este periodo se trabajará y calificará las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental actualizado (Ver anexo 14).

Bajo estos antecedentes y en cumplimiento con la normativa ambiental se procede a realizar el primer informe ambiental de cumplimiento, correspondiente al periodo 23 de agosto de 2022 al 31 de agosto de 2022, el cual se hace la entrega de este, mediante oficio No. ACB-007-2022 con fecha 28 de agosto de 2022 para la revisión respectiva por parte de fiscalización externa, en el cual con oficio N. 004-FIBO-JG-2022 con fecha 01 de septiembre de 2022 fiscalización externa remite la conformidad ambiental aprobada del informe No. 1 al GADPPz.

Se procede a realizar el segundo informe ambiental de cumplimiento, correspondiente al periodo 01 de septiembre de 2022 al 30 de septiembre de 2022, el cual se hace la entrega de este, mediante oficio No. ACB- 020-2022 con fecha 26 de septiembre de 2022 para la revisión respectiva por parte de fiscalización externa, en el cual con oficio N. 012-FIBO-JG-2022 con fecha 04 de octubre de 2022 fiscalización externa remite la conformidad ambiental aprobada del informe No. 2 al GADPPz

Se procede a realizar el tercer informe ambiental de cumplimiento, correspondiente al periodo 01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022, el cual se hace la entrega de este, mediante oficio No. ACB-027-2022 con fecha 26 de octubre de 2022 para la revisión respectiva por parte de fiscalización externa, en el cual con oficio N. 018-FIBO-JG-2022 con fecha 01 de noviembre de 2022 fiscalización externa remite la conformidad ambiental aprobada del informe No. 3 al GADPPz.

Se procede a realizar el cuarto informe ambiental de cumplimiento, correspondiente al periodo 01 de noviembre de 2022 al 30 de noviembre de 2022, el cual se hace la entrega de este, mediante oficio No. ACB- 024-2022 con fecha 26 de noviembre de 2022 para la revisión respectiva por parte de fiscalización externa, en el cual con oficio N. 024-FIBO-JG-2022 con fecha 05 de diciembre de 2022 fiscalización externa remite la conformidad ambiental aprobada del informe No. 4 al GADPPz

Se procede a realizar el quinto informe ambiental de cumplimiento, correspondiente al periodo 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022, el cual se hace la entrega de este, mediante oficio No. ACB- 036-2022 con fecha 29 de diciembre de 2022 para la revisión respectiva por parte de fiscalización externa, en el cual con oficio N. 027-FIBO-JG-2023 con fecha 04 de enero de 2023 fiscalización externa remite la conformidad ambiental aprobada del informe No. 5 al GADPPz



2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"ASFALTADO VIAL CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."							
UBICACIÓN:	PASTAZA-VERACURZ-TACULIN							
CATERGORIA	FICHA AMBIENTAL							
CODIGO	MAAE-DPP-2010-0263							
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL INFORME:	Desde			-	Hasta			quinto informe ambiental de cumplimiento
	01	12	2022		31	12	2022	
	D	M	A		D	M	A	
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:	Construcción.							
FISCALIZADOR EXTERNO:	ING. JUAN GUACHO							
CONTRATISTA:	ING. XIMENA YEROVI							
PORCENTAJE DE AVANCE	65% APROXIMADO							
RESPONSABLES:								
NOMBRES	PROFESION	CARGO						
ING. JUAN GUACHO	Ingeniero Civil.	Fiscalizador externo		 Firmado digitalmente por: JUAN MANUEL GUACHO GUACHO				
ING. ALEX DIAZ	Ingeniero Ambiental.	Técnico Ambiental de Fiscalización externa		 Firmado digitalmente por: ALEX GARY DIAZ				



3. OBJETIVOS

Para la realización del presente Informe el proponente ha establecido los siguientes objetivos con la finalidad de proceder conforme a la Normativa Ambiental vigente.

a. OBJETIVO GENERAL

- Cumplir con las medidas ambientales establecidas en el plan de manejo para el proyecto “ASFALTADO VIAL CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.”

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar y verificar si las actividades cumplen con el plan de manejo ambiental, autorizaciones administrativas, legislación y normativa ambiental vigente.
- Verificar, revisar y aprobar el informe ambiental de cumplimiento emitido por parte del contratista

4. MARCO LEGAL APLICABLE

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
2. El Estado garantizará la participación y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.

CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 983 DE 12 ABRIL DE 2017

Art. 10.- De la responsabilidad ambiental. El Estado, las personas naturales y jurídicas, así como las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, tendrán la obligación jurídica de responder



por los daños o impactos ambientales que hayan causado, de conformidad con las normas y los principios ambientales establecidos en este Código.

ACUERDO MINISTERIAL 061 R. O 316 DEL 04-05-2015

Art. 14.- De la regularización del proyecto, obra o actividad. - Los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental.

Art. 49.- Políticas generales de la gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales. - Se establecen como políticas generales para la gestión integral de estos residuos y/o desechos y son de obligatorio cumplimiento tanto para las instituciones del Estado, en sus distintos niveles de gobierno.

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN-ISO 3864-1:2013

Símbolos gráficos. Colores de seguridad y señales de seguridad. Parte 1: principios de diseño para señales de seguridad e indicaciones de seguridad.

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2841 2014-03

Gestión ambiental. Estandarización de colores para recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.

Expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 2393 y publicado en el Registro Oficial # 565 del 17 de noviembre de 1986.

Las disposiciones de este Reglamento se aplican a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del ambiente laboral.

Art. 76.- ROPA DE TRABAJO.

Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado riesgo de accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucia, deberá utilizarse ropa de trabajo adecuada que será suministrada por el empresario.

5. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



Conformidad (C): Calificación que se da a toda actividad, instalación o práctica que se ha realizado o se encuentra dentro de las restricciones, parámetros o especificaciones expuestas en el Plan de Manejo Ambiental y leyes aplicables

No Conformidad (NC): Calificación que se da a toda actividad, instalación o práctica que no se ha realizado o se encuentra dentro de las restricciones, parámetros o especificaciones expuestas en el Plan de Manejo Ambiental y/o normativa aplicable al parámetro evaluado

- No conformidad menor (NC-): Calificación que implica una falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios:

- Fácil corrección o remediación
- Rápida corrección o remediación
- Bajo costo de corrección o remediación
- Evento de Magnitud Pequeña, Extensión puntual, Poco Riesgo
- Impactos menores, sean directos y/o indirectos.

- No conformidad mayor (NC+): Calificación que implica una falta grave frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificación de NC+ puede ser aplicada también cuando no se produzcan repeticiones periódicas de no conformidades menores.

Los criterios de calificación son los siguientes:

- Corrección o remediación de carácter difícil.
- Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y económicos.
- El evento es de magnitud moderada a grande
- Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales
- Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un problema menor (Greenleaf-Ambiental, 2011)

- No Aplica (NA): Calificación que se otorga cuando una medida del Plan de Manejo Ambiental o requisito de la normativa no guarda relación con las características del proyecto o su ejecución no corresponde al periodo de reporte.



6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR						
Artículo	Descripción	C	NC-	NC+	N/A	Observaciones
Art. 395	La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 2. El Estado garantizará la participación y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales	X				Se verifico y constato que el personal que opera en el proyecto ha recibido las capacitaciones en los temas de seguridad, salud y ambiente. Ver anexo 1
Art. 396	El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.	X				Se verifica que el proyecto opera con el permiso ambiental adecuado según su categoría, Ficha Ambiental. Ver anexo 2
CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 983 DE 12 ABRIL DE 2017						
Artículo	Descripción	C	NC-	NC+	N/A	Observaciones
Art. 10	De la responsabilidad ambiental. El Estado, las personas naturales y jurídicas, así como las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, tendrán la obligación jurídica de responder por los daños o impactos ambientales que hayan causado, de conformidad con las normas y los principios ambientales establecidos en este Código.	X				Se verifico y constato que el personal que opera en el proyecto ha recibido las capacitaciones en los temas de seguridad, salud y ambiente. Ver anexo 1
ACUERDO MINISTERIAL 061 R. O 316 DEL 04-05-2015						
Artículo	Descripción	C	NC-	NC+	N/A	Observaciones
Art. 14	De la regularización del proyecto, obra o actividad. - Los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental	X				Se verifica que el proyecto opera con el permiso ambiental adecuado según su categoría, Ficha Ambiental. Ver anexo 2
Art. 49	Políticas generales de la gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales. - Se establecen como políticas generales para la gestión integral de estos residuos y/o desechos y son de obligatorio cumplimiento tanto para las instituciones del Estado, en sus distintos niveles de gobierno	X				Se constato durante las inspecciones que dentro del proyecto existen tachos metálicos, coloreados y etiquetados según el residuo o desecho para clasificar. Los mismos se encuentran bajo cubierta. Ver anexo 4



NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN-ISO 3864-1:2013						
Artículo	Descripción	C	NC-	NC+	N/A	Observaciones
	ISO 3864-3, Símbolos gráficos- Colores de seguridad y señales de seguridad- Parte 3: Principios de diseño para símbolos gráficos utilizados en señales de seguridad.	X				Se constato durante las inspecciones que el proyecto opera con señalética, las cuales están ubicadas en a lo largo de la vía, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los transeúntes y trafico vehicular.
NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2841 2014-03						
Artículo	Descripción	C	NC-	NC+	N/A	Observaciones
	Objeto. Esta norma establece los colores para los recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos con el fin de fomentar la separación en la fuente de generación y la recolección selectiva	X				Se constato durante las inspecciones que dentro del proyecto existen tachos metálicos, coloreados y etiquetados según el residuo o desecho para clasificar. Los mismos se encuentran bajo cubierta. Ver anexo 4
DECRETO EJECUTIVO 2393 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO						
Artículo	Descripción	C	NC-	NC+	N/A	Observaciones
Art. 11	Literal h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde se llevará a cabo la referida capacitación se establecerán previo acuerdo de las partes interesadas.	X				Se verifico y constato que el personal que opera en el proyecto ha recibido las capacitaciones en los temas de seguridad, salud y ambiente. Ver anexo 1

7. SÍNTESIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL

Se realizo la evaluación a la Normativa Ambiental. Se han identificado un total de ocho (8) actividades. Con un nivel de cumplimiento para el mes de diciembre de 2022, de un 100% de Conformidades (Cumplimientos), un 0% se han establecidos como No Conformidades Mayores, un 0% se han establecidos como No Conformidades Menores y un 0 % de actividades que No Aplican, de acuerdo con la distribución que se muestra en el siguiente grafico estadístico

NORMATIVA AMBIENTAL	C	NC+	NC-	N/A
CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR	2	0	0	0
CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE. LEY 0 (REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO NO. 983 DE 12- ABR.-2017)	1	0	0	0
DECRETO EJECUTIVO 2393 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO	1	0	0	0
NORMAS TÉCNICAS ECUATORIANA NTE – ISO INEN 2841	1	0	0	0
NORMAS TÉCNICAS ECUATORIANA A NTE INEN 2841: 2014	1	0	0	0
ACUERDO MINISTERIAL 061 R. O 316 DEL 04-05-2015	2	0	0	0
TOTAL	8	0	0	0

Cuadro. Resumen de hallazgos del PMA, diciembre 2022 elaboración: Técnico Ambiental externo, 2022

EVALUACION A LA NORMATIVA AMBIENTAL

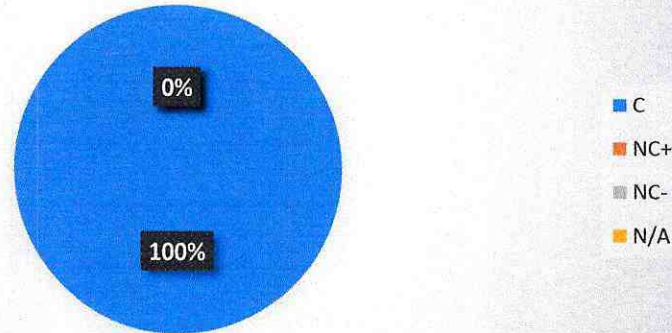


Grafico. Resumen de hallazgos del PMA, diciembre 2022 elaboración: Técnico Ambiental externo, 2022

8. MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

A continuación, se describe el detalle de las actividades relacionadas con el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS							
No	MEDIDA	CUMPLIMIENTO				HALLAZGO	MEDIO DE VERIFICACION
		C	NC-	NC+	N/A		
1	Zonificación de las áreas de trabajo.	X				Se verifico durante las inspecciones realizadas que todos los frentes de trabajos intervenidos en el proyecto son zonificados con cinta de peligro.	Anexo 5 -Zonificación de áreas
2	Controlar al personal del uso obligatorio del EPP.	X				Se verifica que el contratista ha dotado a todo el personal de EPPs adecuado, según el tipo de actividad que realizan dentro del proyecto.	Anexo 6 -Registro documental y fotográfico de entrega y uso de EPPs
3	Se indicará las medidas de seguridad durante la etapa de operación y mantenimiento del proyecto.	X				Se verifico y constato que el personal que opera en el proyecto ha recibido las capacitaciones en los temas de seguridad, salud y ambiente	Anexo 1 -Registro de asistencia y fotográfico
4	Se deberá colocar señalización de tipo preventivo e informativa dentro del área de influencia directa.	X				Se constato que a lo largo del proyecto se encuentra con señalización permanente.	Anexo 3 -Señalética
5	Colocar materiales y equipos en lugares adecuados. No obstruir las vías.	X				Se evidencia las vías libres de obstáculos.	Anexo 7 -Vías despejadas.
6	La barra rociadora del camión distribuidor de asfalto debe estar calibrado con la cantidad determinada de emulsión asfáltica y direccionado al área de aplicación.	X				Se verifica que no exista desperdicios y que los residuos causen impactos negativos al ambiente	
7	El mantenimiento rutinario de los vehículos y maquinaria se los realizarán en un lugar destinado para este fin, fuera del área del proyecto.	X				Se verifico que la maquinaria y vehículos pesados y livianos reciben mantenimiento preventivo y/o correctivo en talleres autorizados y privados, ubicados en zonas alejadas al proyecto.	Anexo 8 -Certificación de mantenimiento vehicular y/o maquinaria
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS							
No	MEDIDA	CUMPLIMIENTO				HALLAZGO	MEDIO DE VERIFICACION
		C	NC-	NC+	N/A		



1	Ubicación en áreas estratégicas contenedores provisionales para la recolección de cada tipo de desechos que se generen durante la construcción de la obra.	X				Se constato que dentro del proyecto existe un área para el almacenamiento temporal de los residuos y/o desechos comunes. La misma que cuenta con señalización y cubierta	Anexo 4 -Área para el almacenamiento temporal de desechos comunes
2	Delimitación y rotulación de áreas de disposición temporal de desechos y escombros.	X				Se evidencia que la escombrera existente en el proyecto está ubicada en un área libre de riesgo, sin embargo, ha sido delimitada con cinta preventiva.	Anexo 5 -Zonificación de áreas

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

No	MEDIDA	CUMPLIMIENTO				HALLAZGO	MEDIO DE VERIFICACION
		C	NC-	NC+	N/A		
1	Capacitación al personal sobre el cumplimiento del PMA, primeros auxilios y procedimientos en caso de emergencias.	X				Se verifico y constato que el personal que opera en el proyecto ha recibido las capacitaciones en los temas de seguridad, salud y ambiente. Las capacitaciones se las imparte a medida que los trabajadores ingresan al proyecto.	Anexo 1 -Registro de asistencia y fotográfico
2	Capacitación sobre Normativa Ambiental y/o Educación Ambiental.	X				Se verifico y constato que el personal que opera en el proyecto ha recibido las capacitaciones en los temas de seguridad, salud y ambiente. Las capacitaciones se las imparte a medida que los trabajadores ingresan al proyecto.	Anexo 1 -Registro de asistencia y fotográfico
3	Charlas al personal referente a control de riesgos laborales, prevención de accidentes, uso correcto del EPP.	X				Se verifico y constato que el personal que opera en el proyecto ha recibido las capacitaciones en los temas de seguridad, salud y ambiente. Las capacitaciones se las imparte a medida que los trabajadores ingresan al proyecto.	Anexo 1 -Registro de asistencia y fotográfico

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

No	MEDIDA	CUMPLIMIENTO				HALLAZGO	MEDIO DE VERIFICACION
		C	NC-	NC+	N/A		
1	Advertir a la población del área afectada, sobre los riesgos, peligros y precauciones que se deben tomar en el área de trabajo.	X				Se evidencia que se ha socializado con la población sobre los posibles riesgos producto de los trabajos realizados en el proyecto.	Anexo 1 -Registro fotográfico de capacitaciones (Socialización con la población).
2	Se realizará una socialización previa a la ejecución de los trabajos de operación y mantenimiento del proyecto.	X				Se verifico que previo a la ejecución de los trabajos en obra se convocó a la población con el objetivo de socializar diversos temas y despejar dudas o inquietudes.	Anexo 1 -Registro fotográfico de capacitaciones (Socialización con la población).
3	Advertir a la población del área afectada, sobre los riesgos, peligros y precauciones que se deben tomar en el área de trabajo.	X				Se evidencia que se ha socializado con la población sobre los posibles riesgos producto de los trabajos realizados en el proyecto.	Anexo 1 -Registro fotográfico de capacitaciones (Socialización con la población).

PLAN DE CONTINGENCIA

No	MEDIDA	CUMPLIMIENTO				HALLAZGO	MEDIO DE VERIFICACION
		C	NC-	NC+	N/A		
1	Colocación de señaléticas informativas, preventivas y reglamentarias en el área de influencia.	X				Se verifica que a lo largo del proyecto cuenta con señalética preventiva e informativa la cual se mantiene de manera permanente en lugares estratégicos.	Anexo 3 -Señalética



2	Cada vez que se presente un suceso inesperado en el área de influencia directa se deberá elaborar un informe de incidentes				X	Esta medida no aplica, sin embargo, que realiza informe de accidentes para constatar lo mencionado.	Anexo 9 -Informe de incidentes Anexo 15 Informe de accidentes de fiscalización externa
3	Aislamiento temporal de la zona de riesgo, zonas afectadas y/o en emergencias (de ser el caso)	X				Todos los frentes de trabajos intervenidos en el proyecto son zonificados con cinta de peligro.	Anexo 5 -Zonificación de áreas
4	Colocación de un extintor y botiquín de primeros auxilios en la maquinaria y/o vehículo que trabajan en la obra vial.	X				Se evidencia que dentro del proyecto existe un extintor recargado y un botiquín con insumos básicos de emergencia. De la misma manera a maquinaria y vehículos pesados disponen de extintores operativos y botiquines.	Anexo 10 -Extintor Anexo 11 -Botiquín

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

No	MEDIDA	CUMPLIMIENTO				HALLAZGO	MEDIO DE VERIFICACION
		C	NC-	NC+	N/A		
1	Se verificará el nivel de cumplimiento al PMA, a través de un informe ambiental de cumplimiento.	X				Mensualmente se entrega el Informe Ambiental de Cumplimiento con los medios de verificación documental y fotográfico.	

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS

No	MEDIDA	CUMPLIMIENTO				HALLAZGO	MEDIO DE VERIFICACION
		C	NC-	NC+	N/A		
1	Rehabilitación de las áreas establecidas como escombreras, de ser el caso.				X	Esta medida no aplica, una vez concluido los trabajos se establecerá medidas de rehabilitación en el caso de requerirlo	-----
2	Revegetación o reforestación de áreas degradadas en el proyecto de ser el caso.				X	Esta medida no aplica, una vez concluido los trabajos se establecerá medidas de rehabilitación en el caso de requerirlo	-----
3	Se deberá recoger todos los desechos sólidos, escombros generados por la actividad de operación y mantenimiento del proyecto	X				Se evidencia que durante y la terminación de trabajo se mantiene las áreas limpias.	Anexo 12 -Limpieza de áreas

PLAN DE ENTREGA Y ABANDONO DEL ÁREA

No	MEDIDA	CUMPLIMIENTO				HALLAZGO	MEDIO DE VERIFICACION
		C	NC-	NC+	N/A		
1	Retiro de maquinaria, equipo, materiales y desmantelamiento de las instalaciones temporales del área del proyecto				X	Esta medida no aplica, debido a que el proyecto se encuentra en la fase de construcción. Una vez concluida con la obra se cumplirá con dicha medida.	-----
2	Limpieza general del área del proyecto, recogiendo todo tipo de desechos				X	Esta medida no aplica, debido a que el proyecto se encuentra en la fase de construcción. Una vez concluida con la obra se cumplirá con dicha medida.	-----
3	Retiro de señalética temporal ubicada en las diferentes áreas durante la ejecución del proyecto				X	Esta medida no aplica, debido a que el proyecto se encuentra en la fase de construcción. Una vez concluida con la obra se cumplirá con dicha medida.	-----



9. ANÁLISIS A LA EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

ANÁLISIS AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					
PROGRAMA	NÚMERO DE MEDIDAS	CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES			
		C	NC-	NC+	N/A
Plan de Prevención y Mitigación de Impactos.	7	7	0	0	0
Plan de Manejo de Desechos Solidos	2	2	0	0	0
Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental	3	3	0	0	0
Plan de Relaciones Comunitarias	3	3	0	0	0
Plan de Contingencias	4	3	0	0	1
Plan de Monitoreo y Seguimiento	1	1	0	0	0
Plan de Rehabilitación de Áreas degradadas	3	1	0	0	2
Programa de Cierre, Abandono y Entrega del Área	3	0	0	0	3
TOTAL	26	20	0	0	6
PORCENTAJE	100%	77%	0%	0%	23%

Cuadro. Resumen de hallazgos del PMA, diciembre 2022 elaboración: Técnico Ambiental externo, 2022

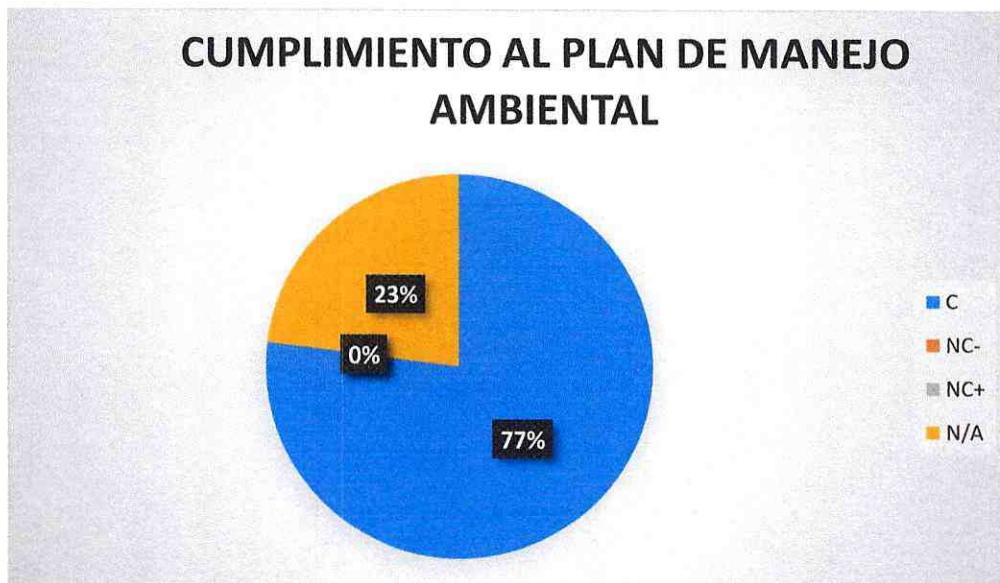


Grafico. Resumen de hallazgos del PMA, diciembre 2022 elaboración: Técnico Ambiental externo, 2022



10. CONCLUSIONES

- El plan de manejo ambiental tiene un porcentaje de 77% de cumplimiento y un 23% de medidas que no aplican en el proyecto porque no se encuentran acorde a las actividades, es importante mencionar que no existe ninguna medida que no se ha cumplido. Por lo tanto, el informe de cumplimiento ambiental emitido por parte del contratista es **APROBADO** por parte de la fiscalización externa contratado para el proyecto.
- Durante este periodo de evaluación no se ha ocurrido accidentes o incidentes dentro del proyecto.
- Durante la ejecución del proyecto se ha evidenciado de forma correcta la aplicación de cada medida establecida en el plan de manejo ambiental.
- durante este periodo se verifico que las actividades de colocación de la carpeta asfáltica en un tramo de la vía, se tomen las precauciones correspondientes como el uso de barrera de material adsorbente (arena y aserrín) kits antiderrames (salchicha adsorbente). Con el objetivo de no contaminar.
- Se verifico que durante este periodo no se genero desechos peligrosos sin embargo en el caso de que se genere, la empresa encargada de la colocación de la carpeta asfáltica se hará cargo debido a que cuentan con los permisos ambientales necesarios.

11. RECOMENDACIONES

- Seguir trabajando conjuntamente para el cumplimiento de plan de manejo ambiental junto con el equipo técnico del contratista, equipo técnico de fiscalización externa y la administración del contrato.
- Seguir cumpliendo de forma correcta las medidas establecidas en el plan de manejo ambiental.

12. ANEXOS



JUAN GUACHO
INGENIERO CIVIL

ANEXO 1. CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE



REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

Nombre Del Proyecto	"ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABCISA 13+100)= 4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, POVINIA PASTAZA."	
Fecha	Hora de Ingreso:	07:30 am
05-DICIEMBRE-2022	Hora de Salida:	08:15 am
Capacitadores	Ing. Enay Ibarra	
Temas tratados	PPA, PRIMEROS AUXILIOS, CASOS DE EMERGENCIAS, ASESORIA AMBIENTAL, RESCUE Y SOCORROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, USO DE EPPS	

No.	Nombres y Apellidos	Cedula	Cargo	Firma
	Mauricio Lopez	0803836905	Trabajador	
	Claudio Montero	0803836302	Trabajador	

CAPACITADOR

CONTRATISTA

"ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABCISA 13+100)= 4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, POVINIA PASTAZA."



Socialización con la comunidad en temas: Avance del proyecto, Plan de Manejo Ambiental y prevención de riesgos y peligro



JUAN GUACHO
INGENIERO CIVIL

ANEXO 2. PERMISO AMBIENTAL DEL PROYECTO

ANEXO 1

PERMISO AMBIENTAL



V. 2010

Via Pastaza F. 07 18
Dirección Provincial de Pastaza
Calle 1 de Octubre - Ecuador
Teléfono (07) 25 280001 / 2523000
www.gobnacional.gub.ec

Oficio No. MAE-DPP-2010-0263

Puyo, 07 de julio de 2010

Ingeniero
Darwin Fejjo
TÉCNICO AMBIENTAL
GOBIERNO PROVINCIAL PASTAZA
Presente.

En respuesta al Oficio N° 119-GPP-2010, del 30 de Abril de 2010, suscrito por el Ing. Darwin Fejjo Técnico Ambiental del Gobierno Provincial, en el cual remite a la Dirección Provincial de Pastaza del Ministerio del Ambiente, para análisis y pronunciamiento de la Ficha Ambiental del proyecto "ASFALTADO DE LA VÍA DESDE EL CALVARIO A LA COMUNIDAD DE TACULIN", al respecto comunico que luego de revisada la documentación y sobre la base del Informe Técnico 076-UCA-DPP, de 24 de Junio de 2010, se aprueba la Ficha Ambiental en mención. Se deberá notificar con anticipación el inicio de la actividades de trabajo en las obras a efectos de monitorear y dar cumplimiento del Plan Ambiental de la Ficha respectiva.

Atentamente,


Mario Vinicio Alvarez
Director Provincial de Pastaza





JUAN GUACHO
INGENIERO CIVIL

ANEXO 3. SEÑALÉTICA





JUAN GUACHO
INGENIERO CIVIL

ANEXO 4. ÁREA PARA EL ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE DESECHOS Y/O RESIDUOS COMUNES





ANEXO 5. ZONIFICACIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS







JUAN GUACHO
INGENIERO CIVIL

ANEXO 7. VÍAS DESPEJADAS





JUAN GUACHO
INGENIERO CIVIL

ANEXO 8. CERTIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y/O MAQUINARIA Y EQUIPOS.



MECÁNICA AUTOMOTRIZ

De: Aragón Álvarez Mauro Gustavo
RUC: 1600349425001
DIRECCIÓN: Puyo – Los Ángeles

Puyo, 21 de noviembre de 2022

CERTIFICADO

El suscrito Sr. Aragón Álvarez Mauro Gustavo, portadora de la cedula de identidad N. 160034942-5, propietario de la mecánica automotriz, a petición de la parte interesada.

CERTIFICA

Que, ha efectuado el mantenimiento de la excavadora de placas 7.1-12-000368, de propiedad del Srta. Ing. Ximena Alexandra Yerovi Muñoz, portadora de la C.C. 160078913-3 que fue revisada en el taller de esta mecánica, la misma que se encuentra en **BUEN ESTADO MECÁNICO**.

Es todo lo que puedo certificar en honor a la verdad, autorizo al interesado a hacer uso del presente documento en lo que estime conveniente, excepto para tramites judiciales.

Lo certifica,

Sr. Mauro Aragón
Propietario



MECÁNICA EN GENERAL

De: Robayo Dávila Ricardo Antonio

RUC N.1600342131001

Puyo, agosto 26 del 2022

CERTIFICADO

El Suscrito Sr. Ricardo Antonio Robayo Dávila, portador de la Cédula de Identidad N. 1600342131, propietario de Mecánica en General, a petición de la interesada,

CERTIFICA

QUE, la Volqueta de placa SAA-1157, de propiedad del Sr. SILVA MERINO CARLOS EDWIN, portador de la C.I. 1600283277, fue revisada en el taller de esta mecánica, la misma que se encuentra en **BUEN ESTADO MECÁNICO**.

DETALLE	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Agua del Radiador	BUEN ESTADO	
Nivel del aceite	BUEN ESTADO	
Mangueras de volteo	BUEN ESTADO	
Sistema de Dirección	BUEN ESTADO	
Paquetes delanteros y traseros	BUEN ESTADO	
Sistema de luces	BUEN ESTADO	
Neumáticos en buen estado	BUEN ESTADO	
Cinturones de Seguridad	BUEN ESTADO	
Pito de retro	BUEN ESTADO	
Sistema de frenos	BUEN ESTADO	
Parabris delantero	BUEN ESTADO	
Espejos	BUEN ESTADO	
Estinguidor	BUEN ESTADO	
Triángulos de Seguridad	BUEN ESTADO	
Lagartos para corriente	BUEN ESTADO	
Carrocería	BUEN ESTADO	
Asientos	BUEN ESTADO	

Es todo lo que puedo certificar en honor a la verdad, autorizando al interesado, hacer uso del presente documento en lo que estime conveniente, excepto para trámites judiciales.

Lo Certifica,



Ricardo Robayo
PROPIETARIO

=====
Dirección: Barrio-El Dorado Via Tarqui Celular: 0995658907

PUYO - PASTAZA - ECUADOR





MECÁNICA EN GENERAL

De: Robayo Dávila Ricardo Antonio
RUC N.1600342131001

Puyo, agosto 26 del 2022

CERTIFICADO

El Suscrito Sr. Ricardo Antonio Robayo Dávila, portador de la Cédula de Identidad N. 1600342131, propietario de Mecánica en General, a petición de la interesada,

CERTIFICA

QUE, la Volqueta de placa **SAA-1051**, de propiedad del Sr. CAJAMARCA MALUSIN LUIS ALFREDO, portador de la C.I. **1704426871**, fue revisada en el taller de esta mecánica, la misma que se encuentra en **BUEN ESTADO MECÁNICO**.

DETALLE	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Agua del Radiador	BUEN ESTADO	
Nivel del aceite	BUEN ESTADO	
Mangueras de volteo	BUEN ESTADO	
Sistema de Dirección	BUEN ESTADO	
Paquetes delanteros y traseros	BUEN ESTADO	
Sistema de luces	BUEN ESTADO	
Neumáticos en buen estado	BUEN ESTADO	
Cinturones de Seguridad	BUEN ESTADO	
Pito de retro	BUEN ESTADO	
Sistema de frenos	BUEN ESTADO	
Parabris delantero	BUEN ESTADO	
Especjos	BUEN ESTADO	
Estinguidor	BUEN ESTADO	
Triángulos de Seguridad	BUEN ESTADO	
Lagartos para corriente	BUEN ESTADO	
Carrocería	BUEN ESTADO	
Asientos	BUEN ESTADO	

Es todo lo que puedo certificar en honor a la verdad, autorizando al interesado, hacer uso del presente documento en lo que estime conveniente, excepto para trámites judiciales.

Lo Certifica,


Ricardo Robayo
PROPIETARIO

=====
Dirección: Barrio El Dorado Via Tarquí Celular: 0995658907

PUYO - PASTAZA - ECUADOR





JUAN GUACHO
INGENIERO CIVIL

ANEXO 9. INFORME DE NO EXISTIR INCIDENTES EN EL PROYECTO



INGENIERIA Y TRANSPORTACION

INFORME DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTES EN EL
PROYECTO: "ASFALTADO VIAL CABECERAS DEL
BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA
8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA
VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."



DICIEMBRE DE 2022



1. INTRODUCCIÓN

Documento diseñado con el propósito de informar sobre los incidentes y/o accidentes que puedan suscitarse dentro del proyecto: "ASFALTADO VIAL CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA." durante el manejo de cualquier evento que implique riesgo, peligro o situación de emergencia significativa. Durante el periodo de diciembre de 2022 se ha impartido a los trabajadores contenido que orienta a los visitantes sobre el protocolo de situaciones peligrosas. Las directrices han de ser informadas, explicadas y puestas en vigor de inmediato y cuantas veces sea necesario debido a las situaciones de emergencia que sean previstas, pronosticadas y que estén ocurriendo. Abarcando las siguientes situaciones: incendios e inundaciones.

2. Objetivo General:

- ✓ Informar y reportar a fiscalización externa sobre los incidentes y/o accidentes que puedan suscitarse dentro del proyecto: "ASFALTADO VIAL CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."

2.1. Objetivo Especifico:

- ✓ Proteger al personal operativo y/o administrativo y visitantes en caso de que ocurra cualquier emergencia de origen natural o antrópica.

3. Desarrollo

Durante el periodo de 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2022 se han adoptado diversas medidas de seguridad dentro del proyecto: "ASFALTADO VIAL CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA." Con el objetivo de precautelar la salud y seguridad de todo el personal que opera en el mismo.

Entre las medidas preventivas que se han ejecutado durante este periodo son las siguientes:

1. Capacitaciones en temas de seguridad, salud y ambiente dictadas a todo el personal que labora en el proyecto.
2. Implementación de señalética preventiva, informativa y prohibitiva.
3. Vías despejadas de material de construcción.
4. Zonificación de áreas peligrosas.
5. Dotación de equipo de protección personal a cada trabajador según la actividad a desarrollar.
6. Implementación de extintor operativo en la oficina, vehículos pesados y maquinaria que opera en el proyecto.



ANEXO 10. EXTINTORES





ANEXO 11. BOTIQUÍN





JUAN GUACHO
INGENIERO CIVIL

ANEXO 12. LIMPIEZA DE ÁREAS





JUAN GUACHO
INGENIERO CIVIL

INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE FISCALIZACIÓN EXTERNA

ANEXO 13. CHECK LIST DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE INFORME AMBIENTAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABCISA 13+100)= 4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PÓVINCIA PASTAZA."

Año: 01-DICIEMBRE-2022 / 31-DICIEMBRE-2022
Razón de CheckList: Verificación del cumplimiento de plan de manejo ambiental

No	Actividades	Meses											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	mayo	junio	julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Recarga de extintores												
2	Mantenimiento de equipos de trabajo												
3	Socialización con el barrio												✓
4	Capacitaciones												✓
5	Colocación de punto ecológico												✓
6	Entrega de equipo de protección personal												✓
7	Colocación de botiquín de primeros auxilios												✓
8	Entrega de desechos comunes o peligrosos												✓
9	Limpieza del área de trabajo												✓
10													✓

CI 1000784133

Firma Contratista

"ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABCISA 13+100)= 4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PÓVINCIA PASTAZA."



JUAN GUACHO
INGENIERO CIVIL

ANEXO 14. OFICIO DE APROBACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EMITIDO POR EL MAATE



Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica

Oficio Nro. MAATE-DZ3-2022-1182-O

Riobamba, 01 de abril de 2022

Asunto: Aprobación del Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto Construcción del proyecto Asfaltado de la Vía desde Calvario a la Comunidad de Taculín, periodo julio 2016 - julio 2018

Señor Ingeniero
Jaime Patricio Guevara Blaschke
En su Despacho

De mi consideración:

Con oficio Nro. GADPPZ-GESTION-AMBIENTAL-2021-0278-O de fecha 22 de abril de 2021 e ingresado a esta Dependencia como documento No. MAAE-UAA-DZ3-2021-1528-E de fecha 26 de abril de 2021, el GAD Provincial de Pastaza presenta la respuesta a las observaciones del cuarto Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto Asfaltado de la Vía desde Calvario a la Comunidad de Taculín, periodo julio 2016 - julio 2018.

Al respecto esta Cartera de Estado con base en el informe técnico No. 029-2022-CV-UCA-OTPA-DZ3-MAAE remitido mediante Memorando Nro. MAAE-OTPA-DZ3-2022-0210-M de fecha 16 de marzo de 2022, determina aprobar el Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto Construcción del proyecto Asfaltado de la Vía desde Calvario a la Comunidad de Taculín, periodo julio 2016 - julio 2018, ya que el documento cumple con los requisitos establecidos en la normativa ambiental vigente.

Se recuerda al Operador que deberá cumplir estrictamente con las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, Plan de Manejo Ambiental aprobado y normativa ambiental vigente.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Gavino Vargas Salazar
DIRECTOR ZONAL 3

Referencias:
- MAAE-UAA-DZ3-2021-1528-E



República
de Ecuador

Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica

Oficio Nro. MAATE-DZ3-2022-1182-O

Riobamba, 01 de abril de 2022

Copia:

Señoría Ingeniera
Cristina Priscila Vaca Villacis
Especialista en Calidad Ambiental Provincial I

Señor
Jonathan Jair Quispe Escobar
Auxiliar de mantenimiento

Señor Licenciado
Vicente Marcelino Robalino Altamirano
Analista Técnico del Centro de Atención Al Ciudadano 1

cpvv/eaasc/vmra



Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica
GAVINO
VARGAS

Dirección: C/14-51 y Bernardo Canguana frente a la Puerta de Emergencia del Hospital Policlínico
Código Postal: 060111 / Riobamba - Ecuador • Teléfono: (592 3) 296-0623
www.ambiente.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quijux

 Gobierno
del Encuentro | Juntos
lo logramos 2/2



ANEXO 15. INFORME DE ACCIDENTES DE FISCALIZACION EXTERNA

INFORME DE ACCIDENTES DE FISCALIZACION EXTERNA

INTRODUCCION

Informe diseñado para la verificación y control de incidentes y/o accidentes emitidos por parte del contratista del proyecto "ASFALTADO VIAL CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA." El cual se encuentra en ejecución y cumpliendo con todas las medidas ambientales y administrativas.

• Objetivo general

Verificar que no haya existido incidentes y/o accidentes dentro del proyecto "ASFALTADO VIAL CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."

• Objetivo específico

Verificar que se cumplen con las medidas de seguridad establecidas

DESARROLLO

Durante el periodo de 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2022 se verifica y se observa que se ha adoptado diversas medidas de seguridad dentro del proyecto:

"ASFALTADO VIAL CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA." Por parte del contratista, con el objetivo de precautelar la salud y seguridad de todo el personal que opera en el mismo. Las siguientes medidas son realizadas por parte del contratista para el proyecto en ejecución:

1. Capacitaciones en temas de seguridad, salud y ambiente dictadas a todo el personal que labora en el proyecto.
2. Implementación de señalética preventiva, informativa y prohibitiva.
3. Vías despejadas de material de construcción.
4. Zonificación de áreas peligrosas.
5. Dotación de equipo de protección personal a cada trabajador según la actividad a desarrollar.

6. Implementación de extintor operativo en la oficina, vehículos pesados y maquinaria que opera en el proyecto.
7. Implementación de botiquín con insumos básicos de emergencia en la oficina, vehículos pesados y maquinaria que opera en el proyecto.
8. Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos pesados y maquinaria que opera en el proyecto.
9. Dotación de maquinaria, equipos e insumos en buen estado.
10. Correcto manejo de los desechos comunes.
11. Instalaciones en buen estado.

Se verifica que todas las medidas plateadas se encuentran acorde lo que se mantiene en el proyecto.

CONCLUSIONES

Se verificó como fiscalización externa que durante el 01 de diciembre hasta 31 de diciembre de 2022 NO HA OCURRIDO INCIDENTES Y/O ACCIDENTES de ningún tipo dentro del proyecto "ASFALTADO VIAL CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."

ELABORADO POR:



ING. ALEX DIAZ

TECNICO AMBIENTAL DE FISCALIZACION EXTERNA



Fecha: 05 ENE 2023

Recibido: ERIS G.

Número: _____ Hora: 14:18



OFICIO: 027-FIBO-JG-2023

Puyo, 04 de enero de 2023

Ingeniero
Álvaro Sosa
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DEL GADPPz

Presente.

De mi consideración,

Reciba un atento y cordial saludo, a la vez desearle éxitos en las funciones a usted encomendadas, de la misma manera pongo en conocimiento que se adjunta el informe de cumplimiento ambiental del proyecto "ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.", perteneciente a la planilla de avance No. 05 para que se proceda con el trámite pertinente.

Verificado en territorio lo presentado en el informe ambiental de cumplimiento remitido por el contratista, fiscalización externa emite la **CONFORMIDAD AMBIENTAL**, correspondiente al periodo 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2022.

Por la atención prestada al presente anticipo mis más sinceros agradecimientos

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
JUAN MANUEL
GUACHO GUACHO

ING. JUAN MANUEL GUACHO

FISCALIZADOR

CORREO: jguacho68@gmail.com

TELÉFONO: 0999985643

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA



DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Pastaza

05 ENE 2023

Fecha:

Recibido: 125

Número: _____

Hora: 10:58

Copia: Ing. David Yedra - Director de Gestión Ambiental del GADPPz

Oficio ACB-036-2022

Puyo, 29 de diciembre de 2022

Ingeniero.

Juan Guacho

FISCALIZADOR EXTERNO

Proyecto: **ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.** Contrato: Coto-GADPPz 004-2022.

Presente;

Reciba un cordial y atento saludo, mediante la presente la Srta. Ing. Ximena Yerovi hace la entrega del Informe Ambiental de Cumplimiento correspondiente a la planilla #5 periodo 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022 del proyecto: **ASFALTADO VÍA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULÍN (ABSCISA 8+600 HASTA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.**

El informe fue realizado con base a las observaciones emitidas por el técnico ambiental de fiscalización, considerando los lineamientos indicados, siendo esta la primera versión a entregar para su respectiva revisión y aprobación.

Se encuentra adjunto el siguiente documento:

- o Informe Ambiental de Cumplimiento (digital)

De antemano anticipo mis agradecimientos por la atención prestada.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**XIMENA
ALEXANDRA
YEROVI MUÑOZ**

Ing. Ximena Yerovi Muñoz

CONTRATISTA

Correo: xym8alex@gmail.com


29/12/2022
Recibido

FACTURAS

FACTURAS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1660000170001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 001-010-000020395

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0712202207166000017000120010100000203951438919213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 07/12/2022 16:07:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0712202207166000017000120010100000203951

GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

Dirección Matriz: FCO. DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y Apellidos: YEROVI MUNOZ XIMENA ALEXANDRA
Identificac 1600789133001
Fecha 07/12/2022

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible	Impuesto	Porcentaje	Valor Retenido
FACTURA	00110000000008	06/12/2022	12/2022	17955.73	IVA	100.0	17955.73
FACTURA	00110000000008	06/12/2022	12/2022	149631.04	Impuesto a la Renta	1.75	2618.54

Información Adicional

Información Adicional

Agente de Retención: No. Resolución 590

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1691718359001

FACTURA

No. 002-011-000028761

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0212202201169171835900120020110000287613110921911

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 02/12/2022 10:55:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0212202201169171835900120020110000287613

ZODISPAS CIA LTDA

ZODISPAS CIA LTDA

Dirección PUYO, CESLAO MARIN SN Y
ALPAYACUDirección PUYO, CESLAO MARIN SN Y
ALPAYACU

OBLIGADO A LLEVAR SI

● Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y YEROVI XIMENA

Identificaci 1600789133001

Fecha 02/12/2022 Placa / null Guía
PUYO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
230000 2	230000 2	1.00	UNIDAD DE DVD WRITER INTERNO		29.02	0.00	0.00	0.00	29.02

Información Adicional	
Descripción:	VENTAS

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32.50

SUBTOTAL 12%	29.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29.02
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.48
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32.50

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0500960398001

FACTURA

No. 001-002-000591404

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0412202201050096039800120010020005914041234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/12/2022 22:17:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0412202201050096039800120010020005914041

VEGA OLMEDO NANCY DEL ROCIO

ESTACION DE SERVICIO LAS AMERICAS

Dirección KM 4 VIA TENA PUYO

Dirección KM 4 VIA TENA PUYO

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA

Identificación 1600789133

Fecha 04/12/2022 Placa / PCI3408 Guía N/D

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
0101		8.34	EXTRA		2.14	0.00	0.00	0.00	17.87

Información Adicional	
Vendedor:	RUTH ZALASAR

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.01

SUBTOTAL 12%	17.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.01

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

FERSAMAX SA

FERSAMAX

Dirección CRISTOBAL COLON S/N Y JUAN DE VELASCO

Dirección CRISTOBAL COLON SN Y JUAN DE VELASCO

OBLIGADO A LLEVAR SI



Agente de Retención Resolución 1

R.U.C.: 1691715279001

FACTURA

No. 001-100-000054030

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0512202201169171527900120011000000540300005403018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/12/2022 10:24:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0512202201169171527900120011000000540300

Razón Social / Nombres y YEROVI MUNOZ XIMENA ALEXANDRA

Identificaci 1600789133001

Fecha 05/12/2022 Placa / null Guía

JAVIER VARGAS Y FRANCISCO DE ORELLANA

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
		1.00	EXTENSION ELECTRICO 2X16 3MTS INCABLE BLANCO		3.91	0.00	0.00	0.00	3.91
		25.00	AMARRA PLASTICA T12 30CM. BLANCO DEXSON		0.06	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional	
AGENTERETENCION:	RESOLUCION No 1
CORREOELECTRONICO:	sincorreo@correo.com
CONTROL:	0801E0054030
REFERENCIA:	0,00
OBSERVACIONES:	SIN ASIGNAR CORREO
VENDEDOR:	00002 CASTILLO GUAMAN WILSON DA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.06

SUBTOTAL 12%	5.41
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.41
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.06

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

FERSAMAX SA

FERSAMAX

Dirección CRISTOBAL COLON S/N Y JUAN DE VELASCO

Dirección CRISTOBAL COLON SN Y JUAN DE VELASCO

OBLIGADO A LLEVAR SI



Agente de Retención Resolución 1

R.U.C.: 1691715279001

FACTURA

No. 001-100-000054030

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0512202201169171527900120011000000540300005403018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/12/2022 10:24:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0512202201169171527900120011000000540300

Razón Social / Nombres y YEROVI MUNOZ XIMENA ALEXANDRA

Identificaci 1600789133001

Fecha 05/12/2022 Placa / null Guía

JAVIER VARGAS Y FRANCISCO DE ORELLANA

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
		1.00	EXTENSION ELECTRICO 2X16 3MTS INCABLE BLANCO		3.91	0.00	0.00	0.00	3.91
		25.00	AMARRA PLASTICA T12 30CM. BLANCO DEXSON		0.06	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional	
AGENTERETENCION:	RESOLUCION No 1
CORREOELECTRONICO:	sincorreo@correo.com
CONTROL:	0801E0054030
REFERENCIA:	0,00
OBSERVACIONES:	SIN ASIGNAR CORREO
VENDEDOR:	00002 CASTILLO GUAMAN WILSON DA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.06

SUBTOTAL 12%	5.41
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.41
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.06

<p>AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando</p>

NO TIENE LOGO

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES
DE PASTAZA FacturaElectronicaEcuador.com

ESTACION DE SERVICIO DEL SINDICATO DE
CHOFERES DE PASTAZA

Dirección CESLAO MARIN 391 Y ATAHUALPA

Dirección AV. ALBERTO ZAMBRANO S/N

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

R.U.C.: 1690005642001

FACTURA

No. 002-005-002227613

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0512202201169000564200120020050022276130222761311

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/12/2022 06:06:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0512202201169000564200120020050022276130

Razón Social / Nombres y YEROVI MUNOZ XIMENA ALEXANDRA

Identificaci 1600789133001

Fecha 05/12/2022 Placa / PQJ0540 Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
0101	0101	0.83	EXTRA	GLS A22 035 - KATERINE OLIVES	2.14	1.00	3.14	0.00	1.78

Información Adicional

Correo: sinenviar
Despacho: 2022-12-05T06:06:43
Embarcacion: ninguna
Placas Adicionales: .NULL.

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

SUBTOTAL 12%	1.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1691715279001

FACTURA

No. 001-100-000053900

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

011220220116917152790012001100000053900005390016

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 01/12/2022 17:25:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0112202201169171527900120011000000539000

FERSAMAX SA

FERSAMAX

Dirección CRISTOBAL COLON S/N Y JUAN DE
VELASCODirección CRISTOBAL COLON SN Y JUAN DE
VELASCO

OBLIGADO A LLEVAR SI



Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y YEROVI MUNOZ XIMENA ALEXANDRA

Identificaci 1600789133001

Fecha 01/12/2022 Placa / null Guía

JAVIER VARGAS Y FRANCISCO DE ORELLANA

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
MF794 010		2.00	SIKA PLASTOCRETE 161-HE 10 KG		31.12	0.00	0.00	0.00	62.24
M00 400		5.00	GUANTE PUPOS NEOPRENO MASTER M		0.89	0.00	0.00	0.00	4.45
MF281 084		1.00	ESPUMA POLIURETANO ABRO 750 GRAMOS		7.98	0.00	0.00	0.00	7.98
MF516 360		3.00	DURATECHO 0.30 X 3.60 MTS		21.28	0.00	0.00	0.00	63.84
MF506 360		3.00	ZINC 3.60 MTS X 0.20 ACESCO		10.22	0.00	0.00	0.00	30.67
MF506 240		4.00	ZINC 2.40 MTS X 0.20 ACESCO		6.73	0.00	0.00	0.00	26.91
PE2202 00		50.00	TORNILLO AUTOPERFORANTE P/MADERA 12 X 2-1/2		0.11	0.00	0.00	0.00	5.65
HE400 284		1.00	COPA MAGNETICA 5/16 P/TALADRO ELITE JU05		1.01	0.00	0.00	0.00	1.01
MF420 303		1.00	CLAVO 3 C/CABEZA 75 X 3,80 25K IDEAL 188411		1.33	0.00	0.00	0.00	1.33

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
MF516360		2.00	DURATECHO 0.30 X 3.60 MTS		21.28	0.00	0.00	0.00	42.56
MF800200		1.00	SILICON TRANSPARENTE ABRO 1200 300ML(360G)		3.16	0.00	0.00	0.00	3.16
HE440005		1.00	PISTOLA P/SILICON INDUSTRIAL TOTAL THT21509		5.45	0.00	0.00	0.00	5.45
HE135130		1.00	DISCO CORTE METAL 4-1/2 X 1/16 X 7/8 ACERO NORTON BNA12		1.40	0.00	0.00	0.00	1.40
HE088015		1.00	BROCA HIERRO 5/32 ALEMANA		0.45	0.00	0.00	0.00	0.45
MF770050		20.00	REMACHE POP 5/32 X 1/2		0.02	0.00	0.00	0.00	0.31
MF193160		1.00	REMACHADORA CENTURY 4R30129		2.59	0.00	0.00	0.00	2.59
M70050		100.00	REMACHE POP 5/32 X 1/2		0.02	0.00	0.00	0.00	1.53
SE100008		1.00	CINTA PELIGRO AMARILLO 75 X 100MTS		3.25	0.00	0.00	0.00	3.25

Información Adicional	
AGENTERETENCION:	RESOLUCION No 1
CORREOELECTRONICO:	sincorreo@correo.com
CONTROL:	0801E0053900
REFERENCIA:	0.00
OBSERVACIONES:	SIN ASIGNAR CORREO
VENDEDOR:	00002 CASTILLO GUAMAN WILSON DA

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	296.54

SUBTOTAL 12%	264.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	264.77
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	31.77
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	296.54

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1691718359001

FACTURA

No. 002-011-000028761

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0212202201169171835900120020110000287613110921911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/12/2022 10:55:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0212202201169171835900120020110000287613

ZODISPAS CIA LTDA

ZODISPAS CIA LTDA

Dirección PUYO, CESLAO MARIN SN Y ALPAYACU

Dirección PUYO, CESLAO MARIN SN Y ALPAYACU

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y	YEROVI XIMENA			
Identificaci	1600789133001	Placa /	null	Guía
Fecha	02/12/2022	PUYO		

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
230000 2	230000 2	1.00	UNIDAD DE DVD WRITER INTERNO		29.02	0.00	0.00	0.00	29.02

Información Adicional	
Descripción:	VENTAS

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32.50

SUBTOTAL 12%	29.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29.02
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.48
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32.50

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1691718359001

FACTURA

No. 002-011-000028762

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0212202201169171835900120020110000287623110929711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/12/2022 11:05:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0212202201169171835900120020110000287623

ZODISPAS CIA LTDA

ZODISPAS CIA LTDA

Dirección PUYO, GESLAO MARIN SN Y ALPAYACU

Dirección PUYO, GESLAO MARIN SN Y ALPAYACU

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y	YEROVI XIMENA			
Identificaci	1600789133001	Placa /	null	Guía
Fecha	02/12/2022			
	PUYO			

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
879071 005159	879071 005159	1.00	REGULADOR VOLTAJE CDP R2C-AVR1008 1000VA/ 400W/ E/S120V/ 8 SALIDAS	210720-2081182	14.73	0.00	0.00	0.00	14.73

Información Adicional	
Descripción:	VENTAS

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.50

SUBTOTAL 12%	14.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.77
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.50

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 163-104-000371910

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0312202201179001691900121631040003719100244024319

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/12/2022 15:38:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0312202201179001691900121631040003719100

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA
COTOGCHOADirección CESLAO MARIN SN Y ALVARO
BALLADARES

Contribuyente 5368

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y YEROVI MU#OZ XIMENA ALEXANDRA

Identificaci 1600789133

Fecha 03/12/2022 Placa / null Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
786100 136193	786100 136193	1.00	SAVITAL SH.COLAGENO 550		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
786210 778037	786210 778037	1.00	NATURES HEART ADEREZO HONEY MUSTARD		2.88	0.00	0.00	0.00	2.88
786104 256621	786104 256621	1.00	H. ROMERO		0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
786104 257110	786104 257110	1.00	LO.SAL DEL HIMALAYA FINA 100G		1.63	0.00	0.00	0.00	1.63
786104 254112	786104 254112	1.00	AK. TE FRUTOS ROJOS		1.61	0.00	0.00	0.00	1.61
786100 780014	786100 780014	1.00	EL SABOR OREGANO		0.47	0.00	0.00	0.00	0.47
786104 256170	786104 256170	1.00	AK.PH CLASICO 3 EN 1 50M		2.82	0.00	0.00	0.00	2.82
750954 602904	750954 602904	1.00	SPEED STICK DEO.ROLL COOL NIGHT 50 G		2.49	0.00	0.00	0.00	2.49
78960	78960	1.00	HUGGIES TOALLA		1.72	0.00	0.00	0.00	1.72

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Descuent o	Precio Total
187006 2	187006 2	1.00	HUMEDAS FRESH FLIP TOP.		1.72	0.00	0.00	1.72
786100 253460	786100 253460	1.00	IMPERIAL MARGARINA		0.46	0.00	0.00	0.46
750954 600098	750954 600098	2.00	COLGATE DNT.TRIPLE ACCION.		1.46	0.00	0.00	2.93
267514	267514	0.18	PIMIENTO VERDE A. GRANEL..		1.03	0.00	0.00	0.18
786211 311471	786211 311471	1.00	ECOPACIFIC LIMON SUTIL MALLA		1.99	0.00	0.00	1.99
770201 092061	770201 092061	1.00	PROTEX JB.AVENA.		2.68	0.00	0.00	2.68
786104 256620	786104 256620	1.00	H. PEREJIL		0.44	0.00	0.00	0.44
786101 778036	786210 778036	1.00	NATURES HEART ADEREZO RANCH BA		2.67	0.00	0.00	2.67
786101 751001	786101 751001	1.00	HORNIMANS BLACK TEA		0.43	0.00	0.00	0.43
786212 312012	786212 312012	1.00	BALANCE STEVIA LIQUID		4.23	0.00	0.00	4.23
986439 0438	986439 0438	1.00	ORIGINAL-M.KISS MEDIO.		1.05	0.00	0.00	1.05
261935	261935	2.00	A-RIBEYE STEAK C/HUESO.		2.18	0.00	0.00	4.36
786104 257244	786104 257244	1.00	LO.ACEITE DE GIRASOL		3.51	0.00	0.00	3.51
786100 931007	786100 931007	1.00	DONA PETRA VINAGRE		0.85	0.00	0.00	0.85
786104 254924	786104 254924	1.00	AK. AJO PELADO		1.12	0.00	0.00	1.12
786800 021825	786800 021825	1.00	MONTERO PAPA CECILIA.		1.31	0.00	0.00	1.31
265027	265027	1.00	TOMATE RINON EMPACADO A		0.58	0.00	0.00	0.58
260796	260796	0.44	AGUACATE FUERTE GRANEL..		1.86	0.00	0.00	0.81

Información Adicional	
DEDUCIBLE ALIMENTACION:	29.97

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	51.87

SUBTOTAL 12%	26.70
SUBTOTAL 0%	21.96
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	48.66
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	51.87

<p>AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando</p>

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0914933494001

FACTURA

No. 001-101-000000028

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0512202201091493349400120011010000000281606425716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/12/2022 09:27:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0512202201091493349400120011010000000281

PALACIOS NARANJO CARMITA ESTHER

PALACIOS NARANJO CARMITA ESTHER

Dirección 27 DE FEBRERO Y TENIENTE HUGO ORTIZ

Dirección 27 DE FEBRERO Y TENIENTE HUGO ORTIZ

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA

Identificaci 1600789133001

Fecha 05/12/2022 Placa / null Guía

JAVIER VARGAS Y FRANCISCO DE ORELLANA

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
CHOE		0.50	CHORIZO ESPECIAL		3.25	0.00	0.00	0.00	1.63
COSTI LA		2.00	COSTILLA DE RES 1LB		2.00	0.00	0.00	0.00	4.00
ESTOF 1		5.00	CARNE DE ESTOFADO 1LB		2.00	0.00	0.00	0.00	10.00
HUEC		4.00	HUESO CARNUDO		1.30	0.00	0.00	0.00	5.20
HUEV		4.00	HUEVOS		3.50	0.00	0.00	0.00	14.00
PATA5		1.00	PATA DE RES UN		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
PCH		6.75	PATA DE CHANCHO		1.60	0.00	0.00	0.00	10.80
POE		22.73	POLLO ENTERO LB		1.25	0.00	0.00	0.00	28.41

Información Adicional	
Teléfono:	0995545470
Email:	xym8alex@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	79.04

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	79.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	79.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	79.04

<p>AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando</p>

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1691715279001

FACTURA

No. 001-100-000054030

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0512202201169171527900120011000000540300005403018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/12/2022 10:24:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0512202201169171527900120011000000540300

FERSAMAX SA

FERSAMAX

Dirección CRISTOBAL COLON S/N Y JUAN DE VELASCO

Dirección CRISTOBAL COLON SN Y JUAN DE VELASCO

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y YEROVI MUNOZ XIMENA ALEXANDRA

Identificaci 1600789133001

Fecha 05/12/2022 Placa / null Guía

JAVIER VARGAS Y FRANCISCO DE ORELLANA

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
		1.00	EXTENSION ELECTRICO 2X16 3MTS INCABLE BLANCO		3.91	0.00	0.00	0.00	3.91
		25.00	AMARRA PLASTICA T12 30CM. BLANCO DEXSON		0.06	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional	
AGENTERETENCION:	RESOLUCION No 1
CORREDELECTRONICO:	sincorreo@correo.com
CONTROL:	0801E0054030
REFERENCIA:	0,00
OBSERVACIONES:	SIN ASIGNAR CORREO
VENDEDOR:	00002 CASTILLO GUAMAN WILSON DA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.06

SUBTOTAL 12%	5.41
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.41
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.06

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1200804530001

FACTURA

No. 001-002-000135938

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0612202201120080453000120010020001359382212060818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/12/2022 08:47:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0612202201120080453000120010020001359382

FLORES ELIZALDE JOSE JUBENCIO

MACROPLASTIC

Dirección 24 DE MAYO Y 9 DE OCTUBRE

Dirección 24 DE MAYO Y 9 DE OCTUBRE

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y

YEROVI XIMENA

Identificaci 1600789133001

Fecha 06/12/2022 Placa / null Guía

PUYO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
T1TT	T1TT	2.00	TARRINA 1L PLOM C/T X50U		2.46	0.00	0.00	0.00	4.91
● LG	LLLG	4.00	LONCH GOLDERY X25U		1.79	0.00	0.00	0.00	7.14
V7VR	V7VR	2.00	VASO 7 OZ TR X50U		0.45	0.00	0.00	0.00	0.89
D5FL	D5FL	1.00	FUN DINA 5 BL X100U		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
SDS0	SDS0	1.00	SERV DORADO X350U		1.35	0.00	0.00	0.00	1.35

Información Adicional	
Email para retencion:	jubenciofe@outlook.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.40

SUBTOTAL 12%	15.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.40

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1691703572001

FACTURA

No. 001-100-000000020

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0612202201169170357200120011000000000200000007214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/12/2022 15:45:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0612202201169170357200120011000000000200

MARCO CARVAJAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CIA LTDA

MC CONSTRUCTORA

Dirección VERACRUZ VIA A MACAS

Dirección VERACRUZ VIA A MACAS

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA

Identificaci 1600789133001

Fecha 06/12/2022

Placa /

null

Gufa

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
002		40.00	RODILLO		40.00	0.00	0.00	0.00	1600.00
005		40.00	MOTONIVELADORA		45.00	0.00	0.00	0.00	1800.00

Información Adicional

Email: xym8alex@gmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

3808.00

SUBTOTAL 12%	3400.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3400.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	408.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3808.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992663235001

FACTURA

No. 001-341-001857788

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0612202201099266323500120013410018577885089792413

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 06/12/2022 22:18:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0612202201099266323500120013410018577885

REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE
S.A. REPORNEDirección Av. 9 de octubre 1911 y Esmeraldas -
Edif. Finansur

Dirección MARISCAL SUCRE OE6-140 CAÑARIS

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y YEROVI MUNOZ XIMENA ALEXANDRA

Identificaci 1600789133001

Fecha 06/12/2022 Placa / null Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
001139 014		1.00	COMISION POR SERVICIO DE RECAUDACION OBLIGACIONES PATRONALES IESS DIRECTO		0.27	0.00	0.00	0.00	0.27

Información Adicional

Comision: Comision \$0.30

Agente de Retencion: No. Resolucion: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.30

SUBTOTAL 12%	0.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.27
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.03
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.30

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791413237001

FACTURA

No. 182-030-000071320

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0712202201179141323700121820300000713200000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/12/2022 13:46:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0712202201179141323700121820300000713200

SUPERDEPORTE S.A.

SUPERDEPORTE S.A.

Dirección AV. GALO PLAZA LASSO 13205 Y DE LOS CEREZOS

Dirección C.C. MULTIPLAZA RIOBAMBA AV. LIZARZABURU

Contribuyente 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	XIMERA YEROVI				
Identificaci	1600789133	Placa /	null	Guía	
Fecha	07/12/2022				

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
107952 50005	406544 966127 0	1.00	380435 18 ELECTRON E,6 ELECTRON E		71.42	0.00	0.00	0.00	71.42
6201 64002	205000 097607 0	1.00	110MED00025NEBLN OSHOW NS 3PK,1 NOSHOW NS 3PK		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35

Información Adicional	
MAIL:	XYM8ALEX@GMAIL.COM
TELEFONO:	593 - 0995545470
DIRECCION:	RBBA
MARCA:	BODEGADEPORTIVA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	85.98

SUBTOTAL 12%	76.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	76.77
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	85.98

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

SUPERMERCADO Y COMIS. HORTENCIA
VARGAS DE JARA E HIJOS C.LTDA.

SUPERMERCADO HDJ E HIJOS

Dirección COLOMBIA 23-41 Y LARREA

Dirección COLOMBIA 23-41 Y LARREA

Contribuyente 246
OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 0690066971001

FACTURA

No. 001-203-000496473

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0712202201069006697100120012030004964731294154711

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 07/12/2022 18:12:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0712202201069006697100120012030004964731

Razón Social / Nombres y YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA

Identificaci 1600789133001

Fecha 07/12/2022 Placa / null Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
692155 557166 8	692155 557166 8	1.00	SOPAS INT JML COST/CERDO 109 GRS	Und 0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99
692155 557186 6	692155 557186 6	1.00	SOPAS INT JML CARNE DE RES 109 GRS	Und 0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99
00020	00020	0.42	MORTADELA CORRIENTE	Kl. 0.00	11.97	0.00	0.00	0.00	5.03
041789 001956	041789 001956	1.00	SOPA MARUCHAN CAMARON 64 GRS	Und (*) 0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99

Información Adicional	
Dirección:	JAVIER VARGAS Y FRANCISCO DE ORELLANA
Teléfono:	032897280
Email:	xym8alex@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.12

SUBTOTAL 12%	0.99
SUBTOTAL 0%	9.01
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.12
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.12

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602452849001

FACTURA

No. 001-002-000063424

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0712202201060245284900120010020000634240006342411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/12/2022 17:19:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0712202201060245284900120010020000634240

VILLACIS TRUJILLO SOFIA GENOVEVA

PLASTIMAS

Dirección 5 DE JUNIO 2134 Y 10 DE AGOSTO

Dirección 5 DE JUNIO 2134 Y 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y	YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA		
Identificaci	1600789133001		
Fecha	07/12/2022	Placa /	null
	JAVIER VARGAS Y FRANCISCO DE ORELLANA	Guía	

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
96CDG 0		8.00	CANASTILLA RATAN CON BISAGRA CAFE/BEIGE		5.89	0.00	0.00	0.00	47.14
Información Adicional						SUBTOTAL 12%			47.14
AGENTERETENCION: Agentes de Retención RESOLUCION No. 1						SUBTOTAL 0%			0.00
CORREOELECTRONICO: sincorreos@correo.com						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
CONTROL: 0101A0063424						SUBTOTAL EXENTO DE IVA			0.00
VENDEDOR: 00001 VENDEDOR 1						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			47.14
FORMA_PAGO: CONTADO						TOTAL DESCUENTO			0.00
						ICE			0.00
						IVA 12%			5.66
						TOTAL DEVOLUCION IVA			0.00
						IRBPNR			0.00
						PROPINA			0.00
						VALOR TOTAL			52.80

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	52.80

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1200804530001

FACTURA

No. 001-002-000136202

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0812202201120080453000120010020001362022212080814

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 08/12/2022 08:09:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0812202201120080453000120010020001362022

FLORES ELIZALDE JOSE JUBENCIO

MACROPLASTIC

Dirección 24 DE MAYO Y 9 DE OCTUBRE

Dirección 24 DE MAYO Y 9 DE OCTUBRE

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y YEROVI XIMENA
Identificaci 1600789133001
Fecha 08/12/2022 Placa / null Guía
PUYO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
T1TT	T1TT	6.00	TARRINA 1L PLOM C/T X50U		2.46	0.00	0.00	0.00	14.73
CGCO	CGCO	6.00	CUCHARA G BL OXF X50U		0.67	0.00	0.00	0.00	4.02
V7VR	V7VR	6.00	VASO 7 OZ TR X50U		0.45	0.00	0.00	0.00	2.68
P9PA	P9PA	12.00	PLATO 9 ALEGRIA BLX25U		0.98	0.00	0.00	0.00	11.79

Información Adicional	
Email para retención:	jubenciofe@outlook.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	37.21

SUBTOTAL 12%	33.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.99
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	37.21

<p>AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando</p>

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1702962331001

FACTURA

No. 001-003-000000489

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0912202201170296233100120010030000004890000048912

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/12/2022 15:23:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0912202201170296233100120010030000004890

ROMO PROANO ANGEL ENRIQUE

TODO FIERRO

Dirección LIBERTAD ARAJUNO S/N Y CURARAY

Dirección LIBERTAD ARAJUNO S/N Y CURARAY

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y

YEROVI XIMENA

Identificaci 1600789133001

Fecha 09/12/2022 Placa / null Guía

JAVIER VARGAS Y FRANCISCO DE ORELLANA

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
PLANC		1.00	PLANCHA		5.36	0.00	0.00	0.00	5.36
TUB		1.00	TUBERIA		5.36	0.00	0.00	0.00	5.36
PL38X6		1.00	PLATINA 38X6MM 1 1 2X14		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
DISCO RT		1.00	DISCOS DE CORTE DE 4 Y 7 PULGADAS		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
ELEC6 011		5.00	ELECTRODO AWS E-6011		1.79	0.00	0.00	0.00	8.93

Información Adicional	
Email:	xym8alex@gmail.com
Dirección:	JAVIER VARGAS Y FRANCISCO DE ORELLANA
cliente:	00001135
AGENTE DE RETENCION:	No.RESOLUCION : 0001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26.50

SUBTOTAL 12%	23.66
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.66
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.84
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.50

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0104843008001

FACTURA

No. 001-101-000000362

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0912202201010484300800120011010000003620000000119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/12/2022 18:46:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0912202201010484300800120011010000003620

UYAGUARI SALTO PATRICIA ALEXANDRA

PAPER HOUSE EL MUNDO DEL PAPEL

Dirección GENERAL VILLAMIL Y TENIENTE HUGO ORTIZ

Dirección GENERAL VILLAMIL Y TENIENTE HUGO ORTIZ

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y XIMENA YEROVY
Identificaci 1600789133001
Fecha 09/12/2022 Placa / null Guía
JAVIER VARGAS Y FRANCISCO DE ORELLANA

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
PLI-189	PLI-189	8.00	PLIEGO PAPEL CELOFAN V COLORES		0.54	0.00	0.00	0.00	4.29
P-91	P-91	3.00	PAPEL ADHESIVO BLANCO A4		0.22	0.00	0.00	0.00	0.67
POM-14	POM-14	1.00	POMPOM V COLORES PAQUETE		0.76	0.00	0.00	0.00	0.76
TOR-02	TOR-02	8.00	PAPEL TORNASOL V COLORES GRUESO		0.54	0.00	0.00	0.00	4.29

Información Adicional	
eMail:	xym8alex@gmail.com
Sistema:	FenixPRO
Vendedor:	ALEXANDRA
Telefono:	032888087
Correo:	paperhousepapeleria@hotmail.com
Plazo:	0 DIAS
Forma Pago:	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD-11.20
Contribuyente:	REGIMEN RIMPE EMPRENDEDORES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.20

SUBTOTAL 12%	10.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.20
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.20

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1800838672001

FACTURA

No. 001-100-000026843

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1212202201180083867200120011000000268430002684312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/12/2022 16:37:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212202201180083867200120011000000268430

VILLACRES URENA RAFAELA ELCIRA

** FERRETERIA ALDAZ**

Dirección FCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO SN

Dirección

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y YEROVI MUÑOS XIMENA ALEXANDRA
Identificaci 1600789133001
Fecha 12/12/2022 Placa / null Guía
PUYO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
35834		2.00	MASKING ABRO 1" (24MM X 40YDS)		1.12	0.00	0.00	0.00	2.23
298		15.00	GRAPA TOTAL THT39121 0.7MM X 12MM 1000UND		1.03	0.00	0.00	0.00	15.40

Información Adicional

REGIMENIMPOSITIVO: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
CORREOELECTRONICO: xym8alex@gmail.com
CONTROL: 1701F0026843
VENDEDOR: 00001 VENDEDOR 1
FORMA_PAGO: CONTADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.75

SUBTOTAL 12%	17.63
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.63
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.12
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.75

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1800838672001

FACTURA

No. 001-100-000026853

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


1212202201180083867200120011000000268530002685313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/12/2022 17:28:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212202201180083867200120011000000268530

VILLACRES URENA RAFAELA ELCIRA

** FERRETERIA ALDAZ**

Dirección FCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO SN

Dirección

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y YEROVI MUÑOS XIMENA ALEXANDRA
Identificaci 1600789133001
Fecha 12/12/2022 Placa / null Guía
PUYO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
52061		10.00	GRAPA TOTAL THT39101 0.7MM X 10MM 1000UND		1.12	0.00	0.00	0.00	11.16

Información Adicional

REGIMENIMPOSITIVO: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
CORREOELECTRONICO: xym8alex@gmail.com
CONTROL: 1701F0026853
VENDEDOR: 00001 VENDEDOR 1
FORMA_PAGO: CONTADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.50

SUBTOTAL 12%	11.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.16
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.34
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.50

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600541336001

FACTURA

No. 003-006-000109696

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


1212202201160054133600120030060001096960020122716

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/12/2022 08:56:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212202201160054133600120030060001096960

PAUCAR LAMAR CLAUDIA MARIGELA

LA GRAN BODEGA

Dirección FRANCISCO DE ORELLANA Y
SUMACO/PUYO - PAZTAZA

Dirección 9 DE OCTUBRE Y 24 DE MAYO

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 0

Razón Social / Nombres y YEROVI MUNOZ XIMENA ALEXANDRA

Identificaci 1600789133001

Fecha 12/12/2022 Placa / null Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
786104 930007 9	550	1.00	AZUCAR VALDEZ BLANCA 10K		9.60	0.00	0.00	0.00	9.60
221	392	1.00	ARROZ GUAYTAMBITO QQ		39.00	0.00	0.00	0.00	39.00
786105 750002 7	5120	3.00	SAL CRIS SAL 2KG.		0.80	0.00	0.00	0.00	2.40

Información Adicional	
Telefono:	0995545470
Email:	@

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	51.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	51.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	51.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	51.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0914933494001

FACTURA

No. 001-101-000000053

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1212202201091493349400120011010000000531218654718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/12/2022 08:53:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212202201091493349400120011010000000531

PALACIOS NARANJO CARMITA ESTHER

PALACIOS NARANJO CARMITA ESTHER

Dirección 27 DE FEBRERO Y TENIENTE HUGO ORTIZ

Dirección 27 DE FEBRERO Y TENIENTE HUGO ORTIZ

OBLIGADO A LLEVAR

NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y

YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA

Identificaci 1600789133001

Fecha 12/12/2022 Placa / null Guía

JAVIER VARGAS Y FRANCISCO DE ORELLANA

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
CARFIL E		5.00	CARNE FILETEADA CON HUESO 1LB		2.50	0.00	0.00	0.00	12.50
CHORIZO		4.00	CHORIZO ESPECIAL		3.25	0.00	0.00	0.00	13.00
CHU		5.00	CHULETACHANCHO		2.50	0.00	0.00	0.00	12.50
COSTILLA		5.00	COSTILLA DE RES 1LB		2.00	0.00	0.00	0.00	10.00
CUERO		4.00	CUERO AMARILLO		2.50	0.00	0.00	0.00	10.00
ESTOF 1		5.00	CARNE DE ESTOFADO 1LB		2.00	0.00	0.00	0.00	10.00
HUEC		5.00	HUESO CARNUDO		1.30	0.00	0.00	0.00	6.50
HUES		5.00	HUESO DE CHANCHO		1.90	0.00	0.00	0.00	9.50
HUEV		3.00	HUEVOS		3.50	0.00	0.00	0.00	10.50

Información Adicional	
Teléfono:	0995545470
Email:	xym8alex@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	94.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	94.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	94.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	94.50

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1200804530001

FACTURA

No. 001-002-000136658

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1212202201120080453000120010020001366582212120911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/12/2022 09:00:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212202201120080453000120010020001366582

FLORES ELIZALDE JOSE JUBENCIO

MACROPLASTIC

Dirección 24 DE MAYO Y 9 DE OCTUBRE

Dirección 24 DE MAYO Y 9 DE OCTUBRE

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y	YEROVI XIMENA				
Identificaci	1600789133001	Placa /	null	Guía	
Fecha	12/12/2022	PUYO			

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
LLLG	LLLG	2.00	LONCH GOLDERY X25U		1.79	0.00	0.00	0.00	3.57
SDS0	SDS0	1.00	SERV DORADO X350U		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
T1TT	T1TT	2.00	TARRINA 1L PLOM C/T X50U		2.46	0.00	0.00	0.00	4.91
EPFC	EPFC	1.00	F HALAR EP 5 COL X100U		1.07	0.00	0.00	0.00	1.07
FNFI	FNFI	1.00	F NATURAL 5X10X100U IN		0.45	0.00	0.00	0.00	0.45
V1VR	V1VR	2.00	VASO 10 OZ TR X 50U		0.67	0.00	0.00	0.00	1.34
CGCO	CGCO	2.00	CUCHARA G BL OXF X50U		0.67	0.00	0.00	0.00	1.34
PHPY	PHPY	1.00	PAPEL INSTITUCIONAL KROSTY 200 YDS (BX12R)		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional	
Email para retencion:	jubenciofe@outlook.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.20

SUBTOTAL 12%	15.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.84
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.20

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600326688001

FACTURA

No. 003-100-000000040

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1312202201160032668800120031000000000409028251414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/12/2022 19:39:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312202201160032668800120031000000000409

ESCOBAR MIRANDA HOLGUER DAMIAN

Dirección Calle: CESLAO MARIN Intersección: 27 DE FEBRERO

Dirección Calle: CESLAO MARIN Intersección: 27 DE FEBRERO

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y

YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA

Identificaci 1600789133

Fecha 13/12/2022 Placa / null Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
DIJEPL ATA 023		1.00	DIJE DE PLATA 23.00	DIJE DE PLATA 23.00	20.54	0.00	0.00	0.00	20.54
DIJEPL ATA 025		1.00	DIJE DE PLATA 25.00	DIJE DE PLATA 25.00	22.32	0.00	0.00	0.00	22.32
DIJEPL ATA 015		1.00	DIJE DE PLATA 15.00	DIJE DE PLATA 15.00	13.39	0.00	0.00	0.00	13.39

Información Adicional	
Telefono:	032883680
Email:	xym8alex@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	63.00

SUBTOTAL 12%	56.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	56.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	63.00

<p>AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando</p>

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600541336001

FACTURA

No. 003-006-000110559

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1312202201160054133600120030060001105590020271617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/12/2022 10:01:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312202201160054133600120030060001105590

PAUCAR LAMAR CLAUDIA MARIGELA

LA GRAN BODEGA

Dirección FRANCISCO DE ORELLANA Y SUMACO/PUYO - PAZTAZA

Dirección 9 DE OCTUBRE Y 24 DE MAYO

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 0

Razón Social / Nombres y	YEROVI MUNOZ XIMENA ALEXANDRA				
Identificaci	1600789133001	Placa /	null	Guía	
Fecha	13/12/2022				

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
7861027599648	1028	1.00	CEPILLO LAVAR MASTER LAVA FACIL		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
7861048600798	3255	1.00	JABON LAVATODO LIMON 4PCK		2.19	0.00	0.00	0.00	2.19
7861003121528	4603	1.00	PAPEL HUIG.FAMILIA MEGA ROLLO X6		3.53	0.00	0.00	0.00	3.53
7861048690812	110	1.00	ACHIOTE FAVORITA 1LT		4.70	0.00	0.00	0.00	4.70
7861012510863	816	2.00	CAFELTPK0250MOCA		0.71	0.00	0.00	0.00	1.43
41	2460	5.00	FREJOL PANAMITO XLIBRAS		0.77	0.00	0.00	0.00	3.87
56	3639	5.00	LENTEJA X LIBRAS		0.85	0.00	0.00	0.00	4.25
71	486	8.00	AVENA HOJUELAS X LIBRAS		0.70	0.00	0.00	0.00	5.60
24	2456	6.00	FREJOL MANTEQUILLA XLIBRAS		1.25	0.00	0.00	0.00	7.50

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin o	Descuent o	Precio Total
835	2450	6.00	FREJOL CANARIO X LIBRAS		1.55	0.00	0.00	0.00	9.30

Información Adicional	
Telefono:	0995545470
Email:	@

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	44.21

SUBTOTAL 12%	8.03
SUBTOTAL 0%	35.22
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	44.21

<p>AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando</p>
--

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1691703572001

FACTURA

No. 001-100-000000021

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


1312202201169170357200120011000000000210000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/12/2022 15:45:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312202201169170357200120011000000000210

MARCO CARVAJAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CIA LTDA

MC CONSTRUCTORA

Dirección VERACRUZ VIA A MACAS

Dirección VERACRUZ VIA A MACAS

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA

Identificaci 1600789133001

Fecha 13/12/2022 Placa / null Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
002		50.00	RODILLO		40.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
005		50.00	MOTONIVELADORA		45.00	0.00	0.00	0.00	2250.00

Información Adicional

Email: xym8alex@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4760.00

SUBTOTAL 12%	4250.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4250.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	510.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4760.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1691718359001

FACTURA

No. 002-011-000028989

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


1312202201169171835900120020110000289893142848511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/12/2022 09:21:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312202201169171835900120020110000289893

ZODISPAS CIA LTDA

ZODISPAS CIA LTDA

Dirección PUYO, CESLAO MARIN SN Y ALPAYACU

Dirección PUYO, CESLAO MARIN SN Y ALPAYACU

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y	YEROVI XIMENA			
Identificaci	1600789133001	Placa /	null	Guía
Fecha	13/12/2022	PUYO		

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
010343 965973	010343 965973	1.00	PAQUETE PACK DE BOTELLAS DE TINTA EPSON T544 - 4 COLORES NEGRO/CYAN/MAG/Y ELLOW		35.71	0.00	0.00	0.00	35.71

Información Adicional	
Descripción:	venta

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 12%	35.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600541336001

FACTURA

No. 002-004-000093113

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


1412202201160054133600120020040000931130020485815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/12/2022 18:30:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1412202201160054133600120020040000931130

PAUCAR LAMAR CLAUDIA MARICELA

LA GRAN BODEGA

Dirección FRANCISCO DE ORELLANA Y SUMACO/PUYO - PAZTAZA

Dirección

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 0

Razón Social / Nombres y	YEROVI MUNOZ XIMENA ALEXANDRA				
Identificaci	1600789133001				
Fecha	14/12/2022	Placa /	null	Guía	

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
196	836	2.00	CANASTA VIVERES NAVIDEÑA 10		10.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Información Adicional	
Teléfono:	0995545470
Email:	@

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600308082001

FACTURA

No. 001-001-000000183

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


1512202201160030808200120010010000001833434224113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/12/2022 15:16:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1512202201160030808200120010010000001833

TOSCANO NARANJO CAROLINA ENMA

FERRETERIA MUÑOZ

Dirección Tnt. Hugo Ortiz y Cumanda

Dirección Tnt. Hugo Ortiz y Cumanda

OBLIGADO A LLEVAR

NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y	XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ				
Identificaci	1600789133001				
Fecha	15/12/2022	Placa /	null	Guía	
	javier vargas y francisco de orellana				

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
NEP210		2.00	NEPLO 2 X 10CM GALVANIZADO		5.36	0.00	0.00	0.00	10.71
07V.EP2		1.00	VALVULA 2" ESFERICA PLASTICA		7.14	0.00	0.00	0.00	7.14
02F.AR2		1.00	ADAPTADOR 2" FLEX REF. M		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
13.TE.MCAL34		1.00	TEFLON MGK AMARILLA 3/4"GRANDE		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
08.SP.439		1.00	LLAVE SP BRONCE FV GRIFO (E439.13.X BR)		6.70	0.00	0.00	0.00	6.70
925582		1.00	TAPON 1/2 MACHO ROSCABLE PLASTIGAMA		0.62	0.00	0.00	0.00	0.63
926643		1.00	TAPON 1/2 HEMBRA ROSCABLE PLASTIGAMA		0.62	0.00	0.00	0.00	0.63
925583		3.00	TAPON 2" MACHO ROSCABLE PLASTIGAMA		3.12	0.00	0.00	0.00	9.38
1317		1.00	JUEGO 3 PCS EXTENSION DE RACHA 5-10" BARRA T 10		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
410311 35XLIB R		3.00	CLAVO 2-1/2X10) C/C (XLIBRAS)		1.34	0.00	0.00	0.00	4.02

Información Adicional	
Dirección:	javier vargas y francisco de orellana
Teléfono:	032897280
Email:	xym8alex@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	61.40

SUBTOTAL 12%	54.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	54.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	61.40

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2100377734001

FACTURA

No. 001-101-000008629

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2112202201210037773400120011010000086290000862913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/12/2022 21:47:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2112202201210037773400120011010000086290

HERNANDEZ SELLAN JAIME RENE

MRAHORRO

Dirección TUNGURAHUA SN SEVERO VARGAS

Dirección

OBLIGADO A LLEVAR

NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y		XIMENA YEROVI							
Identificaci	1600789133	Placa /		null	Guía				
Fecha	21/12/2022	PUYO							

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
124280 23		1.00	*MAGGI MOSTAZA 42X200G		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
780432 830 0		1.00	VINO CLOS D'PIRQUE BLANCO 1LT C:12U		5.49	0.00	0.00	0.00	5.49
5963		3.00	RANCHERO / CRIOLLITA		0.22	0.00	0.00	0.00	0.67
4386		1.00	CRIPS CHIFLES DE SAL 150G		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2575		1.00	VERDURAS		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
REGIMENIMPOSITIVO:	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
CORREOELECTRONICO:	sincorreos@correo.com
CONTROL:	0101E0008629
VENDEDOR:	00001 VENDEDOR 1
FORMA_PAGO:	CONTADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.90

SUBTOTAL 12%	7.05
SUBTOTAL 0%	2.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.85
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.90

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1721850947001

FACTURA

No. 001-002-000000014

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2112202201172185094700120010020000000140000001415

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 21/12/2022 16:05:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2112202201172185094700120010020000000140

LEDESMA CALERO NICOLAS ANDRES

LEDESMA CALERO NICOLAS ANDRES

Dirección VIA A MADRE TIERRA KM 25

Dirección

OBLIGADO A LLEVAR SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y	YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA			
Identificaci	1600789133001	Placa /	null	Guía
Fecha	21/12/2022	JAVIER VARGAS Y FRANCISCO DE ORELLANA		

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
1003		10.00	TRITURADO METRO CUBICO		15.00	0.00	0.00	0.00	150.00
1004		20.00	TAMIZADO		7.00	0.00	0.00	0.00	140.00

Información Adicional	
REGIMENIMPOSITIVO:	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
CORREOELECTRONICO:	xym8alex@gmail.com
CONTROL:	0401E0000014
OBSERVACIONES:	XYM8ALEX@GMAIL.COM
VENDEDOR:	00001 VENDEDOR 1
FORMA_PAGO:	CREDITO
FECHA_VENCIMIENTO:	21/12/2022

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	324.80

SUBTOTAL 12%	290.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	290.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	34.80
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	324.80

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1804022638001

FACTURA

No. 003-100-000000008

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2212202201180402263800120031000000000083834426914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2022 12:37:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2212202201180402263800120031000000000083

SALINAS BALLADARES IVONNE DEL ROCIO

Dirección Calle: AMBATO Número: S/N
Intersección: GALO PLAZA LASO

Dirección Calle: SANTA ANA Número: SN
Intersección: SN

OBLIGADO A LLEVAR NO

Razón Social / Nombres y

YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA

Identificaci 1600789133001

Fecha 22/12/2022 Placa / null Guía

JAVIER VARGAS Y FRANCISCO DE ORELLANA

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
013AZF		1.00	"AZFALTADO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN (ABSCISA 8+600 HASTA LA ABSCISA 13+100) L=4.5 KM, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA" INCLUIDO TRANSPORTE.		44642.86	0.00	0.00	0.00	44642.86

Información Adicional	
Telefono:	032897280
Email:	xym8alex@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50000.00

SUBTOTAL 12%	44642.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44642.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5357.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50000.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600214934001

FACTURA

No. 001-010-100109993

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2212202201160021493400120010101001099931600214911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2022 11:53:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2212202201160021493400120010101001099931

ALBÁN GUEVARA FRANCISCO DANILO

CONDOR COLOR

Dirección 9 DE OCTUBRE Y 24 DE MAYO

Dirección 9 de Octubre y 24 de Mayo

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	XIMENA YEROVI			
Identificaci	1600789133001	Placa /	null	Guía
Fecha	22/12/2022	PUYO		

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
F4675		6.00	UNION PRESION PEGABLE 90MM PLASTIGAMA		4.30	0.00	0.00	0.00	25.80
1157903247		1.00	KALIPEGA 250CC PLASTIGAMA		5.28	0.00	0.00	0.00	5.28

Información Adicional	
Agente de Retención:	No. Resolución: NAC-DNCRASC20-00000001
Telefono:	0
Email:	xym8alex@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.81

SUBTOTAL 12%	31.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.08
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.73
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.81

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1690015133001

FACTURA

No. 001-901-000000190

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2212202201169001513300120019010000001900000007213

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 22/12/2022 16:20:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2212202201169001513300120019010000001900

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA
EN VOLQUETES RIO PASTAZA

COOPERATIVA DE VOLQUETAS RIO PASTAZA

Dirección AV. ALBERTO ZAMBRANO

Dirección AV. ALBERTO ZAMBRANO

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y	XIMENA ALEXANDRA YEROVI MUÑOZ				
Identificaci	1600789133001	Placa /	null	Guía	
Fecha	22/12/2022				

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
160		1.00	TRANSPORTE DE MATERIAL RELLENO TACULIN, SUBBASE, BASE BOBONAZA		770.12	0.00	0.00	0.00	770.12

Información Adicional	
Dirección:	JAVIER VARGAS Y FRANCISCO DE ORELLANA
Teléfono:	032897280
Email:	xym8alex@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	770.12

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	770.12
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	770.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	770.12

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600288409001

FACTURA

No. 001-100-000034029

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2412202201160028840900120011000000340290003402915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/01/2023 23:48:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2412202201160028840900120011000000340290

VILLAGOMEZ VITERI ROSA MARLENE

CONFORT SPORT - PUYO

Dirección 10 DE AGOSTO S N Y ATAHUALPA

Dirección

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y	XIMENA YEROVI				
Identificaci	1600789133				
Fecha	24/12/2022	Placa /	null	Guía	
	PUYO				

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
		1.00	RIDER 10719 (26416) PISCINA SANDALIA		16.88	0.00	0.00	0.00	16.88
		1.00	SKECHERS SONIC LUV (OFWT)		77.59	0.00	0.00	0.00	77.59

Información Adicional	
AGENTERETENCION:	Agente de Retencion RESOLUCION No. 1
CORREOELECTRONICO:	sincorreo@correo.com
CONTROL:	0101E0034029
OBSERVACIONES:	SIN ASIGNAR CORREO
VENDEDOR:	CF CELESTE FLORES

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	105.80

SUBTOTAL 12%	94.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	94.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	11.34
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	105.80

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600147118001

FACTURA

No. 001-100-000000012

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2312202201160014711800120011000000000123719746716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/12/2022 15:26:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2312202201160014711800120011000000000123

FREIRE RODRIGUEZ FIDEL REIMUNDO

Dirección Barrio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN Calle: LUIS JACOME

Dirección Barrio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN Calle: LUIS JACOME Intersección: PABLO VEGA

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y

YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA

Identificaci 1600789133001

Fecha 23/12/2022 Placa / null Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
005		77.81	MOVIMIENTO DE MATERIAL CON MAQUINA EXCAVADORA PARA EL PROYECTO ASFALTADO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN		35.71	0.00	0.00	0.00	2778.60

Información Adicional	
Telefono:	032883680
Email:	xym8alex@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3112.03

SUBTOTAL 12%	2778.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2778.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	333.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3112.03

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400310361001

FACTURA

No. 001-001-000033215

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2312202201140031036100120010010000332157477040613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/12/2022 09:05:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2312202201140031036100120010010000332157

RIVERA OTACOMA BLANCA MARLENE

FERRETERIA TOAPANTA RIVERA

Dirección 27 DE FEBRERO Y TENIENTE HUGO ORTIZ

Dirección 27 DE FEBRERO Y TENIENTE HUGO ORTIZ

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y	YEROVI MUNOZ XIMENA ALEXANDRA			
Identificaci	1600789133001	Placa /	null	Guía
Fecha	23/12/2022			

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
3411323		100.00	GEOTEXTIL 4x1001600		5.34	0.00	0.00	0.00	534.00
SUBTOTAL 12%									534.00
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									534.00
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									64.08
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									598.08

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	598.08

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600147118001

FACTURA

No. 001-100-000000013

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2312202201160014711800120011000000000133535375516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/12/2022 15:31:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2312202201160014711800120011000000000133

FREIRE RODRIGUEZ FIDEL REIMUNDO

Dirección Barrio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN Calle: LUIS JACOME

Dirección Barrio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN Calle: LUIS JACOME Intersección: PABLO VEGA

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA

Identificaci 1600789133001

Fecha 23/12/2022 Placa / null Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
005		71.71	MOVIMIENTO DE MATERIAL CON MAQUINA EXCAVADORA PARA EL PROYECTO ASFALTADO VIA CABECERAS DEL BOBONAZA HASTA LA COMUNIDAD TACULIN		35.71	0.00	0.00	0.00	2560.76

Información Adicional	
Telefono:	032883680
Email:	xym8alex@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2868.05

SUBTOTAL 12%	2560.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2560.76
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	307.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2868.05

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600288409001

FACTURA

No. 001-100-000034029

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2412202201160028840900120011000000340290003402915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/01/2023 23:48:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2412202201160028840900120011000000340290

VILLAGOMEZ VITERI ROSA MARLENE

CONFORT SPORT - PUYO

Dirección 10 DE AGOSTO S N Y ATAHUALPA

Dirección

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y	XIMENA YEROVI			
Identificaci	1600789133	Placa /	null	Guía
Fecha	24/12/2022	PUYO		

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
		1.00	RIDER 10719 (26416) PISCINA SANDALIA		16.88	0.00	0.00	0.00	16.88
		1.00	SKECHERS SONIC LUV (OFWT)		77.59	0.00	0.00	0.00	77.59

Información Adicional	
AGENTERETENCION:	Agente de Retencion RESOLUCION No. 1
CORREOELECTRONICO:	sincorreos@correo.com
CONTROL:	0101E0034029
OBSERVACIONES:	SIN ASIGNAR CORREO
VENDEDOR:	CF CELESTE FLORES

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	105.80

SUBTOTAL 12%	94.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	94.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	11.34
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	105.80

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1801464742001

FACTURA

No. 001-100-00000025

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


261220220118014647420012001100000000256752784415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/12/2022 17:37:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



261220220118014647420012001100000000256

JIMENEZ ESPARZA ANA CECILIA

Dirección Calle: 9 DE OCTUBRE Número: SN
Intersección: FRANCISCO DE

Dirección Calle: 9 DE OCTUBRE Número: SN
Intersección: FRANCISCO DE
ORELLANA

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y	YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA				
Identificaci	1600789133				
Fecha	26/12/2022	Placa /	null	Guía	
	Puyo				

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
003		1.00	CALZADO		40.18	0.00	0.00	0.00	40.18

Información Adicional	
Telefono:	032883680
Email:	xym8alex@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	45.00

SUBTOTAL 12%	40.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.82
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	45.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1690005642001

FACTURA

No. 002-005-002249298

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2612202201169000564200120020050022492980224929813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/12/2022 06:44:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2612202201169000564200120020050022492980

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA FacturaElectronicaEcuador.com

ESTACION DE SERVICIO DEL SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA

Dirección CESLAO MARIN 391 Y ATAHUALPA

Dirección AV. ALBERTO ZAMBRANO S/N

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y	YEROVI MUNOZ XIMENA ALEXANDRA		
Identificaci	1600789133001	Placa /	PQJ0540
Fecha	26/12/2022	Guía	

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
0101	0101	0.90	EXTRA	GLS A22 015 - JAVIER ROJAS	2.14	1.00	3.14	0.00	1.92

Información Adicional	
Correo:	sinenviar
Despacho:	2022-12-26T06:44:41
Embarcacion:	ninguna
Placas Adicionales:	.NULL.

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.16

SUBTOTAL 12%	1.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.23
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.16

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1200804530001

FACTURA

No. 001-002-000138841

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2612202201120080453000120010020001388412212260811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 26/12/2022 08:34:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2612202201120080453000120010020001388412

FLORES ELIZALDE JOSE JUBENCIO

MACROPLASTIC

Dirección 24 DE MAYO Y 9 DE OCTUBRE

Dirección 24 DE MAYO Y 9 DE OCTUBRE

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y	YEROVI XIMENA			
Identificaci	1600789133001	Placa /	null	Guía
Fecha	26/12/2022			
	PUYO			

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
LLLG	LLLG	4.00	LONCH GOLDERY X25U		1.79	0.00	0.00	0.00	7.14
T1TT	T1TT	1.00	TARRINA 1L PLOM C/T X50U		2.46	0.00	0.00	0.00	2.46
R9FF	R9FF	1.00	F ROLLO 9X14 FAPL		1.56	0.00	0.00	0.00	1.56
R8FF	R8FF	1.00	ROLLO 8X12 FAPL		1.56	0.00	0.00	0.00	1.56
EPFC	EPFC	2.00	F HALAR EP 5 COL X100U		1.07	0.00	0.00	0.00	2.14
FNFI	FNFI	3.00	F NATURAL 6X18 X100U IN		0.80	0.00	0.00	0.00	2.41
SDS0	SDS0	1.00	SERV DORADO X350U		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
CGCO	CGCO	2.00	CUCHARA G BL OXF X50U		0.67	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional	
Email para retencion:	jubenciofe@outlook.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.34

SUBTOTAL 12%	19.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.95
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.39
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.34

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1801464742001

FACTURA

No. 001-100-00000025

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


261220220118014647420012001100000000256752784415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/12/2022 17:37:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



261220220118014647420012001100000000256

JIMENEZ ESPARZA ANA CECILIA

Dirección Calle: 9 DE OCTUBRE Número: SN
Intersección: FRANCISCO DE

Dirección Calle: 9 DE OCTUBRE Número: SN
Intersección: FRANCISCO DE
ORELLANA

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA

Identificaci 1600789133

Fecha 26/12/2022 Placa / null Guía

Puyo

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
003		1.00	CALZADO		40.18	0.00	0.00	0.00	40.18

Información Adicional

Telefono: 032883680
Email: xym8alex@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	45.00

SUBTOTAL 12%	40.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.82
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	45.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1803861135001

FACTURA

No. 001-101-000000273

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2612202201180386113500120011010000002731234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/12/2022 10:53:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2612202201180386113500120011010000002731

GUILLEN ATI ZOILA ALEJANDRA

G&G GLOBAL CLEAN

Dirección Calle Atahualpa entre Gnrl. Villamil y 27 de Febrero

Dirección Calle Atahualpa entre Gnrl. Villamil y 27 de Febrero

OBLIGADO A LLEVAR

NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y

YEROVI MUÑOZ XIMENA ALEXANDRA

Identificaci 1600789133001

Fecha 26/12/2022 Placa / null Guía

JAVIER VARGAS y FRANCISCO DE ORELLANA

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
2596	PINZA ESPAT ULA	1.00	PINZA ESPATULA STRONG		2.90	0.00	0.00	0.00	2.90

Información Adicional

vendedor: Vendedor
ciudad: PASTAZA

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 3.25

SUBTOTAL 12%	2.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.35
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.25

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400310361001

FACTURA

No. 001-001-000033265

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2812202201140031036100120010010000332657477040619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/12/2022 16:47:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2812202201140031036100120010010000332657

RIVERA OTACOMA BLANCA MARLENE

FERRETERIA TOAPANTA RIVERA

Dirección 27 DE FEBRERO Y TENIENTE HUGO ORTIZ

Dirección 27 DE FEBRERO Y TENIENTE HUGO ORTIZ

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y	YEROVI MUNOZ XIMENA ALEXANDRA				
Identificaci	1600789133001	Placa /	null	Guía	
Fecha	28/12/2022				

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
44141		60.00	LONA ESPECIAL COLORES 2.5MT*100		2.01	0.00	0.00	0.00	120.54

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	135.00

SUBTOTAL 12%	120.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	120.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	14.46
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	135.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600541336001

FACTURA

No. 002-004-000102594

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2812202201160054133600120020040001025940022600817

PAUCAR LAMAR CLAUDIA MARICELA

LA GRAN BODEGA

Dirección FRANCISCO DE ORELLANA Y
SUMACO/PUYO - PAZTAZA

Dirección

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 0

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 28/12/2022 18:12:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2812202201160054133600120020040001025940

Razón Social / Nombres y YEROVI MUNOZ XIMENA ALEXANDRA

Identificaci 1600789133001

Fecha 28/12/2022 Placa / null Guía

javier vargas y francisco de orellana

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent	Precio Total
786211 950550 9	429	18.00	ATUN DON SANCHO TREPACK		1.60	0.00	0.00	0.00	28.80
786106 350354 8	6020	18.00	TORTA YA VAINILLA500GR		1.74	0.00	0.00	0.00	31.34
786100 251312 6	72	18.00	ACEITE PALMA ORO BOTLL900ML		2.23	0.00	0.00	0.00	40.21
786100 891211 4	2155	18.00	DURAZNO SAN JORGE 820GR.		2.29	0.00	0.00	0.00	41.22
786106 350174 2	2349	18.00	FIDEO CAYAMBE LASO 400GR		0.80	0.00	0.00	0.00	14.40
786104 930002 4	547	18.00	AZUCAR VALDEZ 2KL		1.80	0.00	0.00	0.00	32.40
786210 209008 1	490	18.00	AVENA PRODI FUNDA 500G		0.66	0.00	0.00	0.00	11.85
394	370	38.12	ARROZ CONEJO VIEJO QQ		0.45	0.00	0.00	0.00	17.15
770201 1277	2713	18.00	GALLETAS CASITA COLOMBINA 200G		2.00	0.00	0.00	0.00	36.00

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin o	Descuent o	Precio Total
428	2713	18.00	GALLETAS CASITA COLOMBINA 200G		2.00	0.00	0.00	0.00	36.00
172	829	18.00	CANASTA MEDIANA		2.50	0.00	0.00	0.00	45.00
786212 270144 8	1566	18.00	COCOA LA UNIVERSAL 150GR		0.71	0.00	0.00	0.00	12.86
786111 560029 4	7526	18.00	MERMELADA DE MORA FRASCO 250G		1.12	0.00	0.00	0.00	20.09
786100 011337 3	5131	18.00	SAL PACIFICO 2KG		0.65	0.00	0.00	0.00	11.70

Información Adicional	
Telefono:	0995545470
Email:	xym8alex@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	360.00

SUBTOTAL 12%	141.50
SUBTOTAL 0%	201.52
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	343.02
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	16.98
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	360.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1691713381001

FACTURA

No. 001-010-000000009

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


3012202201169171338100120010100000000091234567817

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 30/12/2022 08:38:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3012202201169171338100120010100000000091

TRANSPORTE PESADO FREIRE CORTEZ S.A

TRANSPORTE PESADO FREIRE CORTEZ S.A

Dirección VIA PUYO - TENA LAS AMERICAS

Dirección VIA PUYO - TENA LAS AMERICAS

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y	XIMENA ALEXNDRA YEROVI MUÑOZ				
Identificaci	1600789133001				
Fecha	30/12/2022	Placa /	null	Guía	

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
1001	1001	1.00	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO		437.99	0.00	0.00	0.00	437.99

Información Adicional

Teléfono: 0328972820
Email: xym8alex@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	437.99

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	437.99
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	437.99
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	437.99

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1690005642001

FACTURA

No. 002-005-002254051

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


3012202201169000564200120020050022540510225405116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/12/2022 08:50:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3012202201169000564200120020050022540510

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA FacturaElectronicaEcuador.com

ESTACION DE SERVICIO DEL SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA

Dirección CESLAO MARIN 391 Y ATAHUALPA

Dirección AV. ALBERTO ZAMBRANO S/N

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y YEROVI MUNOZ XIMENA ALEXANDRA

Identificaci 1600789133001

Fecha 30/12/2022 Placa / PQJ0540 Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
0101	0101	4.16	EXTRA	GLS C21 113 - DANIELA CAMPOVERDE	2.14	1.00	3.14	0.00	8.93

Información Adicional

Correo: sinenviar
Despacho: 2022-12-30T08:50:56
Embarcacion: ninguna
Placas Adicionales: .NULL.

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1690005642001

FACTURA

No. 002-005-002254051

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


3012202201169000564200120020050022540510225405116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/12/2022 08:50:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3012202201169000564200120020050022540510

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA FacturaElectronicaEcuador.com

ESTACION DE SERVICIO DEL SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA

Dirección CESLAO MARIN 391 Y ATAHUALPA

Dirección AV. ALBERTO ZAMBRANO S/N

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y	YEROVI MUNOZ XIMENA ALEXANDRA			
Identificaci	1600789133001	Placa /	PQJ0540	Guía
Fecha	30/12/2022			

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
0101	0101	4.16	EXTRA	GLS C21 113 - DANIELA CAMPOVERDE	2.14	1.00	3.14	0.00	8.93

Información Adicional	
Correo:	sinenviar
Despacho:	2022-12-30T08:50:56
Embarcacion:	ninguna
Placas Adicionales:	.NULL.

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando
