

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**COMPROBANTE DE PAGO N° 1643**

Fecha: 29/09/2023

Asiento N° 4656

Compromiso N° 1107

1BCE PRINCIPAL Cta Cte No 01210014

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **AMAZONAS BUILDING S.A.**

**USD 95,581.78**

LA SUMA DE: **NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN Dolares 78/100 Ctsv**

PUYO, 29 de Septiembre del 2023

**DETALLE DEL COMPROBANTE:**

**AMAZONAS BUILDING S.A..- PAGO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°02 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°02 DEL PROYECTO ASFALTADO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA. REFERENCIA ASIEN TO DE DIARIO N° 4275 DE FECHA 12/09/2023.**

Usuario: ERIKA

**DOCUMENTOS BANCARIOS**


No	Beneficiario	Valor
CTA 4020442268	AMAZONAS BUILDING S.A.	95,581.78
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		95,581.78

**APLICACION CONTABLE**

Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	95,581.78	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014		95,581.78
SUMAN o PASAN USD		95,581.78	95,581.78

**APLICACION PRESUPUESTARIA**


Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			95,581.78
TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	95,581.78



LCDR. ANDRE GRANDA.  
Prefecto Provincial



LCDA. MARILU ORDOÑEZ.  
Directora Financiera E.



ING. ALEXANDRA POZO  
Jefe De Contabilidad E.



ING. GABRIEL SO  
Tesorero

TRB 412  
29/09/2023



Orden de Pago Nro. GADPPZ-GADPPZ-2023-0440-GOP

Puyo, 28 de septiembre de 2023

**PARA:** Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes  
**Directora Financiera (E)**

**ASUNTO:** Orden de pago a favor de AMAZONAS BUILDING S.A.

En conformidad con la solicitud orden de pago Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-0443-SOLOP, del 28 de septiembre del 2023, considerando que la Dirección Financiera ha realizado el control previo del trámite de la **“PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nro.- 02 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nro.-02 DEL PROYECTO ASFALTO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACHA HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO -EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”**, autorizo proceda con el pago en observancia de las disposiciones legales, a favor de **AMAZONAS BUILDING S.A.**, por el valor de 95,581.78 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA.**

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. André Mauricio Granda Garrido  
**PREFECTO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA**

Referencias:

- GADPPZ-FINANCIERO-2023-0443-SOLOP

Anexos:

- solicitud\_orden\_de\_pago\_nro.\_gadppz-financiero-2023-0443-solop.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Abg. Jazmin Paola Rea Sangoquiza - Asistente Administrativo 2 --> Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes - Directora Financiera (E)



Firmado electrónicamente por:  
**ANDRE MAURICIO  
GRANDA GARRIDO**

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA****COMPROBANTE DE DIARIO N° 2355**

Fecha: 12/09/2023

Asiento N° 4275

Compromiso N° 1107

Retención N° 001-010-000021341

## DETALLE DEL COMPROBANTE:

AMAZONAS BUILDING S.A..- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°02 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°02 DEL PROYECTO ASFALTADO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

Usuario: JESSIE

## DOCUMENTOS


Fecha	Documento	No	Autorización	Valor
08/09/2023	FACTURA	001101000000101	10000010117	108,958.36

## APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IVA	11,674.11	
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	97,284.25	
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS		95,581.78
2.1.3.75.01.112	IMPUESTO A LA RENTA 1.75%		1,702.47
2.1.3.81.14.001	CXP IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI		11,674.11
SUMAN o PASAN USD		108,958.36	108,958.36

## APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS		97,284.25	
TOTAL GASTOS USD	0.00	97,284.25	0.00

  
Ing. Alexandra Pozo  
Contadora General (e)

  
Ing. Jessie Rivadeneira  
Contadora 1

R.U.C.: 1691710080001

**FACTURA**

No. 001-101-000000101

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**

0809202301169171008000120011010000001010000010117

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:**

08/09/2023 17:08:13

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISION:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0809202301169171008000120011010000001010000010117

**AMAZONBUILD SA 2023**

**AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S A**

**Dirección Matriz:**

BARRIO EL DORADO, AV TARQUI SN Y LOS LAURELES

**Telf.:**

**E-mail:** jinmarinm@hotmail.com

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**Agente de Retención RESOLUCION No. 1**

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

**RUC / CI:** 1660000170001

**Fecha Emisión:** 08/09/2023

**Dirección:** FRANCISCO DE ORELLANA 739 Y 27 DE FEBRERO

Codigo	Descripción - Serie	Cant.	Unidad	P.Unitario	Desc.	Valor Total
SVF-0001	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°. 02	1.00		95,049.92	0.00	95,049.92
SVF-0001	REAJUSTE (PROVISIONAL) PLANILLA 2	1.00		2,234.33	0.00	2,234.33

**INFORMACION ADICIONAL:**

**Forma de pago:** CREDITO 0 dias

**Vendedor:** 00002 JENNY PUNINA



**Observaciones:** PLANILLA DE AVANCE N° 2: ASFALTADO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO-CANTON PASTAZA, PROV. PASTAZ

<b>SUBTOTAL:</b>	<b>97,284.25</b>
TOTAL DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%:	97,284.25
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUB TOTAL No Objeto IVA:	0.00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:</b>	<b>97,284.25</b>
IVA 12%:	11,674.11
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>108,958.36</b>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
20 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	108958.36	0	DIAS

Compromiso  
# 1109

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA CONTROL PREVIO

"ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY- FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA"		OBRAS PÚBLICAS		FINANCIERO	
CONTRATISTA:	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A	TIPO DE PROCESO		TIPO DE PROCESO	
DOCUMENTO:	PAGO DE PLANILLA	CONTRATO	PLANILLA	CONTRATO	PLANILLA
CONCEPTO:	PLANILLA No. 2 DE AVANCE DE OBRA		X		
FECHA DEL DOCUMENTO:	22 de junio de 2023		X		
TIPO DE PROCESO	LICO-GADPPz-006-2022		X		
VALOR LÍQUIDO PLANILLA + REAJUSTE (SIN IVA):	\$ 97,284.25	APLICA		APLICA	
	<b>CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
1	Requerimiento				
2	Estudios del proyecto				
3	Informe técnico y económico				
4	Factibilidad Ambiental				
5	Certificación POA				
6	Certificación Presupuestaria				
7	Convenio				
8	Pliegos del Procedimiento				
9	Informe Técnico de Evaluación de Ofertas				
10	Resolución de Adjudicación				
11	Garantía Original de fiel Cumplimiento del contrato				
12	Garantía Original de Buen Uso del Anticipo				
13	Certificado de no Adeudar al GADPPz				
14	Documentos Personales / Representante Legal				
15	Certificación Bancaria				
16	Certificado de cumplimiento Tributario (SRI)	X			
17	RUC Actualizado	X			
18	Contrato original y disposición escrita de trabajo (proceso completo)	X			
	Planilla de Reajuste de precios del Anticipo		X		
19	Orden de Inicio de Trabajos	X			
20	Planilla de obra con informe de Fiscalización	X			
21	Anexos de Obra	X			
22	Cuadro de Diferencia de Cantidades		X		
23	Conformidad Ambiental	X			
24	Informe de avance de Obra de Administrador de contrato	X			
25	Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales ( IESS) Planilla	X			
26	Certificado de no ser obra nueva		X		
27	Multa		X		
28	Autorización de la máxima Autoridad para prórroga de Plazos		X		
29	Autorización de la máxima Autoridad para Rubros Nuevos		X		
30	Certificado que no es obra nueva		X		
31	Solicitud de recepción de Obra		X		
32	Solicitud de pago del Administrador del Contrato	X			
33	Solicitud de pago del Director de la Unidad al Financiero	X			
34	Factura/Nota de Venta	X			
35	Validación de la factura/Nota de Venta				
36	Acta de repesion provisional				
<b>OBSERVACIONES:</b>					
Revisado por:	 <small>Firmado electrónicamente por</small> <b>ERYKA MIREYA SILVA MANZANO</b> <b>ING. ERYKA SILVA M.</b> <b>ADMINISTRADOR DE LA OBRA</b> <b>DEPARTAMENTO</b> <b>SOLICITANTE DEL TRAMITE</b>	 <small>Firmado electrónicamente por</small> <b>MERCY JOHANNA QUISHPI CUENCA</b> <b>DEPARTAMENTO</b> <b>FINANCIERO</b>			



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 6-10-2023


Hora: 16:52:36

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: SOSA ESPINEL GABRIEL ALEJANDRO 1210014

Num. Ced o Ruc:1691710080001

Institución Pública: GAD PROV PASTAZA					# Cta.: 1210014			
Fecha de Transferencia : 2023-10-02 00:00:00.0								
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben	Monto	# Ced.Ident.	Nom Ben	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado	Observacion
BANECUADOR B.P.	4020442268	95,581.78	1691710080001	AMAZONAS BUILDING S.A.	2	02-10-2023 17:29:11	ACREDITADA	COMPROBANTE DE PAGO 1643
<b>Total:</b>		<b>95,581.78</b>	<b>Reg.:1</b>					

[Atrás](#)



GOBIERNO DE  
**PASTAZA**

*El Gobierno del Azuero*

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
**PROVINCIAL DE PASTAZA**

Dirección: Francisco de Orellana y 27 de Febrero

Teléfono: 032885380 / Fax: 032886179

E-mail: financiero@pastaza.gob.ec

Web: www.pastaza.gob.ec

Contribuyente Especial: 590

RUC: 1660000170001

COMPROBANTE DE RETENCION

Nº 001-010-000021341

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1209202307166000017000120010100000213411438921216

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

12/09/2023 13:11:38

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1209202307166000017000120010100000213411438921216

Razon Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING S.A.

RUC/CI: 1691710080001

Fecha Emisión: 12 de Septiembre del 2023

Guía de Remisión:

Número de Documento	Cód. SRI	Descrip. Reten.	% Reten.	Base Retención	Valor Retenido
001-101-000000101	346	1.75% IMPUESTO A LA RENTA	1.75	97,284.25	1,702.47
001-101-000000101	731	100% SRI RESOLUCION 074 075	100.00	11,674.11	11,674.11
				Total	13,376.58

Información Adicional:

Dirección:

Teléfono:

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5608-M

Puyo, 29 de junio de 2023

**PARA:** Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes  
**Directora Financiera (E)**

**ASUNTO:** REINGRESO DE LA PLANILLA DE AVANCE 2 DEL PROYECTO:  
"ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY FRANCISCO DE ORELLANA -  
JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO,  
CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA"

En respuesta al Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-2163-M, de fecha 09 de junio de 2023, se reingresa la Planilla de Avance N° 02 del proyecto: "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO", una vez que la ingeniera Eryka Silva – Subdirectora de Fiscalización (Administrador de Contrato), ha subsanado las observaciones emitidas por su dependencia.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas  
**DIRECTOR DE FISCALIZACION**

Referencias:

- GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5555-M

Anexos:

- planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no\_020784408001682689677.pdf
- anexo\_-\_rubro\_17\_justificativo0758912001682689566.pdf
- anexo\_-\_rubro\_170914262001682689566.pdf
- 25\_oficio\_entrega\_de\_planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no\_02\_lico-gadppz-006-20220840615001682689565.pdf
- 22\_oficio\_devolucion\_de\_planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no\_020704198001682689565.pdf
- anexo\_-\_rubro\_10258539001682689566.pdf
- 01\_of\_entrega\_planilla\_2\_jatunpaccha0566016001682689565.pdf
- informe\_adm\_\_obra\_avance\_2-signed0419060001682689565.pdf
- 27\_oficio\_estructura\_iac0065035001682689566.pdf
- memorando\_nro.\_gadppz-financiero-2023-2163-m.pdf
- oficio\_117\_planilla\_de\_avance\_n\_-020630347001682689677.pdf
- memo\_de\_pago\_planilla\_de\_avance\_no\_020441804001682689677.pdf
- informe\_mensual\_de\_avance\_obra\_no\_020092908001682689677.pdf
- cronograma\_valorado\_de\_trabajo0662202001682689676.pdf
- reajuste\_de\_precios\_provisional\_020921992001682689677.pdf
- anexo\_-\_rubro\_200437576001682689632.pdf
- anexo\_-\_rubro\_210602635001682689632.pdf
- anexo\_-\_rubro\_390987174001682689632.pdf
- anexo\_planta\_y\_perfil\_lamina\_010145276001682689633.pdf
- anexo\_planta\_y\_perfil\_lamina\_020324226001682689633.pdf

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL



Pastaza

29 JUN 2023

Fecha:

Ejecutar el control previo y efectuar  
La contabilización, conforme leyes y  
Reglamentos vigentes.



Pastaza

Fecha:

29 JUN 2023

Ejecutar el control previo al pago  
Conforme leyes y reglamentos  
Vigentes.

1751 = 1702,47 //

Benef = 95,581,78 //



**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5608-M**

**Puyo, 29 de junio de 2023**

- anexo\_secciones\_lamina1-a30537347001682689633.pdf
- anexo\_secciones\_lamina2-a30741572001682689633.pdf
- anexo\_secciones\_lamina3-a30902814001682689633.pdf
- anexo\_secciones\_lamina4-a30068336001682689634.pdf
- anexo\_-\_rubro\_300781967001682689632.pdf
- anexo\_-\_rubro\_4\_justificativo0426690001682689566.pdf
- anexo\_-\_rubro\_40588132001682689566.pdf
- informe\_adm\_obra\_avance\_2-signed0729159001687463875.pdf
- poliza\_de\_fiel\_cumplimiento\_renovada.pdf
- conformidad\_ambiental0011159001687463875.pdf
- comprobantepago\_plani\_afi\_jasper\_(27)0550712001687463874.pdf
- 43\_oficio\_planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no.\_02.pdf
- 002-reajuste\_de\_precios\_planilla\_2.pdf
- 1.1.-acta\_de\_cumplimiento\_de\_parametros.pdf
- check\_list\_tramites\_de\_pago\_2-signed.pdf
- memorando\_nro.\_gadppz-fiscalizacion-2023-5555-m.pdf

Copia:

Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - **Secretaria Ejecutiva 2** /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - Secretaria Ejecutiva 2



JEJAI R FERNANDO  
LEDESMA BASTIDAS

**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5555-M**

**Puyo, 22 de junio de 2023**

**PARA:** Sr. Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas  
**Director de Fiscalización**

**ASUNTO:** CORRECCIONES DE LA PLANILLA DE AVANCE 2 "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA"

En respuesta al Documento No. GADPPZ-FINANCIERO-2023-2162-M, en donde se remiten las observaciones a la Planilla de Obra de Avance 2 del proyecto: "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY- FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO".

Tengo a bien adjuntar las correcciones correspondientes:

1. Archivo digital en CD
2. Informe de Administrador de Contrato
3. Reajuste provisional de la planilla de Avance 2, con mayor número de decimales.
4. Oficio original de la Conformidad Ambiental.
5. Póliza renovada de Fiel Cumplimiento.

Particular que comunico para continuar con el trámite correspondiente.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Ing. Eryka Mireya Silva Manzano  
**SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN**

**Referencias:**

- GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5464-M

**Anexos:**

- planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no\_020784408001682689677.pdf
- 27\_oficio\_estructura\_iac0065035001682689566.pdf
- informe\_adm\_obra\_avance\_2-signed0419060001682689565.pdf
- 01\_of\_entrega\_planilla\_2\_jatunpaccha0566016001682689565.pdf
- anexo\_-\_rubro\_10258539001682689566.pdf
- 22\_oficio\_devolucion\_de\_planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no\_020704198001682689565.pdf
- 25\_oficio\_entrega\_de\_planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no\_02\_lico-gadppz-006-20220860615001682689565.pdf
- anexo\_-\_rubro\_170914262001682689566.pdf
- anexo\_-\_rubro\_17\_justificativo0758912001682689566.pdf
- anexo\_-\_rubro\_40588132001682689566.pdf
- anexo\_-\_rubro\_4\_justificativo0426690001682689566.pdf
- anexo\_-\_rubro\_300781967001682689632.pdf



**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5555-M**

**Puyo, 22 de junio de 2023**

- anexo\_secciones\_lamina4-a30068336001682689634.pdf
- anexo\_secciones\_lamina3-a30902814001682689633.pdf
- anexo\_secciones\_lamina2-a30741572001682689633.pdf
- anexo\_secciones\_lamina1-a30537347001682689633.pdf
- anexo\_planta\_y\_perfil\_lamina\_020324226001682689633.pdf
- anexo\_planta\_y\_perfil\_lamina\_010145276001682689633.pdf
- anexo\_-\_rubro\_390987174001682689632.pdf
- anexo\_-\_rubro\_210602635001682689632.pdf
- anexo\_-\_rubro\_200437576001682689632.pdf
- reajuste\_de\_precios\_provisional\_020921992001682689677.pdf
- cronograma\_valorado\_de\_trabajo0662202001682689676.pdf
- informe\_mensual\_de\_avance\_obra\_no\_\_020092908001682689677.pdf
- memo\_de\_pago\_planilla\_de\_avance\_no\_\_020441804001682689677.pdf
- oficio\_117\_planilla\_de\_avance\_n\_-020630347001682689677.pdf
- memorando\_nro.\_gadppz-financiero-2023-2163-m.pdf
- 1.1.-acta\_de\_cumplimiento\_de\_parametros.pdf
- 002-reajuste\_de\_precios\_planilla\_2.pdf
- 43\_oficio\_planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no.\_02.pdf
- comprobantepago\_plani\_afi\_jasper\_(27)0550712001687463874.pdf
- conformidad\_ambiental0011159001687463875.pdf
- poliza\_de\_fiel\_cumplimiento\_renovada.pdf
- informe\_adm\_\_obra\_avance\_2-signed0729159001687463875.pdf



Firmado electrónicamente por:  
**ERYKA MIREYA SILVA  
MANZANO**



## C.2 AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA DE LA PLANILLA

Fecha de aprobación:	
Días de ampliación aprobados:	
Motivación:	

## C.3 PARALIZACIONES EN EL MES A PLANILLAR

Fecha de suspensión:	NINGUNA
Fecha de reinicio:	NINGUNA

## C.4 REPROGRAMACIONES

No.	Fecha	Motivación
1	25 de enero 2023	Reprogramado a la fecha de inicio.
2		

## C.5 CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

No.	Fecha de suscripción	Código de contrato	Monto	Motivación
1	NINGUNA		0.00	

## D) DESARROLLO DEL PLANILLAJE

PLANILLA: MONTO LÍQUIDO A PAGAR: ANTICIPO DEVENGADO:

PLANILLA 2	\$ 95.049,92	USD
REAJUSTE PROV. AVANCE 2	2.234,33	USD
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 97.284,25</b>	<b>USD</b>

MONTO DE AVANCE 2 ECONÓMICO TOTAL:	\$ 95.049,92
MONTO REAJUSTE PROV. AVANCE 2	2.234,33
TOTAL, ANTICIPO DEVENGADO:	
% DE AVANCE TOTAL:	% 4,96
MULTA PLANILLA 2:	\$ 0,00
TOTAL MULTAS:	\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO A PAGAR EN ESTA PLANILLA:	\$ 97.284,25
<i>(VALOR TOTAL - MULTA - % DE ANTICIPO DEVENGADO)</i>	

## E) ANÁLISIS DEL PERÍODO DE PLANILLAJE

### E.1 ANÁLISIS DE PLANILLAJE

ÍTEM	PARÁMETRO DE CUMPLIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
A	Avance de obra de acuerdo al cronograma	X		
B	Retardo parcial en el período de la planilla		X	
C	Disposiciones del Administrador	X		
D	Disposiciones del Fiscalizador	X		
E	Cumplimiento de especificaciones técnicas	X		
F	Utilización de maquinaria ofertada	X		
G	Asistencia a las reuniones	X		
H	Asistencia del personal ofertado	X		



## INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRA

**PLANILLA No. 2 DE AVANCE DE OBRA**  
Período de Ejecución: 01/03/2023 al 31/03/2023

### A) ANTECEDENTES:

Con fecha 07 de noviembre de 2022, el GAD Provincial de Pastaza suscribe con la CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A., el contrato para la ejecución de la obra: "ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Mediante RESOLUCIÓN N° 713-GADPPz-2022 según RESOLUCIÓN N° 713-GADPPz-2022 de Obra: "ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

### B) DATOS GENERALES:

Código del proceso de contratación:	<b>LICO-GADPPz-006-2022</b>
Objeto del contrato:	"ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".
Monto del contrato:	\$ 4,650,521.23USD sin incluir IVA
Fecha del contrato	07 de noviembre del 2022
Monto del anticipo:	-
Fecha de inicio de plazo:	25 de enero del 2023
Fecha de terminación contractual:	18 de julio de 2024
Contratista:	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A
Administrador de Contrato:	Ing. Eryka Silva M.

### C) PLAZOS Y AVANCE

#### C.1 PLAZO DEL CONTRATO

Plazo total inicial: 540 días.



I	Obstaculización de trabajos a otros contratistas o al contratante		X	
J	Demora en la presentación de planillas a Fiscalización		x	
K	Normativa de Seguridad Industrial y Seguro Ocupacional	X		
L	Normativa de Manejo Ambiental	X		

**E.2 ANÁLISIS DE MULTAS (del periodo planillado)**

ÍTEM	DETALLE DEL OBJETO DE SANCIÓN	MONTO BASE PARA CÁLCULO	%	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	No. DE DÍAS	VALOR DE LA MULTA
A							
B							
C							
D							
TOTAL DE MULTAS EN ESTE PERÍODO DE PLANILLAJE:							

**F) CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN**

GARANTÍA DE BUEN USO DEL ANTICIPO	VIGENTE
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENTE
SEGURO SOCIAL	SI CUMPLE

En virtud del presente informe y en calidad de Administrador de Obra, **SE APRUEBA Y SE SOLICITA** se proceda con el pago de la **Planilla de Avance de Obra No.2**, con el siguiente detalle.

PORCENTAJE DE AVANCE PARCIAL EN ESTE PERÍODO	2,04 %
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	4,96 %
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE PLANILLA AVANCE 2	\$ 95.049,92
VALOR TOTAL DE REAJUSTE PROV. AVANCE 2	\$ 2.234,33
DEVENGACIÓN DEL ANTICIPO EN ESTE PERÍODO	-
DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTAS PARA ESTA PLANILLA	\$0.00
VALOR LIQUIDO A PAGAR:	\$ 97.284,25

SON: noventa y siete mil doscientos ochenta y cuatro 25/100 centavos de dólar.

TODAS LAS RETENCIONES TRIBUTARIAS SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL GADPPz.

Att,



ERKYA MIREYA SILVA  
MANZANO

Ing. Eryka Silva M.  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**

Puyo, 21 de junio del 2023

Ingeniera  
Eryka Mireya Silva Manzano  
**Administrador de Contrato**  
**Contrato LICO-GADPPz-006-2022**  
**GAD Provincial de Pastaza**  
Presente. –

De mi consideración:

Mediante Contrato **LICO-GADPPz-006-2022** suscrito el 07 de noviembre del 2022, dentro del Proceso de **LCC-GADPPz-004-2022**, para la **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**, entre la Compañía **AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.** y el **Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza**, con un Anticipo del 0%, por un monto de **USD \$ 4'650.521,23 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 23/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) SIN INCLUIR IVA**, y un Plazo de 540 Días contados a partir de la suscripción del **Acta de Inicio de Obra**.

En referencia al **Oficio 133 CABA/GADPPz**, de fecha 20 de junio del 2023, suscrito por el Señor Odilo **Vinicio** Guevara Marín. Esta fiscalización, una vez revisadas las correcciones solicitadas se aprueba este documento para continuar los trámites de aprobación permitentes y extiende la Planilla de Avance de Obra No. 02, del Periodo: 1 de marzo al 31 de marzo del 2023.

Por la atención al presente le anticipo mis sinceros agradecimientos.

Sin otro particular por el momento, me despido.

Atentamente,



JESSICA MARIELA  
JARAMILLO  
ARMIJOS

**KEYSZEN S.A.S**  
INGENIERIA & CONSTRUCCION  
Machala - El Oro - Ecuador



Ing. Jessica Jaramillo  
C.C. 0704239128  
Gerente General  
**KEYSZEN S.A.S.**  
RUC 0791840462001

CC. CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
Oficina 072 785 269  
keyszen.sas@gmail.com  
www.keyszen.com  
Machala – El oro - Ecuador

Recibido  
22/06/2023  
PPF  
HJ



# AMAZONAS BUILDING S.A.

Puyo - Pastaza - Ecuador

Oficio, 133 CABA/GADPPz

Puyo, 20 de junio de 2023

Ingeniera

Jessica Mariela Jaramillo Armijos

FISCALIZADOR EXTERNO KEYSZEN S.A.S.

Presente. -

De mi consideración:

Con respecto al contrato "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", del particular debo manifestar lo siguiente:

- Adjunto se servirá encontrar la planilla de avance número 02, con los respectivos anexos y sustentos de justificación para que proceda con su revisión y autorización correspondiente, conforme lo señalado en CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO. - La forma de pago se realizará por planilla de avance mensual, una vez realizadas las correcciones solicitadas en comunicación KEYSOFICIO-040-2023 de fecha 19 de junio/2023.

Particular que comunico a ustedes para los fines legales correspondientes.

Atentamente,

Recibido  
20-06-2023



ODILO VINICIO  
GUEVARA MARIN

Sr. Odilo Guevara

CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

GERENTE



AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD



PROYECTO: "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

PLANILLA DE AVANCE No. 2

PERIODO: 01 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2023

CONTRATISTA: Amazonas Building Amazonbuild S.A.  
FISCALIZADOR EXTERNO: Keyszen S.A.S.

PUYO, PASTAZA - ECUADOR  
2023



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA



REAJUSTE (PROVISIONAL) PLANILLA 2

PROYECTO: ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
UBICACIÓN: PARROQUIA 10 DE AGOSTO-CANTON PASTAZA-PROVINCIA DE PASTAZA
CONTRATISTA: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
ANEXO: REAJUSTE (PROVISIONAL) PLANILLA 2
FECHA: martes, 4 de abril de 2023

POR: \$ 2,234.33

NOTA:

FORMULA POLINOMICA DE REAJUSTE

Pr=Po(0.143 B1/Bc + 0.072 C1/Cc + 0.034 COM1/COMo + 0.372 E1/Eo + 0.128 F1/FO + 0.002 H1/Ho + 0.057 M1/Mo + 0.147 P1/PO + 0.023 T1/To + 0.022 X1/Xo)

CUADRILLA TIPO

Table with columns: DESCRIPCION, COEFICIENTE, JORNAL T.D, TOTAL, PLANILLA # 2 (ago-22, mar-23). Rows include OPERADOR EQUIPO PESADO C1, OPERADOR EQUIPO PESADO C2, SIN TITULO D2, ESTRUCTURA OCUPACIONAL E3, CHOFER C1, ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1, ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2, ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2, ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2.

Table with columns: DESCRIPCION, SIMBOLO, COEFICIENTE E (a), PRECIO O INDICE (b), PRECIO (I) INDICE (c), RELACION d=(c/b), TERMINO e=d\*a, OBSERVACIONES. Rows include MANO DE OBRA, CEMENTO PORTLAND-SACOS, COMBUSTIBLES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCC. VIAL, BETUN PETROLEO, ACERO EN BARRAS, MADERA ASERRADA, MATERIALES PETREOS-TUNGURAHUA, ALCANTARILLAS DE LAMINAS DE METAL Y ACC., VARIOS IPC AMBATO.

Summary table with columns: VALOR DE PLANILLA: \$ 95,049.92, VALOR A REAJUSTE (Po) \$ 95,049.92, VALOR REAJUSTADO (Pr=Po\*f) \$ 97,284.25, VALOR DE REAJUSTE PRECIOS (Pr-Po) \$ 2,234.33.

PERIODO:
FECHA DE CIERRE DE OFERTAS:
FECHA DE REAJUSTE: 1.0235069
OBSERVACIONES: Sub-indices ago-22, mar-23

A FAVOR DEL CONTRATISTA
SON: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DÓLARES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS



Presentado al contratista por: JESSICA MARIELA JARAMILLO ARMIOÑOS

KEYSZEN S.A.S
FISCALIZADOR EXTERNO



Presentado al contratista por: MERYKA NIREYA SILVA MANZANO

MERYKA SILVA
ADMINISTRADOR GADPPZ



Presentado al contratista por: RODILO VINICIO GUEVARA MARIN

CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
CONTRATISTA

## POLIZA DE SEGURO DE FIANZAS PUBLICO

ASEGURADORA DEL SUR C.A. en adelante "La Aseguradora" en virtud de la solicitud de seguro presentada por el interesado, que en adelante se denomina "El Afianzado o Contratista", y que forma parte integrante de ese contrato, se obliga a indemnizar al Asegurado, por las razones previstas en este contrato, de acuerdo a las condiciones generales, aprobadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con Resolución N°. SCVS-16-27-PR-1-123004418-22052020 del 22 de mayo de 2020 y especiales, teniendo prelación las últimas sobre las primeras.

**Emitido en:** AMBATO

**Emisión:** 02/06/2023

**Agente:** 16917279

<b>RAMO</b>		<b>PÓLIZA NÚMERO</b>	<b>SUMA ASEGURADA</b>
FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		1142619	232.536,06
<b>VIGENCIA DEL DOCUMENTO</b>		<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	
DESDE LAS 00:01 DE	HASTA LAS 24:00 DE	PLAZO	RENOVACION
05/06/2023	02/12/2023	180	2

**EL AFIANZADO O CONTRATISTA:** AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S A 1691710080001  
**DIRECCIÓN:** LUIS MOLINA SN ,Dpto. , Piso0,  
**TELÉFONOS:** 0 032861348 0999813185

**EL ASEGURADO:** GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA 1660000170001  
**DIRECCIÓN:** PASTAZA / PUYO / FRANCISCO DE ORELLANA 739 Y 27 DE FEBRERO  
**TELÉFONOS:** 0 032885381 0999123457

**OBJETO DEL CONTRATO:**

ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, SEGÚN PROCESO No. LICO-GADPPz-006-2022

PRIMA	IMPUESTOS Y OTROS	TOTAL CONTADO
4.357,66	728,22	5.085,88

**ESTE FOMULARIO ES UN AVISO DE COBRO**

Mediante esta póliza de seguro incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, según la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, Aseguradora del Sur C.A. se obliga a favor del Beneficiario de esta póliza por los perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación afianzada hasta el monto estipulado como suma asegurada que le ocasionare el afianzado, en caso de terminación del contrato. Esta póliza podrá ser renovada mediante petición escrita del Afianzado o Asegurado. Transcurrido el plazo/vigencia, la presente póliza quedará automáticamente caduca, cesando de hecho toda responsabilidad de la compañía aún en el caso de que no fuera devuelto el original de la misma.

En testimonio de lo acordado se firma este contrato en: AMBATO a 2 DE JUNIO DE 2023

**EL ASEGURADO**



Firmado electrónicamente por:  
GABRIEL ALEJANDRO  
SOSA ESPINEL

**EL CONTRATISTA**



Firmado electrónicamente por:  
RODOLFO VINICIO  
GUEVARA MARIN

**LA ASEGURADORA**



Digitally signed by  
RODRIGO CEVALLOS  
GUEVARA  
Date: 2023.06.02  
11:24:55 -05:00  
Reason: Firma  
Electrónica  
Location: Aseguradora  
del Sur

**ORIGINAL**

<b>MATRIZ QUITO</b> TELS:(02)2997500 FAX:(02)2997553 - 2997588 <b>CUENCA</b> TELS:(07)2819721 -	<b>IBARRA</b> TELS:(06)640920 <b>LOJA</b> TELS:(07)587677 FAX:(07)560995	<b>PORTOVIEJO</b> TELS:(05)632647 FAX:(05)632669	<b>MANTA</b> TELS:(05)625751/626503 FAX:(05)623483	<b>AMBATO</b> TELS:(03)829299/828211 FAX:(03)828534	<b>RIOBAMBA</b> TELS:(03)941063 FAX:(03)965040	<b>MACHALA</b> TELS: (07)2985563 FAX: (07)2985561
--	--	--	--	---	--	---

## CONDICIONES DE LA PÓLIZA N° 1142619

RAMO: CUMPLIMIENTO DE CO  
 MONEDA: DÓLARES  
 LUGAR Y FECHA: AMBATO, Noviembre 1 de 2022

VIGENCIA DE LA POLIZA DESDE: 05/06/2023 HASTA: 02/12/2023

VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE: HASTA:

LAS 00:01 H

LAS 24:00 H (Local)

ASEGURADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL

TLF: 0 032885381

Cel: 0999123457

DIRECCIÓN: PASTAZA / PUYO / FRANCISCO DE ORELLANA 739 Y 27 DE FEBRERO

## FIANZAS

COBERTURAS CONTRATADAS	Sumas Aseguradas hasta: USD	Deducible: Aplica el mayor de los tres		
		% Suma Asegurada	%Valor de Siniestro	Mínimo USD
Fiel Cumplimiento de Contrato	232.536,06			

## DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

El(La) asegurado(a) y/o el(la) solicitante declara libre y voluntariamente, que el seguro solicitado a Aseguradora del Sur C.A., ampara bienes, garantías y contratos de procedencia lícita, los mismos que no están ligados con actividades de Narcotráfico, Lavado de Activos o Financiamiento del Terrorismo. Igualmente, declara que los fondos con los cuales se pagará la prima correspondiente a este contrato de seguros tienen origen lícito y no guardan ninguna relación con las actividades mencionadas anteriormente.

## AUTORIZACIÓN

Siendo conocedor de las disposiciones legales para la Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, autorizo expresamente en forma libre, voluntaria e irrevocable a Aseguradora del Sur C.A. a realizar el análisis y las verificaciones que considere necesarias para corroborar la licitud de fondos y bienes comprendidos en el contrato de seguro; así como autorizo expresa, voluntaria e irrevocablemente a todas las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado a facilitar a Aseguradora del Sur C.A. toda la información que ésta les requiera, inclusive autorizo anticipadamente el levantamiento del sigilo o velo bancario en caso de ser necesario, incluido la revisión de los buró de crédito sobre mi información de riesgos crediticios.

<https://fms.aseguradoradelsur.com/asegsur/v1/fms/uploads/bedc194c-76f0-4390-b851-44b0fbc0f318.pdf>

## Direcciones:

Matriz Quito: Av. De Los Naranjos y De Las Azucenas (02) 2997-500 / Fax: (02)2467-983. Sucursal Ambato: Av. Rodrigo Pachano 13-109 y Juan Montalvo. Sector Ficoa (03)2828-211 / (03)2828-213 / (03) 2829-299. Sucursal Francisco Orellana (Coca): Calle Quito entre Guayaquil y Jorge Rodríguez (06)2883-276 / (06)2881-511. Sucursal Cuenca: Feder Proaño 365 y Honorato de Loyola, a dos cuadras de Pizza Hut. (07)2819-721 / (07)2819-964. Sucursal Ibarra: Victoria Cast Chiriboga 657 y Galo Plaza Lasso, atrás del C.C. La Plaza (06) 2630-920 / (06)2630-868. Sucursal Loja: Av. Av. Orillas Zamora y Segundo Puertas Moreno (07)2560-991 / (07)2587-677. Sucursal Machala: Av. 25 de Junio Km 2 1/2, vía a Pas. Urbanización Ciudad del Sol Mz. L1 (07)279-7087 / (07)279-7089 / 099 844 5197. Sucursal Manta: Calle M1 entre las calles y 24, diagonal al Hotel Oro Verde Manta, edificio 'Manta Business Center', planta baja. (05)2625 -751 / (05)2626-50. (05)2626-052. Sucursal Portoviejo: Av. Manabí y Granda Centeno, frente a la pista del aeropuerto (05)2563-494 / (05)2563-33 / (05)2563-508. Sucursal Riobamba: Uruguay 21-50 y Av. Daniel León Borja (03)2942-830 / (03)2941-063. Sucursal Sa Domingo: Av. Los Naranjos S/N y Av. Quito, 3er piso (frente al SRI). (02)2751-377 / (02)2762-006. Sucursal Guayaquil: Urde Circunvalación Sur #304 y Todos los Santos. (04)501-3050.

Línea de atención al cliente: teléfono: (02) 2997500 / (09)9555-3333.

Página web de la compañía: [www.aseguradoradelsur.com](http://www.aseguradoradelsur.com) <<http://www.aseguradoradelsur.com/>>

Dirección de correo electrónico de contacto: [contacto@asur.ec](mailto:contacto@asur.ec) <<mailto:contacto@asur.ec>>

ORIGINAL

Puyo, 19 de junio del 2023

Señor  
Odilo Vinicio Guevara Marín  
**Gerente General**  
**AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.**  
Presente. –

De mi consideración:

Mediante Contrato **LICO-GADPPz-006-2022** suscrito el 07 de noviembre del 2022, dentro del Proceso de **LCC-GADPPz-004-2022**, para la **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**, entre la Compañía **AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.** y el **Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza**, con un Anticipo del **0%**, por un monto de **USD \$ 4'650.521,23 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 23/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) SIN INCLUIR IVA**, y un Plazo de **540 Días** contados a partir de la suscripción del **Acta de Inicio de Obra**.

En referencia al **OFICIO N° GADPPz-ES-2023-006**, suscrito por Ing. Eryka Silva, de fecha **14 de junio del 2023**.

Adjunto subsanar el hallazgo encontrado de la Planilla de Avance de obra No. 02:

- 1.- En el expediente físico no se adjunta el cd con toda la documentación requirente.
- 2.- No se adjunta el informe del administrador de contrato.
- 3.- Se solicita se trabaje con todos los decimales para el cálculo del reajuste provisional de la planilla, en vista que al multiplicar los valores no coincide el resultado.
- 4.- Falta el oficio original para la Conformidad Ambiental.
- 5.- Adjuntar la póliza renovada de Fiel Cumplimiento.
- 6.- Favor hacer entrega los anexos al mail **keyszen.sas@gmail.com**

Por la atención al presente le anticipo mis sinceros agradecimientos.

Sin otro particular por el momento, me despido.



Recibido  
19/06/2023  
[Signature]

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
**JESSICA MARIELA  
JARAMILLO  
ARMIJOS**



Ing. Jessica Jaramillo  
C.C. 0704239128  
Gerente General  
**KEYSZEN S.A.S.**  
RUC 0791840462001

CC. Administrador del Contrato

Puyo, 14 de junio de 2023

Señor  
KEYSZEN.S.A.S  
**CONTRATISTA**  
Presente. -

De mi consideración:

En calidad de Administradora de contrato del proyecto **"ASFALTADO DE LA VIA CURARAY – FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**.

De acuerdo a Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5464-M emitido por el Director de Fiscalización quien remite las observaciones de la Dirección Financiera con respecto a la Planilla de Obra de Avance 2.

Adjunto Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-545464-M, para su corrección y posterior presentación, reiterando que se deberá emitir las correcciones de manera física y digital.

Particular que comunico, para los fines pertinentes.

Atentamente.



Firmado electrónicamente por:  
ERYKA MIREYA SILVA  
MANZANO

Ing. Eryka Silva M.  
**ADMINISTRADORA DE CONTRATO**

Cc: Odilo Guevara, REPRESENTANTE LEGAL DE AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S. A. -  
CONTRATISTA

Recibido  
15-06-2023  
*[Signature]*  
KEYSZEN S.A.S

*[Signature]*  
15/06/2023



GOBIERNO DE  
**PASTAZA**  
*El Gobierno del Añimo*

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA



DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Pastaza

Fecha:

09 JUN 2023

Recibido:

JUMARA M

Número:

Hora:

14h00

**Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-2163-M**

**Puyo, 09 de junio de 2023**

**PARA:** Sr. Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas  
**Director de Fiscalización**

**ASUNTO:** OBERVACIONES PLANILLA DE AVANCE 2: "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA"

De mi consideración:

Estimado Director, en respuesta al Documento No. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5201-M, una vez realizado el control previo de la planilla de obra de avance 2: "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY- FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, se detalla las siguientes observaciones.

OBSERVACIONES	
Nº	DETALLE
1	En el expediente físico no se adjunta el cd con toda la documentación requirente.
2	No se adjunta el informe del administrador de contrato.
4	Se solicita se trabaje con todos los decimales para el cálculo del reajuste provisional de la planilla, en vista que al multiplicar los valores no coincide el resultado.
5	Falta el oficio original para la Conformidad Ambiental.
6	Adjuntar la póliza renovada de Fiel Cumplimiento.

Las mismas que se requieren cumplan adecuadamente para continuar con el proceso correspondiente.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*


Lcdo. Jaime Eduardo Rivadeneira Jaramillo  
**DIRECTOR FINANCIERO**

Referencias:

- GADPPZ-CONTABILIDAD-2023-0181-M

Anexos:

- 27\_oficio\_estructura\_iac0065035001682689566.pdf  
- informe\_adm\_obra\_avance\_2-signed0419060001682689565.pdf  
- 01\_of\_entrega\_planilla\_2\_jatunpaccha0566016001682689565.pdf  
- anexo\_-\_rubro\_10258539001682689566.pdf  
- 22\_oficio\_devolucion\_de\_planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no\_020704198001682689565.pdf  
- 25\_oficio\_entrega\_de\_planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no\_02\_lico-gadppz-006-20220860615001682689565.pdf



**Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-2163-M**

**Puyo, 09 de junio de 2023**

- anexo\_-\_rubro\_17\_justificativo0758912001682689566.pdf
- anexo\_-\_rubro\_40588132001682689566.pdf
- anexo\_-\_rubro\_4\_justificativo0426690001682689566.pdf
- anexo\_-\_rubro\_300781967001682689632.pdf
- anexo\_secciones\_lamina4-a30068336001682689634.pdf
- anexo\_secciones\_lamina3-a30902814001682689633.pdf
- anexo\_secciones\_lamina2-a30741572001682689633.pdf
- anexo\_secciones\_lamina1-a30537347001682689633.pdf
- anexo\_planta\_y\_perfil\_lamina\_020324226001682689633.pdf
- anexo\_planta\_y\_perfil\_lamina\_010145276001682689633.pdf
- anexo\_-\_rubro\_390987174001682689632.pdf
- anexo\_-\_rubro\_210602635001682689632.pdf
- anexo\_-\_rubro\_200437576001682689632.pdf
- reajuste\_de\_precios\_provisional\_020921992001682689677.pdf
- cronograma\_valorado\_de\_trabajo0662202001682689676.pdf
- informe\_mensual\_de\_avance\_obra\_no\_\_020092908001682689677.pdf
- memo\_de\_pago\_planilla\_de\_avance\_no\_\_020441804001682689677.pdf
- oficio\_117\_planilla\_de\_avance\_n\_-020630347001682689677.pdf
- planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no\_020784408001682689677.pdf

Copia:

Srta. Ing. Mercy Johana Quishpi Cuenca - **Contador 1 /**



Firmado electrónicamente por:  
**JAI ME EDUARDO**  
**ORTVA DENETRA**



Pastaza

Fecha:

11 MAY 2023

Recibido:

Pao Pao

Número:

5201

Hora:

16h20

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5201-M

Puyo, 11 de mayo de 2023

**PARA:** Sr. Téc. Jose Mauricio Marin Montero  
**Director Financiero (E)**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PLANILLA DE AVANCE 2: "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA"

En referencia a los documentos: KEYOFICIO-025-2023, de fecha 25 de abril de 2023, suscrito por la ingeniera Jessica Jaramillo – Gerente General KEYSZEN S.AS; Memorandos Nro. GADPPZ-UNIDAD VIAL-2023-7428-M, de fecha 28 de abril de 2023, suscrito por la ingeniera Eryka Silva– Fiscalizador 1 (Administrador de Contrato), hago hincapié lo siguiente:

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado 408-17 Administrador del contrato, que indica: "El administrador del contrato velará porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegación y supervisión de esas tareas, la comunicación constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicación de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de sí para lograr el éxito del proyecto.- Es función del administrador del contrato establecer un sistema que evalúe el logro de los objetivos, mediante el cual pueda obtenerse información sobre su estado. Esto con el fin de tomar oportunamente acciones correctivas o para informar a las autoridades de la entidad sobre el desarrollo del proyecto"

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado 408-18 Jefe de Fiscalización, indica: "El Jefe de Fiscalización establecerá un sistema para asegurar la correcta ejecución de la obra, mediante el control de la calidad, el avance físico y el avance financiero de la obra. Dichos controles conllevan una evaluación mensual, de los aspectos mencionados y la comunicación de resultados a los mandos superiores, incluyendo los problemas surgidos, especialmente cuando afectan las condiciones pactadas en relación al plazo, presupuesto y calidad de la obra.- El Jefe de Fiscalización, se asegurará de que la obra se ejecute de conformidad con las bases establecidas en los estudios de preinversión, es decir, de acuerdo con el diseño definitivo, las especificaciones y demás normas técnicas aplicables, para lograr obtener del proyecto los beneficios esperados".

Con estos antecedentes, adjunto al presente la Planilla de Avance N° 2 (con todos los anexos), del proyecto "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA", documentación que ha sido revisada y aprobada por el Administrador de Contrato y Fiscalizador; por lo que, en base a los informes anexos, se determina como viable y procedente realizar el pago de \$ 95.049,92 USD (NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 92/100), a favor de AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD, S.A de acuerdo al siguiente detalle:

97 331, 12



ESOS YAM I I

**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5201-M**

**Puyo, 11 de mayo de 2023**

- **PLANILLA DE AVANCE N° 2 \$ 95.049,92 USD**
- **REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA N° 2 de \$2.234,33 USD**
- **VALOR TOTAL A PAGAR \$ 97. 284,25**

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Ing. Álvaro Renato Sosa Castro  
**DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN**

**Referencias:**

- GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2023-7428-M

**Anexos:**

- 27\_oficio\_estructura\_iac0065035001682689566.pdf
- informe\_adm\_obra\_avance\_2-signed0419060001682689565.pdf
- 01\_of\_entrega\_planilla\_2\_jatunpaccha0566016001682689565.pdf
- anexo\_-\_rubro\_10258539001682689566.pdf
- 22\_oficio\_devolucion\_de\_planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no\_020704198001682689565.pdf
- 25\_oficio\_entrega\_de\_planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no\_02\_lico-gadppz-006-20220860615001682689565.pdf
- anexo\_-\_rubro\_170914262001682689566.pdf
- anexo\_-\_rubro\_17\_justificativo0758912001682689566.pdf
- anexo\_-\_rubro\_40588132001682689566.pdf
- anexo\_-\_rubro\_4\_justificativo0426690001682689566.pdf
- anexo\_-\_rubro\_300781967001682689632.pdf
- anexo\_secciones\_lamina4-a30068336001682689634.pdf
- anexo\_secciones\_lamina3-a30902814001682689633.pdf
- anexo\_secciones\_lamina2-a30741572001682689633.pdf
- anexo\_secciones\_lamina1-a30537347001682689633.pdf
- anexo\_planta\_y\_perfil\_lamina\_020324226001682689633.pdf
- anexo\_planta\_y\_perfil\_lamina\_010145276001682689633.pdf
- anexo\_-\_rubro\_390987174001682689632.pdf
- anexo\_-\_rubro\_210602635001682689632.pdf
- anexo\_-\_rubro\_200437576001682689632.pdf
- reajuste\_de\_precios\_provisional\_020921992001682689677.pdf
- cronograma\_valorado\_de\_trabajo0662202001682689676.pdf
- informe\_mensual\_de\_avance\_obra\_no\_020092908001682689677.pdf
- memo\_de\_pago\_planilla\_de\_avance\_no\_020441804001682689677.pdf
- oficio\_117\_planilla\_de\_avance\_n\_-020630347001682689677.pdf
- planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no\_020784408001682689677.pdf

**Copia:**

Sr. Ing. Daniel Anibal Ramos Campaña - **Director de Obras Publicas** / Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - **Secretaria Ejecutiva 2 /**

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Jomara Daniela Martinez Moya - Asistente Administrativo 1



Firmado electrónicamente por:  
**ÁLVARO RENATO SOSA  
CASTRO**

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL  
Pastaza  
Fecha: 11 MAY 2023  
Ejecutar el control previo y efectuar  
La contabilización, conforme leyes y  
Reglamentos Vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL  
Pastaza  
Fecha: 11 MAY 2023  
Ejecutar el control previo al pago  
Conforme leyes y reglamentos  
Vigentes.



GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA



DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Pastaza

29 ABR 2023

Fecha:

Recibido:

JOMARA M

Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2023-7428-M

Número:

Hora:

09h52

Puyo, 28 de abril de 2023

**PARA:** Sr. Ing. Álvaro Renato Sosa Castro  
**Director de Fiscalización**

**ASUNTO:** PLANILLA DE OBRA AVANCE 2 "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA"

De acuerdo a los Art(s). 70. de la LOSNCP; 121. del RLOSNCP; 408 – 16 y 408 - 17 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS (Acuerdo 039-CG), en lo que refiere a la "ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO", en atribuciones exclusivas y únicas a lo que la Ley señala para mi designación como Administrador de Contrato; en relación al contrato "ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", a la presente fecha una vez que el Ing. Fiscalizador Externo ha procedido a remitir la **PLANILLA DE AVANCE 2** correspondiente al mes y periodo desde el 01/03/2023 al 31/03/2023 con un VALOR LIQUIDO A PAGAR de \$ 95.049,92USD Dólares Americanos SIN IVA, con un **REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA N° 2** de \$2.234,33 USD Dólares Americanos SIN IVA, una vez revisada la información me permito manifestar la conformidad de la documentación adjunta para su debido proceso.

En virtud de lo expuesto y en cumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas en el CONTRATO - CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO, solicito por medio de su persona SE PROCEDA CON EL PAGO de la **PLANILLA DE AVANCE 2** a favor del AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A Contratista responsable de la obra. Una vez efectuada todas las correcciones necesarias requeridas es conveniente continuar con el trámite pertinente.

Adjunto información para su debido proceso.

Particular que se comunica para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Eryka Mireya Silva Manzano  
**FISCALIZADOR 1**

Anexos:

- informe\_adm\_obra\_avance\_2-signed0419060001682689565.pdf
- 01\_of\_entrega\_planilla\_2\_jatunpaccha0566016001682689565.pdf
- 22\_oficio\_devolucion\_de\_planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no\_\_020704198001682689565.pdf
- 25\_oficio\_entrega\_de\_planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no\_\_02\_lico-gadppz-006-20220860615001682689565.pdf
- 27\_oficio\_estructura\_iac0065035001682689566.pdf
- anexo\_-\_rubro\_10258539001682689566.pdf
- anexo\_-\_rubro\_4\_justificativo0426690001682689566.pdf



**Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2023-7428-M**

**Puyo, 28 de abril de 2023**

- anexo\_-\_rubro\_40588132001682689566.pdf
- anexo\_-\_rubro\_17\_justificativo0758912001682689566.pdf
- anexo\_-\_rubro\_170914262001682689566.pdf
- anexo\_-\_rubro\_200437576001682689632.pdf
- anexo\_-\_rubro\_210602635001682689632.pdf
- anexo\_-\_rubro\_300781967001682689632.pdf
- anexo\_-\_rubro\_390987174001682689632.pdf
- anexo\_planta\_y\_perfil\_lamina\_010145276001682689633.pdf
- anexo\_planta\_y\_perfil\_lamina\_020324226001682689633.pdf
- anexo\_secciones\_lamina1-a30537347001682689633.pdf
- anexo\_secciones\_lamina2-a30741572001682689633.pdf
- anexo\_secciones\_lamina3-a30902814001682689633.pdf
- anexo\_secciones\_lamina4-a30068336001682689634.pdf
- cronograma\_valorado\_de\_trabajo0662202001682689676.pdf
- informe\_mensual\_de\_avance\_obra\_no\_020092908001682689677.pdf
- memo\_de\_pago\_planilla\_de\_avance\_no\_020441804001682689677.pdf
- oficio\_117\_planilla\_de\_avance\_n\_020630347001682689677.pdf
- planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no\_020784408001682689677.pdf
- reajuste\_de\_precios\_provisional\_020921992001682689677.pdf



Firmado electrónicamente por:  
**ERYKA MIREYA SILVA**  
MANZANO

Puyo, 25 de abril del 2023

Ingeniera  
Eryka Mireya Silva Manzano  
**Administrador de Contrato**  
**Contrato LCC-GADPPz-004-2022**  
**GAD Provincial de Pastaza**  
Presente. –

De mi consideración:

Mediante Contrato **LICO-GADPPz-006-2022** suscrito el 07 de noviembre del 2022, dentro del Proceso de **LCC-GADPPz-004-2022**, para la **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**, entre la Compañía **AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.** y el **Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza**, con un Anticipo del 0%, por un monto de **USD \$ 4'650.521,23 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 23/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) SIN INCLUIR IVA**, y un Plazo de 540 Días contados a partir de la suscripción del **Acta de Inicio de Obra**.

En referencia al **Oficio 120 CABA/GADPPz**, de fecha 20 de abril del 2023, suscrito por el Señor Odilo Vinicio Guevara Marín. Esta fiscalización aprueba este documento para continuar los tramites de aprobación permitentes y extiende la Planilla de Avance de Obra No. 02, del Periodo: 01 al 31 de marzo del 2023.

Por la atención al presente le anticipo mis sinceros agradecimientos.

Sin otro particular por el momento, me despido.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
**JESSICA MARIELA**  
**JARAMILLO ARMIJOS**

Ing. Jessica Jaramillo  
C.C. 0704239128  
Gerente General  
**KEYSZEN S.A.S.**  
RUC 0791840462001

**KEYSZEN**   
INGENIERIA & CONSTRUCCION  
Machala - El Oro - Ecuador

CC. Administrador del Contrato

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
Oficina 072 785 269  
keyszen.sas@gmail.com  
www.keyszen.com  
Machala – El oro - Ecuador



**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

# INFORME DE FISCALIZACIÓN

"ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUN PACHA, HASTA EL KILOMETRO  
12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY – FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO – CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA

KEYSZEN S.A.S.

FISCALIZADOR EXTERNO

**INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA No.02**

**PROYECTO:** ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY – FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO – CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA

**CONTRATISTA:** CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

**MONTO DEL CONTRATO:** 4'650,521.23 USD.

**PERIODO DEL INFORME:** 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023

**FECHA DE ELABORACIÓN:** 04 DE ABRIL DEL 2023

## CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO .....	4
2. ASPECTOS CONTRACTUALES DE LA OBRA .....	5
3. PERIODO DEL INFORME.....	6
4. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO .....	6
5. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS Y PLUVIOMÉTRICAS EN LOS FRENTE DE OBRA ..	9
6. DESCRIPCIÓN POR FRENTE DE OBRA.....	12
7. OBRA EJECUTADA DURANTE EL PERÍODO Y ACUMULADA.....	15
.....	15
8. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN.....	19
9. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS ADOPTADAS PARA CUMPLIR LOS PLAZOS ESTABLECIDOS .....	19
10. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.....	20
11. GESTIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DURANTE EL PERÍODO .....	20
12. RESUMEN DE MONTOS EJECUTADOS PLANILLAS CONTRACTUALES .....	21
13. RESUMEN A LA FECHA DEL PROYECTO .....	21
14. ACCIONES EFECTUADAS POR LA FISCALIZACIÓN.....	21
15. UTILIZACIÓN DE RECURSOS, DE EQUIPOS Y DE MANO DE OBRA .....	22
- INCIDENCIAS PRODUCIDAS EN LA OBRA .....	23
- CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES .....	23
- OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS.....	24
16. CONTROL DE COSTOS.....	24
17. INFORME DETALLADO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 26	
18. RESUMEN DE CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES.....	37
19. REPORTE FOTOGRÁFICO .....	37
20. INFORME DEL PERSONAL.....	39
21. CONCLUSIONES .....	41
22. RECOMENDACIONES.....	41
23. BIBLIOGRAFÍA.....	41
24. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME .....	42

**TABLA DE ILUSTRACIONES**

Ilustración 1 Control de plazo.....	6
Ilustración 2 Categorías de nubosidad en marzo 2023 en Puyo .....	10
Ilustración 3 Probabilidad de precipitación en marzo 2023 en Puyo.....	11
Ilustración 4 Promedio mensual de lluvia en marzo 2023 en Puyo .....	11
Ilustración 5 Diagrama de inversión programado vs ejecutado .....	25
Ilustración 6 Diagrama de avance programado vs ejecutado .....	25

## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

### DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA..
CÓDIGO DEL PROCESO	LICO-GADPPz-006-2022
MONTO DEL CONTRATO	4'650,521.23 USD.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 de enero del 2023
PLAZO CONTRATUAL	540 días
FECHA INICIO DE TRABAJO	25 de enero del 2023
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	18 de julio del 2024
SUSPENSIÓN DE TRABAJO	Ninguno
AMPLIACION DE PLAZO	Ninguno
CONTRATISTA	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
GEOREFERENCIAL DEL PROYECTO	BALNEARIO DEL RÍO ARAJUNO - COMUNIDAD JATUNPACCHA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	ING. ERYKA MIREYA SILVA MANZANO

### DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN

OBJETO DEL CONTRATO	FISCALIZACIÓN EXTERNA DEL ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY – FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO – CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA.
CODIGO DEL PROCESO	LCC-GADPPz-004-2022

MONTO DEL CONTRATO	USD \$ 186,020.85
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 de enero del 2023
PLAZO CONTRACTUAL	540 días
MONTO DEL ANTICIPO	USD \$ 93,010.42
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	24 de enero del 2023
FECHA INICIO DE TRABAJO	25 de enero del 2023
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	18 de julio del 2024
AMPLIACIÓN DE PLAZO	Ninguno
FISCALIZADOR	KEYSZEN S.A.S.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	ING. ERYKA MIREYA SILVA MANZANO

## 2. ASPECTOS CONTRACTUALES DE LA OBRA

### TIEMPO UTILIZADO DESDE LA FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO

El plazo contractual es de 540 días, de los cuales se ha utilizado 35 días desde la entrega del proyecto hasta el presente periodo que corresponde (1 al 31 de marzo / 2023)

	PLAZO	PORCENTAJE
PLAZO TOTAL	540	100%
DÍAS UTILIZADOS	66	12.22%

## Control de avance de plazos

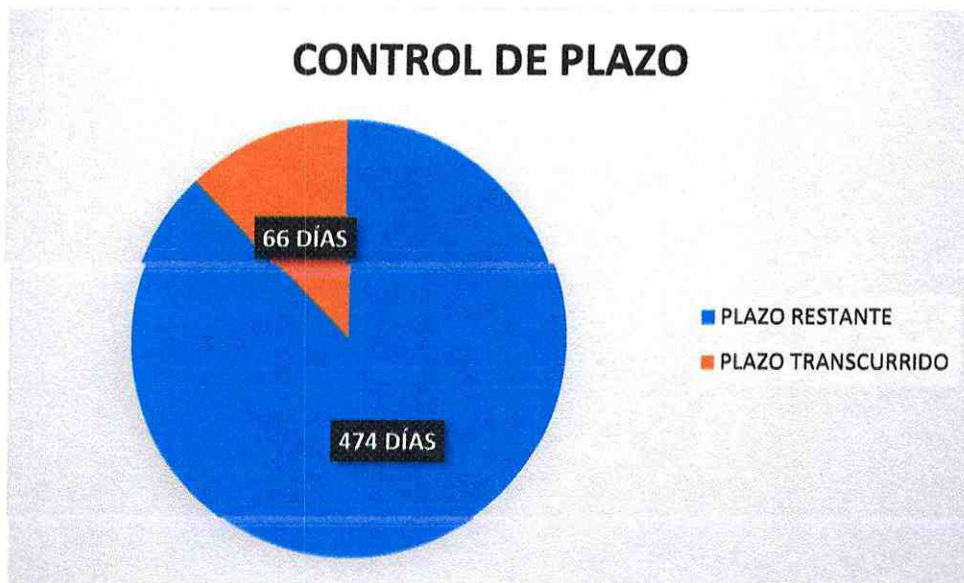


Ilustración 1 Control de plazo

### 3. PERIODO DEL INFORME

El presente informe de avance de trabajos relacionado con la obra, recoge las actividades, eventos y circunstancias operativas ocurridas dentro del periodo:  
MARZO 1 – 31 / 2023.

### 4. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

El monto total del proyecto, alcanza la suma de **USD \$ 4'650,521.23** (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO DÓLARES CON 23/100 CENTAVOS) para la **CONSTRUCCIÓN DE ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY – FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO – CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA.**

TOTAL MONTO DEL PROYECTO:	USD \$ 4'650,521.23	100%
---------------------------	---------------------	------

## Costo total de los diferentes rubros ejecutados

ITEMS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
1	Desbroce, desbosque y limpieza	1,422.14	1,244.38	2,666.52
2	Replanteo y nivelación a nivel de asfalto	2,214.35		2,214.35
3	Remoción de alcantarillas	1,659.12		1,659.12
4	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	3,181.58	4,303.99	7,485.57
5	Excavación de cunetas de coronación			-
6	Excavación para cunetas y encauzamiento			-
7	Excavación y relleno de estructuras menores	11,031.68		11,031.68
8	Limpieza de derrumbes			-
9	S.C. Tubería de acero corrugado D= 0,80 m, e=2.5 mm, PM-100			-
10	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m, e=2.5 mm, PM-100	13,337.80		13,337.80
11	S.C. Tubería de acero corrugado D= 2.20 m, e=2.5 mm, PM-100			-
12	Hormigón para cunetas (F'C=180 KG/CM)			-
13	Muro de H.S. f'c=180kg./cm2 tipo B(Cabezales)			-
14	Hormigón simple en obras de arte F'C=240 KG/CM2			-
15	Hierro estructural fy=4200 kg/cm <sup>2</sup>			-
16	Muro de gaviones - calibre N° 12			-
17	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	20,484.60	22,986.60	43,471.20
18	Material de subbase clase 3	13,995.00		13,995.00
19	Material de base granular de agregados			-
20	Transporte material de desalojo		2,131.80	2,131.80
21	Transporte de material pétreo de mejoramiento	56,298.51	63,174.84	119,473.35
22	Transporte de material pétreo de subbase clase 3	9,275.63		9,275.63
23	Transporte de material pétreo de base granular de agregados			-
24	Imprimación con emulsión asfáltica			-
25	C. rodadura hormigón asf. Mezclado en planta, e=2"			-
26	Bordillo de H.S.(f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> - 0,14x0,40)			-
27	Aceras de H.S. f'c=180kg/cm <sup>2</sup> E=7cm escobillado			-
28	Marcas en pavimento			-
29	Marcas sobre salidas de pavimento (unidireccionales y bidireccionales)			-
30	Pancarta informativa (letrero)-con estructura		1,179.51	1,179.51
31	Señales ecologicas (2.40x1.20)M			-
32	Señales informativas (2.40x1.20)M			-
33	Señales reglamentarias (0.75 x 0.75)M			-
34	Señales preventivas (0.75 x 0.75)M			-
35	Señales informativas y reglamentarias (0.60mx0.80m) móviles	312.72		312.72
36	Señales preventivas tipo barrera (1.22mx0.60m) móviles	653.36		653.36
37	Contenedores metálicos de 55 galones	70.28		70.28
38	Kit antiderrames	630.00		630.00
39	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	28.80	28.80	57.60
40	S/C Cono de seguridad con protección UV, 71cm Incl. cinta reflectiva	449.60		449.60
41	Suministro de paleta de alto v. siqa	121.28		121.28
42	Capacitación sobre preservación de recursos naturales (de 2 a 3 horas)	100.00		100.00
43	Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a 3 horas)	100.00		100.00
44	Capacitación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3 horas)	100.00		100.00

IMPORTANTE				
		T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
DESCUENTOS:	TOTAL	\$ 135,466.45	\$ 95,049.92	\$ 230,516.37
Anticipo	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Mora 0 días	\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>VALOR A PAGARSE</b>		<b>\$ 135,466.45</b>	<b>\$ 95,049.92</b>	<b>\$ 230,516.37</b>

SON: NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE DÓLARES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

## Reajuste de precios

PROYECTO: ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN: PARROQUIA 10 DE AGOSTO-CANTON PASTAZA-PROVINCIA DE PASTAZA

CONTRATISTA: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

ANEXO: REAJUSTE (PROVISIONAL) PLANILLA 2

POR: \$ 2,234.33

FECHA: 4 de Abril de 2023

NOTA:

### FORMULA POLINOMICA DE REAJUSTE

$$P=P_0(0.143 B_1/B_0 + 0.072 C_1/C_0 + 0.034 COM_1/COM_0 + 0.372 E_1/E_0 + 0.128 F_1/F_0 + 0.002 H_1/H_0 + 0.057 M_1/M_0 + 0.147 P_1/P_0 + 0.023 T_1/T_0 + 0.022 X_1/X_0)$$

### CUADRILLA TIPO

DESCRIPCION	COEFICIENTE	Ago-22		Mar-23	
		JORNAL T.D	TOTAL	JORNAL T.D	TOTAL
		OPERADOR EQUIPO PESADO C1	0.059	4.29	0.25
OPERADOR EQUIPO PESADO C2	0.030	4.09	0.12	4.33	0.130
SIN TITULO D2	0.077	3.87	0.30	4.16	0.320
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3	0.000	4.30	0.00	4.55	0.000
CHOFER C1	0.302	5.62	1.70	5.95	1.797
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	0.040	4.29	0.17	4.55	0.182
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2	0.003	4.09	0.01	4.33	0.013
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	0.152	3.87	0.59	4.1	0.623
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	0.337	3.83	1.29	4.05	1.365
	1.000		4.43		4.689

DESCRIPCION	SIMBOLO	COEFICIENTE E (a)	Ago-22		Mar-23		OBSERVACIONES
			PRECIO O INDICE (b)	PRECIO (I) INDICE (c)	RELACION d=(c/b)	TERMINO e=d*a	
			MANO DE OBRA	B	0.143	4.434	
CEMENTO PORTLAND-SACOS	C	0.072	184.780	184.300	0.997	0.072	Nivel Nacional
COMBUSTIBLES (PRECIOS NACIONALES SUBSIDIADOS)(O)	COM	0.034	252.130	252.130	1.000	0.034	Nivel Nacional
EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCC. VIAL	E	0.372	184.350	192.310	1.043	0.388	Nivel Nacional
BETUN PETRÓLEO (ASFALTO) (O)	F	0.128	746.200	746.200	1.000	0.128	Nivel Nacional
ACERO EN BARRAS	H	0.002	301.350	301.350	1.000	0.002	Nivel Nacional
MADERA ASERRADA, CEPILLADA Y/O ESCUADRADA (PREPAR	M	0.057	512.780	514.320	1.003	0.057	Nivel Nacional
MATERIALES PÉTREOS-TUNGURAHUA	P	0.147	221.600	219.720	0.992	0.146	Tungurahua
ALCANTARILLAS DE LÁMINAS DE METAL Y ACC.	T	0.023	202.060	202.060	1.000	0.023	Nivel Nacional
VARIOS IPC AMBATO	X	0.022	109.540	110.360	1.008	0.022	Nivel Nacional
	OK	1.000				1.024	<=FACTOR DE REAJUSTE

VALOR A REAJUSTE (Po)	\$	95,049.92
VALOR REAJUSTADO (Pr=Po*f)	\$	97,284.25
VALOR DE REAJUSTE PRECIOS (Pr-Po)	\$	2,234.33

SON: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DÓLARES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

### VALOR LÍQUIDO A PAGAR

PLANILLA DE AVANCE Nro. 02	\$ 95,049.92 USD
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE Nro. 02	\$ 2,234.33 USD.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 97,284.25 USD.</b>

### Fuentes de financiación del proyecto

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, GADPPz.

### Subcontratistas

Ninguno

### 5. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS Y PLUVIOMÉTRICAS EN LOS FRENTE DE OBRA

ESTADO DEL TIEMPO	MAÑANA	TARDE
01/03/2023	LLUVIOSO	LLUVIOSO
02/03/2023	LLUVIA FUERTE	NUBLADO
03/03/2023	LLUVIA FUERTE	LLUVIA FUERTE
04/03/2023	NUBLADO	LLUVIOSO
05/03/2023	NUBLADO	LLUVIOSO
06/03/2023	LLUVIOSO	SOLEADO
07/03/2023	NUBLADO	SOLEADO
08/03/2023	LLUVIA FUERTE	NUBLADO
09/03/2023	LLUVIA FUERTE	NUBLADO
10/03/2023	LLUVIOSO	LLUVIOSO
11/03/2023	LLUVIOSO	NUBLADO
12/03/2023	LLUVIOSO	NUBLADO
13/03/2023	LLUVIOSO	NUBLADO
14/03/2023	LLUVIA FUERTE	LLUVIA FUERTE
15/03/2023	LLUVIA FUERTE	LLUVIA FUERTE
16/03/2023	SOLEADO	SOLEADO
17/03/2023	NUBLADO	LLUVIOSO
18/03/2023	LLUVIOSO	LLUVIA FUERTE

19/03/2023	SOLEADO	LLUVIOSO
20/03/2023	LLUVIA FUERTE	LLUVIOSO
21/03/2023	LLUVIA FUERTE	LLUVIOSO
22/03/2023	NUBLADO	SOLEADO
23/03/2023	SOLEADO	SOLEADO
24/03/2023	LLUVIA FUERTE	LLUVIOSO
25/03/2023	SOLEADO	SOLEADO
26/03/2023	LLUVIOSO	SOLEADO
27/03/2023	SOLEADO	SOLEADO
28/03/2023	LLUVIA FUERTE	LLUVIA FUERTE
29/03/2023	LLUVIA FUERTE	LLUVIA FUERTE
30/03/2023	LLUVIOSO	SOLEADO
31/03/2023	NUBLADO	LLUVIOSO

## Nubosidad

El mes de marzo, Puyo tiene nubosidad que permanece esencialmente constante y el porcentaje de tiempo que el cielo está nublado o mayormente nublado permanece en alrededor del 84 % durante el mes. La probabilidad más alta de tener condiciones nubladas o mayormente nubladas es del 86 % el 4 de marzo.

El día más despejado del mes es el 31 de marzo, con condiciones despejadas, mayormente despejadas o parcialmente nubladas el 18 % del tiempo. (Weatherspark, 2023)

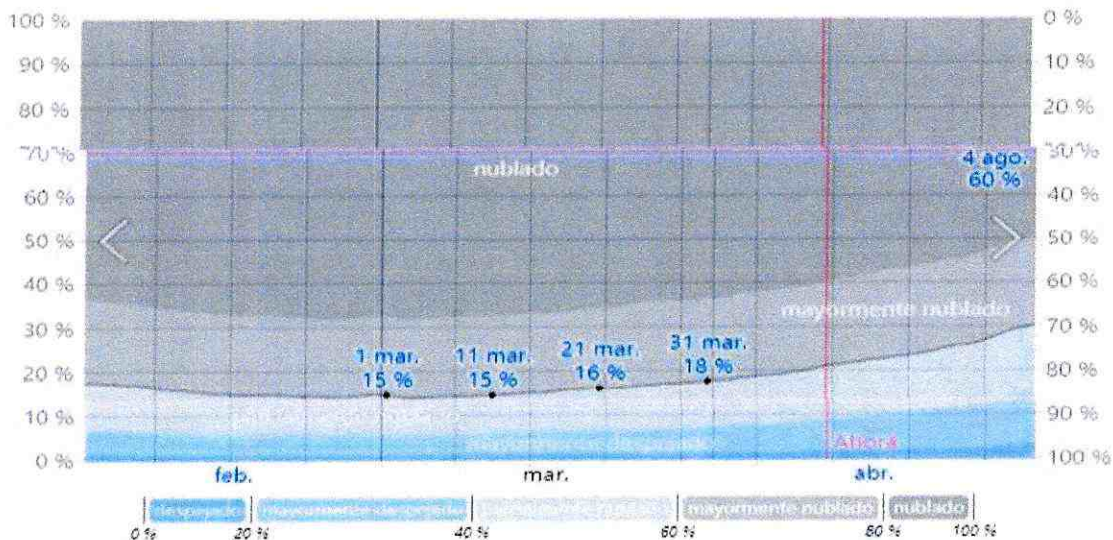


Ilustración 2 Categorías de nubosidad en marzo 2023 en Puyo

## Precipitación

Un día mojado es un día con por lo menos 1 milímetro de líquido o precipitación equivalente a líquido. En Puyo, la probabilidad de un día mojado durante marzo aumenta, y comienza el mes en 67 % y termina en 71 %.

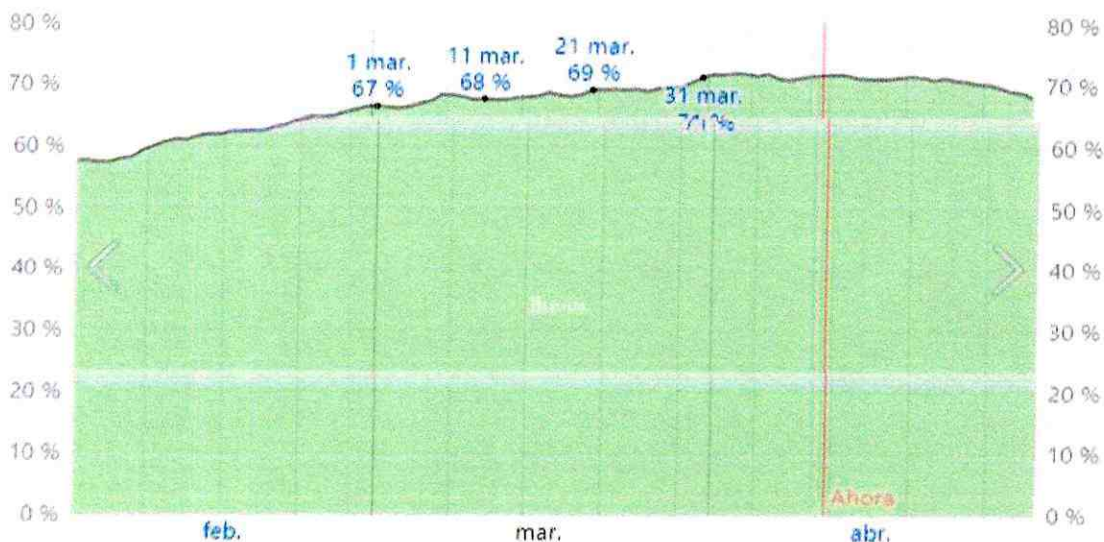


Ilustración 3 Probabilidad de precipitación en marzo 2023 en Puyo

## Lluvia

Para mostrar la variación durante el mes y no sólo el total mensual, mostramos la precipitación de lluvia acumulada durante un periodo de 31 días en una escala móvil, centrado alrededor de cada día.

El promedio de lluvia durante un periodo de 31 días en una escala móvil en marzo en Puyo aumenta, comenzando el mes con 148 milímetros, cuando rara vez excede 230 milímetros o es menos de 71 milímetros, y terminando el mes con 171 milímetros.

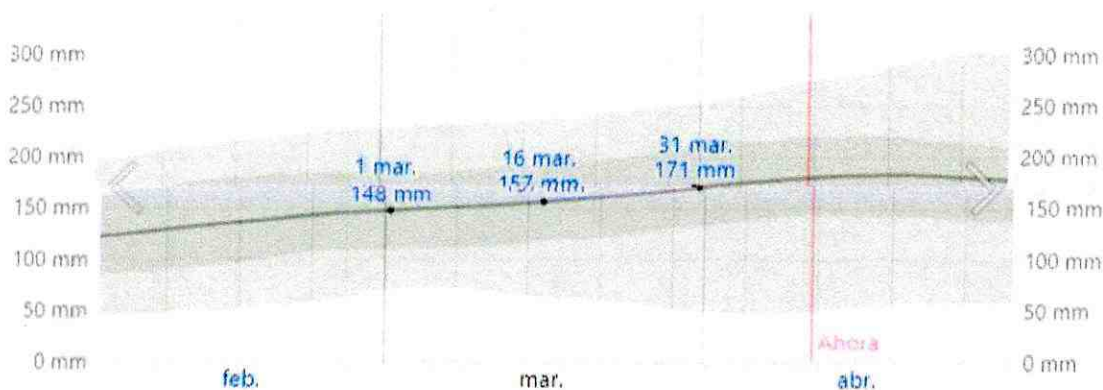


Ilustración 4 Promedio mensual de lluvia en marzo 2023 en Puyo

## 6. DESCRIPCIÓN POR FRENTE DE OBRA

### DESCRIPCIÓN DE RUBROS EN EJECUCIÓN

Desbroce, desbosque y limpieza

Excavación sin clasificar (mov. de tierra)

Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)

Transporte **material** de desalojo

Transporte **de** material pétreo de mejoramiento

Pancarta **informativa** (letrero)-con estructura

Cinta **peligro** colores intensos (mat. polietileno)

## Cantidades de los diferentes rubros ejecutados

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES			
		T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL
1	Desbroce, desbosque y limpieza	3.20	2.80	6.00	20.56%
2	Replanteo y nivelación a nivel de asfalto	1.60		1.60	10.97%
3	Remoción de alcantarillas	62.00		62.00	25.51%
4	Excavación sin clasificar (mov. de tierra)	3,119.20	4,219.60	7,338.80	10.66%
5	Excavación de cunetas de coronación			-	0.00%
6	Excavación para cunetas y encauzamiento			-	0.00%
7	Excavación y relleno de estructuras menores	2,171.59		2,171.59	28.13%
8	Limpieza de derrumbes			-	0.00%
9	S.C. Tubería de acero corrugado D= 0,80 m, e=2,5 mm, PM-100			-	0.00%
10	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m, e=2,5 mm, PM-100	49.00		49.00	18.63%
11	S.C. Tubería de acero corrugado D= 2.20 m, e=2.5 mm, PM-100			-	0.00%
12	Hormigon para cunetas (F'C=180 KG/CM)			-	0.00%
13	Muro de H.S. f'c=180kg/cm2 tipo B(Cabezales)			-	0.00%
14	Hormigón simple en obras de arte F'C=240 KG/CM2			-	0.00%
15	Hierro estructural fy=4200 kg/cm <sup>2</sup>			-	0.00%
16	Muro de gaviones - calibre N° 12			-	0.00%
17	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	6,828.20	7,682.20	14,490.40	17.40%
18	Material de subbase clase 3	1,125.00		1,125.00	5.35%
19	Material de base granular de agregados			-	0.00%
20	Transporte material de desalojo		2,090.00	2,090.00	23.90%
21	Transporte de material pétreo de mejoramiento	225,194.04	252,699.36	477,893.40	14.44%
22	Transporte de material pétreo de subbase clase 3	37,102.50		37,102.50	4.75%
23	Transporte de material pétreo de base granular de agregados			-	0.00%
24	Imprimación con emulsión asfáltica			-	0.00%
25	C. rodadura hormigon asf. Mezclado en planta, e=2"			-	0.00%
26	Bordillo de H.S.(f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> - 0,14x0,40)			-	0.00%
27	Aceras de H.S. f'c=180kg/cm <sup>2</sup> E=7cm escobillado			-	0.00%
28	Marcas en pavimento			-	0.00%
29	Marcas sobre salidas de pavimento (unidireccionales y bidireccionales)			-	0.00%
30	Pancarta informativa (letrero)-con estructura		1.00	1.00	100.00%
31	Señales ecológicas (2.40x1.20)M			-	0.00%
32	Señales informativas (2.40x1.20)M			-	0.00%
33	Señales reglamentarias (0,75 x 0,75)M			-	0.00%
34	Señales preventivas (0,75x0,75)M			-	0.00%
35	Señales informativas y reglamentarias (0.60mx0.80m) móviles	4.00		4.00	100.00%
36	Señales preventivas tipo barrera (1.22mx0.60m) móviles	4.00		4.00	100.00%
37	Contenedores metálicos de 55 galones	4.00		4.00	100.00%
38	Kit antiderrames	4.00		4.00	100.00%
39	Cinta peligró colores intensos (mat. polietileno)	90.00	90.00	180.00	18.00%
40	S/C Cono de seguridad con protección UV, 71cm Incl. cinta reflectiva	20.00		20.00	100.00%
41	Suministro de paleta de alto y siga	4.00		4.00	100.00%
42	Capacitación sobre preservación de recursos naturales (de 2 a 3 horas)	1.00		1.00	100.00%
43	Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a 3 horas)	1.00		1.00	100.00%
44	Capacitación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3 horas)	1.00		1.00	100.00%

## Avance físico

AVANCE PROGRAMADO	1.58 %
AVANCE EJECUTADO	2.04 %
AVANCE CONTRATO CONTRACTUAL	95,049.92 USD

## Avance económico parcial y acumulado

PLANILLAS	VALORES					% PORCENTAJES			
	MONTO PROGRAMADO		MONTO PLANILLADO			AVANCE PROGRAMADO		AVANCE EJECUTADO	
	MES	ACUM	ANTERIOR	ACTUAL	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM
PLANILLA	73,239.23	146,535.65	135,466.45	95,049.92	230,516.37	1.58	3.15	2.04	4.96
OBRA CIVIL EXCEDENTE									
OBRA CIVIL RUBROS NUEVOS									
<b>TOTAL</b>	<b>73,239.23</b>	<b>146,535.65</b>	<b>135,466.45</b>	<b>95,049.92</b>	<b>230,516.37</b>	<b>1.58</b>	<b>3.15</b>	<b>2.04</b>	<b>4.96</b>

DESCRIPCION No	PLANILLA	VALOR	PORCENTAJE
CONTRATUAL 2	1 marzo – 31 marzo	\$ 95,049.92	2.04 %
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 95,049.92</b>	<b>2.04 %</b>

**Observación:** El contratista cumple con el cronograma valorado de trabajo según se anexa tabla comparativa del mes de marzo.

## 7. OBRA EJECUTADA DURANTE EL PERÍODO Y ACUMULADA

PROYECTO:		ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA					
CONTRATISTA:		CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.					
PLANILLA N°:		2				N° RUBRO: 1	
PERIODO:		01-Mar-23		-		31-Mar-23 UNIDAD: Ha	
Desbroce, desbosque y limpieza							
TRAMO	ABSCISADO		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m <sup>2</sup> )	CANTIDAD EJECUTADA (Ha)	OBSERVACIONES
	DESDE	HASTA					
1	1+600.00	3+000.00	1,400.00	20.00	28,000.00	2.80	
TOTAL						2.80	
PLANILLADO ANTERIORMENTE =						3.20 Ha	
TOTAL CONTRATADO =						29.18 Ha	
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =						2.80 Ha	
CANTIDAD PLANILLADA =						6.00 Ha	
EXCEDENTES =						- Ha	

PROYECTO:		ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA					
CONTRATISTA:		CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.					
PLANILLA N°:		2				N° RUBRO: 4	
PERIODO:		01-Mar-23		-		31-Mar-23 UNIDAD: m <sup>3</sup>	
Excavación sin clasificar (mov. de tierra)							
TRAMO	ABSCISADO		CANTIDAD EJECUTADA (m <sup>3</sup> )	VOLUMEN EXCAVADO (m <sup>3</sup> )	OBSERVACIONES		
	DESDE	HASTA					
1	1+600.00	3+000.00	4,219.60	4,219.60	Ver anexo justificativo Rubro 4		
TOTAL				4219.60			
PLANILLADO ANTERIORMENTE =				3,119.20 m <sup>3</sup>			
TOTAL CONTRATADO =				68,863.54 m <sup>3</sup>			
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =				4,219.60 m <sup>3</sup>			
CANTIDAD PLANILLADA =				7,338.80 m <sup>3</sup>			
EXCEDENTES =				- m <sup>3</sup>			

PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA							
CONTRATISTA:	CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.							
PLANILLA N°:	2				N° RUBRO:	4		
PERIODO:	01-Mar-23		-		31-Mar-23		UNIDAD:	m³
Excavación sin clasificar(mov.de tierra)								
Abs. 1+600 a la 3+000								
ABSCISAS	LONGITUD (M)	CAJERAS (M2)	ÁREA CORTE (M2)	ÁREA T. CORTE. (M2)	ÁREA PROMEDIO (M2)	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO (M3)	
1+600.00		1.73	1.6	3.33				
	20.00				4.42	88.40	88.40	
2+940.00		1.9	0.13	2.03				
	20.00				1.80	36.00	4,148.00	
2+960.00		1.57	0	1.57				
	20.00				1.42	28.40	4,176.40	
2+980.00		1.23	0.03	1.26				
	20.00				2.16	43.20	4,219.60	
3+000.00		2.42	0.64	3.06				
<b>SUB TOTAL EJECUTADO (M3)</b>							<b>4,219.60</b>	

PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA							
CONTRATISTA:	CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.							
PLANILLA N°:	2				N° RUBRO:	17		
PERIODO:	01-Mar-23		-		31-Mar-23		UNIDAD:	m³
Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)								
TRAMO	ABSCISADO		CANTIDAD EJECUTADA (m3)	OBSERVACIONES				
	DESDE	HASTA						
1	1+600.00	3+000.00	7,662.20	Ver anexo justificativo Rubro 17				
			<b>TOTAL</b>	<b>7,662.20</b>				
PLANILLADO ANTERIORMENTE =				6,828.20 m³				
TOTAL CONTRATADO =				68,863.54 m³				
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA :				7,662.20 m³				
CANTIDAD PLANILLADA =				14,490.40 m³				
EXCEDENTES =				- m³				

PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA						
CONTRATISTA:	CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.						
PLANILLA No.	2					Nº RUBRO	17
PERIODO:	01-Mar-23		-			31-Mar-23	
						UNIDAD:	m³
Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)							
Abs. 1+600 a la 3+000							
ABSCISAS	LONGITUD (M)	CAJERAS (M2)	ÁREA RELLENO (M2)	AREA T. (M2)	ÁREA PROMEDIO	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO (M3)
1+600.00		1.73	0	1.73			
	20.00	0			2.02	40.40	40.40
1+620.00		2.31	0	2.31			
	20.00	0			2.17	43.40	83.80
1+640.00		2.02	0	2.02			
2+960.00		1.57	1.31	2.88			
	20.00	0			3.18	63.60	7,603.20
2+980.00		1.23	2.25	3.48			
	20.00	0			2.95	59.00	7,662.20
3+000.00		2.42	0	2.42			
						7,662.20	
SUB TOTAL EJECUTADO (M3)						7,662.20	
TOTAL EJECUTADO EN PLANILLA (M3)						7,662.20	

PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA															
CONTRATISTA:	CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.															
PLANILLA No.:	2										Nº RUBRO	20				
PERIODO:	01-Mar-23					-					31-Mar-23					
											UNIDAD:	m³				
Transporte material de desalojo																
DESCRIPCIÓN	VOLQUETA	DIMENSIONES (m)						DESCUENTO				CUBICAJE		VIAJES	VIAJES	OBSERVACIONES
		LARGO (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	BASE MENOR (m)	BASE MAYOR (m)	ANCHO (m)	DESCUENTO (balde redondo)	VOLUMEN (m3)		Numero	Volumen desalojado m3				
									REAL	ASUMIDO						
Desalojo mecanico volqueta tierra/escombros	VOLQUETA 1	4.4	2.2	1.2	0.5	0.8	0.31		10.63	10	11	110	distancia a la escombrera 1.5 km			
	VOLQUETA 2	4.4	2.1	1.1	0.5	0.8	0.32		10.17	10	11	110	distancia a la escombrera 1.5 km			
	VOLQUETA 3	4.4	2.2	1.3	0.45	0.8	0.25		12.28	12	11	132	distancia a la escombrera 1.5 km			
	VOLQUETA 4	4.5	2.2	1.4	0.5	0.8	0.39		13.21	13	11	143	distancia a la escombrera 1.5 km			
	VOLQUETA 5	4.4	2.2	1.2	0.5	0.8	0.39		10.83	10	11	110	distancia a la escombrera 1.5 km			
	VOLQUETA 6	4.4	2.1	1.2	0.5	0.86	0.28		10.75	10	11	110	distancia a la escombrera 1.5 km			
	VOLQUETA 7	4.4	2.2	1.2	0.5	0.9	0.39		10.68	10	11	110	distancia a la escombrera 1.5 km			
	VOLQUETA 8	4.4	2.3	1.2	0.38	0.6	0.24		12.39	12	11	132	distancia a la escombrera 1.5 km			
	VOLQUETA 9	4.4	2.2	1.2	0.55	0.9	0.29		11.04	11	11	121	distancia a la escombrera 1.5 km			
	VOLQUETA 10	4.3	2.2	1.2	0.5	0.85	0.29		10.72	10	11	110	distancia a la escombrera 1.5 km			
	VOLQUETA 11	4.7	2.2	1.2	0.14	0.4	0.3		12.44	12	11	132	distancia a la escombrera 1.5 km			
	VOLQUETA 12	4.5	2.4	1.2	0.3	0.35	0.3		12.06	12	11	132	distancia a la escombrera 1.5 km			
	VOLQUETA 13	4.3	2.3	1.2					11.06	11	11	121	distancia a la escombrera 1.5 km			
	VOLQUETA 14	4.7	2.3	1.1	0.33	0.82	0.27		11.63	11	11	121	distancia a la escombrera 1.5 km			
	VOLQUETA 15	4.7	2.3	1.1	0.34	0.8	0.3		11.99	12	11	132	distancia a la escombrera 1.5 km			
	VOLQUETA 16	4.9	2.2	1.4					14.74	14	11	154	distancia a la escombrera 1.5 km			
	VOLQUETA 17	4.4	2.2	1.1	0.5	0.9	0.35		10.33	10	11	110	distancia a la escombrera 1.5 km			
<b>TOTAL</b>											<b>2090.00</b>					
PLANILLADO ANTERIORMENTE =														-	m³	
TOTAL CONTRATADO =														8,746.43		m³
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =														2,090.00		m³
CANTIDAD PLANILLADA														2,090.00		m³
EXCEDENTES =														-		m³

<b>PROYECTO:</b>		ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA						
<b>CONTRATISTA:</b>		CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.						
<b>PLANILLA N°:</b>		2			<b>N° RUBRO:</b>		21	
<b>PERIODO:</b>		01-Mar-23		-		31-Mar-23		
				<b>UNIDAD:</b>		m² - km		
Transporte de material pétreo de mejoramiento								
<b>TRAMO</b>	<b>ABSCISADO</b>		<b>CANTIDAD EJECUTADA A</b> (m3)	<b>DISTANCIA MINA INICIO PROYECTO</b> (Km)	<b>CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO</b> (Km)	<b>DISTANCIA TOTAL</b> (Km)	<b>TOTAL</b> (m² - Km)	<b>OBSERVACIONES</b>
	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>						
1	1+600.00	3+000.00	7,662.20	31.33	1.65	32.98	252,699.36	Cantidades detalladas en Anexo 17
<b>SUB TOTAL</b>							252,699.36	
		<b>PLANILLADO ANTERIORMENTE =</b>		225,194.04		m² - km		
		<b>TOTAL CONTRATADO =</b>		3,309,493.83		m² - km		
		<b>CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =</b>		252,699.36		m² - km		
		<b>CANTIDAD PLANILLADA</b>		477,893.40		m² - km		
		<b>EXCEDENTES =</b>		-		m² - km		

<b>PROYECTO:</b>		ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA					
<b>CONTRATISTA:</b>		CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.					
<b>PLANILLA N°:</b>		2			<b>N° RUBRO:</b>		30
<b>PERIODO:</b>		01-Mar-23		-		31-Mar-23	
				<b>UNIDAD:</b>		u	
Pancarta Informativa (letrero)-con estructura							
<b>DESCRIPCIÓN DEL IMPLEMENTO</b>				<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
Pancarta informativa (letrero)-con estructura				u	1.00		
<b>TOTAL</b>					<b>1.00</b>		
		<b>PLANILLADO ANTERIORMENTE =</b>		-		u	
		<b>TOTAL CONTRATADO =</b>		1.00		u	
		<b>CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =</b>		1.00		u	
		<b>CANTIDAD PLANILLADA</b>		1.00		u	
		<b>EXCEDENTES =</b>		-		u	

<b>PROYECTO:</b>		ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA					
<b>CONTRATISTA:</b>		CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.					
<b>PLANILLA N°:</b>		2			<b>N° RUBRO:</b>		39
<b>PERIODO:</b>		01-Mar-23		-		31-Mar-23	
				<b>UNIDAD:</b>		m	
Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)							
<b>DESCRIPCIÓN</b>				<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)					90.00		
<b>TOTAL</b>					<b>90.00</b>		
		<b>PLANILLADO ANTERIORMENTE =</b>		90.00		m	
		<b>TOTAL CONTRATADO =</b>		100.00		m	
		<b>CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =</b>		90.00		m	
		<b>CANTIDAD PLANILLADA</b>		180.00		m	
		<b>EXCEDENTES =</b>		80.00		m	

## **8. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN**

- Se ha revisado la ejecución de los trabajos de acuerdo a las especificaciones técnicas, y a las actividades presupuestadas y al cronograma de trabajos para la construcción del proyecto.
- Se ha ejercido la supervisión continua de los equipos y materiales en el proyecto.
- Se atendió oportunamente las consultas y requerimientos del Contratista.
- Se ha controlado el avance de todos los trabajos realizados.
- Se ha vigilado el cumplimiento de todas las Normas y Reglamentos de Seguridad Industrial y Ambiental de acuerdo a las especificaciones contractuales.
- Se han aprobado los procedimientos de trabajo empleados por el Contratista.
- Se ha exigido al Contratista el cumplimiento de la Leyes Laborales y reglamentos de Seguridad Industrial, Ambiental, etc.
- Se ha verificado que el Personal Técnico y el equipo del Constructor sea idóneo y suficiente para la obra.
- Oportunamente se han dado soluciones técnicas a los problemas surgidos durante la ejecución de la obra.
- Se ha vigilado periódicamente el cumplimiento del contrato de construcción, para que el proyecto se ejecute de acuerdo a especificaciones técnicas y programas de trabajos.

## **9. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS ADOPTADAS PARA CUMPLIR LOS PLAZOS ESTABLECIDOS**

La fiscalización a organizado los controles de supervisión de campo, control de calidad de materiales y topografía, en acción permanente en los frentes de trabajo de la obra.

En oficina se dispone del personal técnico para el procesamiento de información y documentos en atención a todas las áreas de control técnico, financieros, actas de trabajo, programación de actividades, administrativo y contractual.

El grupo de profesionales mantiene como objetivo principal y base del cumplimiento de sus funciones, el aseguramiento permanente de calidad y los productos para la satisfacción del GAD Provincial de Pastaza y los usuarios beneficiarios del proyecto.

## 10. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se reporta la evidencia de charlas de seguridad, higiene y salud en el trabajo, previo al inicio de la jornada laboral, documentadas estas charlas con evidencia fotográfica. La misma que brinda información clara y precisa al personal sobre la seguridad en un ambiente laboral, para lo cual se realiza el análisis de la situación actual de la empresa y se identifica cuáles son los riesgos existentes en cada uno de los puestos de trabajo, que sirva de fundamento para el trabajo diario, y de esta manera establecer procedimientos de prevención y protección contra riesgos de trabajo.

Para minimizar los riesgos de trabajo, la fiscalización vigila que se tomen todas las medidas de seguridad, verificando que se ejecuten las obras de protección estipuladas, ya que no se permite ubicar fuera del sitio de trabajo, equipos, herramientas o materiales que interfieran con el tráfico, a fin de minimizar las molestias al público.

## 11. GESTIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DURANTE EL PERÍODO

Control del trabajo realizado por la maquinaria, verificando el buen estado de las misma y su óptimo rendimiento.

Verificación de Abscisas con sus respectivas áreas y volúmenes de movimientos de tierra.

Revisión y aprobación de la Planilla de Avance de Obra No. 2

El contratista deberá realizar los trabajos necesarios para la protección ambiental de la obra, así como cumplir con todos los parámetros de seguridad industrial para sus trabajadores y cumplir con las obligaciones laborales.

Verificación de la colocación de señales informativas, preventivas y reglamentarias.

Revisión del uso de contenedores metálicos de 55 galones y el uso de Kit antiderrames  
Comprobación de la utilización de los conos de seguridad con protección UV, que incluyen cinta reflectiva

Registro de las capacitaciones brindadas al personal sobre preservación de recursos naturales, manejo de desechos peligrosos, capacitación en seguridad y salud ocupacional.

## 12. RESUMEN DE MONTOS EJECUTADOS PLANILLAS CONTRACTUALES

PLANILLA	MES	MONTO DE OBRA PROGRAMADO	PORCENTAJE DE OBRA PROGRAMADO	MONTO DE OBRA EJECUTADO	PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO
Planilla de Avance No. 02	1 marzo – 31 marzo/ 2023	73,239.23	1.58 %	95,049.92	2.04 %
	TOTAL	73,239.23	1.58 %	95,049.92	2.04 %

## 13. RESUMEN A LA FECHA DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	MONTO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
MONTO DEL CONTRATO	4'650,521.23	100 %	Los trabajos se están realizando conforme al cronograma.
PLANILLAS CONTRACTUALES	230,516.37	4.96 %	
MONTO DE INCREMENTOS			
MONTO DE DECREMENTOS			
CONTRATO COMPLEMENTARIO			
COSTO + PORCENTAJE			

## 14. ACCIONES EFECTUADAS POR LA FISCALIZACIÓN

Las actividades y acciones efectuadas por el equipo de Fiscalización del Proyecto están determinadas por el contrato de Consultoría y por los términos de referencia. Son actividades que se realizan en forma permanente y rutinaria y están enfocadas básicamente a: control de calidad de los materiales y de la ejecución de los rubros que se incorporan al proyecto; estado y número de maquinaria disponible en la ejecución de los trabajos; número y desempeño del personal del contratista; solución de los problemas que afecten a la obra y tramite de los aspectos administrativos vinculados al proyecto.

## 15. UTILIZACIÓN DE RECURSOS, DE EQUIPOS Y DE MANO DE OBRA

### VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL DEL CONTRATISTA

PERSONAL OFERTADO	PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA	CHECK LIST
SUPERINTENDENTE	SUPERINTENDENTE	OK
RESIDENTE	RESIDENTE	OK
INGENIERO AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	OK
TÉCNICO EN SEGURIDAD	TÉCNICO EN SEGURIDAD	OK
ING. AYUDANTE	ING. AYUDANTE	OK
TOPOGRAFO	TOPOGRAFO	OK
CADENERO	CADENERO	OK
OPERADORES	OPERADORES	OK
CHOFERES	CHOFERES	OK
MECANICO	MECANICO	OK
AYUDANTE DE MECÁNICO	AYUDANTE DE MECÁNICO	OK
INSPECTORES	INSPECTORES	OK
ALBAÑILES	ALBAÑILES	OK
SOLDADORES	SOLDADORES	OK
JORNALEROS	JORNALEROS	OK

### VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA DEL CONTRATISTA

EQUIPO Y MAQUINARIA OFERTADO	EQUIPO Y MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA	CHECK LIST
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	OK
MOTONIVELADORA	MOTONIVELADORA	OK
CAMIÓN CISTERNA	CAMIÓN CISTERNA	OK
VOLQUETES	VOLQUETES	OK
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	OK
PLANTA DE ASFALTO	PLANTA DE ASFALTO	OK
TERMINADORA DE ASFALTO	TERMINADORA DE ASFALTO	OK
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	OK
RODILLO VIBRATORIO LISO	RODILLO VIBRATORIO LISO	OK
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	OK

CONCRETERA 1 SACO	CONCRETERA 1 SACO	OK
MINICARGADORA	MINICARGADORA	OK
APARATOS DE TOPOGRAFÍA	APARATOS DE TOPOGRAFÍA	OK

## PERSONAL PROPUESTO POR EL FISCALIZADOR

No	FUNCIÓN	CANTIDAD	NOMBRE	COMPROMISO
1	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	1	DANNY DANIEL DURAN CABRERA	100 %
2	RESIDENTE	1	RICARDO WELLINGTON CARPIO JARAMILLO	100 %
3	INGENIERO AMBIENTAL	1	JESSICA GISSELLA GOROZABEL ROSILLO	50 %
4	CONTADOR GENERAL	1	AVEIGA FAUBLA MARITZA MARIA	100 %
5	CHOFER: OTROS CAMIONES	1	MAXI VALLE ERWIN JOSUE	100 %
6	GERENTE / AFINES	1	JARAMILLO ARMIJOS JESSICA MARIELA	100 %

## EQUIPO E INSTRUMENTOS PROPUESTO POR EL FISCALIZADOR

No	FUNCIÓN	CANTIDAD	CARACTERÍSTICAS	PLACA / FACTURA / MATRÍCULA
1	CAMIONETA JAC T.8	1	MODELO: FC1037D3KST LUXURY T.8 AC 2.0 CD 4X4 T.M. DIESEL	QBC2109
2	LAPTO HP	1	CORE I7 MODELO CS3073	001-100-000003578

### - INCIDENCIAS PRODUCIDAS EN LA OBRA

No se ha producido en este periodo ningún incidente grave.

### - CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES

Uno de los principales objetivos de la Fiscalización es el control de la calidad de los materiales que intervienen en los diferentes rubros, así como el cumplimiento de las especificaciones para la ejecución de los rubros.

- OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS

OFICIO NRO.	FECHA	ASUNTO
OFICIO: 117 CABA/GADPPz	5 de abril del 2023	Oficio de presentación de Planilla de avance de obra No. 02
OFICIO: KEYSOFICIO-022-2023	10 de abril del 2023	Oficio de devolución de Planilla de avance de obra No. 02
OFICIO: 120 CABA/GADPPz	20 de abril del 2023	Oficio de presentación de Planilla de avance de obra No. 02
OFICIO: KEYSOFICIO-025-2023	25 de abril del 2023	Oficio de entrega de Planilla de avance de obra No. 02

## 16. CONTROL DE COSTOS

Con base en el programa de inversiones propuesto, se presenta la inversión ejecutada en el mes y la total acumulada.

INVERSIÓN PROGRAMADA	73,239.22720
AVANCE PROGRAMADO (%)	1.58
INVERSIÓN EJECUTADA	95,049.92
AVANCE EJECUTADO (%)	2.04

### Control de avance económico

DESCRIPCIÓN	CRONOGRAMA VALORADO	PROGRAMADO EN EL PERÍODO	EJECUTADO EN EL PERÍODO	ACUMULADO EJECUTADO	ÍNDICES DE DESEMPEÑO
					SPI= EV/PV
VALOR	146,535.65	73,239.23	95,049.92	230,516.37	1.57
PORCENTAJE	3.15	1.58	2.04	4.96	

Nota: SPI es un índice de desempeño del cronograma que tiene la siguiente interpretación:

SPI > 1 se tiene un adelanto respecto a la línea base del proyecto.

SPI < 1 se tiene retrasos respecto a la línea base del proyecto.

SPI = 1 se tiene un avance igual al programado en la línea base del proyecto.

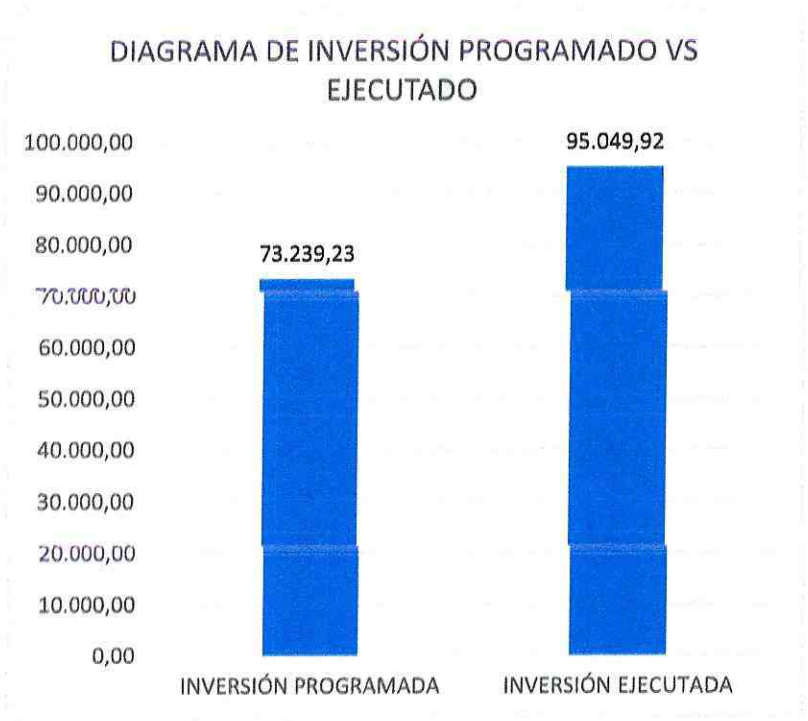


Ilustración 5 Diagrama de inversión programado vs ejecutado

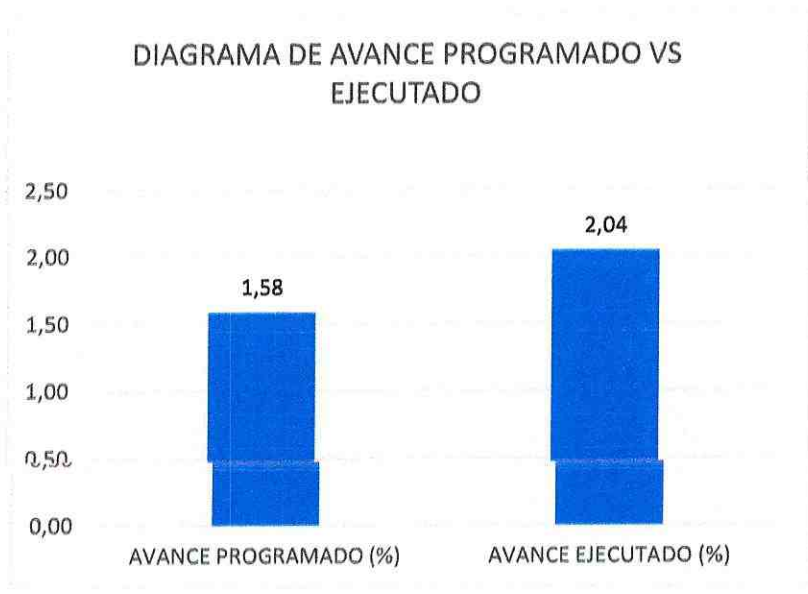


Ilustración 6 Diagrama de avance programado vs ejecutado

**17. INFORME DETALLADO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**

**PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS**

ITEM	MEDIDA	Medio de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Implementar señalética</li> <li>● Señalética de prohibición</li> <li>● Señalética de condición obligatoria</li> <li>● Señalética condición Segura</li> <li>● Señalética preventiva</li> <li>● Señalética Ambiental</li> <li>● Señalética informativa</li> </ul>	<p>ANEXO 08</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Señalética</li> </ul>	X			<p>En el frente de trabajo existe señalética. La colocación e implementación de la señalética informativa, preventiva y reglamentaria se establece para la etapa final del proyecto tal como lo señala el cronograma de ejecución de obra</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Humedecer la vía en los días soleados para evitar material particulado, optimizando el recurso agua.</li> </ul>				X	<p>Dentro del periodo 01 al 31 de marzo no fue necesario, por condiciones climáticas</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Zonificar las áreas de trabajo con cinta de peligro.</li> </ul>	<p>ANEXO 09</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Zonificación de áreas con cinta</li> </ul>	X			<p>Los diferentes frentes de trabajo han sido zonificados por cinta de peligro, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los peatones y tránsito vehicular.</p>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cubrir con una lona las volquetas que trasladen material pétreo hacia el lugar de la obra.</li> </ul>	<p>ANEXO 12</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Volquetas cubiertas con lona</li> </ul>	X			<p>Las volquetas que operan en el proyecto son cubiertas de lonas para evitar la dispersión del material transportado.</p>

5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las vías por donde circula el equipo caminero deben estar despejadas y sin obstáculo.</li> </ul>	<p>ANEXO 11</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vías despejadas</li> </ul>	X	Las vías se encuentran libres de obstáculos.
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar mantenimiento regular de la maquinaria y equipo utilizado</li> </ul>	<p>ANEXO 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Registro del mantenimiento vehicular (Periodo del 01 al 31 de marzo)</li> </ul>	X	La revisión y mantenimiento de la maquinaria para el mes de marzo se realizó en los talleres de la compañía Amazonas Building, ubicados en la parroquia Madre Tierra el cual consta con todos los permisos y regularizaciones ambientales.
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>El transporte del equipo se realizará utilizando las vías de accesos existentes, considerado no causar molestias a los habitantes del costado de la vía y el posible deterioro de la misma.</li> </ul>	<p>ANEXO 11</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vías despejadas</li> </ul>	X	Los vehículos livianos y pesados que operan en el proyecto utilizan las vías de acceso, precautelado el correcto uso de las mismas con el objetivo de evitar daños.
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementar un kit antiderrame y equipo de respuesta rápida, para combatir posibles contaminados.</li> </ul>	<p>ANEXO 12</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kits antiderrames</li> </ul>	X	Dentro del proyecto existe un kit antiderrame, con el objetivo de mitigar cualquier derrame.
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se Deberá instalar de forma permanente un extintor y botiquín de primeros auxilios en los vehículos y maquinaria.</li> </ul>	<p>ANEXO 5 Y 6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Botiquín</li> <li>Extintor</li> </ul>	X	La maquinaria y vehículos cuentan con botiquín y extintor

10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dotar al personal que labora en el Proyecto de EPP</li> </ul>	<p>ANEXO 7</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usode EPPs</li> </ul>	X		<p>El contratista ha dotado a sus trabajadores del EPP adecuados, según la actividad laboral asignada. Entrega de impermeables, gafas y chalecos a operadores de maquinaria pesada se realizó en el periodo anterior y tiene la vigencia de tres meses</p>
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementar un área para el almacenamiento temporal de combustibles el cual deberá cumplir las siguientes características. Deberá estar ubicado alejado de cuerpos hídricos y aislados.</li> <li>Los sitios de almacenamiento de combustible serán ubicados en áreas no inundables.</li> <li>La estructura será realizada con vigas de madera y cubierta de dura techo o también pueden ser hojas de si las dimensiones del área se realizarán en base a la cantidad de tanques de almacenamiento a utilizar.</li> <li>El tanque de almacenamiento deberá estar protegido contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones que contaminen el ambiente y contarán con mangueras y llaves de distribución.</li> <li>El tanque de almacenamiento debe estar rodeado de un cubeto o estructura de contención impermeables</li> </ul>	<p>ANEXO 13</p> <p>Área para el almacenamiento de combustible</p>	X		<p>En el campamento se encuentra un área destinada para el almacenamiento de combustible, la misma que cuenta con piso pavimentado, bajo cubierta kit antiderrame, señalética y extintor.</p>

<p>técnicamente diseñado para el efecto con volumen = o mayor a 110% del tanque.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En el área deberá implementar un extintor para evitar cualquier riesgo de incendio</li> <li>• Tener un acceso adecuado para la carga de combustible y en caso de ser necesario para la entrada del carro de los bomberos</li> <li>• El área deberá estar señalizado en base a la normativa NTE INEN 2266.</li> </ul>			
<p>12.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ubicar el material de desalojo en los sitios descritos en el ítem 7 del presente documento.</li> <li>• Los cuáles han sido ubicados de acuerdo con los siguientes criterios técnicos</li> <li>• Deberán encontrarse dentro del área de influencia del Proyecto.</li> <li>• El terreno deberá estar desprovisto de vegetación</li> <li>• Alejado de cueros hídricos</li> <li>• Las áreas destinadas a las escobreras deberán ser estables y seguras a corto y largo plazo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro fotografía de las escobreras del Proyecto</li> <li>• Actas de acuerdo de desalojo de escobreras (en caso de ser predios privados)</li> <li>• Deberán contar con una capacidad mínima de 1500m3</li> <li>• El transporte del material debe realizarse en una volqueta con cubierta (lona), con el fin de evitar derrames en la carretera.</li> </ul>	X	<p>Se lo realizará cuando las actividades lo ameriten</p>

**PLAN DE MANEJO DE DESECHOS**

ITEM	MEDIDA	Medio de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementar un área de almacenamiento temporal de desechos peligrosos en el cual deberá tener las siguientes características:</li> <li>Estar bajo cubierta</li> <li>Iluminación natural</li> <li>En un espacio abierto cerrado</li> <li>El acceso a estos locales deberá ser registrado Y el personal que ingiere estará provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad industrial</li> <li>Contar con señalización apropiada en lugares y formas visibles en base a la Norma nte inen 2266.</li> <li>Contar con el material y equipamiento para atender contingencias.</li> <li>Contar con sistemas de extinción contra incendios</li> <li>Contar con bases o pisos impermeabilizados osimilares según el caso.</li> </ul>	<p>ANEXO 14</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Área para almacenamiento de desechos peligrosos</li> </ul>	X			<p>En el campamento se encuentra un área destinada para el almacenamiento temporal de los desechos peligrosos, la misma que cuenta con piso pavimentado, bajo cubierta, kit antiderrame, señalética y extintor.</p> <p>Cabe mencionar que durante este periodo no se han realizado actividades productivas que generen desechos peligrosos.</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dotar de fundas plásticas a los conductores de volquetes y máquinas pesadas para los desechos.</li> </ul>				X	<p>La dotación de fundas plásticas anterior aún tiene unidades existentes para el correcto almacenamiento de los desechos comunes.</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación de contenedores de colores debidamente etiquetados para la clasificación en lavía, se deberá cumplir con las siguientes características:</li> <li>Encontrarse bajo techo</li> <li>Contenedores de 55 galones (4)</li> <li>El rotulado estará en un lugar visible con caracteres legibles según lo establecido en la NTE INEN 878. El nombre o</li> </ul>	<p>ANEXO 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Contenedores metálicos</li> </ul>	X			<p>En el frente de trabajo existen contenedores metálicos móviles, coloreados según el residuo y/o desecho a clasificar.</p>

	denominación de los residuos con su logo respectivo y la distancia de observaciones					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>según lo establecido en la NTE INEN ISO 3864-1</li> </ul>					

**PLAN DE CAPACITACIÓN:**





ITEM	MEDIDA	Medio de verificación	CUMPLE	NO CUMPLÉ	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitaciones al personal de trabajo sobre:</li> <li>Medidas propuestas en el MIA</li> <li>Manejo de los procedimientos de seguridad</li> <li>Trabajos en alturas</li> <li>Protecciones del ambiente</li> <li>Primeros auxilios y procedimiento en caso de emergencia</li> <li>Manejo de desechos peligrosos y no peligrosos</li> <li>Técnicas para prevenir conflictos con la comunidad</li> </ul>	ANEXO 15 ↳ Capacitaciones	X			Todo el personal que opera en el proyecto ha sido capacitado en los temas de seguridad, salud y ambiente, de igual forma ha sido socializado el PMA. Se realizaron charlas y entrega de trípticos de manejo de desechos sólidos con volqueteros y ayudantes del proyecto

**PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS:**

ITEM	MEDIDA	Medio de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar una reunión previa con los involucrados directos del Proyecto para darles a conocer las ventajas de implementación del Proyecto obra o actividad.</li> </ul>				X	El proyecto fue socializado en el periodo anterior.
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación un buzón donde se recopile las quejas y sugerencias de la población.</li> </ul>	ANEXO 16 Buzón de quejas	X			El personal que se encuentra diariamente en el proyecto cuenta con hojas de registro, en las cuales las personas
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Participar activamente en reuniones y procesos comunales que se realicen en el área de influencia</li> </ul>				X	Las reuniones de informe de actividades y avance de obra se ejecutaron a partir del mes de abril del presente año.

## PLAN DE CONTINGENCIAS:

ITEM	MEDIDA	Medio de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar un plan de contingencia accesible a todo el personal en el cual se aborde la gestión de contingencia en caso de incendios, derrame, fuga o explotación</li> </ul>	ANEXO 17 Plan de contingencia	X			El proyecto cuenta con un plan de contingencia, el mismo que ha sido socializado a los trabajadores.
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Crear un comité de seguridad que actúe en caso de emergencia.</li> </ul>				X	Se lo realizó en el mes de febrero
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizará simulacros, de evaluación, incendio, derrames o fugas para agilizar los tiempos de reacción del personal y su actuación.</li> </ul>				X	Se lo realizó en el mes de febrero.
4	<p>Actuar de la siguiente manera en caso de</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>En caso de incendio</b></li> </ul> <p>Si alguien detecta un fuego incipiente y sabe usar un extintor actúa inmediatamente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se recomienda el uso de extintores de industriales ubicados estrictamente Tipos de extintores</li> </ul> <p><b>El tipo A</b> se usará durante la combustión de sólidos comunes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>El tipo B</b> se usará para líquidos y gases inflamables <b>El tipo C</b> se usará para equipos eléctricos energizados y tipo de para metales combustibles</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Salve su vida y la de los demás abandonando el lugar de incendio</li> <li>Una vez a salvo avisar a la brigada hágalo sin pensar que otro ya lo han hecho</li> <li>Solicite Auxilio</li> </ul> <p>Si se encuentra Atrapado por el humo trate de salir arrastrándose o permanézcalo más cerca del suelo el humo tiende a subir y existe aire no contaminado a nivel del suelo</p>	Informe técnico derecho			X	Durante este periodo no ha existido ningún incidente y/o accidente de manera natural o antrópica, en caso de suceso se tomará en cuenta lo establecido en esta medida.

<p>- Si el humo es muy denso curarse con un pañuelo ropa mojada la boca y nariz manténgase cerca del suelo</p> <p>- Cuando se inflaman la ropa de una persona, impida que corra, el viento aviva el fuego. Cobijelo con una manta húmeda haga que se proteja la cara y cuello.</p> <p>● <u>En caso de explosión</u></p> <p>- Evacuen la zona de riesgo y proceda de acuerdo a lo establecido en el programa de contingencia</p> <p>-Acordeón del área y restringe el acceso a personal ajeno</p> <p>-Utilice el extintor adecuado</p> <p>- No intente extinguir el fuego hasta que la fuga haya sido detenida de otra manera existe grave riesgo de rescisión y explosión.</p> <p>● <u>En caso de sismo o fenómeno natural</u></p> <p>Antes un sismo</p> <p>-Conozca las zonas de seguridad</p> <p>-Contar con un mapa de peligro potencial y zonas seguras</p> <p>-Reciba entrenamiento en primeros auxilios y evacuación</p> <p>-Manténgase plenamente informado de cómo interrumpir de forma segura sus labores habituales o el proceso de construcción</p> <p>-Observe la ubicación de su área de trabajo Buscar sitios de protección contra materiales que pudieran desprenderse.</p> <p>-Haga una evacuación de vulnerabilidad de su entorno de trabajo para determinar los peligros potenciales</p> <p>-En caso de derrame o fuga</p> <p>-Localice el derrame o fuga</p> <p>-Antes de comenzar con el control o contención del derrame, debe colocarse los elementos de protección personal necesario: ropa adecuada impermeable y resistente a los productos químicos guantes protectores lentes de seguridad protección respiratoria.</p> <p>-Contenga con barreras, di que sí o materiales absorbentes</p> <p>-Colocar fluidos y desechables en recipientes de fundas para recolección de materiales contaminados</p> <p>-Entregar el material contaminado a un gestor calificado</p>				
---	---	--	--	--

## PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO:

ITEM	MEDIDA	Medio de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar el nivel de cumplimiento al presente PMA a través de un informe interno de cumplimiento de las medidas del plan de aprobación por la Autoridad Ambiental.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe de monitoreo</li> </ul>	X			Se presenta el informe correspondiente a este periodo.
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitorear el manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos dentro del área de influencia del proyecto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe de monitoreo al manejo de desechos peligrosos y no peligrosos</li> </ul>			X	La acción No Aplica, debido a que durante este periodo no se han realizado actividades que generen desechos peligrosos.
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar el mantenimiento de los extintores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ANEXO 6</li> <li>• Extintores</li> </ul>	X			Los extintores se encuentran recargados, en buen estado y ubicados en lugares visibles y de fácil acceso.

## PLAN DE REHABILITACION:

ITEM	MEDIDA	Medio de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revegetación reforestación de áreas degradadas en el proyecto con plantas nativas de la zona.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro fotográfico</li> <li>• Informe de revegetación</li> </ul>			X	La acción no aplica, debido a que el proyecto se encuentra en etapa de construcción.

**PLAN DE ENTREGA Y ABANDONO:**

ITEM	MEDIDA	Medio de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desmantelamiento de la infraestructura temporal existente en el área del proyecto (campamento, área de almacenamiento de combustibles y desechos peligrosos)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registro fotográfico</li> <li>Informe de monitoreo</li> </ul>			X	La acción no aplica, debido a que el proyecto se encuentra en etapa de construcción.
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpieza general del área del proyecto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registro fotográfico</li> </ul>			X	La acción no aplica, debido a que el proyecto se encuentra en etapa de construcción.

## 18. RESUMEN DE CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES

Para determinar las sanciones establecidas en el Procedimiento de Sanciones por incumplimientos Ambientales.

Dentro del periodo evaluado 01 al 31 de marzo del 2023 se encontró con un Nivel de Conformidad al 100%.

## 19. REPORTE FOTOGRÁFICO



Limpieza y desbroce



Movimiento de tierra



Regado de material pétreo



Compactado de material pétreo




Transporte de material de desalojo



Transporte de material pétreo



Pancarta informativa

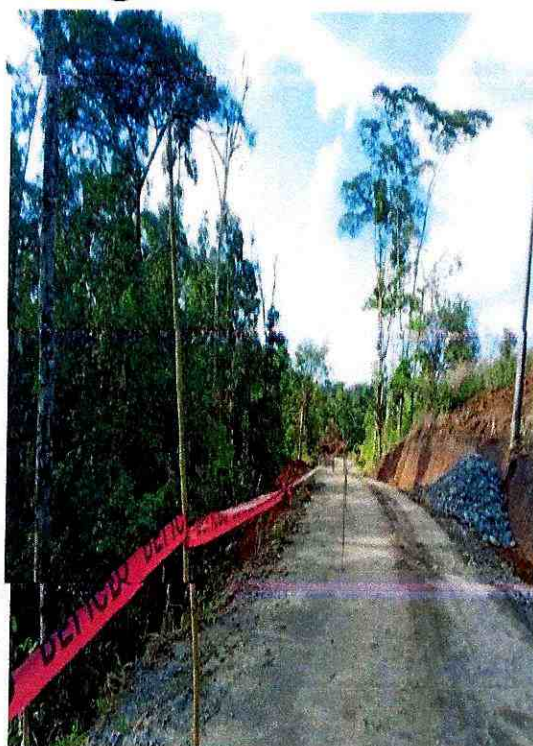

Cinta de peligro

## 20. INFORME DEL PERSONAL

### Personal técnico del contratista

No	FUNCIÓN	NOMBRE	NÚMERO DE CÉDULA
1	SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. MARCO VINICIO TAMAYO MEJIA	1600086779
2	RESIDENTE DE OBRA 1	ING. JONATHAN RODOLFO TORRES TAMAYO	1600294852
3	RESIDENTE DE OBRA 2	ING. LUIS OCTAVIO TIBANTA GUAMÁN	1600153132
4	TÉCNICO AMBIENTAL	ING. EDGAR RAÚL GASPATA CALO	1600282295
5	TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	ING. WASHINGTON EDUARDO LASCANO COELLO	1600232332
6	TOPÓGRAFO	ING. DANIELA ANALIA GOMEZ ZAMBRANO	0704073212

## Personal en obra

No	CARGO	NOMBRE	NÚMERO DE CÉDULA
1	OPERADOR DE EXCAVADORA	JUAN ISAAC ACERO UMAQUINGA	1720483609
2	CHOFER DE VOLQUETA	CARLOS ALEXANDER AMAGUAY CEDEÑO	1600786873
3	CHOFER DE VOLQUETA	JOSE ALFREDO AMAGUAY CEDEÑO	1312506288
4	SECRETARIA	NUBIA TATHIANA BRAVO CHANGO	1600354383
5	OPERADOR DE EXCAVADORA	JOSE AUGUSTO CHASIPANTA CHASIPANTA	0503530610
6	OPERADOR DE EXCAVADORA	JOSE PEDRO CHASIPANTA CHASIPANTA	0503774580
7	MECÁNICO	AURELIO GREFA CHIMBO	1600203267
8	CHOFER DE VOLQUETA	GEREMIAS JOSE GUAMAN CASTILLO	0603907080
9	INGENIERA AMBIENTAL	JHESLY SARAY IBARRA RIVERA	092286234
10	CHOFER CAMIÓN	EDWIN HUGO JACOME RODRIGUEZ	1600342222
11	JEFE DE TALENTO HUMANO	JENNY BEATRIZ JACOME RODRIGUEZ	1600267494
12	ADMINISTRATIVO	JENNYFER BRITHNEY MARIN JACOME	1600671760
13	ADMINISTRATIVO	KENYA MERY JOSEPH MARIN JACOME	1600496770
14	ADMINISTRADOR DE CIA AMAZONAS BUILDING AMAZON S.A.	KLEVER JINSOP MARIN MONTERO	1600296717
15	CHOFER CAMIÓN	JOSE ALEXANDER MARIN PEREZ	1600595876
16	ADMINISTRATIVO	KRISLEY ARIANNA MARIN PEREZ	1600695868
17	AYUDANTE DE TOPOGRAFÍA	EDGAR JUVENAL MIRANDA AMBI	0601716327
18	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	KATTY JESSENIA MONTERO ESPINOSA	1600439804

19	CHOFER DE VOLQUETA	CARLOS VICENTE MIÑOZ VELASTEGUI	1600573032
20	ADMINISTRATIVO	JENNY MARITZA PUNINA CAIZAGUANO	1600724809
21	OPERADOR MOTONIVELADORA	PATRICIO BOLIVAR SOTAMINGA BELTRAN	1004325641
22	OBRERO	CESAR LUIS TAPUY TAPUY	1600177461
23	AYUDANTE DE TOPOGRAFÍA	JOSE GREGORIO UGSHA VEGA	0500865159

## 21. CONCLUSIONES

Esta fiscalización aprueba la presente planilla de avance de obra No. 02, que se encuentra verificada en campo, cumpliendo con los parámetros de acuerdo a la planificación mensual aprobada, por lo que es pertinente continuar con el trámite respectivo.

Hasta la presente fecha de elaboración del informe el desarrollo de la obra se lleva de manera adecuada con la respectiva utilización de los materiales según especificación técnica.

Se ha encontrado en diferentes tramos de la vía intervenida filtraciones de agua subterránea lo que ha dificultado la estabilización de la misma, por lo que ha conllevado a mejorar la estructura, mediante encauzamiento con la finalidad que no se produzcan asentamientos.

## 22. RECOMENDACIONES

Se deberá dar estricto cumplimiento de la normativa establecida por el Ministerio de Medio Ambiente (MAE) y el Departamento de Gestión Ambiental del GADPPz.

Mantener el número de trabajadores, equipo mínimo y personal técnico en los diferentes frentes de trabajo para mantener el avance conforme el cronograma.

## 23. BIBLIOGRAFÍA

Weatherspark. (marzo de 2023). *Weatherspark*. Obtenido de <https://es.weatherspark.com/m/20022/3/Tiempo-promedio-en-marzo-en-Puyo-Ecuador>

## 24. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME

Aprobado por:

Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:  
**DANNY DANIEL DURAN**  
CABRERA

Ing. Danny Duran.  
C.C. 0703997627  
Director de Fiscalización



Firmado electrónicamente por:  
**RICARDO WELLINGTON**  
CARPIO JARAMILLO

Ing. Ricardo Carpio  
C.C. 0706553500  
Residente

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
**JESSICA MARIELA**  
JARAMILLO ARMIJOS

Ing. Jessica Jaramillo  
C.C. 0704239128  
Gerente General  
**KEYSZEN S.A.S.**  
RUC 0791840462001

**KEYSZEN**   
INGENIERIA & CONSTRUCCION  
Machala - El Oro - Ecuador



**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

# PLANILLA DE AVANCE N.2

"ASFALTADO DE LA VIACURARAY -FRANCISCO DE ORELLANA-JATUN PACCHA, HASTA EL KILOMETRO  
12 VIA 10 DE AGOSTO -EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA



LIQUIDACIÓN DE LA PLANILLA No. 2

PROYECTO:

ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

FECHA DE CONTRATO: 7 DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 CONTRATISTA: CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
 VALOR CONTRATO \$: 4,650,521.23  
 PLAZO: 540 DIAS  
 PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CONCEPTO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL ECHA
VALOR PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	135,466.45	95,049.92	230,516.37
MULTAS	-	-	-
VALOR REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL	1,973.63	2,234.33	4,207.96
VALOR REAJUSTE DEFINITIVO ANTICIPO DE OBRA	-	-	-
VALOR PLANILLA TOTAL	137,440.08	97,284.25	234,724.33
ANTICIPO	-	-	-
VALOR LIQUIDO A PAGAR	137,440.08	97,284.25	234,724.33

FECHA DEL ANTICIPO: -  
 VALOR DEL ANTICIPO \$: -  
 VALOR AMORTIZADO \$: -  
 SALDO POR AMORTIZAR \$: -

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



Firmado electrónicamente por:  
KODILO VINICIO  
GUEVARA MARIN

CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:  
JESSICA MARIELA  
JARAMILLO ARMIJOS

KEYSZEN S.A.S.

FISCALIZADOR EXTERNO

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**  
**DPTO. FISCALIZACIÓN**

**OBRA** : ASFALTADO DE LA VIA CURIRAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA  
**FECHA DE CONTRATO** : Lunes, 7 de noviembre de 2022  
**CONTRATISTA** : CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
**PLAZO** : 540 Días a partir de la orden de inicio  
**AUPLICACIONES** : 0 Días  
**SUSPENSIÓN** : 0 Días  
**TOTAL** : 540 Días

**PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO. 02**  
**FECHA DE PLANILLA** : 4 de abril de 2023  
**INICIO DEL PLAZO** : 25 de enero de 2023  
**TERMINACIÓN DEL PLAZO** : 15 de julio de 2024  
**PERIODO** : 01-mar-23 A 31-mar-23

**PARCIAL**  
 \$4 650 521.23  
 \$95 049.92  
 0.00  
 2.04%  
 3.15%

**ACUMULADO**  
 \$230 516.37  
 0.00  
 4.96%

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CONTRATO	TOTAL	CANTIDADES			IMPORTANTES			
						T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
1	Desbroce, desbosque y limpieza	Ha	29.18	444.42	\$ 12 968.176	3.20	2.80	6.00	20.56%	1 422.14	1 244.38	2 666.52
2	Replanteo y nivelación a nivel de asfalto	km	14.59	1.383.97	\$ 20 192.122	1.60	1.60	3.20	10.97%	2 214.35	2 214.35	4 428.70
3	Remoción de alcantarillas	m	243.00	26.76	\$ 6 502.680	62.00	62.00	124.00	25.51%	1 658.12	1 658.12	3 316.24
4	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m <sup>3</sup>	60 863.54	1.02	\$ 70 240.811	3 119.20	4 219.60	7 338.80	10.66%	3 181.58	4 303.99	7 485.57
5	Excavación de cunetas de coronación	m <sup>3</sup>	613.80	1.29	\$ 791.802				0.00%			
6	Excavación para cunetas y encauzamiento	m <sup>3</sup>	8 576.91	5.02	\$ 43 056.088				0.00%			
7	Excavación y relleno de estructuras menores	m <sup>3</sup>	7 720.00	5.08	\$ 39 217.600	2 171.59	2 171.59	4 343.18	28.13%	11 031.68	11 031.68	22 063.36
8	Limpieza de derrumbes	m <sup>2</sup>	8 746.43	0.82	\$ 7 172.073				0.00%			
9	S.C. Tubería de acero corrugado D= 0,80 m, e=2,5 mm, PM-100	m	126.00	166.33	\$ 20 957.580				0.00%			
10	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m, e=2,5 mm, PM-100	m	263.00	272.20	\$ 71 586.600	49.00	49.00	98.00	18.63%	13 337.80	13 337.80	26 675.60
11	S.C. Tubería de acero corrugado D= 2,20 m, e=2,5 mm, PM-100	m	46.00	562.20	\$ 25 861.200				0.00%			
12	Hormigón para cunetas (f'c=180 KG/CM)	m <sup>3</sup>	4 746.82	167.21	\$ 793 715.772				0.00%			
13	Muro de H.S. f'c=180kg./cm2 tipo B(Cabezales)	m <sup>2</sup>	763.00	167.20	\$ 127 573.600				0.00%			
14	Hormigón simple en obras de arte f'c=240 KG/CM2	m <sup>3</sup>	78.47	162.46	\$ 12 746.236				0.00%			
15	Hierro estructural fy=4200 kg/cm <sup>2</sup>	kg	8 288.90	1.94	\$ 16 080.466				0.00%			
16	Muro de gaviones - calibre Nº 12	m <sup>3</sup>	400.00	70.12	\$ 28 048.000				0.00%			
17	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m <sup>3</sup>	83 263.76	3.00	\$ 249 781.280	6 828.20	7 662.20	14 490.40	17.40%	20 484.60	22 986.60	43 471.20
18	Material de subbase clase 3	m <sup>3</sup>	21 010.98	12.44	\$ 261 376.591	1 125.00	1 125.00	2 250.00	5.35%	13 995.00	13 995.00	27 990.00
19	Material de base granular de agregados	m <sup>3</sup>	13 031.28	15.78	\$ 205 633.598				0.00%			
20	Transporte material de desalzo	m <sup>3</sup>	8 746.43	1.02	\$ 8 921.359				23.90%	2 090.00	2 131.80	4 221.80
21	Transporte de material pétreo de mejoramiento	m <sup>3</sup> -km	3 309 493.83	0.25	\$ 827 373.458	225 194.04	252 699.36	477 893.40	14.44%	56 298.51	63 174.94	119 473.35
22	Transporte de material pétreo de subbase clase 3	m <sup>3</sup> -km	781 104.32	0.25	\$ 195 276.080	37 102.50	37 102.50	74 205.00	4.75%	9 275.63	9 275.63	18 551.26
23	Transporte de material pétreo de base granular de agregados	m <sup>3</sup> -km	484 450.99	0.25	\$ 121 112.748				0.00%			
24	Imprimación con emulsión asfáltica	Lt	171 247.08	0.76	\$ 130 147.781				0.00%			
25	C. rodadura hormigón asf. Mezclado en planta, e=2"	m <sup>2</sup>	122 319.34	9.74	\$ 1 191 390.372				0.00%			
26	Bordillo de H.S.(f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> - 0,14x0,40)	m	2 000.00	14.64	\$ 29 280.000				0.00%			
27	Aceras de H.S. f'c=180kg/cm <sup>2</sup> E=7cm escobillado	m <sup>2</sup>	3 000.00	19.32	\$ 57 960.000				0.00%			

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**  
DPTO. **FISCALIZACIÓN**

**PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 02**

OBRA : ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA  
 FECHA DE CONTRATO : lunes, 7 de noviembre de 2022  
 CONTRATISTA : CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
 PLAZO : 540 Días a partir de la orden de inicio  
 AMPLIACIONES : 0 Días  
 SUSPENSION : 0 Días  
 TOTAL : 540 Días

PRECIO CONTRATO : \$ 17 450,788  
 CANTIDAD : 43 626,97  
 UNIDAD : m

PARCIAL : \$4 650 521,23  
 ACUMULADO : \$230 516,37  
 V. CONTRATO : \$95 049,92  
 V. PLANILLAS : 0,00  
 V. EXCEDENTES : 2,04%  
 % DE AVANCE EJECUTADO : 3,15%  
 % DE AVANCE PROGRAMADO : 4,96%

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CONTRATO	TOTAL	CANTIDADES			IMPORTANTE			
						T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
28	Marcas en pavimento	m	43 626,97	0,40	\$ 17 450,788			-	0,00%			-
29	Marcas sobre salidas de pavimento (unidireccionales y bidireccionales)	u	3 895,00	7,32	\$ 28 511,400			-	0,00%			-
30	Pancreta informativa (letero)-con estructura	u	1,00	1 179,51	\$ 1 179,510		1,00	1,00	100,00%		1 179,51	1 179,51
31	Señales ecológicas (2.40x1.20)M	u	2,00	354,87	\$ 709,740			-	0,00%			-
32	Señales informativas (2.40x1.20)M	u	4,00	354,87	\$ 1 419,480			-	0,00%			-
33	Señales reglamentarias (0.75 x 0.75)M	u	10,00	111,50	\$ 1 115,000			-	0,00%			-
34	Señales preventivas (0.75 x 0.75 )M	u	200,00	111,50	\$ 22 300,000			-	0,00%			-
35	Señales informativas y reglamentarias (0.60mx0.80m) móviles	u	4,00	78,18	\$ 312,720	4,00	4,00	4,00	100,00%	312,72	653,36	312,72
36	Señales preventivas tipo barrera (1.22mx0.60m) móviles	u	4,00	163,34	\$ 653,360	4,00	4,00	4,00	100,00%	653,36	653,36	653,36
37	Contenedores metálicos de 55 galones	u	4,00	17,57	\$ 70,280	4,00	4,00	4,00	100,00%	70,28	70,28	70,28
38	Kit antiderrames	u	4,00	157,50	\$ 630,000	4,00	4,00	4,00	100,00%	630,00	630,00	630,00
39	Cinta peligro colores intensos (mat. poliuretano)	m	1 000,00	0,32	\$ 320,000	90,00	90,00	180,00	18,00%	28,80	28,80	57,60
40	S/C Cono de seguridad con protección UV, 71cm Incl. cinta reflectiva	u	20,00	22,48	\$ 449,600	20,00	20,00	20,00	100,00%	449,60	449,60	449,60
41	Suministro de paleta de alto y siga	u	4,00	30,32	\$ 121,280	4,00	4,00	4,00	100,00%	121,28	121,28	121,28
42	Capacitación sobre preservación de recursos naturales (de 2 a 3 horas)	u	1,00	100,00	\$ 100,000	1,00	1,00	1,00	100,00%	100,00	100,00	100,00
43	Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a 3 horas)	u	1,00	100,00	\$ 100,000	1,00	1,00	1,00	100,00%	100,00	100,00	100,00
44	Capacitación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3 horas)	u	1,00	100,00	\$ 100,000	1,00	1,00	1,00	100,00%	100,00	100,00	100,00
DESCUENTOS:					\$ 4 650 521,23							
Anticipo										\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Mora 0 días										\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR A PAGARSE										\$ 135 466,45	\$ 95 049,92	\$ 230 516,37

SON: NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE DÓLARES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS



Firmado electrónicamente por:  
**JESSICA MARIELA JARAMILLO ARMILLOS**



Firmado electrónicamente por:  
**ODILIO VINICIO GUEVARA MARIN**

KEYSZEN S.A.S.

FISCALIZADOR EXTERNO

CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:  
**ERYKA MIREYA SILVA MANZANO**

ING. ERYKA SILVA

ADMINISTRADOR GADPPPz



**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

# REAJUSTE

# PROVISIONAL

"ASFALTADO DE LA VIACURARAY -FRANCISCO DE ORELLANA-JATUN PACCHA, HASTA EL KILOMETRO  
12 VIA 10 DE AGOSTO -EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA



REAJUSTE (PROVISIONAL) PLANILLA 2

PROYECTO: ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
UBICACIÓN: PARROQUIA 10 DE AGOSTO-CANTON PASTAZA-PROVINCIA DE PASTAZA
CONTRATISTA: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
ANEXO: REAJUSTE (PROVISIONAL) PLANILLA 2
FECHA: 4 de Abril de 2023
POR: \$ 2,234.33

NOTA:

FORMULA POLINOMICA DE REAJUSTE

Pr=Po(0.143 B1/Bo + 0.072 C1/Co + 0.034 COM1/COMo + 0.372 E1/Eo + 0.128 F1/Fo + 0.002 H1/Ho + 0.057 M1/Mo + 0.147 P1/Po + 0.023 T1/To + 0.022 X1/Xo)

CUADRILLA TIPO

Table with columns: DESCRIPCION, COEFICIENTE, JORNAL T.D, TOTAL, JORNAL T.D, TOTAL. Rows include OPERADOR EQUIPO PESADO C1, OPERADOR EQUIPO PESADO C2, SIN TITULO D2, ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3, CHOFER C1, ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1, ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2, ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2, ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2.

Table with columns: DESCRIPCION, SIMBOLO, COEFICIENTE E (a), PRECIO O INDICE (b), PRECIO (I) INDICE (c), RELACION d=(c/b), TERMINO c=d\*a, OBSERVACIONES. Rows include MANO DE OBRA, CEMENTO PORTLAND-SACOS, COMBUSTIBLES (PRECIOS NACIONALES SUBSIDIADOS)(O), EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCC. VIAL, BETÓN PETRÓLEO (ASFALTO) (O), ACERO EN BARRAS, MADERA ASERRADA, CEPILLADA Y/O ESCUADRADA (PREPARADA), MATERIALES PÉTREOS-TUNGURAHUA, ALCANTARILLAS DE LÁMINAS DE METAL Y ACC., VARIOS IPC AMBATO.

Summary table with columns: VALOR DE PLANILLA: \$ 95,049.92, VALOR A REAJUSTE (Po) \$ 95,049.92, VALOR REAJUSTADO (Pr=Po\*1) \$ 97,284.25, VALOR DE REAJUSTE PRECIOS (Pr-Po) \$ 2,234.33.

REAJUSTE: 1.024
OBSERVACIONES: Sub-indices Ago-22, Sub-indices Mar-23

A FAVOR DEL CONTRATISTA
SON: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DÓLARES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS



Firmado electrónicamente por: JESSICA MARIELA JARAMILLO ARMIJOS



Firmado electrónicamente por: ALVARO RENATO SOSA CASTRO

KEYSZEN S.A.S.
FISCALIZADOR EXTERNO

ING. ALVARO SOSA
DIRECCION DE FISCALIZACION

Handwritten notes: 0.98, 2281.19

## ANEXOS

## INDICES MARZO - 2023

DENOMINACIÓN	ÍNDICES			VARIACIONES PORCENTUALES	
	MARZO/22	FEBRERO/23	MARZO/23	MENSUAL	ANUAL
Aceites, lubricantes hidráulicos y afines *	394.53	430.77	430.77	0.00	9.19
Acero en bruto *	296.41	301.35	301.35	0.00	1.67
Acero estructural para puentes	409.56	406.44	402.08	-1.07	-1.63
Alicatados de láminas de metal y Acc. *	202.06	202.06	202.06	0.00	0.00
Artículos de soldadura *	367.23	368.42	368.42	0.00	0.32
Ascensores	149.29	154.27	154.84	0.37	3.72
Azuquejos y cerámicos vitrificadas *	185.80	183.56	183.75	0.10	-1.10
Baldosas de vinil (I) 5/ *	111.08	117.94	117.94	0.00	6.18
Betún petróleo (Asfalto) (O) *	746.20	746.20	746.20	0.00	0.00
Cemento Portland *	185.91	186.41	185.64	-0.41	-0.15
Granel *	191.24	192.58	192.19	-0.20	0.50
Sacos *	184.78	185.13	184.30	-0.45	-0.26
Centrales Telefónicas	69.17	73.70	72.03	-2.27	4.13
Cerraduras y similares **	437.45	431.11	431.11	0.00	-1.45
Combustibles (O)	272.40	252.13	252.13	0.00	-7.44
Combustibles (Mezcla 5% gasolina extra - 95% diesel) (O)	266.83	244.32	244.32	0.00	-8.44
Ductos de planchas galvanizadas *	575.16	575.16	575.16	0.00	0.00
Emulsiones Asfálticas (I) *	234.53	356.36	356.36	0.00	51.95
Equipo de aire acondicionado	181.72	186.76	189.34	1.38	4.19
Equipo para detección de incendios	109.45	108.81	108.81	0.00	-0.58
Equipo para lavado y secado de ropa	122.38	135.23	135.23	0.00	10.50
Equipo para tratamiento de aguas residuales	173.81	189.92	190.67	0.39	8.45
Equipo y maquinaria de Construcción vial	171.79	192.08	192.31	0.12	11.94
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparada) *	516.92	513.81	514.32	0.10	-0.50

ANEXOS

INDICES AGOSTO - 2022

(BASE ABRIL/12 2000 = 100.00)

DENOMINACIÓN	2021				2022							
	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
Aceites lubricantes, hidráulicos y afines *	382.04	390.53	390.53	390.53	390.53	392.54	394.53	394.53	396.88	404.21	407.46	407.24
Acera en barras *	290.47	290.47	290.47	290.47	290.47	290.47	296.41	296.41	301.35	301.35	301.35	<b>301.35</b>
Acero estructural para puentes *	395.84	393.16	399.42	397.24	403.39	404.58	409.56	410.79	404.30	411.44	409.23	412.31
Acetileno *	250.34	250.34	250.34	250.34	255.28	255.28	255.28	255.28	255.28	255.28	255.28	258.39
Aditivos para hormigones autolubrificantes 3/	248.85	252.28	247.85	240.55	241.88	241.50	243.82	255.48	253.86	259.90	269.30	269.44
Alambres y cables para Inst. eléctricas *	252.04	255.28	255.74	250.74	261.22	267.20	271.70	276.09	276.09	276.09	276.09	268.73
Alambres y cables para Inst. telefónicas												
Exteriores (I) 2/	243.99	246.43	249.84	254.72	251.59	254.85	267.72	271.30	274.48	272.46	258.42	259.19
Interiores *	351.20	356.50	358.97	358.97	359.82	360.02	360.02	362.88	362.68	362.68	362.68	359.98
Alambres de metal *	308.77	308.77	308.77	310.77	311.25	311.25	323.20	324.44	334.83	338.58	338.58	338.58
Alcantarillas de láminas de metal y Acc. *	138.93	138.93	138.93	138.93	202.04	202.04	202.04	202.04	202.04	202.04	202.04	<b>202.04</b>
Artículos de soldadura *	330.87	337.37	340.47	340.47	367.23	367.23	367.23	367.23	367.23	367.23	367.23	<b>367.23</b>
Ascensores *	130.00	132.44	132.32	146.13	145.16	148.25	149.29	150.68	151.41	151.41	151.20	151.33
Azulejos, cerámicas vitrificadas y porcelanatos *	177.85	177.88	177.90	177.90	179.91	178.77	185.80	186.98	189.47	189.24	183.51	183.51
Baldosas de vinil (I) 5/ *	108.54	109.71	109.71	109.71	109.71	109.71	111.08	111.08	111.08	114.56	114.56	114.56
Behín petróleo (Asfalto) (O) *	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	746.20	<b>746.20</b>
Bombas de Agua *	173.98	173.45	173.55	173.65	182.01	180.66	183.20	182.89	183.73	185.82	192.19	192.19
Calderas *	183.77	184.57	184.59	197.49	197.49	212.45	212.45	222.47	218.74	218.74	223.91	221.04
Cal química *	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19	292.19
Carpint. de hierro (puertas enrollables) *	273.96	273.96	273.96	273.96	273.96	271.09	273.92	276.14	276.14	276.14	276.14	276.14
Cementina *	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31	210.31
Cemento Portland *	176.50	176.50	176.50	176.50	182.45	185.91	185.91	185.91	185.91	185.91	185.91	<b>185.91</b>
Sacos *	175.31	175.31	175.31	175.31	181.38	184.78	184.78	184.78	184.78	184.78	184.78	184.78
Granel *	182.20	182.20	182.20	182.20	187.42	191.24	191.24	191.24	191.24	191.24	191.24	191.24
Centrales telefónicas *	66.51	66.75	68.13	68.84	67.34	73.24	69.17	68.58	71.11	69.14	72.85	73.35
Cerraduras y similares *	410.50	419.14	419.14	419.14	435.82	437.45	437.45	437.45	437.45	437.45	437.45	437.45

INDICES DE MATERIALES EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCION  
(BASE ABRIL/12 2000 = 100.00)

DENOMINACIÓN	2021				2022							
	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
Ductos de planchas galvanizadas *	494.64	494.64	543.64	543.64	543.64	544.64	575.16	575.16	575.16	575.16	575.16	575.16
Emisiones acústicas (I) *	234.53	234.53	234.53	234.53	234.53	234.53	234.53	269.04	269.04	269.04	271.74	280.83
Equipo de aire acondicionado *	157.29	158.24	158.62	159.23	147.21	147.51	181.72	181.52	181.50	182.58	184.43	187.91
Equipo de circuito cerrado de televisión *	131.15	131.52	132.85	135.04	136.03	136.44	141.85	140.94	141.82	141.42	142.03	142.13
Equipo para detección de incendios *	100.38	100.38	102.33	102.33	109.35	109.35	109.45	109.45	109.45	109.45	109.45	109.45
Equipo para lavado y secado de ropa *	109.49	110.49	112.33	112.33	118.41	122.38	122.38	121.93	123.74	123.74	123.95	125.72
Equipo para tratamiento de aguas residuales *	144.37	144.73	147.00	147.74	170.64	171.66	175.81	184.00	189.72	190.85	194.21	194.80
Equipo y maquinaria de Construc. stal *	162.73	163.24	168.62	170.19	175.19	171.92	171.79	175.93	177.21	175.69	179.72	<b>184.33</b>
Equipo y maquinaria para asfo de áreas y vías públicas *	172.28	174.31	174.54	175.07	181.20	182.79	185.70	188.30	187.07	189.13	196.43	198.43
Explosivos y Aditivos *	244.38	240.53	240.53	240.53	240.53	240.53	240.53	240.53	240.53	240.53	240.53	240.53
Grifería y similares *	243.40	243.40	243.40	243.40	243.40	243.40	243.40	243.40	243.40	243.40	243.40	243.40
Grupos electrógenos *	162.74	166.27	172.46	172.97	177.02	179.84	180.63	182.23	183.13	184.21	187.51	188.22
Hidráulicos *	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74	175.74
Hormigón premezclado *	216.71	216.68	216.89	216.91	219.24	223.07	223.35	223.24	224.24	224.86	224.86	224.86
Instalaciones eléctricas (vivienda) *	247.70	247.33	272.88	274.35	280.18	286.53	287.43	289.15	289.15	289.04	288.98	284.73
Instalaciones sanitarias (vivienda) *	248.78	248.73	249.71	249.38	249.54	249.13	251.40	251.83	254.33	253.44	253.08	252.34
Interruptores y tomacorrientes (tacos) *	212.35	208.10	208.10	208.10	208.10	211.47	211.47	211.47	211.47	211.47	211.47	211.47
Ladrillos arcilla (prensados húmedos) *	309.95	309.95	308.74	308.74	314.20	314.27	314.88	314.88	322.34	323.41	323.41	323.41
Láminas de acero de espesor mayor a 30 mm *	183.40	184.14	193.02	193.02	204.03	208.34	206.48	208.03	207.74	207.74	208.98	208.42
Láminas y placas aluminadas *	285.23	285.23	285.23	285.23	285.23	285.23	285.23	278.92	278.92	278.92	284.17	401.92
Láminas y planchas Galv. Pintadas moldeadas (cubiertas y recubrimientos) *	187.62	187.62	187.62	188.00	170.55	170.55	170.55	170.55	170.55	170.55	160.92	145.64
Luminarias para lámparas aparatos y Acc. Eléctricas												
Para alumbrado público *	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70	117.70
Para interiores *	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01	124.01
Madera aserrada, capilada y/o escuadrada (preparada) *	311.53	311.53	312.43	314.38	314.38	314.38	316.92	316.92	316.92	316.92	316.92	<b>316.92</b>
Madera tratada químicamente (postes) *	317.43	317.43	317.43	317.43	317.43	317.43	317.43	322.58	334.47	334.47	334.47	334.47
Mallas diversas (fundidos) *	334.08	334.08	334.08	342.85	344.92	344.92	358.14	340.49	371.83	376.93	376.93	376.93
Mallas metálicas (galvanos) *	338.33	338.33	338.33	343.74	345.04	345.04	344.60	344.03	351.41	358.32	358.32	358.32
Mallas metálicas para cerramiento *	340.18	340.18	340.18	345.46	346.98	346.98	346.74	346.46	357.10	367.07	367.07	367.07

INDICES DE MATERIALES EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCION  
(BASE ABRIL/12 2000 = 100.00)

DENOMINACIÓN	2021				2022							
	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
Adoquines de hormigón *	250.44	250.44	250.44	250.44	246.22	245.92	245.92	245.92	245.92	245.92	245.92	245.92
Bloques de hormigón *	247.96	247.96	247.96	247.96	248.94	249.02	249.02	249.02	249.02	247.29	245.19	247.02
Ladrillos comunes de arcilla *	204.54	204.54	204.54	204.54	204.54	204.54	204.54	204.54	204.54	204.54	204.54	204.54
Materiales pétreos *	215.47	215.13	218.06	215.15	215.29	216.23	216.25	218.48	222.03	219.44	219.44	<b>221.40</b>
Tubos de hormigón simple y accesorios *	281.77	281.77	281.77	281.77	283.72	286.74	286.74	286.74	293.12	293.12	293.12	293.12

INDICES DE MATERIALES EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCION  
(BASE ABRIL/12 2000 = 100.00)

DENOMINACIÓN	2021				2022							
	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
Equipo para instalaciones eléctricas *	148.55	149.91	151.93	154.03	156.79	161.90	161.91	162.10	163.43	164.51	165.36	166.74
Equipo y maquinaria *	158.49	160.41	161.24	165.80	170.17	170.33	171.86	173.32	174.24	175.54	179.51	180.60
Materiales eléctricos *	215.59	215.94	218.46	215.68	216.70	217.77	218.40	219.45	219.45	219.19	219.99	217.50
Productos de hormigón armado *	291.41	291.41	291.41	291.41	291.41	291.41	292.00	295.41	295.75	297.34	297.34	297.24
Productos de hormigón simple *	191.16	191.09	191.12	191.11	192.29	193.86	195.00	195.86	196.53	197.36	197.36	197.45
Productos metálicos *	242.54	243.44	244.44	244.84	246.05	245.83	249.80	250.94	252.39	252.14	252.15	249.80
Índice General de la Construcción *	267.67	267.63	273.48	274.17	279.39	281.80	283.75	284.99	286.73	286.91	285.84	285.57
Índice General al Consumidor *	105.38	105.80	106.18	106.26	107.02	107.37	107.39	108.03	108.43	109.34	109.51	<b>109.54</b>

INDICES DE MATERIALES EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCION  
(BASE ABRIL/12 2000 = 100.00)



**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

**ANEXOS**  
**GRÀFICOS**  
**VOL DE OBRA**

"ASFALTADO DE LA VIACORRWAY FRANCISCO DE ORELLANA-JATUN PALCHA, HASTA EL KILOMETRO  
12 VIA 10 DE AGOSTO -EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
 PROVINCIAL DE PASTAZA  
 ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO



PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
CONTRATISTA:	CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.		
PLANILLA N°:	2	N° RUBRO:	1
PERIODO:	01-mar-23	31-mar-23	UNIDAD: Ha

Desbroce, desbosque y limpieza



TRAMO	ABSCISADO		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m2)	CANTIDAD EJECUTADA (Ha)	OBSERVACIONES
	DESDE	HASTA					
1	1+600.00	3+000.00	1 400.00	20.00	28 000.00	2.80	
<b>TOTAL</b>						<b>2.80</b>	

PLANILLADO ANTERIORMENTE =	3.20 Ha
TOTAL CONTRATADO =	29.18 Ha
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	2.80 Ha
CANTIDAD PLANILLADA =	6.00 Ha
EXCEDENTES =	- Ha



Firmado electrónicamente por:  
 ODILIO VINICIO  
 GUEVARA MARIN



Firmado electrónicamente por:  
 JESSICA MARIELA  
 JARAMILLO ARMIJOS

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
 CONTRATISTA

KEYSZEN S.A.S  
 FISCALIZADOR EXTERNO




**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA  
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO**



<b>PROYECTO:</b>	ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA			
<b>CONTRATISTA:</b>	CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.			
<b>PLANILLA N°:</b>	2	<b>N° RUBRO:</b>	4	
<b>PERIODO:</b>	01-mar-23	-	31-mar-23	<b>UNIDAD:</b> m <sup>3</sup>

Excavación sin clasificar (mov. de tierra)

**SECCIÓN TRANSVERSAL TIPO  
EXCAVACIÓN DE CAJERAS Y TALUDES**



TRAMO	ABSCISADO		CANTIDAD EJECUTADA (m3)	VOLUMEN EXCAVADO (m3)	OBSERVACIONES
	DESDE	HASTA			
1	1+600.00	3+000.00	4 219.60	4 219.60	Ver anexo justificativo Rubro 4
<b>TOTAL</b>			<b>4219.60</b>		

PLANILLADO ANTERIORMENTE =	3 119.20 m <sup>3</sup>
TOTAL CONTRATADO =	68 863.54 m <sup>3</sup>
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	4 219.60 m <sup>3</sup>
CANTIDAD PLANILLADA =	7 338.80 m <sup>3</sup>
EXCEDENTES =	- m <sup>3</sup>



Firmado electrónicamente por:  
**ODILO VINCICIO  
GUEVARA MARIN**



Firmado electrónicamente por:  
**JESSICA MARIELA  
JARAMILLO ARMIJOS**

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
**CONTRATISTA**

KEYSZEN S.A.S  
**FISCALIZADOR EXTERNO**



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
 PROVINCIAL DE PASTAZA  
 ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO



<b>PROYECTO:</b>	ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA						
<b>CONTRATISTA:</b>	CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.						
<b>PLANILLA N°:</b>	2				<b>N° RUBRO</b>	4	
<b>PERIODO:</b>	01-mar-23		-		31-mar-23		<b>UNIDAD:</b> m³
<b>Excavación sin clasificar(mov.de tierra)</b>							
<b>Abs. 1+600 a la 3+000</b>							
ABSCISAS	LONGITUD (M)	CAJERAS (M2)	ÁREA CORTE(M2)	AREA T. CORTE. (M2)	ÁREA PROMEDIO (M2)	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO (M3)
1+600.00		1.73	1.6	3.33			
	20.00				4.42	88.40	88.40
1+620.00		2.31	3.19	5.5			
	20.00				5.49	109.80	198.20
1+640.00		2.02	3.46	5.48			
	20.00				2.74	54.80	253.00
1+660.00		0	0	0			
	20.00				0.00	0.00	253.00
1+680.00		0	0	0			
	20.00				0.00	0.00	253.00
1+700.00		0	0	0			
	20.00				0.00	0.00	253.00
1+720.00		0	0	0			
	20.00				2.31	46.20	299.20
1+740.00		1.79	2.82	4.61			
	20.00				6.88	137.60	436.80
1+760.00		2.78	6.36	9.14			
	20.00				8.80	176.00	612.80
1+780.00		3.25	5.2	8.45			
	20.00				9.21	184.20	797.00
1+800.00		3.77	6.2	9.97			
	20.00				7.25	145.00	942.00
1+820.00		1.15	3.37	4.52			
	20.00				5.25	105.00	1 047.00
1+840.00		1.83	4.15	5.98			
	20.00				7.61	152.20	1 199.20
1+860.00		2.18	7.06	9.24			
	20.00				7.47	149.40	1 348.60
1+880.00		1.73	3.97	5.7			
	20.00				8.46	169.20	1 517.80
1+900.00		6.19	5.02	11.21			
	20.00				7.92	158.40	1 676.20
1+920.00		3.21	1.42	4.63			
	20.00				6.28	125.60	1 801.80
1+940.00		3.33	4	7.33			
	20.00				5.95	119.00	1 920.80
1+960.00		3.14	0.83	3.97			
	20.00				2.07	41.40	1 962.20
1+980.00		0	0.16	0.16			
	20.00				0.08	1.60	1 963.80
2+000.00		0	0	0			
	20.00				1.44	28.80	1 992.60

ABSCISAS	LONGITUD (M)	CAJERAS (M2)	ÁREA CORTE(M2)	AREA T. CORTE. (M2)	ÁREA PROMEDIO (M2)	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO (M3)
2+020.00		2.41	0.47	2.88			
	20.00				2.86	57.20	2 049.80
2+040.00		2.26	0.58	2.84			
	20.00				2.16	43.20	2 093.00
2+060.00		1.39	0.08	1.47			
	20.00				3.14	62.80	2 155.80
2+080.00		2.91	1.9	4.81			
	20.00				4.96	99.20	2 255.00
2+100.00		2.59	2.52	5.11			
	20.00				4.11	82.20	2 337.20
2+120.00		2.64	0.46	3.1			
	20.00				2.64	52.80	2 390.00
2+140.00		2.1	0.08	2.18			
	20.00				1.09	21.80	2 411.80
2+160.00		0	0	0			
	20.00				1.02	20.40	2 432.20
2+180.00		2.02	0.01	2.03			
	20.00				2.86	57.20	2 489.40
2+200.00		2.31	1.37	3.68			
	20.00				3.60	72.00	2 561.40
2+220.00		2.32	1.19	3.51			
	20.00				3.12	62.40	2 623.80
2+240.00		2.44	0.29	2.73			
	20.00				2.77	55.40	2 679.20
2+260.00		2.76	0.04	2.8			
	20.00				3.03	60.60	2 739.80
2+280.00		2.7	0.55	3.25			
	20.00				3.02	60.40	2 800.20
2+300.00		2.38	0.41	2.79			
	20.00				2.35	47.00	2 847.20
2+320.00		1.88	0.03	1.91			
	20.00				0.96	19.20	2 866.40
2+340.00		0	0	0			
	20.00				0.00	0.00	2 866.40
2+360.00		0	0	0			
	20.00				0.00	0.00	2 866.40
2+380.00		0	0	0			
	20.00				1.32	26.40	2 892.80
2+400.00		2.18	0.45	2.63			
	20.00				5.59	111.80	3 004.60
2+420.00		2.33	6.22	8.55			
	20.00				5.83	116.60	3 121.20
2+440.00		2.18	0.93	3.11			
	20.00				2.42	48.40	3 169.60
2+460.00		1.72	0.01	1.73			
	20.00				1.06	21.20	3 190.80
2+480.00		0.38	0	0.38			
	20.00				1.05	21.00	3 211.80
2+500.00		1.52	0.19	1.71			
	20.00				2.45	49.00	3 260.80
2+520.00		2.32	0.87	3.19			
	20.00				2.94	58.80	3 319.60
2+540.00		2.2	0.49	2.69			
	20.00				2.57	51.40	3 371.00
2+560.00		1.86	0.59	2.45			
	20.00				2.51	50.20	3 421.20

ABSCISAS	LONGITUD (M)	CAJERAS (M2)	ÁREA CORTE(M2)	AREA T. CORTE. (M2)	ÁREA PROMEDIO (M2)	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO (M3)
2+580.00		2.116	0.46	2.576			
	20.00				1.96	39.20	3 460.40
2+600.00		1.34	0	1.34			
	20.00				1.85	37.00	3 497.40
2+620.00		1.98	0.37	2.35			
	20.00				2.03	40.60	3 538.00
2+640.00		1.68	0.02	1.7			
	20.00				1.80	36.00	3 574.00
2+660.00		1.89	0	1.89			
	20.00				2.14	42.80	3 616.80
2+680.00		2.23	0.16	2.39			
	20.00				3.17	63.40	3 680.20
2+700.00		2.32	1.62	3.94			
	20.00				3.13	62.60	3 742.80
2+720.00		2.023	0.29	2.313			
	20.00				2.09	41.80	3 784.60
2+740.00		1.79	0.07	1.86			
	20.00				1.38	27.60	3 812.20
2+760.00		0.9	0	0.9			
	20.00				1.17	23.40	3 835.60
2+780.00		1.42	0.01	1.43			
	20.00				1.45	29.00	3 864.60
2+800.00		1.47	0	1.47			
	20.00				1.83	36.60	3 901.20
2+820.00		1.725	0.47	2.195			
	20.00				1.70	34.00	3 935.20
2+840.00		1.72	0.08	1.2			
	20.00				1.01	20.20	3 955.40
2+860.00		0.82	0	0.82			
	20.00				1.34	26.80	3 982.20
2+880.00		1.79	0.06	1.85			
	20.00				2.20	44.00	4 026.20
2+900.00		2.31	0.23	2.54			
	20.00				2.27	45.40	4 071.60
2+920.00		1.7	0.3	2			
	20.00				2.02	40.40	4 112.00
2+940.00		1.9	0.13	2.03			
	20.00				1.80	36.00	4 148.00
2+960.00		1.57	0	1.57			
	20.00				1.42	28.40	4 176.40
2+980.00		1.23	0.03	1.26			
	20.00				2.16	43.20	4 219.60
3+000.00		2.42	0.64	3.06			
<b>SUB TOTAL EJECUTADO (M3)</b>							<b>4 219.60</b>



Firmado electrónicamente por:  
ODILO VINICIO  
GUZMÁN MARÍN



Firmado electrónicamente por:  
JESSICA MARIELA  
JARAMILLO ARMIJOS

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
CONTRATISTA

KEYSZEN S.A.S  
FISCALIZADOR EXTERNO




**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA  
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO**



<b>PROYECTO:</b>	ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
<b>CONTRATISTA:</b>	C/A. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.,		
<b>PLANILLA N°:</b>	2	<b>N° RUBRO:</b>	17
<b>PERIODO:</b>	01-mar-23	31-mar-23	<b>UNIDAD:</b> m <sup>3</sup>

Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)

**SECCIÓN TRANSVERSAL TIPO  
MEJORAMIENTO DE CAJERAS Y TERRAPLEN**



TRAMO	ABSCISADO		CANTIDAD EJECUTADA (m3)	OBSERVACIONES
	DESDE	HASTA		
1	1+600.00	3+000.00	7 662.20	Ver anexo justificativo Rubro 17
<b>TOTAL</b>			<b>7 662.20</b>	

PLANILLADO ANTERIORMENTE =	6 828.20 m <sup>3</sup>
TOTAL CONTRATADO =	68 863.54 m <sup>3</sup>
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	7 662.20 m <sup>3</sup>
CANTIDAD PLANILLADA =	14 490.40 m <sup>3</sup>
EXCEDENTES =	- m <sup>3</sup>



Firmado electrónicamente por:  
**ODILO VINICIO  
GUEVARA MARIN**

C/A. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:  
**JESSICA MARIELA  
JARAMILLO ARMIJOS**

KEYSZEN S.A.S  
FISCALIZADOR EXTERNO



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA  
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO



<b>PROYECTO:</b>	ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
<b>CONTRATISTA:</b>	CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.		
<b>PLANILLA No.</b>	2	<b>Nº RUBRO</b>	17
<b>PERIODO:</b>	01-mar-23	31-mar-23	<b>UNIDAD:</b> m³

Materiales para el pavimento (mineral, carga y resaca)

Abs. 1+600 a la 3+000

ABSCISAS	LONGITUD (M)	CAJERAS (M2)	ÁREA RELLENO(M2)	AREA T. (M2)	ÁREA PROMEDIO	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO (M3)
1+600.00		1.73	0	1.73			
	20.00	0			2.02	40.40	40.40
1+620.00		2.31	0	2.31			
	20.00	0			2.17	43.40	83.80
1+640.00		2.02	0	2.02			
	20.00	0			20.36	407.20	491.00
1+660.00		0	27.74	38.7			
	20.00	0			33.41	668.20	1 159.20
1+680.00		0	28.11	28.11			
	20.00	0			25.91	518.20	1 677.40
1+700.00		0	23.7	23.7			
	20.00	0			22.07	441.40	2 118.80
1+720.00		0	20.43	20.43			
	20.00	0			13.08	261.60	2 380.40
1+740.00		1.79	3.94	5.73			
	20.00	0			4.85	97.00	2 477.40
1+760.00		2.78	1.19	3.97			
	20.00	0			4.09	81.80	2 559.20
1+780.00		3.25	0.96	4.21			
	20.00	0			4.03	80.60	2 639.80
1+800.00		3.77	0.07	3.84			
	20.00	0			5.73	114.60	2 754.40
1+820.00		1.15	6.46	7.61			
	20.00	0			8.50	170.00	2 924.40
1+840.00		1.83	7.56	9.39			
	20.00	0			7.69	153.80	3 078.20
1+860.00		2.18	3.8	5.98			
	20.00	0			4.54	90.80	3 169.00
1+880.00		1.73	1.37	3.1			
	20.00	0			4.65	93.00	3 262.00
1+900.00		6.19	0	6.19			
	20.00	0			5.37	107.40	3 369.40
1+920.00		3.21	1.33	4.54			
	20.00	0			4.69	93.80	3 463.20
1+940.00		3.93	0.91	4.84			
	20.00	0			4.62	92.40	3 555.60
1+960.00		3.14	1.25	4.39			
	20.00	0			5.45	109.00	3 664.60
1+980.00		0	6.5	6.5			
	20.00	0			10.87	217.40	3 882.00
2+000.00		0	15.24	15.24			
	20.00	0			9.64	192.80	4 074.80
2+020.00		2.41	1.62	4.03			
	20.00	0			3.47	69.40	4 144.20
2+040.00		2.26	0.64	2.9			
	20.00	0			3.39	67.80	4 212.00
2+060.00		1.39	2.49	3.88			
	20.00	0			3.40	68.00	4 280.00
2+080.00		2.91	0	2.91			
	20.00	0			2.75	55.00	4 335.00
2+100.00		2.59	0	2.59			
	20.00	0			2.77	55.40	4 390.40
2+120.00		2.64	0.31	2.95			
	20.00	0			3.33	66.60	4 457.00
2+140.00		2.1	1.61	3.71			
	20.00	0			5.50	110.00	4 567.00
2+160.00		0	7.28	7.28			

	20.00	0			5.63	112.60	4 679.60
2+180.00		2.02	1.96	3.98			
	20.00	0			3.15	63.00	4 742.60
2+200.00		2.31	0	2.31			
	20.00	0			2.32	46.40	4 789.00
2+220.00		2.32	0	2.32			
	20.00	0			2.89	57.80	4 846.80
2+240.00		2.44	1.01	3.45			
	20.00	0			3.28	65.60	4 912.40
2+260.00		2.76	0.34	3.1			
	20.00	0			3.23	64.60	4 977.00
2+280.00		2.7	0.65	3.35			
	20.00	0			3.03	60.60	5 037.60
2+300.00		2.38	0.32	2.7			
	20.00	0			2.93	58.60	5 096.20
2+320.00		1.88	1.28	3.16			
	20.00	0			6.56	131.20	5 227.40
2+340.00		0	9.95	9.95			
	20.00	0			10.23	204.60	5 432.00
2+360.00		0	10.51	10.51			
	20.00	0			9.61	192.20	5 624.20
2+380.00		0	8.7	8.7			
	20.00	0			5.57	111.40	5 735.60
2+400.00		2.18	0.26	2.44			
	20.00	0			2.39	47.80	5 783.40
2+420.00		2.33	0	2.33			
	20.00	0			2.41	48.20	5 831.60
2+440.00		2.18	0.3	2.48			
	20.00	0			4.25	85.00	5 916.60
2+460.00		1.72	4.29	6.01			
	20.00	0			7.14	142.80	6 059.40
2+480.00		0.38	7.89	8.27			
	20.00	0			5.71	114.20	6 173.60
2+500.00		1.52	1.62	3.14			
	20.00	0			2.80	56.00	6 229.60
2+520.00		2.32	0.14	2.46			
	20.00	0			2.55	51.00	6 280.60
2+540.00		2.2	0.44	2.64			
	20.00	0			2.78	55.60	6 336.20
2+560.00		1.86	1.06	2.92			
	20.00	0			3.10	62.00	6 398.20
2+580.00		2.116	1.16	3.276			
	20.00	0			3.16	63.20	6 461.40
2+600.00		1.34	1.71	3.05			
	20.00	0			2.80	56.00	6 517.40
2+620.00		1.98	0.56	2.54			
	20.00	0			2.53	50.60	6 568.00
2+640.00		1.68	0.83	2.51			
	20.00	0			2.77	55.40	6 623.40
2+660.00		1.89	1.13	3.02			
	20.00	0			2.91	58.20	6 681.60
2+680.00		2.23	0.57	2.8			
	20.00	0			2.56	51.20	6 732.80
2+700.00		2.32	0	2.32			
	20.00	0			2.36	47.20	6 780.00
2+720.00		2.023	0.38	2.403			
	20.00	0			2.52	50.40	6 830.40
2+740.00		1.79	0.84	2.63			
	20.00	0			2.61	52.20	6 882.60
2+760.00		0.9	1.69	2.59			
	20.00	0			2.85	57.00	6 939.60
2+780.00		1.42	1.68	3.1			
	20.00	0			3.13	62.60	7 002.20
2+800.00		1.47	1.69	3.16			
	20.00	0			2.89	57.80	7 060.00
2+820.00		1.725	0.9	2.625			
	20.00	0			3.17	63.40	7 123.40
2+840.00		1.12	2.6	3.72			
	20.00	0			4.29	85.80	7 209.20
2+860.00		0.82	4.04	4.86			
	20.00	0			3.96	79.20	7 288.40
2+880.00		1.79	1.26	3.05			

	20.00	0			3.50	70.00	7 358.40
2+900.00		2.31	1.63	3.94			
	20.00	0			3.53	70.60	7 429.00
2+920.00		1.7	1.41	3.11			
	20.00	0			2.82	56.40	7 485.40
2+940.00		1.9	0.63	2.53			
	20.00	0			2.71	54.20	7 539.60
2+960.00		1.57	1.31	2.88			
	20.00	0			3.18	63.60	7 603.20
2+980.00		1.23	2.25	3.48			
	20.00	0			2.95	59.00	7 662.20
3+000.00		2.42	0	2.42			
							7 662.20
<b>SUB TOTAL EJECUTADO (M3)</b>							<b>7 662.20</b>
<b>TOTAL EJECUTADO EN PLANILLA (M3)</b>							<b>7 662.20</b>



Firmado electrónicamente por:  
**ODIRO VINICIO**  
**GUEVARA MARIN**

**CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.**  
**CONTRATISTA**



Firmado electrónicamente por:  
**JESSICA MARIELA**  
**JARAMILLO ARMIJOS**

**KEYSZEN S.A.S**  
**FISCALIZADOR EXTERNO**



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA  
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO**



<b>PROYECTO:</b>	ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
<b>CONTRATISTA:</b>	CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.		
<b>PLANILLA N°:</b>	2	<b>N° RUBRO:</b>	20
<b>PERIODO:</b>	01-mar-23	31-mar-23	<b>UNIDAD:</b> m <sup>3</sup>

Transporte material de desalojo



DESCRIPCIÓN	VOLQUETA	DIMENSIONES (m)			DESCUENTO			SUBTOTAL VOLUMEN		VIAJES Numero	VIAJES Volumen desalojado m <sup>3</sup>	OBSERVACIONES
		LARGO (m)	ANCHO (m)	Altura (m)	BASE MENOR (m)	MASE MAYOR (m)	ANCHO (m)	REAL	ASUMIDO			
Desalojo mecanico volqueta tierra/escombros	VOLQUETA 1	4.38	2.15	1.15	0.5	0.8	0.31	10.63	10	11	110	distancia a la escombrera 1.5 km
	VOLQUETA 2	4.35	2.13	1.12	0.5	0.8	0.32	10.17	10	11	110	distancia a la escombrera 1.5 km
	VOLQUETA 3	4.35	2.2	1.3	0.45	0.8	0.25	12.28	12	11	132	distancia a la escombrera 1.5 km
	VOLQUETA 4	4.5	2.2	1.36	0.5	0.8	0.39	13.21	13	11	143	distancia a la escombrera 1.5 km
	VOLQUETA 5	4.35	2.16	1.18	0.5	0.8	0.39	10.83	10	11	110	distancia a la escombrera 1.5 km
	VOLQUETA 6	4.37	2.14	1.17	0.5	0.86	0.28	10.75	10	11	110	distancia a la escombrera 1.5 km
	VOLQUETA 7	4.35	2.17	1.16	0.5	0.9	0.39	10.68	10	11	110	distancia a la escombrera 1.5 km
	VOLQUETA 8	4.42	2.32	1.22	0.38	0.6	0.24	12.39	12	11	132	distancia a la escombrera 1.5 km
	VOLQUETA 9	4.43	2.17	1.17	0.55	0.9	0.29	11.04	11	11	121	distancia a la escombrera 1.5 km
	VOLQUETA 10	4.3	2.17	1.17	0.5	0.85	0.29	10.72	10	11	110	distancia a la escombrera 1.5 km
	VOLQUETA 11	4.7	2.22	1.2	0.14	0.4	0.3	12.44	12	11	132	distancia a la escombrera 1.5 km
	VOLQUETA 12	4.5	2.35	1.15	0.3	0.35	0.3	12.06	12	11	132	distancia a la escombrera 1.5 km
	VOLQUETA 13	4.28	2.25	1.15				11.06	11	11	121	distancia a la escombrera 1.5 km
	VOLQUETA 14	4.68	2.29	1.1	0.33	0.82	0.27	11.63	11	11	121	distancia a la escombrera 1.5 km
	VOLQUETA 15	4.66	2.31	1.13	0.34	0.8	0.3	11.99	12	11	132	distancia a la escombrera 1.5 km
	VOLQUETA 16	4.89	2.2	1.37				14.74	14	11	154	distancia a la escombrera 1.5 km
	VOLQUETA 17	4.37	2.18	1.17	0.5	0.8	0.35	10.33	10	11	110	distancia a la escombrera 1.5 km
<b>TOTAL</b>											<b>2090.00</b>	

PLANILLADO ANTERIORMENTE =	-	m <sup>3</sup>
TOTAL CONTRATADO =	8 746.43	m <sup>3</sup>
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	2 090.00	m <sup>3</sup>
CANTIDAD PLANILLADA	2 090.00	m <sup>3</sup>
EXCEDENTES =	-	m <sup>3</sup>



Firmado electrónicamente por:  
**ODILO VINICIO  
GUEVARA MARIN**



Firmado electrónicamente por:  
**JESSICA MARIELA  
JARAMILLO ARMIJOS**

CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
CONTRATISTA

KEYSZEN S.A.S  
FISCALIZADOR EXTERNO



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
 PROVINCIAL DE PASTAZA  
 ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO



<b>PROYECTO:</b>	ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
<b>CONTRATISTA:</b>	CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.		
<b>PLANILLA N°:</b>	2	<b>N° RUBRO:</b>	21
<b>PERIODO:</b>	01-mar-23	31-mar-23	<b>UNIDAD:</b> m³ - km

Transporte de material pétreo de mejoramiento



TRAMO	ABSCISADO		CANTIDAD EJECUTADA (m3)	DISTANCIA MINA - INICIO PROYECTO (Km)	CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO (Km)	DISTANCIA TOTAL (Km)	TOTAL (m³ - Km)	OBSERVACIONES
	DESDE	HASTA						
1	1+600.00	3+000.00	7 682.20	31.33	1.65	32.98	252 699.36	Cantidades detalladas en Anexo 17
<b>SUB TOTAL</b>							252 699.36	

<b>PLANILLADO ANTERIORMENTE =</b>	225 194.04	m³ - km
<b>TOTAL CONTRATADO =</b>	3 309 493.83	m³ - km
<b>CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =</b>	252 699.36	m³ - km
<b>CANTIDAD PLANILLADA</b>	477 893.40	m³ - km
<b>EXCEDENTES =</b>	-	m³ - km



Firmado electrónicamente por:  
 ODILO VINICIO  
 GUEVARA MARIN



Firmado electrónicamente por:  
 JESSICA MARIELA  
 JARAMILLO ARMIJOS

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
 CONTRATISTA

KEYSZEN S.A.S  
 FISCALIZADOR EXTERNO



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
 PROVINCIAL DE PASTAZA  
 ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO



PROYECTO:	ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
CONTRATISTA:	CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.		
PLANILLA N°:	2		N° RUBRO: 30
PERIODO:	01-mar-23	31-mar-23	UNIDAD: u

Pancarta Informativa (letrero)-con estructura



DESCRIPCIÓN DEL IMPLEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Pancarta Informativa (letrero)-con estructura	u	1.00	
<b>TOTAL</b>		<b>1.00</b>	

PLANILLADO ANTERIORMENTE =	-	u
TOTAL CONTRATADO =	1.00	u
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	1.00	u
CANTIDAD PLANILLADA	1.00	u
EXCEDENTES =	-	u



Firmado electrónicamente por:  
 ODILO VINICIO  
 GUEVARA MARIN

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
 CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:  
 JESSICA MARIELA  
 JARAMILLO ARMIJOS

KEYSZEN S.A.S  
 FISCALIZADOR EXTERNO



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

PROVINCIAL DE PASTAZA

ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO



<b>PROYECTO:</b>	ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
<b>CONTRATISTA:</b>	CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.		
<b>PLANILLA N°:</b>	2	<b>N° RUBRO:</b>	39
<b>PERIODO:</b>	01-mar-23	31-mar-23	<b>UNIDAD:</b> m

Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)



DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBSERVACIONES
Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	90.00	
<b>TOTAL</b>	<b>90.00</b>	

PLANILLADO ANTERIORMENTE =	90.00 m
TOTAL CONTRATADO =	100.00 m
CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =	90.00 m
CANTIDAD PLANILLADA	180.00 m
EXCEDENTES =	80.00 m














Firmado electrónicamente por:  
ODILO VINICIO  
GUEVARA MARIN




Firmado electrónicamente por:  
JESSICA MARIELA  
JARAMILLO ARMIJOS

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
CONTRATISTA

KEYSZEN S.A.S  
FISCALIZADOR EXTERNO

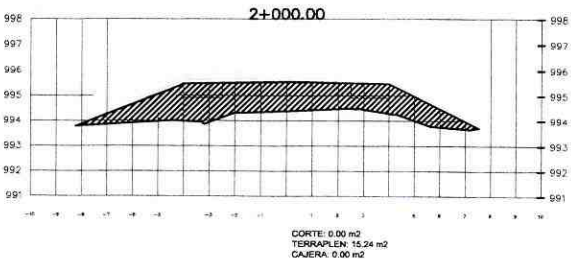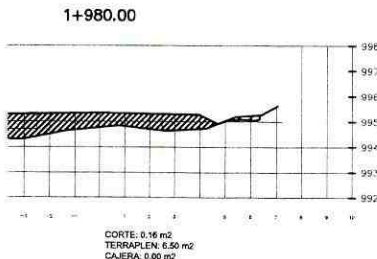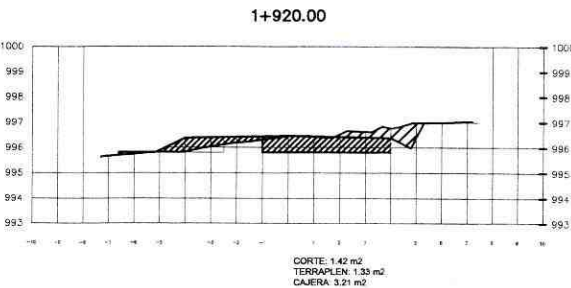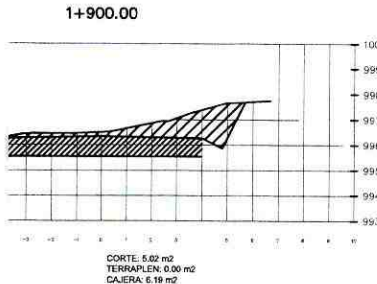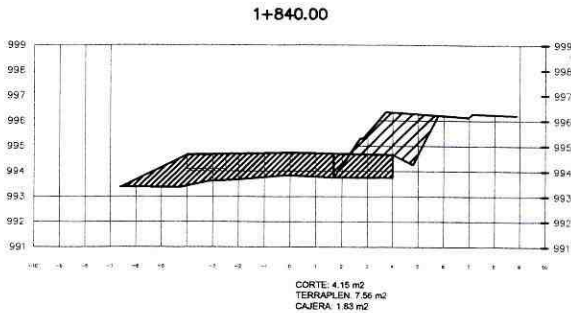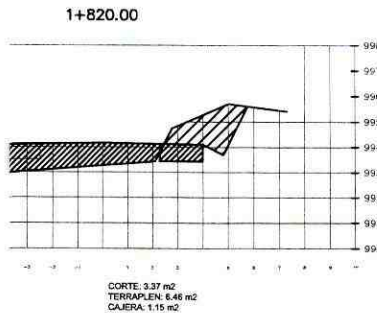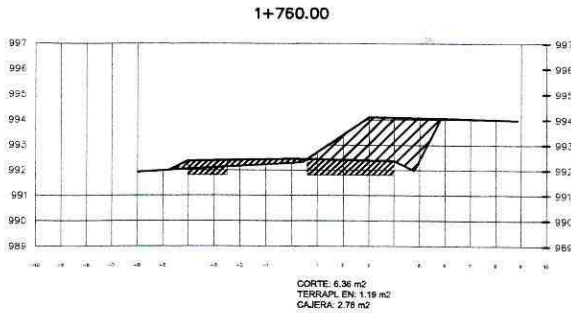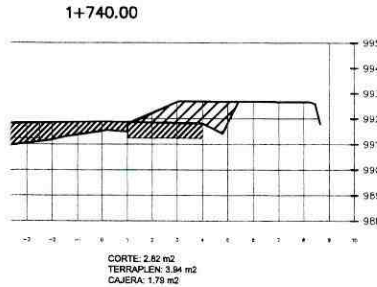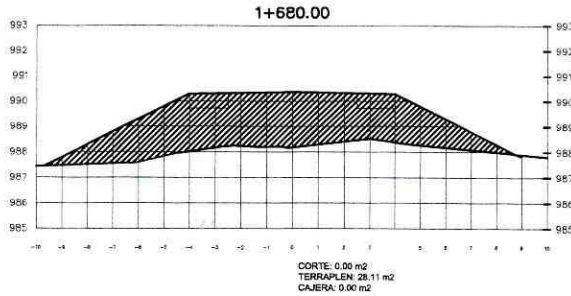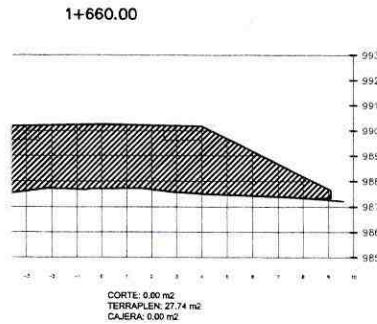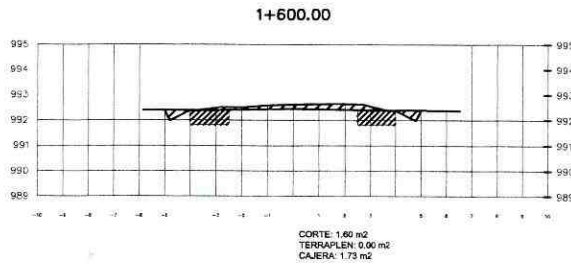

 <b>astaza</b> GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA	<b>Administración 2019-2023</b>	<b>GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA</b>	
	ASFALTADO DE LA VÍA GURANAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACHA, HASTA EL KM 12 VÍA 16 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CLASE: EXCAVACION	HOJA: 1 DE 4
		DESDE: 1+600	ESCALA H: 1:1000
		HASTA: 2+040	ESCALA V: 1:100
	CONTENIDO: SECCIONES TRANSVERSALES DE CORTE Y RELLENO	ESTUDIO: DEFINITIVO	DIBUJO: KM
INTRATISTA:  Firmado electrónicamente por: <b>ODILO VINICIO GUEVARA MARIN</b>	FISCALIZADOR EXTERNO:  Firmado electrónicamente por: <b>JESSICA MARIELA JARAMILLO ARMIJOS</b>		
SR. ODILO GUEVARA MARIN C/TE GENERAL AMAZONAS BUILDING S.A	ING. JESSICA JARAMILLO GERENTE GENERAL KEYSZEN S.A.S		

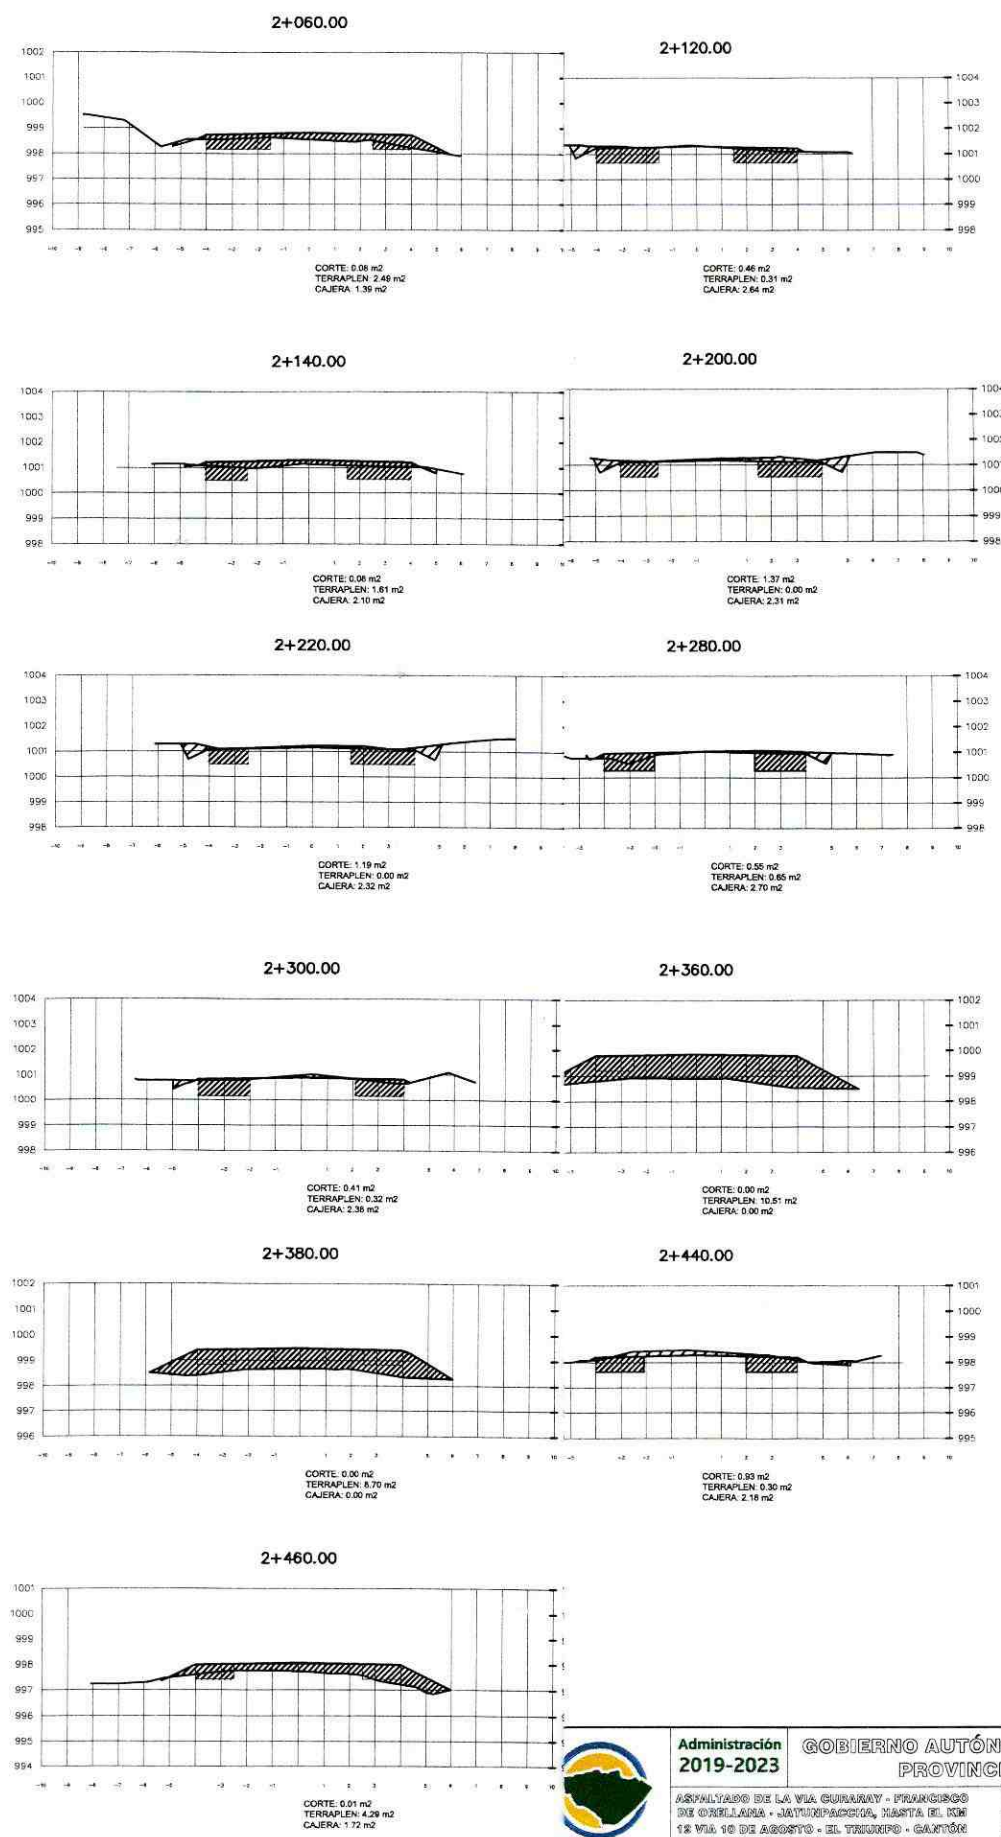

Administración **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO**  
2019-2023 **PROVINCIAL DE PASTAZA**

ASIGNADO DE LA VÍA GUARAY - FRANCISCO DE ORILLANA - JAYUMAPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 90 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

CLASE: EXCAVACION HOJA: 2 DE 4  
DESDE: 2+060 ESCALA H: 1:1000  
HASTA: 2+500 ESCALA V: 1:100

CONTENIDO: SECCIONES TRANSVERSALES DE CORTE Y RELLENO

ESTUDIO: DEFINITIVO DIBUJO: KM

CONTRATISTA:



ODILO VINICIO GUEVARA MARIN












SR. ODILO GUEVARA MARIN  
VTE GENERAL AMAZONAS BUILDING S.A

FISCALIZADOR EXTERNO:




JESSICA MARILIA JARAMILLO ARMIJOS

ING. JESSICA JARAMILLO  
GERENTE GENERAL KEYSZEN S.A.S

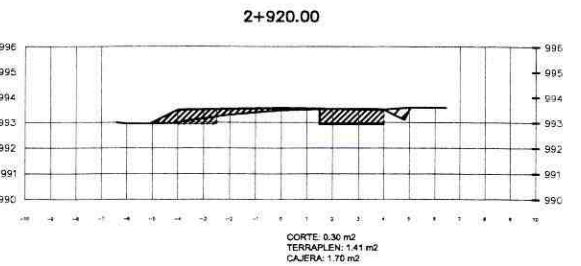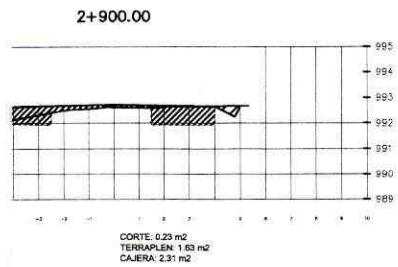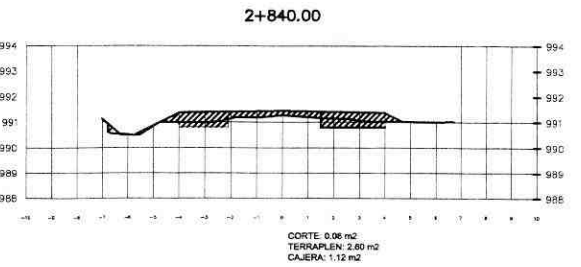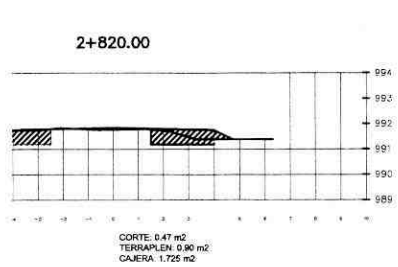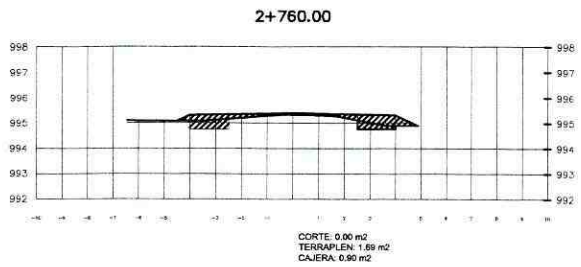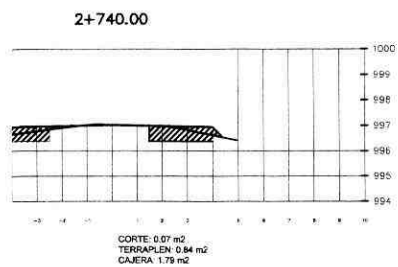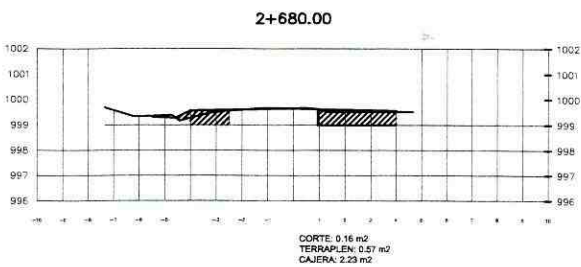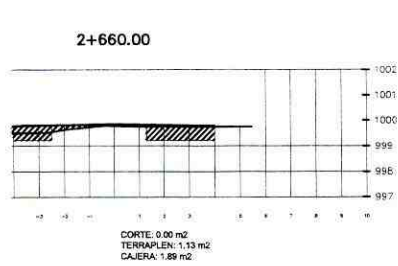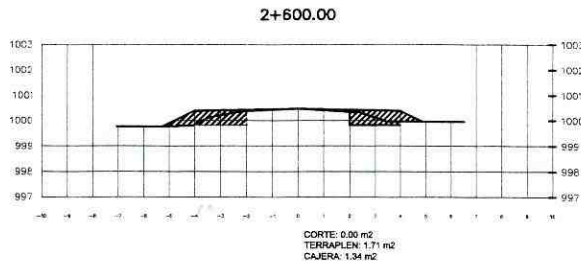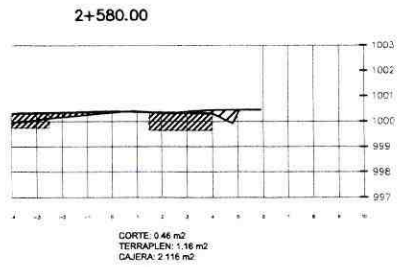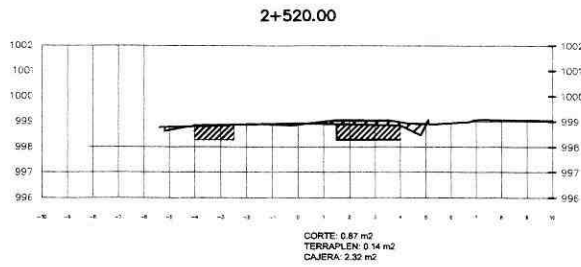

 <p><b>Pastaza</b> GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA</p>	<p><b>Administración 2019-2023</b></p>	<p><b>GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA</b></p>	
	<p>ASFOYADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA</p>	<p>CLASE: EXCAVACION</p>	<p>HOJA: 3 DE 4</p>
<p>CONTENIDO: SECCIONES TRANSVERSALES DE CORTE Y RELLENO</p>	<p>DESDE: 2+520</p>	<p>ESCALA H: 1:1000</p>	
<p>CONTRATISTA:</p> <p>ODILO VINICIO GUEVARA MARIN</p>	<p>HASTA: 2+960</p>	<p>ESCALA V: 1:100</p>	
<p>FISCALIZADOR EXTERNO:</p> <p>JESSICA MARIELA JARAMILLO ARMIJOS</p>	<p>ESTUDIO: DEFINITIVO</p>	<p>DIBUJO: KM</p>	
<p>SR. ODILO GUEVARA MARIN DIRECCIÓN GENERAL AMAZONAS BUILDING S.A</p>	<p>ING. JESSICA JARAMILLO GERENTE GENERAL KEYSZEN S.A.S</p>		

2+980.00



CORTE: 6.03 m<sup>2</sup>  
 TERRAPLEN: 2.25 m<sup>2</sup>  
 CAJERA: 1.25 m<sup>2</sup>

 <b>Pastaza</b> GOBIERNO PROVINCIAL	<b>Administración</b> 2019-2023	<b>GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO</b> <b>PROVINCIAL DE PASTAZA</b>		
	ASPALTADO DE LA VÍA CUNARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACHA, MARTA EL DE 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CLASE: EXCAVACION	HOJA: 4 DE 4	
	CONTENIDO: SECCIONES TRANSVERSALES DE CORTE Y RELLENO	DESDE: 2+980 HASTA: 3+000	ESCALA H: 1:1000 ESCALA V: 1:100	
	CONTRATISTA:  Firmado electrónicamente por: <b>ODILO VINICIO GUEVARA MARIN</b>	FISCALIZADOR EXTERNO:  Firmado electrónicamente por: <b>JESSICA MARIELA JARAMILLO ARMIJOS</b>	ESTUDIO: DEFINITIVO DIBUJO: KM	
SR. ODILO GUEVARA MARIN ENTE GENERAL AMAZONAS BUILDING S.A	ING. JESSICA JARAMILLO GERENTE GENERAL KEYSZEN S.A.S			


9845400.000

9845500.000

1742

173800.01

173700

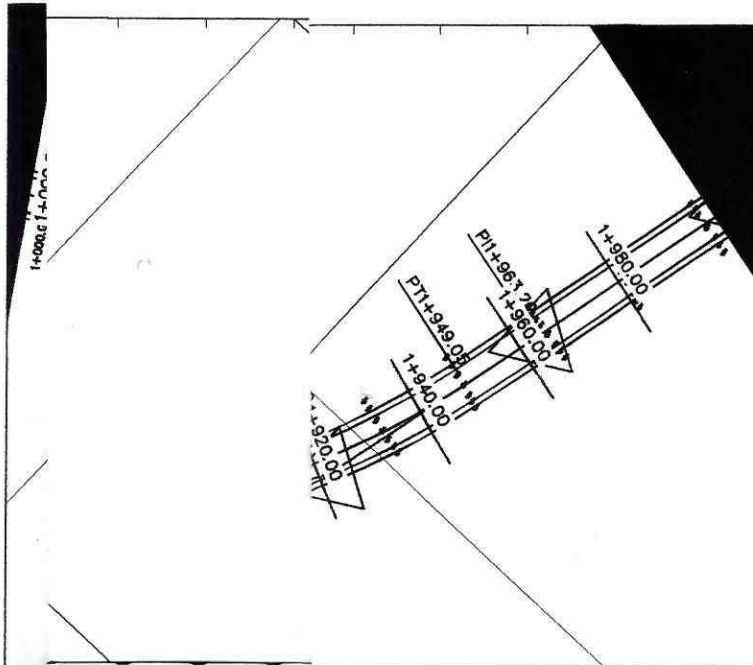

1+00	994.18	994.05	0.13
1+58	993.51	993.44	0.06
1+60	992.62	992.45	0.17
1+62	991.60	991.24	0.36

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA

VIA GJRALAY - FRANCISCO TUNPACCHA, HASTA EL KM	CLASE: EXCAVACION	HOJA: 1 DE 2
PTO - EL TRIUNFO - CANTÓN	DESDE: 1+000	ESCALA H: 1:1000
PROVINCIA DE PASTAZA	HASTA: 2+000	ESCALA V: 1:100
PERFIL DE VIA	ESTUDIO: DEFINITIVO	DIBUJO: KM

0%EN	6.17%EN	6.17%EN
0.00m	30.00m	13.08m

FISCALIZADOR EXTERNO:



JESSICA MARIELA  
JARAMILLO ARMIJOS

ING. JESSICA JARAMILLO  
GERENTE GENERAL KEYSZEN S.A.S



**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

# LIBRO DE OBRA

"ASFALTADO DE LA VIACURARAY -FRANCISCO DE ORELLANA-JATUN PACCHA, HASTA EL KILOMETRO  
12 VIA 10 DE AGOSTO -EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"





PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 01 Mes 03 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: Descarga - Extendido, Regalo - Compactado y Nivelado de Material de mejoramiento  
 Abi: 2 + 600 Abf: 2 + 650

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: *Aluvoso* TARDE: *Aluvoso* NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
VOLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPOGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOPERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMATICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 02 Mes 03 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: Puente entre Ab 2+650 y Ab 2+660  
 Desbroce y limpieza - Excavación de un área de drenaje - Fudo Derechos  
 Descarga - Extendidos - Pegado - Compactado y Nivelados de Material de Mejoramiento  
 Abi: 2+660 Abf: 2+680 - Conformado de Terapien

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: *Huayaquet* TARDE: *nublado* NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
VOLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

  
 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

  
 FISCALIZADOR (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCODEORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCODEORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 03 Mes 03 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: *Dobroce & Limpieza - Exposición de Exposamiento - Todo Descarte Descarga Extendido - Regado - Compactado & Nivelación de Material de Mejoramiento - Conformación de Terraplen*  
*Abi: 2+680 Abf: 1+710*

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: *Huvia fuerte* TARDE: *Huvia fuerte* NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
VOLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
TRUJILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

*[Signature]*  
CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

*[Signature]*  
CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 04 Mes 03 Año 2023

Trabajos realizados: *Desbroce y limpieza - Excavador de Encohusamientos - Trabajo de desechos - Desacargo - Extensidors - Peglos - Compactados - Nivelados de material de Mejoramiento - Conformación de terraplen*  
*Shis: 1+710 Abf: 1+710*

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: *Nublado* TARDE: *Lluvioso* NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
VOLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PIANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	1

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA) *[Firma]*

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA) *[Firma]*



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 05 Mes 03 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJO REALIZADO: Desbroce Limpieza - Excavación de Escavamientos para drenajes  
 Drenaje - Expendido - Pegado - Compactado - Nivelado de Material de Mejoramiento  
 Conformación de Terapien  
 Abf: 1+740 Abf: 1+770  
 Replanteo 6 divisiones Abf: 2+000 Abf: 3+200

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: *Sublata* TARDE: *Lluvia* NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
VOLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPOGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LINEA	1	TRUHEROS	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMATICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos especificos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicacion)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

  
 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

  
 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 06 Mes 03 Año 2023

Trabajos realizados: Desarrollo - Estudios - Desecho - Compactado - Nuclados de Material de Mejoramiento  
 Leds Desecho M3: 1+660 Abf: 1+710  
 Desecho de Limpieza - Excavación de Geos M3: 2+000 M3: 2+080

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: *Hurioso* TARDE: *Soleado* NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
VOLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERS	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos especificos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicacion)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

*[Signature]*

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

*[Signature]*

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 07 Mes 03 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: *Desbroce - Extensión - Regala - compactado - Nivelado de Material de mejoramiento talo de c/ds Abj: it 710 Desbroce g completa - Excavación de cajeros Abj: 2+080 Abj: 1+770 Abj: 2+180*

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: *Nublado* TARDE: *Soleado* NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
VOLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPOGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMATICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	-
	1	SOLDADORES	1
		JORNALEROS	11

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a trámites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 08 Mes 03 Año 2023

Espacio para el contratista:

TRABAJOS REALIZADOS: Desbroce - Estendidos - Regalo - Compactado - Nivelados - de Material de Mezcla  
 miente Lote 22 queerb Abi: 1+660 Abif: 1+690  
 Desbroce y limpieza - Excavación de cajas Abi: 2+180 Abif: 2+280

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: *El viento fuerte* TARDE: *nublado* NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
VOLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 09 Mes 03 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: Desbroce y limpieza - Equipos de Encubrimiento los ingresos  
Des cargo - Extensivos - Regados - compactados - Nivelado de material de Mejoramiento - en  
permeación de Terraplen - Abj: 1+690 Abj: 1+710  
- Desbroce y limpieza - Equipos de ligeros Abj: 2+280 Abj: 2+400

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: *Huvia fuerte* TARDE: *Nublado* NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
VOLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	0
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO EST	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos especificos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicacion)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

*[Signature]*

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

*[Signature]*

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 10 Mes 03 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: Destroce y limpieza - Excavación de encoframiento para izaje de  
 Desarrollo - Extensión de cunetas - compactación de material de relleno  
 conformación de terraplen Ab: 1+710 Ab: 1+750  
 Destroce y limpieza - Excavación de cunetas Ab: 2+100 Ab: 2+500

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO:		MAÑANA: <i>Lluvioso</i>	TARDE: <i>Lluvioso</i>	NOCHE:
EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO		
MAQUINA	No	CARGO	No	
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1	
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2	
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1	
VOLQUETA	5	Técnico en seguridad	1	
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1	
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1	
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2	
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6	
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5	
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1	
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1	
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1	
APARATOS DE TOPOGRAFÍA	1	ALBAÑILES	1	
		SOLDADORES	1	
		JORNALEROS	4	

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

  
CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

  
CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 11 Mes 03 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: *Desbroce y limpieza - Escaqueo de encoframientos para 12 metros de ancho - Extensión de pedregal - Compactado - Nivelado de Material de Mejoramiento - Colado masilla de Terraplen Ab: 1+780 Ab f: 1+770*

*Desbroce y limpieza - Escaqueo de cofre Ab: 2+500 Ab f: 2+620*

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: *Huivoso* TARDE: *Nublado* NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
VOLQUETA	3	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	5
TRUJILLO VIBRATORIO LINEA	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	5

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos especificos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicacion)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO	ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		
UBICACIÓN	PROVINCIA PASTAZA		
CONTRATISTA	CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.		
CONTRATO	Monto USD 4 650 521.23	FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022	
FISCALIZADOR	KEYSZEN S.A.S		
FECHA DE REPORTE N	Día 12	Mes 03	Año 2023

Espacio para el contratista  
 TRABAJOS REALIZADOS: Desbroce - Limpieza - Excavación de base - Abj: 2+620 Abj: 2+700  
 Desbarrido - Extender - Pegado - Compactado - Nivelado de material de mejoramiento  
 Abj: 1+770 Abj: 1+830

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: *Hurioso* TARDE: *Nublado* NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
VOLQUETA	3	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	2
RODILLO VIBRATORIO UNICO CASO	1	CHOFERES	1
RODILLO VIBRATORIO NEUMATICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

Espacio para la fiscalización  
 INSTRUCCIONES: (relativos a trámites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

*[Firma]*  
 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

*[Firma]*  
 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 13 Mes 03 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: Desbroce y limpieza - Excavación de tierra - M<sup>3</sup>: 21700 M<sup>3</sup>: 21780  
 Descarga - Extensión - Regado - compactado - nivelado - del material de mejoramiento  
 M<sup>3</sup>: 1+830 M<sup>3</sup>: 1+900

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO:		MAÑANA: <i>Húmedo</i>	TARDE: <i>Nublado</i>	NOCHE:
EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO		
MAQUINA	No	CARGO	No	
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1	
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2	
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1	
VOLQUETA	5	Técnico en seguridad	1	
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1	
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPOGRAFO	1	
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2	
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6	
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5	
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1	
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1	
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1	
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1	
		SOLDADORES	1	
		JORNALEROS	4	

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquia, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA) *[Firma]*

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA) *[Firma]*



PROYECTO : ASFALTADO DEL AVIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DEL AVIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 14 Mes 03 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: Destroce Limpieza - Excavación de la capa Abj: 2+780 Abj: 2+900  
 Descarga Extendidos - Pavidos - Compactado - Nivelado - de Material de Mejoramiento  
 Abj: 1+900 Abj: 1+970  
 Mejoramiento de Vía Abj: 1+590 Abj: 1+610

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: *Huvia fuerte* TARDE: *Huvia fuerte* NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
VOLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	2
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	1
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	5
		JORNALEROS	5

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

*[Signature]*  
 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

*[Signature]*  
 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 15 Mes 03 Año 2023

Trabajos realizados: Desbaste y limpieza - Excavación de cunetas - Mh: 2+900, Mh: 3+000  
 Descarga Extintidos - Pegado - Compactado - Nivelados - de Material de Mepla mientas  
 Mh: 1+970 Mh: 2+030

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: *Huvia fuerte* TARDE: *Huvia fuerte* NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
VOLQUETA	5	Técnico en seguridad	4
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	2
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	5

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos especificos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicacion)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA) *[Firma]*

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA) *[Firma]*



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 16 Mes 03 Año 2023

Trabajos realizados: Descarga - Extendidos - Pegos - Compactos - Movidos - de Material de Mejoramiento Ahí: 2+030 Ahí: 2+090

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Solado TARDE: Solado NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	1
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
VOLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	1
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	1
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	1
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	5

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 17 Mes 03 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJO REALIZADO: Desgaso - Extendido - Regado - Compactado - Nivelado - de Material de Mejoramiento  
 Abi: 2+090 Δ Df: 2+160

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: *Nublado* TARDE: *Fluvio* NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
VOLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LÍNEA	1	CHOFERES	3
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 18 Mes 03 Año 2023

Trabajos realizados: *Gravación de Eje de pavimento entre Ab: 2+160 a 2+180 Lab 12 metros 6m de longitud - Desarrollo - Extensión - Pegado - Compactación - Nivelado en el material de mejoramiento - Ab: 2+160 Abf: 2+230 - Mejoramiento de una Ab: 1+550*

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO:		MAÑANA: <i>Huivio</i>	TARDE: <i>Huivio fuerte</i>	NOCHE:
EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO		
MAQUINA	No	CARGO	No	
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1	
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2	
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1	
VOLQUETA	5	Técnico en seguridad	1	
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1	
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1	
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2	
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6	
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	TRUMPETAS	3	
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1	
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1	
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1	
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1	
		SOLDADORES	1	
		JORNALEROS	4	

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos especificos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicacion)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA) *[Firma]*

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA) *[Firma]*



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 19 Mes 03 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: Excavación de Enchusamiento - entre Km 2+220 a 2+230 lado izquierdo con 2 mt de longitud - Descomp - Extendidos - Pegado - Compactado - M. Jalo de material de Mejoamiento Mh: 2+230 Mh F: 2+300 Mejoamiento de via Mh: 1+740 Mh F: 1+760

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado TARDE: Nublado NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
VOLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	1
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	5

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativas a trámites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 20 Mes 03 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: *Desarrollo - Extensión - Regado - Compactado - Nivelado - de Material de Mejoramiento - Abj: 2+300 Abj: 2+370*

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: *Lluvia fuerte* TARDE: *Lluvioso* NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
VOLQUETA	1	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	1
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	1
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	1
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFÍA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	5

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 21 Mes 03 Año 2023

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: *Excavación de Enchusamiento - Talo 1790mts - 4mt de longitud - Talo derecho 3mt - Abi: 2+380 - Abi: 2+385 - Desargo Extendido - Pega 5 - compactado - Nivelado - de Material de Mejoramiento - Abi: 2+370, Abi: 2+110 - Mejoraimiento de vía Abi: 1+780 Abi: 1+790*

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO:		MAÑANA: <i>Huvia fuerte</i>	TARDE: <i>Huvia</i>	NOCHE:
EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO		
MAQUINA	No	CARGO	No	
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1	
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2	
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1	
VOLQUETA	5	Técnico en seguridad	1	
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1	
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1	
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2	
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6	
RODILLO VIBRATORIO (CS)	1	CHOFERES	5	
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1	
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1	
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1	
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1	
		SOLDADORES	1	
		JORNALEROS	4	

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA) *[Firma]*

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA) *[Firma]*



PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 22 Mes 03 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: Descarga - Extensión - Pegado - Nivelado - de material de Mejoramiento  
 Abi: 2 + 1110 Abf: 2 + 590

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: *Nublado* TARDE: *Soleado* NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
VOLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	3
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

*[Signature]*

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

*[Signature]*

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 23 Mes 03 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: *Des cargo - Extendido - Regato - Compactado - limpieza de material de mejoramiento*  
*Abi: 2+500 Abf: 2+500*

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO:		MAÑANA: <i>Soleado</i>	TARDE: <i>Soleado</i>	NOCHE:
EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO		
MAQUINA	No	CARGO	No	
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1	2
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE		1
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1	1
VOLQUETA	1	Técnico en seguridad	1	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1	2
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	6	
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	1	5
RODILLO VIBRATORIO LENTO	1	CHOFERES	1	1
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1	1
		SOLDADORES		1
		JORNALEROS		1

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

*[Handwritten Signature]*

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

*[Handwritten Signature]*



PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCODEORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCODEORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 24 Mes 03 Año 2023

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: Desargo - Extendido - Regado - Compactado - Nivelado de Material de Mejora mienta  
 Mh: 2+580  
 Mh: 2+640

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: *Huaca pdk* TARDE: *Huucoso* NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
VOLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO COLD	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-  
 ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA  
 OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-  
 ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA  
 UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA  
 CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
 CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S  
 FECHA DE REPORTE N : Día 25 Mes 03 Año 2023

Espacio para el contratista  
 TRABAJOS REALIZADOS: *Desarrollo - Extensión - Regalo - Compactado - Nivelado - de Material de Mejora m. cantón* *Abi: 27610* *Abi: 27710*

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: *Soleado* TARDE: *Soleado* NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
VOLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

Espacio para la fiscalización  
 INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos especificos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

*[Signature]*

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

*[Signature]*

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 26 Mes 03 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: Des cargo - Extendido - Pega ls - Compactar - Nivelado - de Material de Mejoramiento Abi 2+710 Abi 2+770

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: *Huivoso* TARDE: *Soleado* NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
VOLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 27 Mes 03 Año 2023

Trabajos realizados: *Desarrollo - Extensión - Pegado - Compactado y Volcado de Material de Mejora Mientro*  
*Sh: 2+780* *Ab: 2+840*

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: *Soleado* TARDE: *Soleado* NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
VOLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHUFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	1

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a trámites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 28 Mes 03 Año 2023

Trabajos realizados: *Desarrollo - Extensión - Regalo - Compactado - Nivelado - de Material de Mejoramiento*  
*Obj: 2+800 Obj: 2+900*

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: *Huvia fuerte* TARDE: *Huvia fuerte* NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MÁQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
VOLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFAETO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFÍA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 29 Mes 03 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: Descarga - Extensión - Pegado - Compactado - Nivelado de Material de Mejora miento de base de la vía de 10m de ancho de base de 10m de ancho de base de 10m de ancho

Ab: 2+900 Ab: 2+960

Ab: 1+720 Ab: 1+780

Ab: 1+620

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: *Huvia fuerte* TARDE: *Huvia fuerte* NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
VOLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO ESTE	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFÍA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 30 Mes 03 Año 2023

Trabajos realizados: *Desarrollo - Extensión - Pegado - Compactado - Nivelado de Material de Mejora - manto corte de Talud Abj: 1+780 Abj: 1+890*

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO:		MAÑANA: <i>Huoso</i>	TARDE: <i>Soleado</i>	NOCHE:
EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO		
MAQUINA	No	CARGO	No	
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1	
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE		2
CAMION CISTERNA	1	Ingeniero ambiental		1
VOLQUETA	5	Técnico en seguridad	1	
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE		1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1	
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO		2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6	
RODILLO VIBRATORIO	1	CRUFERS		5
RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO	1	MECÁNICO	1	
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO		1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES		1
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	ALBAÑILES		1
		SOLDADORES		1
		JORNALEROS		1

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos especificos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicacion)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

*[Signature]*  
CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

*[Signature]*  
CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO: ASFALTADO DE LA VIACURARA Y FRANCISCO ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO: ASFALTADO DE LA VIACURARA Y FRANCISCO ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN: PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA: CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO: Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR: KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N: Día 31 Mes 03 Año 2023

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS:

Descarga de material - Extendido de mejoramiento de Abi: 2+960 - Recarpado - Compactado - Nivelado - Abi: 3+000

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Nublado TARDE: Lluvioso NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO		PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINA	No	CARGO	No
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	SUPERINTENDENTE	1
MOTONIVELADORA	1	RESIDENTE	2
CAMIÓN CISTERNA	1	Ingeniero ambiental	1
VOLQUETA	5	Técnico en seguridad	1
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	ING. AYUDANTE	1
PLANTA DE ASFALTO	1	TOPÓGRAFO	1
TERMINADORA DE ASFALTO	1	CADENERO	2
RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	OPERADORES	6
RODILLO VIBRATORIO LISO	1	CHOFERES	5
RODILLO VIBRATORIO NEGATIVO	1	MARCANEROS	1
CONCRETERA 1 SACO	2	AYUDANTE DE MECÁNICO	1
MINICARGADORA	1	INSPECTORES	1
APARATOS DE TOPOGRAFÍA	1	ALBAÑILES	1
		SOLDADORES	1
		JORNALEROS	4

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

# ANEXOS

# FOTOGRAFICOS

"ASOCIADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUN PALCHA, HASTA EL KILOMETRO  
12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"



## Desbroce, desbosque y limpieza



**Excavación sin clasificar (mov. de tierra)**



**Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)**





**Transporte material de desalojo**



**Transporte de material pétreo de mejoramiento**



**Pancarta informativa (letrero)-con estructura**



**Cinta peligro colores intensos (mat. Polietileno)**





**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

**PLANILLA**

**PAGO IESS**

"ASFALTADO DE LA VIACURARAY -FRANCISCO DE ORELLANA-JATUN PACCHA, HASTA EL KILOMETRO  
12 VIA 10 DE AGOSTO -EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

abril 07 del 2023 12:35

GUEVARA MARIN ODILO VINICIO

## DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 000000168931917

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2023-04-04
No. RUC / REGISTRO:	1691710080001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2023-04-17	
Nombre / Razón Social / Organización:	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. - AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.			
Periodo de Pago:	2023 - 03			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:	Ticket#2023040671002367			

### AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2023 - 3	06	1720483609	ACERO UMAQUINGA JUAN ISAAC	521.45	30	NNA	107.42	0.00
2023 - 3	06	1600786873	AMAGUAY CEDEÑO CARLOS ALEXANDER	492.69	30	NNA	101.49	0.00
2023 - 3	06	1312506288	AMAGUAY CEDEÑO JOSE ALFREDO	691.69	30	NNA	142.49	0.00
2023 - 3	06	1600354383	BRAVO CHANGO NUBIA TATHIANA	198.62	13	NNA	40.92	0.00
2023 - 3	06	0503530610	CHASIPANTA CHASIPANTA JOSE AUGUSTO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2023 - 3	06	0503774580	CHASIPANTA CHASIPANTA JOSE PEDRO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2023 - 3	06	1600203267	GREFA CHIMBO AURELIO	450.04	30	NNA	92.71	0.00
2023 - 3	06	0603907080	GUAMAN CASTILLO GEREMIAS JOSE	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2023 - 3	06	0922862834	IBARRA RIVERA JHESLY SARAY	346.27	21	NNA	71.33	0.00
2023 - 3	06	1600342222	JACOME RODRIGUEZ EDWIN HUGO	691.69	30	NNA	142.49	0.00
2023 - 3	06	1600267494	JACOME RODRIGUEZ JENNY BEATRIZ	494.67	30	NNA	101.90	0.00
2023 - 3	06	1600671760	MARIN JACOME JENNYFER BRITHNEY	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2023 - 3	06	1600496770	MARIN JACOME KENYA MERYJOSEPH	450.04	30	NNA	92.71	0.00
2023 - 3	06	1600296717	MARIN MONTERO KLEVER JINSOP	680.00	30	NNA	140.08	0.00
2023 - 3	06	1600695876	MARIN PEREZ JOSE ALEXANDER	450.04	30	NNA	92.71	0.00
2023 - 3	06	1600695868	MARIN PEREZ KRISLEY ARIANNA	458.72	30	NNA	94.50	0.00
2023 - 3	06	0601716327	MIRANDA AMBI EDGAR JUVENAL	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2023 - 3	06	1600439804	MONTERO ESPINOSA KATTY JESSENIA	450.04	30	NNA	92.71	0.00
2023 - 3	06	1600573032	MUÑOZ VELASTEGUI CARLOS VICENTE	494.67	30	NNA	101.90	0.00
2023 - 3	06	1600724809	PUNINA CAIZAGUANO JENNY MARITZA	450.04	30	NNA	92.71	0.00
2023 - 3	06	1004325641	SOTAMINGA BELTRAN PATRICIO BOLIVAR	521.45	30	NNA	107.42	0.00
2023 - 3	06	1600177461	TAPUY TAPUY CESAR LUIS	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2023 - 3	06	0500865159	UGSHA VEGA JOSE GREGORIO	450.00	30	NNA	92.70	0.00
				<b>10992.12</b>			<b>2264.39</b>	<b>0.00</b>

## DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

Valor	2374.32
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	2374.32
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	2374.32

### Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

\*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

\*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

\*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



Imprimir

Conf Impresora

### Servipagos - PagoAgil

IESS RECAUDACION EN LINEA  
 OFICINA: CANAL WEB COOP CREA  
 CAJA: AGENCIA RUYO  
 DIRECCION: AV SIMON BOLIVAR Y VIA A NAYON  
 CAJERO: ZAMBRANO BASTIDAS KEYLA ESTEFANNY  
 FECHA: 2023-04-11 10:02:37  
 CODIGO: 2010275972

Identificación: 1691710080001  
 Razón Social: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
 No. Comprobante: 000000168931917  
 Tipo de Comprobante: PLANI  
 Período: 202303  
 Monto Comprobante: \$2374.32

Fecha: 2023-04-11 10:02:37  
 Efectivo: \$ 2374.32  
 Comisión: \$ 0.57  
 Total: \$ 2374.89

\*\*\* ORIGINAL - CLIENTE \*\*\*  
 \*\*\* GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\*

#### EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA

Factura N°: 001-041-000244825  
 Matriz: AV. SIMON BOLIVAR Y VIA A NAYON  
 Clave de acceso: 1104202301179139824600120 0104100024482511100  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Emisión: NORMAL  
 Ruc: 1791398246001  
 Contribuyente: Contrib Esp Resol.No. 00155

#### COMISIÓN POR SERVICIOS

Forma de Pago: EFECTIVO  
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
 Ruc Cliente: 9999999999999

Oficina: CANAL WEB COOP CREA  
 Cajero: ZAMBRANO BASTIDAS KEYLA ESTEFANNY  
 Fecha Transacción: 2023-04-11 10:02:37

Comisión: \$ 0.51  
 Iva 12 %: \$ 0.56  
 Comisión Total: \$ 0.57

LA FACTURA SERÁ EL ÚNICO COMPROBANTE VALIDO PARA EFECTUAR CUA RECLAMO

\*\*\* GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\*

Imprimir

Conf Impresora

### Servipagos - PagoAgil

IESS RECAUDACION EN LINEA  
 OFICINA: CANAL WEB COOP CREA  
 CAJA: AGENCIA RUYO  
 DIRECCION: AV SIMON BOLIVAR Y VIA A NAYON  
 CAJERO: ZAMBRANO BASTIDAS KEYLA ESTEFANNY  
 FECHA: 2023-04-11 10:02:37  
 CODIGO: 2010275972

Identificación: 1691710080001  
 Razón Social: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
 No. Comprobante: 000000168931917  
 Tipo de Comprobante: PLANI  
 Período: 202303  
 Monto Comprobante: \$2374.32

Fecha: 2023-04-11 10:02:37  
 Efectivo: \$ 2374.32  
 Comisión: \$ 0.57  
 Total: \$ 2374.89

\*\*\* ORIGINAL - CLIENTE \*\*\*  
 \*\*\* GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\*

#### EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA

Factura N°: 001-041-000244825  
 Matriz: AV. SIMON BOLIVAR Y VIA A NAYON  
 Clave de acceso: 1104202301179139824600120 0104100024482511100  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Emisión: NORMAL  
 Ruc: 1791398246001  
 Contribuyente: Contrib Esp Resol.No. 00155

#### COMISIÓN POR SERVICIOS

Forma de Pago: EFECTIVO  
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
 Ruc Cliente: 9999999999999

Oficina: CANAL WEB COOP CREA  
 Cajero: ZAMBRANO BASTIDAS KEYLA ESTEFANNY  
 Fecha Transacción: 2023-04-11 10:02:37

Comisión: \$ 0.51  
 Iva 12 %: \$ 0.56  
 Comisión Total: \$ 0.57

LA FACTURA SERÁ EL ÚNICO COMPROBANTE VALIDO PARA EFECTUAR CUA RECLAMO

\*\*\* GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\*



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Junio 06 del 2023 09:55

GUEVARA MARIN ODILO VINICIO

## DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2023-05-09))

(BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO)

No. Comprobante: 0000000170126933

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES.

Emitido en: 2023-05-08

No. RUC / REGISTRO: 1691710080001 - 0001

Fecha de Vigencia de Pago: 2023-05-15

Nombre / Razón Social / Organización: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. - AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Periodo de Pago: 2023 - 04

Forma de pago: Fondos propios

Observaciones:

### AFILIADOS

PERIODO	RT	CCEBLA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL	
2023 - 4	06	1720483609	ACERO UMAQUINGA JUAN ISAAC	521.45	30	NNA	107.42	0.00	
2023 - 4	06	1690786873	AMAGUAY CEDEÑO CARLOS ALEXANDER	492.69	30	NNA	101.49	0.00	
2023 - 4	06	1312506288	AMAGUAY CEDEÑO JOSE ALFREDO	691.69	30	NNA	142.49	0.00	
2023 - 4	06	0593530810	CHASIPANTA CHASIPANTA JOSE AUGUSTO	450.00	30	NNA	92.70	0.00	
2023 - 4	06	0593774580	CHASIPANTA CHASIPANTA JOSE PEDRO	450.00	30	NNA	92.70	0.00	
2023 - 4	06	1690203287	GREFA CHIMBO AURELIO	450.04	30	NNA	92.71	0.00	
2023 - 4	06	0603907080	GUAMAN CASTILLO GEREMIAS JOSE	450.00	30	NNA	92.70	0.00	
2023 - 4	06	1690342222	JACOME RODRIGUEZ EDWIN HUGO	691.69	30	NNA	142.49	0.00	
2023 - 4	06	1690267494	JACOME RODRIGUEZ JENNY BEATRIZ	494.67	30	NNA	101.90	0.00	
2023 - 4	06	1690671760	MARIN JACOME JENNYFER BRITHNEY	450.00	30	NNA	92.70	0.00	
2023 - 4	06	1690496770	MARIN JACOME KENYA MERY JOSEPH	450.04	30	NNA	92.71	0.00	
2023 - 4	06	1690296717	MARIN MONTERO KLEVER JINSOP	680.00	30	NNA	140.08	0.00	
2023 - 4	06	1690695876	MARIN PEREZ JOSE ALEXANDER	450.04	30	NNA	92.71	0.00	
2023 - 4	06	1690695868	MARIN PEREZ KRISLEY ARIANNA	458.72	30	NNA	94.50	0.00	
2023 - 4	06	2100210505	MESTANZA LEON JORGE DAVID	691.69	30	NNA	142.49	0.00	
2023 - 4	06	0601716327	MIRANDA AMBI EDGAR JUVENAL	450.00	30	NNA	92.70	0.00	
2023 - 4	06	1690439804	MONTERO ESPINOSA KATTY JESSENIA	450.04	30	NNA	92.71	0.00	
2023 - 4	06	1690573032	MUNOZ VEL ASTEGUI CARLOS VICENTE	494.67	30	NNA	101.90	0.00	
2023 - 4	06	1690724809	PUNINA CAIZAGUANO JENNY MARITZA	450.04	30	NNA	92.71	0.00	
2023 - 4	06	1004325641	SOTAMINGA BELTRAN PATRICIO BOLIVAR	521.45	30	NNA	107.42	0.00	
2023 - 4	06	1690177461	TAPUY TAPUY CESAR LUIS	450.00	30	NNA	92.70	0.00	
2023 - 4	06	0590865159	UGSHA VEGA JOSE GREGORIO	450.00	30	NNA	92.70	0.00	
							<b>11138.92</b>	<b>2294.63</b>	<b>0.00</b>

-or mora (+)	
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	2406.03
Notas de Crédito (-)	0.00
	<b>2406.03</b>

### Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

\*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

\*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmege

\*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Imprimir

Cont Impresora

### Servipagos - Pago Ágil

**OFICINA:** IESS RECAUDACION EN LINEA  
**CAJA:** CANAL WEB COOP CREA  
**DIRECCION:** AGENCIA FUYO  
**CAJERO:** AV. SIMON BOLIVAR Y VIA A NAYON  
**FECHA:** ZAMBRANO BASTIDAS KEILA ESTEFANIE  
**CODIGO:** 2023-05-09 15:17:21  
**CODIGO:** 0290290044

**Identificación:** 1891710090001  
**Razón Social:** AMAZONAS BUILDING AMAZONABLE S.A.  
**No. Comprobante:** 0000000170126993  
**Tipo de Comprobante:** PLANI  
**Periodo:** 202304  
**Monto Comprobante:** \$3406.03

**Fecha:** 2023-05-09 15:17:21  
**Efectivo:** \$ 2406.03  
**Comisión:** \$ 0.57  
**Total:** \$ 3406.60

\*\*\* ORIGINAL - CLIENTE \*\*\*  
 \*\*\* GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\*

**Factura N°:** EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA  
**Matriz:** 001-041-000280409  
**Clave de acceso:** AV. SIMON BOLIVAR Y VIA A NAYON  
**Ambiente:** 0F05202304179139824600120 0104100028040900151  
**Emission:** PRODUCCION  
**Ruc:** NORMAL  
**Controluyente:** 1791398246001  
 Control Exp Resol No: 00155

**Forma de Pago:** COMISIÓN POR SERVICIOS  
**Cliente:** EFECTIVO  
**Ruc Cliente:** CONSUMIDOR FINAL  
 99999999999999

**Oficina:** CANAL WEB COOP CREA  
**Cajero:** ZAMBRANO BASTIDAS KEILA ESTEFANIE  
**Fecha Transacción:** 2023-05-09 15:17:21  
**Comisión:** \$ 0.51  
**Iva 12.0%:** \$ 0.06  
**Comisión Total:** \$ 0.57

LA FACTURA SERA EL UNICO COMPROBANTE VALIDO PARA EFECTUAR CUA  
 RECLAMO  
 \*\*\* GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\*



# AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING  
RUC. 1691710080001

## CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

En la ciudad de Puyo, el 01 día del mes de diciembre del 2022, comparecen a la suscripción del presente Contrato, por una parte, en calidad de INGENIERO CIVIL el Ing. MARCO VINICIO TAMAYO MEJIA C.I. 16000877-9 y, por otra, parte el señor Odilo Vinicio Guevara Marín en calidad de representante legal de la Compañía AMAZONAS BUILDING S.A con Ruc 1691710080001, quienes en forma libre y voluntaria convienen en celebrar el presente contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, contenido en las siguientes cláusulas

### Cláusula Primera. - ANTECEDENTES

El día 7 de noviembre del 2022, La Compañía Amazonas Building suscribe un contrato con el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA para la ejecución de la Obra denominada **ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**".

### Cláusula Segunda. - OBJETO DEL CONTRATO

La compañía contrata al Ing. Marco Vinicio Tamayo Mejía, el mismo que prestará sus servicios de manera autónoma e independiente a la compañía, encargándose del área civil en el proyecto de **ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**". tareas que se encuentran dentro de su campo de conocimiento y experiencia" teniendo la capacidad de celebrar el contrato, en virtud de que está familiarizado con la materia indicada en el mismo, en los términos y condiciones.

### Cláusula Tercera. — PLAZO

El plazo del presente contrato es por el tiempo que dure la ejecución de la obra, (aproximadamente 18 meses) a partir de la suscripción del presente contrato, pudiendo prorrogarse, si las partes así lo convienen, sólo podrá extinguirse una vez que las labores materia del mismo hayan concluido para la COMPAÑIA Es obligación del Ing. Marco Vinicio Tamayo Mejía, realizar el trabajo contratado, los alcances y aclaraciones que la Compañía solicite, previo al pago.

### Cláusula Cuarta. - OBLIGACIONES DEL CONTRATADO

EL CONTRATADO está obligado y sin perjuicio de lo previsto por las leyes y reglamentos vigentes en el Ecuador a: Encargándose de supervisar que se aplique todas las normas técnicas del proyecto de **ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**".

- Desarrollar con total transparencia, prolijidad y honestidad las tareas allá encomendadas.
- Mantener la confidencialidad de la información y los datos proporcionados por la Compañía.



# AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING  
RUC. 1691710080001

- Será responsable del manejo, uso y mantenimiento de los equipos y mobiliario a él entregados,

La compañía se reserva el derecho a intervenir, evaluar y analizar el trabajo realizado por el Ing. Marco Vinicio Tamayo Mejía.

Además, un informe mensual de los trabajos civiles realizados en el proyecto **ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**.

## **Cláusula Quinta: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO**

Las partes acuerdan determinar que la COMPAÑÍA cancelara sus honorarios profesionales al TECNICO por la gestión que él asume en el presente Contrato, al finalizar la obra. previa presentación de la factura correspondiente,

## **Cláusula Sexta – DEDUCCIONES**

La compañía deducirá de los honorarios " PROFESIONALES ", las cantidades que correspondan por concepto de impuesto a la Renta (10 %) e Impuesto al Valor Agregado (100%).

## **Cláusula Séptima. – RESPONSABILIDAD**

EL SUPERINTENDENTE DE OBRA se obliga a ejecutar el trabajo con profesionalismo, diligencia, prolijidad y cuidados necesarios. Para evitar algún daño, pérdida o deterioro en los bienes de la COMPAÑÍA, por cualquier causa que fuere, El Superintendente se obliga a informar de manera inmediata, para determinar responsabilidades y sanciones a los causantes.

## **Clausula Octava: RELACIÓN CIVIL ENTRE LAS PARTES**

El presente Contrato es de naturaleza civil, sujeto al derecho común y singularmente a las reglas del Mandato. Por tanto, entre la COMPAÑÍA y 'EL SUPERINTENDENTE DE OBRA' no existe relación laboral o de dependencia alguna, ni, consecuentemente sometimiento al Código del Trabajo y Leyes del Seguro Social Obligatorio. No hay subordinación jurídica ni de ninguna otra especie que pudiera significar relación laboral entre las partes o sus dependientes, puesto que " EL SUPERINTENDENTE DE OBRA" prestará sus servicios a la Compañía de manera libre, independiente y autónoma.

## **Clausula Novena: MODIFICACIONES**

Este contrato podrá ser modificado de común acuerdo y por escrito entre las partes contratantes.

## **Clausula Décima: DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO**

El presente contrato podrá darse por terminado en los siguientes casos:

- a) De común acuerdo entre las partes,
- b) Por terminación de su plazo de duración.
- c) Por cualquier causa legalmente establecida.



# AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING  
RUC. 1691710080001

## **Clausula Décima Primera: DEL PACTO DE CONFIDENCIALIDAD**

Toda la información que sea conocida por EL SUPERINTENDENTE DE OBRA consecuencia de este Contrato, sin importar su naturaleza y que fuere entregada, comunicada, divulgada o conocida como consecuencia de la ejecución de sus obligaciones bajo este instrumento, es propiedad de la COMPAÑÍA AMAZONAS BUILDING y se encuentra limitada su divulgación a terceros salvo las excepciones previstas en la ley.

## **Clausula Décima Segunda: DEL DOMICILIO DE LAS PARTES**

Para los efectos legales respectivos, las partes señalan domicilios para citaciones y notificaciones en esta ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, los siguientes.

- a) COMPAÑÍA AMAZONAS BUILDING S.A Avenida Tarqui calle los Laureles
- b) Ing. Marco Vinicio Tamayo Mejía, Ciudad Puyo.

## **Clausula Décima Tercera: DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA**

Los Contratantes quedan sometidos a los jueces competentes de esta ciudad de Puyo y al trámite previsto por la LEY

## **Clausula Décima Cuarta: DE LA ACEPTACIÓN**

Los contratantes aceptan el presente contrato en su integridad, para constancia de lo cual lo firman por triplicado, todo en el día y fecha antes anotados.




Firmado electrónicamente por:  
ODILO VINICIO  
GUEVARA MARIN

Sr. Odilo Guevara Marín  
**GERENTE CIA AMAZONAS BUILDING**



Firmado electrónicamente por:  
MARCO VINICIO  
TAMAYO MEJIA

Ing. Marco Tamayo  
**SUPERINTENDENTE**



# AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING  
RUC. 1691710080001

## CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

En la ciudad de Puyo, el 01 día del mes de diciembre del 2022, comparecen a la suscripción del presente Contrato, por una parte, en calidad de TOPOGRAFO la Ing. Daniela Analía Gómez Zambrano Cl. 070407321-2 y, por otra, parte el señor Odilo Vinicio Guevara Marín en calidad de representante legal de la Compañía AMAZONAS BUILDING S.A con Ruc 1691710080001, quienes en forma libre y voluntaria convienen en celebrar el presente contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, contenido en las siguientes cláusulas

### Cláusula Primera. – ANTECEDENTES

El día 7 de noviembre del 2022, La Compañía Amazonas Building suscribe un contrato con el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA para la ejecución de la Obra denominada ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

### Cláusula Segunda. - OBJETO DEL CONTRATO

La compañía contrata al Ing. Daniela Analía Gómez Zambrano, el mismo que prestará sus servicios de manera autónoma e independiente a la compañía, encargándose de la TOPOGRAFIA en el proyecto de ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA". tareas que se encuentran dentro de su campo de conocimiento y experiencia" teniendo la capacidad de celebrar el contrato, en virtud de que está familiarizado con la materia indicada en el mismo, en los términos y condiciones.

### Cláusula Tercera. — PLAZO

El plazo del presente contrato es por el tiempo que dure la ejecución de la obra, (aproximadamente 18 meses) a partir de la suscripción del presente contrato, pudiendo prorrogarse, si las partes así lo convienen, solo podrá extinguirse una vez que las labores materia del mismo hayan concluido para la COMPAÑIA Es obligación de la Ing. Daniela Analía Gómez Zambrano realizar el trabajo contratado, los alcances y aclaraciones que la Compañía solicite, previo al pago.

### Cláusula Cuarta. - OBLIGACIONES DEL CONTRATADO

EL CONTRATADO está obligado y sin perjuicio de lo previsto por las leyes y reglamentos vigentes en el Ecuador a: Encargándose de supervisar que se aplique todas las normas técnicas del proyecto de ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

- Desarrollar con total transparencia, prolijidad y honestidad las tareas allá encomendadas.
- Mantener la confidencialidad de la información y los datos proporcionados por la Compañía.



# AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING  
RUC. 1691710080001

- Será responsable del manejo, uso y mantenimiento de los equipos y mobiliario a él entregados,

La compañía se reserva el derecho a intervenir, evaluar y analizar el trabajo realizado por la Ing. Daniela Analía Gómez Zambrano.

Además, un informe mensual de los trabajos topográficos realizadas en el proyecto **ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**".

## **Cláusula Quinta: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO**

Las partes acuerdan determinar que la COMPAÑÍA cancelara sus honorarios profesionales al TECNICO por la gestión que él asume en el presente Contrato, al finalizar la obra. previa presentación de la factura correspondiente,

## **Cláusula Sexta – DEDUCCIONES**

La compañía deducirá de los honorarios " TOPOGRAFO ", las cantidades que correspondan por concepto de impuesto a la Renta (10 %) e Impuesto al Valor Agregado (100%).

## **Cláusula Séptima. – RESPONSABILIDAD**

LA TOPOGRAFA se obliga a ejecutar el trabajo con profesionalismo, diligencia, prolijidad y cuidados necesarios. Para evitar algún daño, pérdida o deterioro en los bienes de la COMPAÑÍA, por cualquier causa que fuere," EL TECNICO "se obliga a informar de manera inmediata, para determinar responsabilidades y sanciones a los causantes.

## **Clausula Octava: RELACIÓN CIVIL ENTRE LAS PARTES**

El presente Contrato es de naturaleza civil, sujeto al derecho común y singularmente a las reglas del Mandato. Por tanto, entre la COMPAÑÍA Y LA TOPÓGRAFA "no existe relación laboral o de dependencia alguna, ni, consecuentemente sometimiento al Código del Trabajo y Leyes del Seguro Social Obligatorio. No hay subordinación jurídica ni de ninguna otra especie que pudiera significar relación laboral entre las partes o sus dependientes, puesto que" LA TOPÓGRAFA, "prestará sus servicios a la Compañía de manera libre, independiente y autónoma.

## **Clausula Novena: MODIFICACIONES**

Este contrato podrá ser modificado de común acuerdo y por escrito entre las partes contratantes.

## **Clausula Décima: DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO**

El presente contrato podrá darse por terminado en los siguientes casos:

- a) De común acuerdo entre las partes,
- b) Por terminación de su plazo de duración.
- c) Por cualquier causa legalmente establecida.

## **Clausula Décima Primera: DEL PACTO DE CONFIDENCIALIDAD**



# AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING  
RUC. 1691710080001

Toda la información que sea conocida por LA TOPÓGRAFA "consecuencia de este Contrato, sin importar su naturaleza y que fuere entregada, comunicada, divulgada o conocida como consecuencia de la ejecución de sus obligaciones bajo este instrumento, es propiedad de la COMPAÑÍA AMAZONAS BUILDING y se encuentra limitada su divulgación a terceros salvo las excepciones previstas en la ley.

## Clausula Décima Segunda: DEL DOMICILIO DE LAS PARTES

Para los efectos legales respectivos, las partes señalan domicilios para citaciones y notificaciones en esta ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, los siguientes.

- a) COMPAÑÍA AMAZONAS BUILDING S.A Avenida Tarqui calle los laureles
- b) Ing. Daniela Analía Gómez Zambrano Barrio la Merced.

## Clausula Décima Tercera: DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Los Contratantes quedan sometidos a los jueces competentes de esta ciudad de Puyo y al trámite previsto por la LEY

## Clausula Décima Cuarta: DE LA ACEPTACIÓN

Los contratantes aceptan el presente contrato en su integridad, para constancia de lo cual lo firman por triplicado, todo en el día y fecha antes anotados.



ODILO VENCIO  
GUEVARA MARIN



DANIELA ANALIA  
GOMEZ ZAMBRANO

Sr. Odilo Guevara Marín  
**GERENTE CIA AMAZONAS BUILDING**

Ing. Daniela Gómez  
**TOPÓGRAFO**



# AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING  
RUC. 1691710080001

## CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

En la ciudad de Puyo, el 01 día del mes de diciembre del 2022, comparecen a la suscripción del presente Contrato, por una parte, en calidad de INGENIERO CIVIL el Ing. LUIS OCTAVIO TIBANTA GUAMAN C.I. 160015313-2 y, por otra, parte el señor Odilo Vinicio Guevara Marín en calidad de representante legal de la Compañía AMAZONAS BUILDING S.A con Ruc 1691710080001, quienes en forma libre y voluntaria convienen en celebrar el presente contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, contenido en las siguientes cláusulas

### Cláusula Primera. – ANTECEDENTES

El día 7 de noviembre del 2022, La Compañía Amazonas Building suscribe un contrato con el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA para la ejecución de la Obra denominada ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

### Cláusula Segunda. - OBJETO DEL CONTRATO

La compañía contrata al Ing. Luis Octavio Tibanta Guamán, el mismo que prestará sus servicios de manera autónoma e independiente a la compañía, encargándose del área civil en el proyecto de ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA". tareas que se encuentran dentro de su campo de conocimiento y experiencia" teniendo la capacidad de celebrar el contrato, en virtud de que está familiarizado con la materia indicada en el mismo, en los términos y condiciones.

### Cláusula Tercera. — PLAZO

El plazo del presente contrato es por el tiempo que dure la ejecución de la obra, (aproximadamente 18 meses) a partir de la suscripción del presente contrato, pudiendo prorrogarse, si las partes así lo convienen, solo podrá extinguirse una vez que las labores materia del mismo hayan concluido para la COMPAÑIA Es obligación del Ing. Luis Octavio Tibanta Guamán realizar el trabajo contratado, los alcances y aclaraciones que la Compañía solicite, previo al pago.

### Cláusula Cuarta. - OBLIGACIONES DEL CONTRATADO

EL CONTRATADO está obligado y sin perjuicio de lo previsto por las leyes y reglamentos vigentes en el Ecuador a: Encargándose de supervisar que se aplique todas las normas técnicas del proyecto de ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

- Desarrollar con total transparencia, prolijidad y honestidad las tareas allá encomendadas.
- Mantener la confidencialidad de la información y los datos proporcionados por la Compañía.



# AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING

RUC. 1691710080001

- Será responsable del manejo, uso y mantenimiento de los equipos y mobiliario a él entregados,

La compañía se reserva el derecho a intervenir, evaluar y analizar el trabajo realizado por el Ing. Luis Octavio Tibanta Guamán.

Además, un informe mensual de los trabajos civiles realizados en el proyecto **ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**".

## **Cláusula Quinta: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO**

Las partes acuerdan determinar que la COMPAÑÍA cancelara sus honorarios profesionales al TECNICO por la gestión que él asume en el presente Contrato, al finalizar la obra. previa presentación de la factura correspondiente,

## **Cláusula Sexta – DEDUCCIONES**

La compañía deducirá de los honorarios " PROFESIONALES ", las cantidades que correspondan por concepto de impuesto a la Renta (10 %) e Impuesto al Valor Agregado (100%).

## **Cláusula Séptima. – RESPONSABILIDAD**

EL RESIDENTE DE OBRA 2 se obliga a ejecutar el trabajo con profesionalismo, diligencia, prolijidad y cuidados necesarios. Para evitar algún daño, pérdida o deterioro en los bienes de la COMPAÑÍA, por cualquier causa que fuere, "El Técnico se obliga a informar de manera inmediata, para determinar responsabilidades y sanciones a los causantes.

## **Clausula Octava: RELACIÓN CIVIL ENTRE LAS PARTES**

El presente Contrato es de naturaleza civil, sujeto al derecho común y singularmente a las reglas del Mandato. Por tanto, entre la COMPAÑÍA y "EL RESIDENTE DE OBRA" no existe relación laboral o de dependencia alguna, ni, consecuentemente sometimiento al Código del Trabajo y Leyes del Seguro Social Obligatorio. No hay subordinación jurídica ni de ninguna otra especie que pudiera significar relación laboral entre las partes o sus dependientes, puesto que" EL RESIDENTE DE OBRA 2" prestará sus servicios a la Compañía de manera libre, independiente y autónoma.

## **Clausula Novena: MODIFICACIONES**

Este contrato podrá ser modificado de común acuerdo y por escrito entre las partes contratantes.

## **Clausula Décima: DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO**

El presente contrato podrá darse por terminado en los siguientes casos:

- a) De común acuerdo entre las partes,
- b) Por terminación de su plazo de duración.
- c) Por cualquier causa legalmente establecida.



# AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING  
RUC. 1691710080001

## **Clausula Décima Primera: DEL PACTO DE CONFIDENCIALIDAD**

Toda la información que sea conocida por EL RESIDENTE DE OBRA consecuencia de este Contrato, sin importar su naturaleza y que fuere entregada, comunicada, divulgada o conocida como consecuencia de la ejecución de sus obligaciones bajo este instrumento, es propiedad de la COMPAÑÍA AMAZONAS BUILDING y se encuentra limitada su divulgación a terceros salvo las excepciones previstas en la ley.

## **Clausula Décima Segunda: DEL DOMICILIO DE LAS PARTES**

Para los efectos legales respectivos, las partes señalan domicilios para citaciones y notificaciones en esta ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, los siguientes.

- a) COMPAÑÍA AMAZONAS BUILDING S.A Avenida Tarqui calle los Laureles
- b) Ing. Luis Octavio Tibanta Guamán, Ciudad Puyo.

## **Clausula Décima Tercera: DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA**

Los Contratantes quedan sometidos a los jueces competentes de esta ciudad de Puyo y al trámite previsto por la LEY

## **Clausula Décima Cuarta: DE LA ACEPTACIÓN**

Los contratantes aceptan el presente contrato en su integridad, para constancia de lo cual lo firman por triplicado, todo en el día y fecha antes anotados.



ODILO YINICIO  
GUEVARA MARIN

Sr. Odilo Guevara Marín  
**GERENTE CIA AMAZONAS BUILDING**



LUIS OCTAVIO  
TIBANTA  
GUAMAN

Ing. Luis Tibanta  
**RESIDENTE CIVIL**



# AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING  
RUC. 1691710080001

## CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

En la ciudad de Puyo, el 01 día del mes de diciembre del 2022, comparecen a la suscripción del presente Contrato, por una parte, en calidad de INGENIERO CIVIL el Ing. JONATHAN RODOLFO TORRES TAMAYO C.I. 160029485-2 y, por otra, parte el señor Odilo Vinicio Guevara Marín en calidad de representante legal de la Compañía AMAZONAS BUILDING S.A con Ruc 1691710080001, quienes en forma libre y voluntaria convienen en celebrar el presente contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, contenido en las siguientes cláusulas

### Cláusula Primera. - ANTECEDENTES

El día 7 de noviembre del 2022, La Compañía Amazonas Building suscribe un contrato con el **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA** para la ejecución de la Obra denominada **ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**".

### Cláusula Segunda. - OBJETO DEL CONTRATO

La compañía contrata al Ing. Jonathan Rodolfo Torres Tamayo, el mismo que prestará sus servicios de manera autónoma e independiente a la compañía, encargándose del área civil en el proyecto de **ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**". tareas que se encuentran dentro de su campo de conocimiento y experiencia" teniendo la capacidad de celebrar el contrato, en virtud de que está familiarizado con la materia indicada en el mismo, en los términos y condiciones.

### Cláusula Tercera. - PLAZO

El plazo del presente contrato es por el tiempo que dure la ejecución de la obra, (aproximadamente 18 meses) a partir de la suscripción del presente contrato, pudiendo prorrogarse, si las partes así lo convienen, solo podrá extinguirse una vez que las labores materia del mismo hayan concluido para la COMPAÑIA Es obligación del Ing. Jonathan Rodolfo Torres Tamayo realizar el trabajo contratado, los alcances y aclaraciones que la Compañía solicite, previo al pago.

### Cláusula Cuarta. - OBLIGACIONES DEL CONTRATADO

EL CONTRATADO está obligado y sin perjuicio de lo previsto por las leyes y reglamentos vigentes en el Ecuador a: Encargándose de supervisar que se aplique todas las normas técnicas del proyecto de **ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**".

- Desarrollar con total transparencia, prolijidad y honestidad las tareas allá encomendadas.
- Mantener la confidencialidad de la información y los datos proporcionados por la Compañía.



# AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING  
RUC. 1691710080001

- Será responsable del manejo, uso y mantenimiento de los equipos y mobiliario a él entregados,

La compañía se reserva el derecho a intervenir, evaluar y analizar el trabajo realizado por el Ing. Jonathan Rodolfo Torres Tamayo.

Además, un informe mensual de los trabajos civiles realizados en el proyecto **ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**".

## **Cláusula Quinta: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO**

Las partes acuerdan determinar que la COMPAÑÍA cancelara sus honorarios profesionales al TECNICO por la gestión que él asume en el presente Contrato, al finalizar la obra. previa presentación de la factura correspondiente,

## **Cláusula Sexta – DEDUCCIONES**

La compañía deducirá de los honorarios " PROFESIONALES ", las cantidades que correspondan por concepto de impuesto a la Renta (10 %) e Impuesto al Valor Agregado (100%).

## **Cláusula Séptima. – RESPONSABILIDAD**

EL RESIDENTE DE OBRA 1 se obliga a ejecutar el trabajo con profesionalismo, diligencia, prolijidad y cuidados necesarios. Para evitar algún daño, pérdida o deterioro en los bienes de la COMPAÑÍA, por cualquier causa que fuere, "El Técnico se obliga a informar de manera inmediata, para determinar responsabilidades y sanciones a los causantes.

## **Clausula Octava: RELACIÓN CIVIL ENTRE LAS PARTES**

El presente Contrato es de naturaleza civil, sujeto al derecho común y singularmente a las reglas del Mandato. Por tanto, entre la COMPAÑÍA y "EL RESIDENTE DE OBRA" no existe relación laboral o de dependencia alguna, ni, consecuentemente sometimiento al Código del Trabajo y Leyes del Seguro Social Obligatorio. No hay subordinación jurídica ni de ninguna otra especie que pudiera significar relación laboral entre las partes o sus dependientes, puesto que "EL RESIDENTE DE OBRA" prestará sus servicios a la Compañía de manera libre, independiente y autónoma.

## **Clausula Novena: MODIFICACIONES**

Este contrato podrá ser modificado de común acuerdo y por escrito entre las partes contratantes.

## **Clausula Décima: DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO**

El presente contrato podrá darse por terminado en los siguientes casos:

- a) De común acuerdo entre las partes,
- b) Por terminación de su plazo de duración.
- c) Por cualquier causa legalmente establecida.

## **Clausula Décima Primera: DEL PACTO DE CONFIDENCIALIDAD**



# AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING  
RUC. 1691710080001

Toda la información que sea conocida por EL RESIDENTE DE OBRA consecuencia de este Contrato, sin importar su naturaleza y que fuere entregada, comunicada, divulgada o conocida como consecuencia de la ejecución de sus obligaciones bajo este instrumento, es propiedad de la COMPAÑÍA AMAZONAS BUILDING y se encuentra limitada su divulgación a terceros salvo las excepciones previstas en la ley.

## Clausula Décima Segunda: DEL DOMICILIO DE LAS PARTES

Para los efectos legales respectivos, las partes señalan domicilios para citaciones y notificaciones en esta ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, los siguientes.

- a) COMPAÑÍA AMAZONAS BUILDING S.A Avenida Tarqui calle los Laureles
- b) Ing. Jonathan Rodolfo Torres Tamayo, Ciudad Puyo.

## Clausula Décima Tercera: DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Los Contratantes quedan sometidos a los jueces competentes de esta ciudad de Puyo y al trámite previsto por la LEY

## Clausula Décima Cuarta: DE LA ACEPTACIÓN

Los contratantes aceptan el presente contrato en su integridad, para constancia de lo cual lo firman por triplicado, todo en el día y fecha antes anotados.



Firmado electrónicamente por:  
ODILO VINICIO  
GUEVARA MARIN

Sr. Odilo Guevara Marín  
**GERENTE CIA AMAZONAS BUILDING**



Firmado electrónicamente por:  
JONATHAN RODOLFO  
TORRES TAMAYO

Ing. Jonathan Torres  
**RESIDENTE CIVIL**

**POLIZA DE SEGURO DE FIANZAS  
PUBLICO**

ASEGURADORA DEL SUR C.A. en adelante "La Aseguradora" en virtud de la solicitud de seguro presentada por el interesado, que en adelante se denomina "El Afianzado o Contratista", y que forma parte integrante de ese contrato, se obliga a indemnizar al Asegurado, por las razones previstas en este contrato, de acuerdo a las condiciones generales, aprobadas por la Superintendencia de Bancos y seguros con Resolución N°. SBS-INS-2002-293 de Septiembre 3 del 2002 y especiales, teniendo prelación las últimas sobre las primeras.

Emisión en: AMBATO

Emisión: 01/11/2022

Agente: 16917279

RAMO		PÓLIZA NÚMERO	SUMA ASEGURADA
FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		1142619	232.536,06
VIGENCIA DEL DOCUMENTO			TIPO DE DOCUMENTO
DESDE LAS 00:01 DE	HASTA LAS 24:00 DE	PLAZO	POLIZA
07/11/2022	06/05/2023 <i>Renovado</i>	180	0

**EL AFIANZADO O CONTRATISTA:** AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S A

1691710080001

**DIRECCIÓN:** LUIS MOLINA SN ,Dpto. , Piso0,

**TELÉFONOS:** 0 032861348 0999813185



**ASEGURADO:** GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

1660000170001

**DIRECCIÓN:** FRANCISCO DE ORELLANA SN GENERAL VILLAMIL

**TELÉFONOS:** 0 032883830 0999123457

**OBJETO DEL CONTRATO:**

ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, SEGÚN PROCESO No. LICO-GADPPz-006-2022

PRIMA	IMPUESTOS Y OTROS	TOTAL CONTADO
4.357,66	728,22	5.085,88

**ESTE FOMULARIO ES UN AVISO DE COBRO**

Mediante esta póliza de seguro incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, según la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, Aseguradora del Sur C.A. se obliga a favor del Beneficiario de esta póliza por los perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación afianzada hasta el monto estipulado como suma asegurada que le ocasione el afianzado, en caso de terminación del contrato. Esta póliza podrá ser renovada mediante petición escrita del Afianzado o Asegurado. Transcurrido el plazo/vigencia, la presente póliza quedará automáticamente caduca, cesando de hecho la responsabilidad de la compañía aún en el caso de que no fuera devuelto el original de la misma.

En testimonio de lo acordado se firma este contrato en: AMBATO a 1 DE NOVIEMBRE DE 2022

**EL ASEGURADO**



Firmado electrónicamente por:  
**JORGE RODRIGO LOPEZ PAREDES**

**EL CONTRATISTA**



Firmado electrónicamente por:  
**ODILO VINICIO GUEVARA MARIN**

**LA ASEGURADORA**



Digitally signed by  
**RODRIGO CEVALLOS GUEVARA**  
Date: 2022.11.01  
17:17:54 -05:00  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Aseguradora

**ORIGINAL**

<b>MATRIZ QUITO</b> TELS:(02)2997500 FAX:(02)2997553 2997588 CUENCA TELS:(07)2819721 -	<b>BARRA</b> TELS:(06)640920 <b>LOJA</b> TELS:(07)587677 FAX:(07)580995	<b>PORTOVIEJO</b> TELS:(05)632647 FAX:(05)632669	<b>MANTA</b> TELS:(05)625741/622698 FAX:(05)623483	<b>AMBATO</b> TELS:(03)829299/828211 FAX:(03)828534	<b>RIORAMIRA</b> TELS:(03)941063 FAX:(03)965040	<b>MACHALA</b> TELS: (07)2985563 FAX: (07)2985561
---	---	--	--	---	---	---



Abg. Pedro Eduardo Merino Castilla  
C.C. 1803295591  
SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO

09 NOV 2022

CONDICIONES DE LA PÓLIZA Nº 1142319

RAMO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  
 MONEDA: DÓLARES  
 LUGAR Y FECHA: AMBATO, Noviembre 1 de 2022



VIGENCIA DE LA POLIZA DESDE: 07/11/2022 HASTA: 06/05/2023  
 VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE: LAS 00:01 H HASTA: LAS 24:00 H (Local)

ASEGURADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL TLF: 0 032883830 Cel: 0999123457  
 DIRECCIÓN: FRANCISCO DE ORELLANA SN GENERAL VILLAMIL

FIANZAS

COBERTURAS CONTRATADAS	Sumas Aseguradas hasta: USD	Deducible: Aplica el mayor de los tres		
		% Suma Asegurada	% Valor de Siniestro	Mínimo USD
Fiel Cumplimiento de Contrato	232.536,06			

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

El(La) asegurado(a) y/o el(la) solicitante declara libre y voluntariamente, que el seguro solicitado a Aseguradora del Sur C.A., ampara bienes, garantías y contratos de procedencia lícita, los mismos que no están ligados con actividades de Narcotráfico, Lavado de Activos o Financiamiento del Terrorismo. Igualmente, declara que los fondos con los cuales se pagará la prima correspondiente a este contrato de seguros tienen origen lícito y no guardan ninguna relación con las actividades mencionadas anteriormente.

AUTORIZACIÓN

Siendo conocedor de las disposiciones legales para la Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, autorizo expresamente en forma libre, voluntaria e irrevocable a Aseguradora del Sur C.A. a realizar el análisis y las verificaciones que considere necesarias para corroborar la licitud de fondos y bienes comprendidos en el contrato de seguro; así como autorizo expresa, voluntaria e irrevocablemente a todas las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado a facilitar a Aseguradora del Sur C.A. toda la información que ésta les requiera, inclusive autorizo anticipadamente el levantamiento del sigilo o velo bancario en caso de ser necesario, incluido la revisión de los buró de crédito sobre mi información de riesgos crediticios.

://fms.aseguradoradelsur.com/asegsur/v1/fms/uploads/bedc194c-76f0-4390-b851-44b0fbc0f318.pdf

Direcciones:

Matriz Quito: Av. De Los Naranjos y De Las Azucenas (02) 2997-500 / Fax: (02)2467-983. Sucursal Ambato: Av. Rodrigo Pachano 13-109 y Juan Montalvo. Sector Ficoa (03)2828-211 / (03)2828-213 / (03) 2829-299. Sucursal Francisco Orellana (Cuenca), Calle Cuito entre Guayaquil y Jorge Rodríguez (06)2883-276 / (06)2881-511. Sucursal Cuenca: Federico Proaño 365 y Honorato de Loyola, a dos cuadras de Pizza Hut. (07)2819-721 / (07)2819-964. Sucursal Ibarra: Victoria Cast Chiriboga 657 y Galo Plaza Lasso, atrás del C.C. La Plaza (06) 2630-920 / (06)2630-868. Sucursal Loja: Av. Av. Orillas Zamora y Segundo Puertas Moreno (07)2560-991 / (07)2587-677. Sucursal Machala: Av. 25 de Junio Km 2 1/2, vía a Pas Urbanización Ciudad del Sol Mz. L1 (07)279-7087 / (07)279-7089 / 099 844 5197. Sucursal Manta: Calle M1 entre las calles y 24, diagonal al Hotel Oro Verde Manta, edificio 'Manta Business Center', planta baja. (05)2625 -751 / (05)2626-50: (05)2626-052. Sucursal Portoviejo: Av. Manabí y Granda Centeno, frente a la pista del aeropuerto (05)2563-494 / (05)2563-33 / (05)2563-508. Sucursal Riobamba: Uruguay 21-50 y Av. Daniel León Borja (03)2942-830 / (03)2941-063. Sucursal Sa Domingo: Av. Los Naranjos S/N y Av. Quito, 3er piso (frente al SRI). (02)2759-312 / (02)2762-006. Sucursal Guayaquil: Urde Circunvalación Sur #304 y Todos los Santos. (04)501-3050.  
 Línea de atención al cliente: teléfono: (02) 2997500 / (09)9555-3333.  
 Página web de la compañía: [www.aseguradoradelsur.com](http://www.aseguradoradelsur.com)

Dirección de correo electrónico de contacto:  
  
 C.C. 1803299591  
 SECRETARÍA GENERAL DEL CADEP

ORIGINAL



09 NOV 2022



**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

# DOCUMENTACIÓN CRUZADA

"ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUN PACHA, HASTA EL KILOMETRO  
12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"



Oficio,117 CABA/GADPPz  
Puyo, a 4 de abril del 2023

**KEYSZEN S.A.S**  
**FISCALIZADOR EXTERNO**

Presente. -

De mi consideración:

Con respecto al contrato **"ASFALTADO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VIA 10 DE AGOSTO- EL TRIUNFO, PARROQUIA 10 DE AGOSTO, PROVINCIA DE PASTAZA"**, del particular debo manifestar lo siguiente:

- Adjunto se servirá encontrar la planilla de avance número 02, con los respectivos anexos y sustentos de justificación para que proceda con su revisión y autorización correspondiente, conforme lo señalado en CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO. - La forma de pago se realizará por planilla de avance mensual.

Particular que comunico a ustedes para los fines legales correspondientes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
**ODILO VINICIO**  
**GUEVARA MARIN**

**Sr. Odilo Guevara**  
CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
GERENTE  
CC. Ing. Eryka Silva Administradora del contrato.

Puyo, 10 de abril del 2023

Señor  
Odilo Vinicio Guevara Marín  
**Gerente General**  
**AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.**  
Presente. –

De mi consideración:

Mediante **Contrato LICO-GADPPz-006-2022** suscrito el 07 de noviembre del 2022, dentro del **Proceso de LCC-GADPPz-004-2022**, para la **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**, entre la Compañía **AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.** y el **Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza**, con un **Anticipo del 0%**, por un monto de **USD \$ 4'650.521,23 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 23/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) SIN INCLUIR IVA**, y un **Plazo de 540 Días** contados a partir de la suscripción del **Acta de Inicio de Obra**.

En referencia al **Oficio 117 CABA/GADPPz**, suscrito por el Señor Odilo Vinicio Guevara Marín, de fecha 05 de abril del 2023.

Adjunto la corrección de la Planilla de Avance No. 02:

- 1.- Dentro de la sabana principal indicar lo siguiente: se debe eliminar el Reajuste provisional, corregir la fecha de planilla, añadir la firma del administrador del contrato.
- 2.- Adjuntar el Reajuste de precios provisional de la Planilla de Avance No. 02.
- 3.- Adjuntar el memo de pago de la Planilla de Avance No. 02.
- 4.- Adjuntar los planos de la sección horizontal.
- 5.- Adjuntar los anexos de cálculos.
- 6.- Anexar los archivos CAD.
- 7.- Anexar Excel para revisión de cálculos.
- 8.- Favor hacer entrega de correos con la Planilla y los anexos al mail **keyszen.sas@gmail.com**

Por la atención al presente le anticipo mis sinceros agradecimientos.

Sin otro particular por el momento, me despido.

Atentamente,



JESSICA MARIELA  
JARAMILLO ARMIÑOS

Ing. Jessica Jaramillo  
C.C. 0704239128  
Gerente General  
**KEYSZEN S.A.S.**  
RUC 0791840462001



CC. Administrador del Contrato

Puyo, 25 de abril del 2023

Ingeniera  
Eryka Mireya Silva Manzano  
**Administrador de Contrato**  
**Contrato LCC-GADPPz-004-2022**  
**GAD Provincial de Pastaza**  
Presente. –

De mi consideración:

Mediante Contrato **LICO-GADPPz-006-2022** suscrito el 07 de noviembre del 2022, dentro del Proceso de **LCC-GADPPz-004-2022**, para la **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**, entre la Compañía **AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.** y el **Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza**, con un Anticipo del 0%, por un monto de **USD \$ 4'650.521,23 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 23/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) SIN INCLUIR IVA**, y un Plazo de 540 Días contados a partir de la suscripción del **Acta de Inicio de Obra**.

En referencia al **Oficio 120 CABA/GADPPz**, de fecha 20 de abril del 2023, suscrito por el Señor Odilo Vinicio Guevara Marín. Esta fiscalización aprueba este documento para continuar los tramites de aprobación permitentes y extiende la Planilla de Avance de Obra No. 02, del Periodo: 01 al 31 de marzo del 2023. ✓

Por la atención al presente le anticipo mis sinceros agradecimientos.

Sin otro particular por el momento, me despido.

Atentamente,



firmado electrónicamente por  
**JESSICA MARTELA**  
**JARAMILLO ARMIÑOS**

Ing. Jessica Jaramillo  
C.C. 0704239128  
Gerente General  
**KEYSZEN S.A.S.**  
RUC 0791840462001

**KEYSZEN **SAS****  
INGENIERIA & CONSTRUCCION  
Machala - El Oro - Ecuador

CC. Administrador del Contrato

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
Oficina 072 785 269  
keyszen.sas@gmail.com



# AMAZONAS BUILDING S.A.

Puyo - Pastaza - Ecuador

Oficio, 120 CABA/GADPPz

Puyo, 20 de abril de 2023

**Ingeniera**

Jessica Mariela Jaramillo Armijos

**FISCALIZADOR EXTERNO KEYSZEN S.A.S.**

Presente. -

De mi consideración:

Con respecto al contrato "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", del particular debo manifestar lo siguiente:

- Adjunto se servirá encontrar la planilla de avance número 02, con los respectivos anexos y sustentos de justificación para que proceda con su revisión y autorización correspondiente, conforme lo señalado en CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO. - La forma de pago se realizará por planilla de avance mensual.

Particular que comunico a ustedes para los fines legales correspondientes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
ODILO VINICIO  
GUEVARA MARIN

**Sr. Odilo Guevara**

CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

GERENTE

CC. Ing. Eryka Silva Administradora del contrato

Recibido  
20-04-2023  
Ricardo Corpio



**ACTA DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS DE PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO “ASFALTO DE LA VÍA CURARAY – FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”.**

En la ciudad de Puyo a los veintiocho días del mes de diciembre del 2022, comparecen en calidad de contratista AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S. A., representado legalmente por el Sr. Odilo Guevara Marín; Ing. Eryka Silva M. en calidad de Administradora de contrato con la finalidad de suscribir el Acta de Cumplimiento de Parámetros del Personal Técnico Mínimo y Equipo Mínimo requerido en la etapa precontractual de la obra antes mencionada; y así dar cumplimiento a lo determinado en la resolución Nro. RE-SERCOP-2019-0000100.

**PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO POR LA ENTIDAD**

CANTIDAD	FUNCIÓN	NIVEL DE ESTUDIO	TITULACIÓN ACADÉMICA	EXPERIENCIA	PARTICIPACIÓN
1	SUPERINTENDENTE DE OBRA	TERCER NIVEL CON TÍTULO	INGENIERO/A CIVIL	7 AÑOS	100%
1	RESIDENTE DE OBRA 1	TERCER NIVEL CON TÍTULO	INGENIERO/A CIVIL CON LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN REGISTRADO EN EL SENESCYT	5 AÑOS	100%
1	RESIDENTE DE OBRA 2	TERCER NIVEL CON TÍTULO	INGENIERO/A CIVIL CON LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN REGISTRADO EN EL SENESCYT	5 AÑOS	100%
1	TÉCNICO AMBIENTAL	TERCER NIVEL CON TÍTULO	INGENIERO/A AMBIENTAL Ó A FIN, CON LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN.	3 AÑOS	50%
1	TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	TERCER NIVEL CON TÍTULO	INGENIERO/A INDUSTRIAL Ó A FIN, ESPECIALIZADO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	2 AÑOS	50%
1	TOPOGRAFO	TERCER NIVEL CON TÍTULO	TOPOGRAF O/A INGENIERO CIVIL	1 AÑO	100%

**PERSONAL MÍNIMO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA**

FUNCIÓN	NOMBRE	AÑO DE TITULACIÓN ACADÉMICA	EXPERIENCIA	COMPROMISO
SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. MARCO VINCELA TAMAYO MEJIA	2002	1.- SUPERINTENDENTE DE OBRA CON EL CONSORCIO OMEGA, EN EL PROYECTO “MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL-PLANTA DE TRATAMIENTO – ASFALTO- DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, SUB SISTEMA DE RÍO PUYO”, \$ 5'152,543.30 USD	100%
RESIDENTE DE OBRA 1	ING. JONATHAN RODOLFO TORRES TAMAYO	2005	1.- RESIDENTE DE OBRA DEL PROYECTO” ASFALTADO CAMINO VECINAL KM. 14 VÍA PUYO-SAN RAMON KM. 31 VÍA AL TENA, CANTÓN SANTA CLARA Y PASTAZA \$ 3'767,743.28 USD	100%
RESIDENTE DE OBRA 2	ING. LUIS OCTAVIO	2010	1.- RESIDENTE DE OBRA DEL PROYECTO” ASFALTADO Y ADOQUINADO DE LA VÍA CHUCCHUPUNGO LA ESPERANZA ZULETA,	100%

	TIBANTA GUAMÁN		LIMITE PROVINCIAL CO PICHINCHA, CANTÓN IBARRA, LONGITUD 15.54KM \$ 4'590,355.59 USD	
TÉCNICO AMBIENTAL	ING. EDGAR RAÚL GASPATA CALO	2006	RESIDENTE AMBIENTAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TERMAS DE LA VIRGEN, UBICADO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA, OBRA CONTRATADA CON LA CONSTRUCTORA AMAZONAS BUILDING S. A. MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BAÑOS DE AGUA SANTA Y LA FISCALIZACIÓN A CARGO DEL ING. DANNY DURÁN CABERA \$ 1'150,232.93 USD	50%
TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	ING. WASHINGTON EDUARDO LASCANO COELLO	2018	ASFALTADO DEL CAMINO VECINAL TARQUI-SAN JACINTO – LOS ANGELES CON SUS RAMALES HUAGRAYACU Y CHINGUSHIMI \$ 1'344,013.54 USD	50%
TOPOGRAFO	ING. DANIELA ANALLA GOMEZ ZAMBRANO	2007	ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY – FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO EL TRIUNFO CATÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA \$ 1'344,013.54 USD	100%

**EQUIPO E INSTRUMENTOS DISPONIBLES REQUERIDO POR LA ENTIDAD**

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CARACTERÍSTICAS
1	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	POTENCIA MINIMA 148 HP
2	MOTO NIVELADORA	1	CAPACIDAD MINIMA 140 HP
3	CAMIÓN CISTERNA	1	CAPACIDAD MINIMA 2000 GALONES
4	VOLQUETES	5	CAPACIDAD MINIMA 10M3
5	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	CAPACIDAD MINIMA 1000 GALONES
6	PLANTA DE ASFALTO	1	110 T/H 150 HP MINIMA
7	TERMINADORA DE ASFALTO	1	60 HP POTENCIA MINIMA
8	RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR	1	80 HP POTENCIA MINIMA.
9	RODILLO VIBRATORIO LISO	1	125 HP POTENCIA MINIMA.
10	RODILLO VIBRATORIO NEUMATICO	1	28 HP POTENCIA MINIMA
11	CONCRETERA 1 SACO	2	CAPACIDAD MINIMA 1 SACO
12	MINICARGADORA	1	54 HP POTENCIA MINIMA
13	APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	SISTEMA GPS-GNSS, ESTACION TOTAL

**EQUIPO E INSTRUMENTOS DISPONIBLES PROPUESTO POR EL CONTRATISTA**

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PROPIETARIO	CARACTERÍSTICAS	PLACA / FACTURA / MATRICULA
1	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	1	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.	POTENCIA 148 HP	7.1-16-000150
	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	1	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.	POTENCIA 148 HP	7.1-16-000149



	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	1	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.	POTENCIA 148 HP	7.1-16-000006
2	MOTO NIVELADORA	1	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.	POTENCIA 140 HP	6.0-16-000004
3	CAMION CISTERNA	1	COMPROMISO DE VENTA Y DISPONIBILIDAD PARA AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. POR PARTE DE VEHICENTRO S.A.	CAPACIDAD 2000 GALONES	SN
4	VOLQUETE	1	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.	CAPACIDAD 12 M3	SBD0253
	VOLQUETE	1	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.	CAPACIDAD 12 M3	VBA1052
	VOLQUETE	1	COMPROMISO DE VENTA Y DISPONIBILIDAD PARA AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. POR PARTE DE VEHICENTRO S.A.	CAPACIDAD 20 M3	SN
	VOLQUETE	1	COMPROMISO DE VENTA Y DISPONIBILIDAD PARA AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. POR PARTE DE VEHICENTRO S.A.	CAPACIDAD 20 M3	SN
5	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1	COMPROMISO DE VENTA Y DISPONIBILIDAD PARA AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. POR PARTE DE VEHICENTRO S.A.	CAPACIDAD 1500 GALONES	SN
	PLANTA ASFALTICA	1	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.	MODELO Y POTENCIA 110 SPL Y 150 HP	15.0-17230
7	TERMINADORA DE ASFALTO (FINISHER)	1	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.	60 HP DE POTENCIA	16.0-14-000411

8	RODILLO TANDEM DOBLE TAMBOR	1	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A	99 HP POTENCIA	001-001-000122989
9	RODILLO TANDEM VIBRATORIO LISO	1	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A	125 HP POTENCIA	8.1-16000005
10	RODILLO VIBRATORIO NEUMATICO	1	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A	28 HP POTENCIA	8.6-14-000410
11	CONCRETERA I SACO	1	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A	CONCRETERA DE UN SACO	0032728
	CONCRETERA I SACO	1	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A	CONCRETERA DE UN SACO	0000128
12	MINICARGADORA	1	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A	54 HP POTENCIA	4.5-18-000625
13	GPS	1	FACTURA AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A	MARCA SOUTH	001-002-000000095
	ESTACIÓN TOTAL	1	FACTURA AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A	MARCA SOUTH	001-002-000000095

De la documentación presentada por el contratista se puede verificar que cumple con lo determinado en la sección **4.1.2 Equipo mínimo** y **4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico** de los pliegos determinados para el presente proceso; así como también lo dispuesto en los numerales **4.1.6 Metodología y Cronograma de ejecución**; para constancia se firma tres ejemplares.



ODILO VINICIO GUEVARA MARIN

Sr. Odilo Guevara

**REPRESENTANTE LEGAL DE AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S. A.**



JAIME ANDRES SILVA CORDOVA

Ing. Jaime Silva

**FISCALIZADOR TEMPORAL GADPPz**



ERYKA MIREYA SILVA MANZANO

Ing. Eryka Silva M.

**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**



**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

# CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO

"ASFALTADO DE LA VIACURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA-JAT'UN PACCHA, HASTA EL KILOMETRO  
12 VIA 10 DE AGOSTO -EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"







**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

# CONFORMIDAD AMBIENTAL

"ASFALTADO DE LA VIACURARAY -FRANCISCO DE ORELLANA-JATUN PACCHA, HASTA EL KILOMETRO  
12 VIA 10 DE AGOSTO -EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"



Puyo, 05 de abril del 2023

Ing. Adam Mariño  
DIRECTOR DE FISCALIZACION SUBROGANTE DEL GADPPz  
Presente. -

De mis consideraciones. -

Reciba un cordial y atento saludo, a la vez desearle éxitos en las funciones a usted encomendadas, de la misma manera pongo en conocimiento que se adjunta el informe Ambiental de Cumplimiento del Proyecto **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA** perteneciente a la Planilla de Avance No. 02 para que se proceda con el trámite pertinente.

Verificando en territorio lo presentado en el informe Ambiental de cumplimiento remitido por el contratista, fiscalización externa emite la **CONFORMIDAD AMBIENTAL**, correspondiente al periodo **MARZO 01 DEL 2023 A MARZO 31 DEL 2023**

Por la atención prestada anticipo mis más sinceros agradecimientos

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
JESSICA MARIELA  
JARAMILLO ARMIJOS

Ing. Jessica Jaramillo  
C.C. 0704239128  
GERENTE GENERAL  
KEYSZEN S.A.S.  
RUC 0791840462001

**KEYSZEN** SAS  
INGENIERIA & CONSTRUCCION  
Machala - El Oro - Ecuador

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN DE FISCALIZACION

Pastaza  
Fecha:

05 ABR 2023

Recibido: \_\_\_\_\_

Número: \_\_\_\_\_

EM  
Hora: 11:08

Archivos Adjuntos :

- 01 Oficio de Entrega Informe Ambiental Administrador de Contrato (1 hoja)
- 02 Oficio de Entrega Informe Ambiental Director de Fiscalizacion(2 hojas)
- 03 Informe Ambiental de Cumplimiento Planilla de Avance N° 02 (51 hojas)

CC. Ing. David Yadra - Director de Gestión Ambiental del GADPPz

**INFORME AMBIENTAL DE FISCALIZACION DEL PROYECTO: "ASFALTADO  
DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL  
KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA,  
PROVINCIA DE PASTAZA"**

**PERIODO: MARZO 01 DEL 2023 A MARZO 31 DEL 2023**

ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”

## 2. FICHA DEL PROYECTO

<b>ETAPA DEL PROYECTO</b>	Operación y mantenimiento		
<b>UBICACIÓN GEOGRÁFICA</b>	<b>Provincia:</b> Pastaza	<b>Cantón:</b> Pastaza	<b>Parroquia:</b> 10 de agosto
	CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA ✓		
<b>TIPO DE ZONA</b>	Rural		
<b>CÓDIGO DEL PROYECTO</b>	LICO-GADPPz-006-2022		
<b>PERIODO DEL INFORME</b>	01 de marzo de 2023 al 31 de marzo de 2023 ✓		
<b>COORDENADAS UTM</b>			
	<b>Este (X)</b>		<b>Norte (Y)</b>
	169467		9837116
	169975		9837403
	170901		9838807
	173028		9840607
	173979		9841143
	175562		9841028
	176810		9841069
	178330		9841233
	178384		9841892
	178743		9842171
<b>DATOS DEL OPERADOR DEL PROYECTO</b>			
<b>Representante legal</b>	Ing. Jaime Guevara		
<b>Domicilio</b>	Francisco de Orellana y 27 de febrero, Puyo, Pastaza		
<b>Página web</b>	gadppz@pastaza.gob.ec	<b>Cel:</b>	(593) 032 994-220
<b>DATOS DEL RESPONSABLE TÉCNICO FISCALIZACIÓN EXTERNA</b>			
<b>Elaborado por:</b>	Ing. Jessica Gorozabel		
<b>Dirección</b>	Machala		
<b>Correo electrónico</b>	jessica.gorozabel@gmail.com	<b>Cel:</b>	0995057489
<b>Aprobado por:</b>	Ing. Jessica Jaramillo		
<b>Dirección:</b>	Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03		
<b>Correo Electrónico</b>	keyszen.sas@gmail.com	<b>Cel:</b>	072 785 269
<b>Representante legal</b>	Gerente de KEYSZEN S.A.S.		
<b>PERIODO</b>	01 de marzo de 2023 al 31 de marzo de 2023		

**INFORME AMBIENTAL DE FISCALIZACION DEL PROYECTO: "ASFALTADO DE LA VÍA  
CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA  
10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**

**PERIODO: MARZO 01 DEL 2023 A MARZO 31 DEL 2023**



**FISCALIZADOR:**  
KEYSZEN S.A.S.

**CONTRATISTA:**  
CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

**PERIODO:**  
MARZO 01 DEL 2023 A MARZO 31 DEL 2023

## **1. ANTECEDENTES.**

El presente informe pretende cumplir con lo establecido en el contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza y la Compañía Amazonas Building S.A. por un monto de USD \$4,650,521.23 (Cuatro millones seis cientos cincuenta mil quinientos veinte y uno dólares con 23/100) para el Asfalto de la vía Curaray – Fco. de Orellana – 10 de agosto, Jatun Paccha hasta el km 12 vía 10 de agosto – El Triunfo en la provincia de Pastaza, cantón Pastaza, Parroquia 10 de agosto.

En este sentido, en el presente informe se indicarán las actividades encaminadas a prevenir, controlar o mitigar los impactos ambientales de la fase de construcción, operación y mantenimiento del proyecto de acuerdo con el plan de manejo ambiental aprobado por ministerio del Ambiente para su ejecución.

El informe ambiental toma como base para su elaboración los siguientes documentos:

1. Proyecto constructivo.
2. Ficha Ambiental aprobada por el Ministerio del ambiente del proyecto.

## **2. BASE LEGAL**

El análisis legal efectuado describe los principales contenidos relacionados con la obligatoriedad de cumplir las leyes y reglamentos vigentes para el cumplimiento de los parámetros ambientales exigibles en la legislación ecuatoriana.

El Ministerio del Ambiente es el ente que dirige la gestión ambiental, a través de políticas normas e instrumentos de control, para lograr el uso sustentable y la conservación del capital natural del Ecuador, asegurar el derecho de sus habitantes a vivir en un ambiente sano y apoyar la competitividad del país.

El Estudio de Impacto Ambiental, considera el marco regulatorio ambiental ecuatoriano que se encuentra estipulado en varias leyes y reglamentos así:

Según la Constitución Nacional actual, Título VII del Régimen del Buen Vivir; Capítulo Segundo: Biodiversidad y Recursos Naturales; Sección Primera: Naturaleza y Ambiente; Párrafos 1 y 3 del Artículo 395, se manifiesta que:

“El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas y asegure la satisfacción de las necesidades de las

generaciones presentes y futuras”.

“El Estado garantizará la participación y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales”.

En el Párrafo 2 del artículo 396 se expone que se deben “Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales”.

**En la Sección Cuarta (Recursos Naturales) del capítulo en mención**, en el Artículo 408 se manifiesta que “son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo....”.

- **La Ley de Gestión Ambiental**, publicada en el R.O. N° 245 del 30 de julio de 1999, que establece la necesidad de que las actividades que supongan riesgo ambiental cuenten con la licencia respectiva, previa la aprobación de estudios ambientales por parte de las instituciones respectivas del Estado.

**Artículo 6. - Señala:** El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en función de los intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico y de evaluación de impactos ambientales.

**En el Capítulo IV, DE LA PARTICIPACION DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO,**

**Art. 13. -** Los Consejos Provinciales y los Municipios, dictarán políticas ambientales, seccionales con Sujeción a la Constitución Política de la República y a la presente Ley. Respetarán las regulaciones Nacionales sobre el Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas, para determinar los usos del suelo y consultarán a los representantes de los Pueblos Indígenas y Afroecuatorianos y Poblaciones locales para la delimitación, manejo y administración de áreas de conservación y reserva ecológica.

- **La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre**, establece la obligación de conservar las áreas naturales. Publicada en el Registro Oficial No 64, del 24 de agosto de 1981, y codificada por el H. Congreso Nacional (Comisión de Legislación y Codificación) en el R.O. No 418 del 10 de septiembre del 2004.

**En el marco de la ley en mención, Título V: Disposiciones Generales, Artículo 101,** menciona: “En los proyectos de desarrollo rural o industriales, construcción de carreteras,

obras de regadío, hidroeléctricas u otras, que pudieren originar deterioro de los recursos naturales renovables, el Ministerio del Ambiente y demás instituciones del sector público afectadas, determinarán las medidas y valores que los ejecutores de tales proyectos u obras deban efectuar o asignar para evitar dicho deterioro o para la reposición de tales recursos”.

**Asimismo, en el Artículo 105, Título V: Disposiciones Generales,** se instaura que “Los propietarios de predios rurales colindantes, con carreteras, caminos vecinales, o cursos naturales de agua o que se hallen cruzados por éstos, están obligados a plantar árboles en los costados de estas vías y de tales cursos, según las normas legales y las que establezca el Ministerio del Ambiente en coordinación con el de Obras Públicas”.

- El Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3399 del 28 de noviembre de 2002, publicado en el Registro Oficial No. 725 del 16 de diciembre de 2002 y ratificado mediante Decreto Ejecutivo No. 3516, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 2 del 31 de marzo de 2003, contiene como mecanismos de aplicación las siguientes disposiciones legales:

- Políticas Básicas Ambientales (Título Preliminar).
- Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (Capítulo III, Título IV, Libro VI De la Calidad Ambiental).

Prevención y Control de la Contaminación; así:

- Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua, (Anexo 1, Libro VI, de la Calidad Ambiental).
- Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados, (Anexo 2, Libro VI, de la Calidad Ambiental).
- Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión, (Anexo 3, Libro VI, de la Calidad Ambiental).
- Norma de Calidad del Aire Ambiente, (Anexo 4, Libro VI, de la Calidad Ambiental).
- Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles, y para Vibraciones, (Anexo 5, Libro VI, de la Calidad Ambiental).
- Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos No Peligrosos, (Anexo 6, Libro VI, de la Calidad Ambiental).
- Listados Nacionales de Productos Químicos Prohibidos, Peligrosos y de Uso Severamente Restringido que se utilicen en el Ecuador, (Anexo 7, Libro VI, de la Calidad Ambiental).

- **Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo** (R.O. No. 565 del 17 de noviembre de 1986). Las disposiciones de este Reglamento son aplicables a las actividades de construcción en sus diferentes fases. Deberán observarse fundamentalmente procedimientos de seguridad y capacitación; y, se aprovecharán experiencias prácticas y técnicas actualizadas que coadyuven al mejoramiento en la producción; a la protección de los trabajos y a la conservación de la maquinaria empleada en los mismos y sus instalaciones, evitando, además, riesgos de accidentes y enfermedades profesionales.

- **Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas** en el Ecuador. Este Reglamento fue expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 1215 y publicado en el Registro Oficial No. 265 del 13 de febrero de 2001. El Artículo 1, señala el objeto de “regular las actividades hidrocarburíferas de exploración, desarrollo y producción, almacenamiento, transporte, industrialización y comercialización de petróleo crudo, derivados del petróleo, gas natural y afines, susceptibles de producir impactos ambientales en el área de influencia directa, definida en cada caso por el Estudio Ambiental respectivo”.

- El constructor del proyecto deberá regirse a las especificaciones técnicas estipuladas por el **Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador (MTOPE)**, referentes a la construcción de caminos y puentes, en especial a lo indicado en las siguientes secciones:

- Secciones 104, Marco de Actuación Ambiental.
- Capítulo 200, Medidas Generales de Control Ambiental.

### 3. OBJETIVO GENERAL

- El Objetivo principal, es el cumplimiento de Plan de manejo Ambiental establecido en materia ambiental, por parte de la contratista AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A., que permitan evitar, mitigar y corregir las potenciales afectaciones que se pudieran presentar durante la ejecución del proyecto.

#### 3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Procurar la menor afectación e impactos ambientales negativos hacia el recurso humano y recursos naturales como suelo, agua, calidad de aire, flora y fauna.
- Maximizar el bienestar de la población, en función de los beneficios sociales y deseguridad que conllevan la ejecución del proyecto.
- Detectar oportunamente errores y/u omisiones en el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y dar soluciones a las diferentes situaciones que se presenten

dentro de la ejecución del proyecto **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY- FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**

#### 4. ACTIVIDADES Y MAQUINARIA

Las actividades de quien suscribe este informe se han desarrollado durante el periodo marzo 01 del 2023 a marzo 31 del 2023.

En cumplimiento a la ejecución del proyecto **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY- FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA** sea compatible con las normas ambientales; se ha establecido el siguiente alcance:

- Identificación y sistematización de los potenciales riesgos ambientales que se producirán durante la ejecución de las actividades de constructivas del proyecto en mención.

#### DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE PROYECTO

- Desbroce, desbosque y limpieza
- Replanteo y nivelación a nivel de asfalto
- Remoción de alcantarillas
- Excavación sin clasificar (mov. de tierra)
- Excavación de cunetas de coronación
- Excavación para cunetas y encauzamiento
- Excavación y relleno de estructuras menores
- Limpieza de derrumbes
- S.C. Tubería de acero corrugado D= 0,80 m, e=2.5 mm, MP-100
- S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m, e=2.5 mm, MP-100
- S.C. Tubería de acero corrugado D= 2.20 m. e=3.0 mm, MP-100
- Hormigón para cunetas (F'C=180 KG/CM2)
- Muro de H.S. f'c=180kg./cm2 tipo B(Cabezales)
- Hormigón simple en obras de arte F'C=240 KG/CM2
- Hierro estructural fy=4200 kg/cm<sup>2</sup>
- Muro de gaviones - calibre N.º 12
- Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)
- Material de subbase clase 3
- Material de base granular de agregados
- Transporte material de desalojo

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
Oficina 072 785 269  
keyszen.sas@gmail.com  
www.keyszen.com  
Machala – El oro - Ecuador

- Transporte material pétreo de mejoramiento
- Transporte de material sub base clase 3
- Transporte de material base granular de agregados
- Imprimación con emulsión asfáltica
- C. rodadura hormigón asf. Mezclado en planta, e=2"
- Bordillo de H.S.(f'c=210 kg/cm<sup>2</sup> - 0,14x0,40)
- Aceras de H.S. f'c=180kg/cm<sup>2</sup> E=7cm escobillado
- Marcas en pavimento
- Marcas sobre salidas de pavimento (unidireccionales y bidireccionales)
- Pancarta informativa de la obra (letrero)-con estructura
- Señales ecológicas (2.44x1.22) M2
- Señales informativas (2.44x1.22) M2
- Señales reglamentarias (0.75 x 0.75) M2
- Señales preventivas (0.75 x 0.75) M2
- Señales informativas y reglamentarias (0.60m x 0.80m) móviles
- Señales preventivas tipo barrera (1.22mx0.60m) móviles
- Contenedores metálicos de 55 galones
- Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)
- S/C Cono de seguridad con protección UV, 71cm Incl. cinta reflectiva
- Suministro de paleta de alto y siga
- Capacitación sobre preservación de recursos naturales (de 2 a 3 horas)
- Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a 3 horas)
- Capacitación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3 horas)

## MAQUINARIA/EQUIPO EMPLEADO

- Motoniveladora
- Excavadora sobre oruga
- Camión cisterna
- Volquetes
- Distribuidor de asfalto
- Planta de asfalto
- Terminador de asfalto
- Rodillo tanden doble tambor
- Rodillo vibratorio liso
- Rodillo vibratorio neumáticos
- Concreteira
- Mini cargadora
- Aparatos de topografía

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
Oficina 072 785 269  
keyszen.sas@gmail.com  
www.keyszen.com  
Machala – El oro - Ecuador

**5. IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES**

1. Reconformación de la subrasante y excavación para cunetas de drenaje en la vía existente (camino vecinal).
2. Colocación de una capa de material pétreo para estabilización de la subrasante, de un espesor de 60cm., perfectamente compactada y con sus alineaciones correspondientes.
3. Colocación de una capa de subbase clase 3 de espesor igual a 15 cm perfectamente compactada.
4. Colocación de una capa de base clase 4 de espesor igual a 10cm perfectamente compactada.
5. Colocación de una capa de rodadura de hormigón asfáltico de 2" de espesor.
6. Construcción de cunetas laterales de hormigón para drenaje.
7. Construcción de alcantarilladas de hormigón y metálicas para drenaje de aguas pluviales.

**6. CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS**

ITEM	MEDIDA	Medio de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementar señalética</li> <li>Señalética de prohibición</li> <li>Señalética de condición obligatoria</li> <li>Señalética condición Segura</li> <li>Señalética preventiva</li> <li>Señalética Ambiental</li> <li>Señalética informativa</li> </ul>	ANEXO 08 • Señalética	X	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Humedecer la vía en los días soleados para evitar material particulado, optimizando el recurso agua.</li> </ul>			
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zonificar las áreas de trabajo con cinta de peligro.</li> </ul>	ANEXO 09 • Zonificación de áreas con cinta	X	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cubrir con una lona las volquetas que trasladen material pétreo hacia el lugar de la obra.</li> </ul>	ANEXO 12 • Volquetas cubiertas con lona	X	

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
 Oficina 072 785 269  
 keyszen.sas@gmail.com  
 www.keyszen.com  
 Machala – El oro - Ecuador

5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las vías por donde circula el equipo caminero deben estar despejadas y sin obstáculo.</li> </ul>	<p>ANEXO 11</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vías despejadas</li> </ul>	X	Las vías se encuentran libres de obstáculos.
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar mantenimiento regular de la maquinaria y equipoutilizado</li> </ul>	<p>ANEXO 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Registro del mantenimiento vehicular (Periodo del 01 al 31 de marzo)</li> </ul>	X	La revisión y mantenimiento de la maquinaria para el mes de marzo se realizó en los talleres de la compañía Amazonas Building, ubicados en la parroquia Madre Tierra el cual consta con todos los permisos y regularizaciones ambientales.
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>El transporte del equipo se realizará utilizando las vías de accesos existentes, considerado no causar molestias a los habitantes del costado de la vía y el posible deterioro de la misma.</li> </ul>	<p>ANEXO 11</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vías despejadas</li> </ul>	X	Los vehículos livianos y pesados que operan en el proyecto utilizan las vías de acceso, precautelado el correcto uso de las mismas con el objetivo de evitar daños.
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementar un kit antiderrame y equipo de respuesta rápida, para combatir posibles contaminados.</li> </ul>	<p>ANEXO 12</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kits antiderrames</li> </ul>	X	Dentro del proyecto existe un kit antiderrame, con el objetivo de mitigar cualquier derrame.
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se Deberá instalar de forma permanente un extintor y botiquin de primeros auxilios en los vehículos y maquinaria.</li> </ul>	<p>ANEXO 5 Y 6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Botiquín</li> <li>Extintor</li> </ul>	X	La maquinaria y vehículos cuentan con botiquín y extintor

10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotar al personal que labora en el Proyecto de EPP</li> </ul>	<p>ANEXO 7</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usode EPPs</li> </ul>	X	<p>El contratista ha dotado a sus trabajadores del EPP adecuado, según la actividad laboral asignada. Entrega de impermeables, gafas y chalecos a operadores de maquinaria pesada se realizó en el periodo anterior y tiene la vigencia de tres meses</p>
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementar un área para el almacenamiento temporal de combustibles el cual deberá cumplir las siguientes características. Deberá estar ubicado alejado de cuerpos hídricos y aislados.</li> <li>• Los sitios de almacenamiento de combustible serán ubicados en áreas no inundables.</li> <li>• La estructura será realizada con vigas de madera y cubierta de dura techo o también pueden ser hojas de si las dimensiones del área se realizarán en base a la cantidad de tanques de almacenamiento a utilizar.</li> <li>• El tanque de almacenamiento deberá estar protegido contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones que contaminen el ambiente y contarán con mangueras y llaves de distribución.</li> <li>• El tanque de almacenamiento debe estar rodeado de un cubeto o estructura de contención impermeables técnicamente diseñado para el efecto con volumen = o mayor a 110% del tanque.</li> <li>• En el área deberá implementar un extintor para evitar cualquier riesgo de incendio</li> </ul>	<p>ANEXO 13</p> <p>Área para el almacenamiento de combustible</p>	X	<p>En el campamento se encuentra un área destinada para el almacenamiento de combustible, la misma que cuenta con piscipavimentado, bajo cubierta, kit antiderrame, señalética y extintor.</p>

Urb. Puercas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03

Oficina 072 785 269

keyszen.sas@gmail.com

www.keyszen.com

Machala – El oro - Ecuador

12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tener un acceso adecuado para la carga de combustible y en caso de ser necesario para la entrada del carro de los bomberos</li> <li>El área deberá estar señalizado en base a la normativa NTE INEN 2266.</li> <li>Ubicar el material de desalojo en los sitios descritos en el ítem 7 del presente documento.</li> <li>Los cuáles han sido ubicados de acuerdo con los siguientes criterios técnicos</li> <li>Deberán encontrarse dentro del área de influencia del Proyecto.</li> <li>El terreno deberá estar desprovisto de vegetación</li> <li>Alejado de cueros hídricos</li> <li>Las áreas destinadas a las escombreras deberán serestables y seguras a corto y largo plazo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registro fotografía de las escombreras del Proyecto</li> <li>Actas de acuerdo de desalojo de escombreras (en caso de ser predios privados)</li> <li>Deberán contar con una capacidad mínima de 1500m<sup>3</sup></li> <li>El transporte del material debe realizarse en una volqueta con cubierta (lona), con el fin de evitar derrames en la carretera.</li> </ul>	X	Se lo realizara cuando las actividades lo ameriten
----	--	--	---	--

## PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

ITEM	MEDIDA	Medio de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementar un área de almacenamiento temporal de desechos peligrosos en el cual deberá tener las siguientes características:</li> <li>Estar bajo cubierta</li> <li>Iluminación natural</li> <li>En un espacio abierto cerrado</li> <li>El acceso a estos locales deberá ser registrado Y el personal que ingiere estará provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad industrial</li> <li>Contar con señalización apropiada en lugares y formas visibles en base a la Norma nte inen 2266.</li> <li>Contar con el material y equipamiento para atender contingencias.</li> <li>Contar con sistemas de extinción contra incendios</li> <li>Contar con bases o pisos impermeabilizados osimilares según el caso.</li> </ul>	ANEXO 14 ● Área para almacenamiento de desechos peligrosos	X			En el campamento se encuentra un área destinada para el almacenamiento temporal de los desechos peligrosos, la misma que cuenta con piso pavimentado, bajo cubierta, kit antiderrame, señalética y extintor. Cabe mencionar que durante este periodo no se han realizado actividades productivas que generen desechos peligrosos.
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dotar de fundas plásticas a los conductores de volquetes y máquinas pesadas para los desechos.</li> </ul>				X	La dotación de fundas plásticas anterior aún tiene unidades existentes para el correcto almacenamiento de los desechos comunes.
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación de contenedores de colores debidamente etiquetadas para la clasificación en lavia, se deberá cumplir con las siguientes características:</li> <li>Encontrarse bajo techo</li> <li>Contenedores de 55 galones (4)</li> <li>El rotulado estará en un lugar visible con caracteres legibles según lo</li> </ul>	ANEXO 3 ● Contenedores metálicos	X			En el frente de trabajo existen contenedores metálicos móviles, coloreados según el residuo y/o desecho a clasificar.

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03

Oficina 072 785 269

keyszen.sas@gmail.com

www.keyszen.com

Machala – El Oro - Ecuador

	<p>establecido en la NTE INEN 878. El nombre o denominación de los residuos con su logo respectivo y la distancia de observaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>según lo establecido en la NTE INEN ISO 3864-1</li> </ul>				
--	---	--	--	--	--

### PLAN DE CAPACITACIÓN:

ITEM	MEDIDA	Medio de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitaciones al personal de trabajo sobre:</li> <li>Medidas propuestas en el MA</li> <li>Manejo de los procedimientos de seguridad</li> <li>Trabajos en alturas</li> <li>Protecciones del ambiente</li> <li>Primeros auxilios y procedimiento en caso de emergencia</li> <li>Manejo de desechos peligrosos y no peligrosos</li> <li>Técnicas para prevenir conflictos con la comunidad</li> </ul>	<p>ANEXO 15</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitaciones</li> </ul>	X			<p>Todo el personal que opera en el proyecto ha sido capacitado en los temas de seguridad, salud y ambiente, de igual forma ha sido socializado el PMA. Se realizaron charlas y entrega de trípticos de manejo de desechos sólidos con volqueteros y ayudantes del proyecto</p>

## PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS:

ITEM	MEDIDA	Medio de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar una reunión previa con los involucrados directos del Proyecto para darles a conocer las ventajas de implementación del Proyecto obra o actividad.</li> </ul>				X	El proyecto fue socializado en el periodo anterior.
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación un buzón donde se recepte las quejas y sugerencias de la población.</li> </ul>	ANEXO 16 <ul style="list-style-type: none"> <li>Buzón de quejas</li> </ul>	X			El personal que se encuentra diariamente en el proyecto cuenta con hojas de registro, en las cuales las personas
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Participar activamente en reuniones y procesos comunales que se realizan que se realicen en el área de influencia</li> </ul>				X	Las reuniones de informe de actividades y avance de obra se ejecutará semestralmente a partir del mes de abril del presente año.

## PLAN DE CONTINGENCIAS:

ITEM	MEDIDA	Medio de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar un plan de contingencia accesible a todo el personal en el cual se aborde la gestión de contingencia en caso de incendios, derrame, fuga o explotación</li> </ul>	ANEXO 17 <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de contingencia</li> </ul>	X			El proyecto cuenta con un plan de contingencia, el mismo que ha sido socializado a los trabajadores.
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Crear un comité de seguridad que actúe en caso de emergencia.</li> </ul>				X	Se lo realizó en el mes de febrero

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03

Oficina 072 785 269

keyszen.sas@gmail.com

www.keyszen.com

Machala – El Oro - Ecuador

3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizará simulacros, de evaluación, incendio, derrames o fugas para agilizar los tiempos de reacción del personal y su actuación.</li> </ul>		X	Se lo realizará en el mes de febrero.
4	<p>Actuar de la siguiente manera en caso de</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>En caso de incendio</b></li> </ul> <p>Si alguien detecta un fuego incipiente y sabe usar un extintor actúa inmediatamente</p> <p>Tipos de extintores</p> <p>El tipo A se usará durante la combustión de sólidos comunes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El tipo B se usará para líquidos y gases inflamables El tipo C se para equipos eléctrico energizado y tipo de para metales combustibles</li> <li>Salve su vida y la de los demás abandonando el lugar de incendio</li> <li>Una vez a salvo avisar a la brigada hágalo sin pensar que otro ya lo han hecho</li> <li>Solicite Auxilio</li> </ul> <p>Si se encuentra Atrapado por el humo trate de salir arrastrándose o permanézcalo más cerca del suelo el humo tiende a subir y existe aire no contaminado a nivel del suelo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si el humo es muy denso curarse con un pañuelo ropa mojada la boca y nariz manténgase cerca del suelo</li> <li>Cuando se inflaman la ropa de una persona, impida que corra, el viento aviva el fuego. Cobijelo con una manta húmeda haga que se proteja la cara y cuello.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>En caso de explosión</b></li> <li>Evacuen la zona de riesgo y proceda de acuerdo a lo establecido en el programa de contingencia</li> <li>Acordeón del área y restringe el acceso a personal ajeno</li> <li>Utilice el extintor adecuado</li> <li>No intente extinguir el fuego hasta que la fuga haya sido detenida de otra manera existe grave riesgo de rescisión y explosión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe técnico</li> <li>derecho</li> </ul>	X	Durante este periodo no ha existido ningún incidente y/o accidente de manera natural o antrópica, en caso de suceder se tomará en cuenta lo establecido en esta medida.

	<p>● <b>En caso de sismo o fenómeno natural</b></p> <p>Antes un sismo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Conozca las zonas de seguridad</li> <li>-Contar con un mapa de peligro potencial y zonas seguras</li> <li>-Reciba entrenamiento en primeros auxilios y evacuación</li> <li>-Manténgase plenamente informado de cómo interrumpir de forma segura sus labores habituales o el proceso de construcción</li> <li>-Observe la ubicación de su área de trabajo Buscar sitios de protección contra materiales que pudieran desprenderse.</li> <li>-Haga una evacuación de vulnerabilidad de su entorno de trabajo para determinar los peligros potenciales</li> <li>-En caso de derrame o fuga</li> <li>-Localice el derrame o fuga</li> <li>-Antes de comenzar con el control o contención del derrame, debe colocarse los elementos de protección personal necesario: ropa adecuada impermeable y resistente a los productos químicos guantes protectores lentes de seguridad protección respiratoria.</li> <li>-Contenga con barreras, di que si o materiales absorbentes</li> <li>-Colocar fluidos y desechables en recipientes de fundas para recolección de materiales contaminados</li> <li>-Entregar el material contaminado a un gestor calificado</li> </ul>					
--	---	--	--	--	--	--

## PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO:

ITEM	MEDIDA	Medio de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar el nivel de cumplimiento al presente PMA a través de un informe interno de cumplimiento de las medidas del plan de aprobación por la Autoridad Ambiental.</li> <li>• Monitorear el manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos dentro del área de influencia del proyecto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe de monitoreo</li> </ul>	X			Se presenta el informe correspondiente a este periodo.
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitorear el manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos dentro del área de influencia del proyecto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe de monitoreo al manejo de desechos peligrosos y no peligrosos</li> </ul>			X	La acción No Aplica, debido a que durante este periodo no se han realizado actividades que generen desechos peligrosos.
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar el mantenimiento de los extintores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ANEXO 6</li> <li>• Extintores</li> </ul>	X			Los extintores se encuentran recargados, en buen estado y ubicados en lugares visibles y de fácil acceso.

## PLAN DE REHABILITACION:

ITEM	MEDIDA	Medio de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revegetación reforestación de áreas degradadas en el proyecto con plantas nativas de la zona.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro fotográfico</li> <li>• Informe de revegetación</li> </ul>			X	La acción no aplica, debido a que el proyecto se encuentra en etapa de construcción.

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03

Oficina 072 785 269

keyszen.sas@gmail.com

www.keyszen.com

Machala — El Oro - Ecuador

**PLAN DE ENTREGA Y ABANDONO:**

ITEM	MEDIDA	Medio de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desmantelamiento de la infraestructura temporal existente en el área del proyecto (campamento, área de almacenamiento de combustibles y desechos peligrosos)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registro fotográfico</li> <li>Informe de monitoreo</li> </ul>			X	La acción no aplica, debido a que el proyecto se encuentra en etapa de construcción.
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpieza general del área del proyecto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registro fotográfico</li> </ul>			X	La acción no aplica, debido a que el proyecto se encuentra en etapa de construcción.

Durante el periodo marzo 01 del 2023 a marzo 31 del 2023. En la ejecución del proyecto **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA ELKILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.**

**LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LAS MEDIDAS AMBIENTALES SE HAN CUMPLIDO**

**6. CONCLUSIONES**

Se realizó los trámites pertinentes para la regularización y obtención del permiso ambiental en el tramo del Km 12 Vía 10 de agosto \_ El Triunfo hasta Jatun Paccha desde la abscisa 0+000 hasta la abscisa 2+040 y desde la abscisa 2+500 hasta la 3+445.

Podemos concluir en el presente informe mensual la administración del Proyecto **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE**

**PASTAZA**, tiene como objetivo continuar con el cumplimiento de las medidas ambientales y así mitigar el impacto que esta obra pueda ocasionar en los moradores del sector.

En ese contexto, se recomienda continuar con la implementación del Plan de Manejo Ambiental, así como también el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad del personal.

**Elaborado por:**



Firmado electrónicamente por:  
**JESSICA GISELLA  
GOROZABEL ROSILLO**

Jessica Gorozabel Rosillo  
**INGENIERO AMBIENTAL**

**Aprobado por:**



Firmado electrónicamente por:  
**JESSICA MARIELA  
JARAMILLO ARMIJOS**

Jessica Jaramillo Armijos  
**KEYSZEN S.A.S.  
FISCALIZADOR EXTERNO**

# ANEXOS

## ANEXO 1. Permiso Ambiental



Via Puyo-Napo Km2 1/4  
Diagonal Hosteria los Chontas  
Puyo - Ecuador  
Teléfonos (593 3) 2883809 / 2883085  
www.ambiente.gob.ec

Oficio No. MAE-DPP-2010-0457

Puyo, 09 de diciembre de 2010

Señor Ingeniero  
Jaime Patricio Guevara Blaschke  
Prefecto  
GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA  
Presente.

En respuesta al oficio N° 266-GPPZ-2010, de lugar y fecha, Puyo 04 de Noviembre de 2010, suscrito por el Ing. Rodrigo Villagomez, Técnico Ambiental del Gobierno Provincial de Pastaza, en el cual remite a la Dirección Provincial de Pastaza del Ministerio del Ambiente, para análisis y pronunciamiento de la Ficha Ambiental del proyecto: "ASFALTADO DE LA VIA CURARAY -FRANCISCO DE ORELLANA-INTERSECCION CON LA VIA 10 DE AGOSTO -EL TRIUNFO", al respecto comunico que luego de revisada la documentación y sobre el Informe Técnico N° 171 UCA.DPP de 08 de diciembre de 2010 realizado por el Ing. Franklin Guamán, Responsable de la Unidad Calidad Ambiental, se aprueba la Ficha Ambiental en mención, el cumplimiento a cabalidad del Plan de Manejo Ambiental de la ficha lo realizará el Ministerio del Ambiente hacia el proyecto a través de inspecciones, sin previo aviso.

Al ejecutarse modificaciones en la operación normal del proyecto, se deberá notificar en forma oficial e inmediata de los detalles de modificación y/o cambios a esta Dirección Provincial.

Atentamente,

  
José María García Paican

DIRECTOR PROVINCIAL DE PASTAZA (E)



C.C. Señor  
Franklin Patricio Guamán Bosmediano  
Servidor Público 1  
MINISTERIO DEL AMBIENTE  
Señor  
Ángel Gualberto Vargas Cevallos  
Servidor público de apoyo 3  
MINISTERIO DEL AMBIENTE

Oficio de aprobación del permiso ambiental del  
proyecto.

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
Oficina 072 785 269  
keyszen.sas@gmail.com  
www.keyszen.com  
Machala - El oro - Ecuador

## ANEXO 2. Certificado de Intersección



Via Puyo-Napo Km2 1/2  
Diagonal Hostera los Chontas  
Puyo - Ecuador  
Teléfonos: (593 3) 2683509 / 2683085  
www.ambiente.gob.ec

Oficio No. MAE-DPP-2010-0457


Puyo, 09 de diciembre de 2010

Señor Ingeniero  
Jaime Patricio Guevara Blaschke  
Prefecto  
GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA  
Presente.

En respuesta al oficio N° 266-GPPZ-2010, de lugar y fecha, Puyo 04 de Noviembre de 2010, suscrito por el Ing. Rodrigo Villagomez, Técnico Ambiental del Gobierno Provincial de Pastaza, en el cual remite a la Dirección Provincial de Pastaza del Ministerio del Ambiente, para análisis y pronunciamiento de la Ficha Ambiental del proyecto: "ASFALTADO DE LA VIA CURARAY -FRANCISCO DE ORELLANA-INTERSECCION CON LA VIA 10 DE AGOSTO -EL TRIUNFO", al respecto comunico que luego de revisada la documentación y sobre el Informe Técnico N° 171 UCA.DPP de 08 de diciembre de 2010 realizado por el Ing. Franklin Guamán, Responsable de la Unidad Calidad Ambiental, se aprueba la Ficha Ambiental en mención, el cumplimiento a cabalidad del Plan de Manejo Ambiental de la ficha lo realizará el Ministerio del Ambiente hacia el proyecto a través de inspecciones, sin previo aviso.

Al ejecutarse modificaciones en la operación normal del proyecto, se deberá notificar en forma oficial e inmediata de los detalles de modificación y/o cambios a esta Dirección Provincial.

Atentamente,

  
José María García Paican  
DIRECTOR PROVINCIAL DE PASTAZA (E)



C.C.  
Señor  
Franklin Patricio Guamán Bosmediano  
Servidor Público 1  
MINISTERIO DEL AMBIENTE  
Señor  
Ángel Gualberto Vargas Cevallos  
Servidor público de apoyo 3  
MINISTERIO DEL AMBIENTE

**ANEXO 3. Contenedores metálicos**



## ANEXO 4. Certificación de mantenimiento vehicular

AMAZONAS BUILDING S.A.						
CONTROL DE MANTENIMIENTOS MAQUINARIA						
Fecha:	23/05/2023		Lugar de Mantenimiento:	FALLER DE COMPAÑIA AMAZONAS BUILDING S.A.		RESPONSABLE:
VEHICULOS						
MINICARGADORA KOMATSU SK 815-5			EXCAVADORA DRUGA DOOSAN DX225LCA 2			TIPO DE ACEITE
PLANTA ASFALTICA ADM SPL-1120			EXCAVADORA DRUGA DOOSAN DX225LCA 3			ACEITE
GENERADOR CUMMINS (PLANTA DE ASFALTO)			EXCAVADORA DRUGA DOOSAN DX225LCA 4			CANTIDAD
GENERADOR KOLER (PLANTA DE ASFALTO)			GALLINETA			TECNICO
BOMBA HORMIGON SCHWING AMERICA INC SP 750.1			Rodillo AMMAN	2915.3		
RODILLO TANDEM BOMAG BW 9A5			Rodillo AMMAN 2			
RODILLO TANDEM INGERSOLL SD1000			Rodillo Caterpile			
RODILLO NEUMATICO BASIC KUBOTA MODELO 700						
FINISHER LEE BOY 8500 T						
MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670B						
PLANTA DOSIFICADORA HORMIGON PAD00362						
CAMBIO DE ACEITE MOTOR						
FECHA CAMBIO	CANTIDAD	KILOMETRAJE HOROMETRO	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO		
23/05/2023	7	2915.3	210	30/05/2023		
CAMBIO FILTRO DE ACEITE						
FECHA CAMBIO	CANTIDAD	KILOMETRAJE HOROMETRO	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO		
CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE						
FECHA CAMBIO	CANTIDAD	KILOMETRAJE HOROMETRO	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO		
CAMBIO FILTRO DE AIRE						
FECHA CAMBIO	CANTIDAD	KILOMETRAJE HOROMETRO	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO		
CAMBIO ACEITE HIDRAULICO						
FECHA CAMBIO	CANTIDAD	KILOMETRAJE HOROMETRO	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO		
CAMBIO DE ACEITE DE GIRO						
FECHA CAMBIO	CANTIDAD	KILOMETRAJE HOROMETRO	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO		
CAMBIO DE ACEITE DEPURADORES						
FECHA CAMBIO	CANTIDAD	KILOMETRAJE HOROMETRO	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO		
CAMBIO DE ACEITE CATALINA						
FECHA CAMBIO	CANTIDAD	KILOMETRAJE HOROMETRO	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO		
CAMBIO DE ACEITE RUEDAS GUJAS						
FECHA CAMBIO	CANTIDAD	KILOMETRAJE HOROMETRO	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO		
CAMBIO DE UÑAS - RETENEDORES - RUEDAS						
FECHA CAMBIO	CANTIDAD	KILOMETRAJE HOROMETRO	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO		
OTROS MANTENIMIENTOS						
DETALLAR OBSERVACIONES:						
Revision sistema electrico y sistema hidraulico						



## CONTROL DE MANTENIMIENTOS MAQUINARIA

Fecha:	23-03-2023	Lugar de Mantenimiento:	TALLER DE COMPAÑIA AMAZONAS BUILDING S.A	RESPONSABLE	
VEHICULOS		ACEITE	TIPO DE ACEITE	CANTIDAD	TECNICO
MINICARGADORA KOMATSU SK 815-5	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN DX225LCA 2		15W/40		
PLANTA ASFALTICA ADM SPL-110	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN DX225LCA 3				
GENERADOR CUMMIS (PLANTA DE ASFALTO)	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN DX225LCA 4				
GENERADOR KOLER (PLANTA DE ASFALTO)	GALLINETA				
BOMBA HORMIGON SCHWING AMERICA INC. SP 750-1	Rodillo AMMAN				
RODILLO TANDEM BOMAG BW 9AS	Rodillo AMMAN 2 TAMBIEN 25124				
RODILLO TANDEM INGERSOLL SD100D	Rodillo Caterpile				
RODILLO NEUMATICO BASIC KUBOTA MODELO 700					
FINISHER LEE BOY 8500 T					
MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670B					
PLANTA DOSIFICADORA HORMIGON PAD0036Z					

CAMBIO DE ACEITE MOTOR				
FECHA CAMBIO	CANTIDAD	KILOMETRAJE HOROMETRO	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO
23-03-2023	1		25124	28/3/23
CAMBIO FILTRO DE ACEITE				
FECHA CAMBIO	CANTIDAD	KILOMETRAJE HOROMETRO	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO
CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE				
FECHA CAMBIO	CANTIDAD	KILOMETRAJE HOROMETRO	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO
CAMBIO FILTRO DE AIRE				
FECHA CAMBIO	CANTIDAD	KILOMETRAJE HOROMETRO	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO
CAMBIO ACEITE HIDRAULICO				
FECHA CAMBIO	CANTIDAD	KILOMETRAJE HOROMETRO	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO
CAMBIO DE ACEITE DE GIRO				
FECHA CAMBIO	CANTIDAD	KILOMETRAJE HOROMETRO	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO
CAMBIO DE ACEITE DEPURADORES				
FECHA CAMBIO	CANTIDAD	KILOMETRAJE HOROMETRO	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO
CAMBIO DE ACEITE CATALINA				
FECHA CAMBIO	CANTIDAD	KILOMETRAJE HOROMETRO	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO
CAMBIO DE ACEITE RUEDAS GUIAS				
FECHA CAMBIO	CANTIDAD	KILOMETRAJE HOROMETRO	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO
CAMBIO DE UÑAS - RETENEDORES - RUEDAS				
FECHA CAMBIO	CANTIDAD	KILOMETRAJE HOROMETRO	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO


OTROS MANTENIMIENTOS

DETALLAR OBSERVACIONES:

- Limpieza de sistema eléctrico y sistema hidráulico



## CONTROL DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS

Fecha:	10/03/23	Lugar de Mantenimiento:	TALLER DE COMPANIA AMAZONAS BUILDING S.A. (1)		
VEHICULOS		PLACA	TBJ5817		RESPONSABLE
MINI DUTRO 300		TOYOTA FORTUNER	ACEITE	TIPO DE ACEITE	
MINI FM 500		VITARA ROJO		15W40	
MINI FS700		MIXER HYUNDAI HD270			
RAILER FREIGHTLINER		TANQUERO MERCEDES			
Volquete Chevrolet Azul		FORD AZUL			
TRACTOR WALL 5 BLANCA	X				
TRACTOR WALL 7 PLOMA					
TRACTOR WALL 8 ROJO					
CAMBIO DE ACEITE MOTOR					
FECHA CAMBIO	10/03/23	CANTIDAD	1 1/4	KILOMETRAJE HOROMETRO	65843
				PROXIMO CAMBIO	70845 KM
					NUMERACION
					6517
CAMBIO FILTRO DE ACEITE					
FECHA CAMBIO	10/03/23	CANTIDAD	1	KILOMETRAJE HOROMETRO	"
				PROXIMO CAMBIO	"
					NUMERACION
					Libro Firma PHE20
CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE					
FECHA CAMBIO	10/03/23	CANTIDAD	1	KILOMETRAJE HOROMETRO	"
				PROXIMO CAMBIO	"
					NUMERACION
					Libro Firma PHE20
CAMBIO FILTRO DE AIRE					
FECHA CAMBIO	10/03/23	CANTIDAD	1	KILOMETRAJE HOROMETRO	"
				PROXIMO CAMBIO	75845 KM
					NUMERACION
					Libro Firma A-36270
CAMBIO ACEITE DE CORONAS					
FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO	
				PROXIMO CAMBIO	
					NUMERACION
CAMBIO DE ACEITE DE CAJA					
FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO	
				PROXIMO CAMBIO	
					NUMERACION
CAMBIO DE GRASAS DE LAS RUEDAS					
FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO	
				PROXIMO CAMBIO	
					NUMERACION
CAMBIO DE DE RUEDAS					
FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO	
				PROXIMO CAMBIO	
					NUMERACION
OTROS MANTENIMIENTOS					
DETALLAR OBSERVACIONES:					

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
 Oficina 072 785 269  
 keyszen.sas@gmail.com  
 www.keyszen.com  
 Machala – El oro - Ecuador



## CONTROL DE MANTENIMIENTOS MAQUINARIA

Fecha:	07/03/23	Lugar de Mantenimiento:	TALLER DE COMPANIA AMAZONAS BUILDING S.A.	RESPONSABLE	
VEHICULOS		TIPO DE ACEITE	CANTIDAD	TECNICO	
MINICARGADORA KOMATSU SK 815 S	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN DX225LC-2	25W-40	5 1/4		
PLANTA ASFALTICA ADM SPL-110	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN DX225LC-1				
GENERADOR CUMMIS (CALDERO DE P. ASFALTO)	EXCAVADORA ORUGA DOOSAN DX225LC-4				
GENERADOR KOLER (PLANTA DE LUZ)	GALLINETA				
BOMBA HORMIGON SCHIWIW AMERICA INC. SP 750-L	Rodillo AMMAN neumatico				
RODILLO TANDEM BOMAG BW 9AS	Rodillo AMMAN tandem				
RODILLO TANDEM INGERSOLL SD 1000	Rodillo Compactador Caterpillar				
RODILLO NEUMATICO BASIC KUBOTA MODELO 700	Generador Lovol Trituradora				
FINISHER LEE BOY 8500 T	Generador Weichai				
MOTONIVELADORA JIION DEERE 670B	Excavadora SANY SY 365H				
PLANTA HORMIGON HORMIGON PADOSSO					

### CAMBIO DE ACEITE MOTOR

FECHA CAMBIO	07/03/23	CANTIDAD	5 1/4	KILOMETRAJE HOROMETRO	408 H	NUMERACION	650 H
--------------	----------	----------	-------	-----------------------	-------	------------	-------

### CAMBIO FILTRO DE ACEITE

FECHA CAMBIO	"	CANTIDAD	2	KILOMETRAJE HOROMETRO	408 H	NUMERACION	650 H
--------------	---	----------	---	-----------------------	-------	------------	-------

### CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE

FECHA CAMBIO	"	CANTIDAD	2	KILOMETRAJE HOROMETRO	408 H	NUMERACION	650 H
--------------	---	----------	---	-----------------------	-------	------------	-------

### CAMBIO FILTRO DE AIRE

FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		NUMERACION	PROXIMO CAMBIO
--------------	--	----------	--	-----------------------	--	------------	----------------

### CAMBIO ACEITE HIDRAULICO

FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		NUMERACION	PROXIMO CAMBIO
--------------	--	----------	--	-----------------------	--	------------	----------------

### CAMBIO DE ACEITE DE GIRO

FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		NUMERACION	PROXIMO CAMBIO
--------------	--	----------	--	-----------------------	--	------------	----------------

### CAMBIO DE ACEITE DEPURADORES

FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		NUMERACION	PROXIMO CAMBIO
--------------	--	----------	--	-----------------------	--	------------	----------------

### CAMBIO DE ACEITE CATALINA

FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		NUMERACION	PROXIMO CAMBIO
--------------	--	----------	--	-----------------------	--	------------	----------------

### CAMBIO DE ACEITE RUEDAS GUIAS

FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		NUMERACION	PROXIMO CAMBIO
--------------	--	----------	--	-----------------------	--	------------	----------------

### CAMBIO DE UÑAS - RETENEDORES - RUEDAS

FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		NUMERACION	PROXIMO CAMBIO
--------------	--	----------	--	-----------------------	--	------------	----------------

### OTROS MANTENIMIENTOS

DETALLAR OBSERVACIONES:

**ANEXO 5. Botiquín**



## ANEXO 6. Extintor





**ANEXO 7. Uso de EPPs**



**ANEXO 08. Señalética**



Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
Oficina 072 785 269  
keyszen.sas@gmail.com  
www.keyszen.com  
Machala – El oro - Ecuador



**ANEXO 10. Volquetas cubiertas con lona**



**ANEXO 11. Vías despejadas**



**ANEXO 12. Kit antiderrame**



**ANEXO 13. Área para almacenamiento de combustible**



**ANEXO 14. Área para almacenamiento temporal de los desechos peligrosos**



## ANEXO 15. Capacitaciones y Tripticos



### Código de colores para la recolección de residuos:

Existen diferentes códigos para la recolección de los residuos en tachos de diferentes colores según el tipo de residuos que se va a desechar. A continuación mencionaremos uno de los más usados.



CANECA GRIS	CANECA VERDE	CANECA AZUL
<b>RESIDUOS APROVECHABLES</b> Papel y cartón son recuperables si están limpios.	<b>RESIDUOS ORDINARIOS</b> Sobrantes de comida, vasos, platos, cubiertos, desechables, papel de mecate, papel engrasado, carbón y aluminio.	<b>RESIDUOS APROVECHABLES</b> Vidrio y plástico, botellas retornables, bolsas plásticas.

No olvides que si no eres parte de la solución, eres parte del problema.

### AMAZONAS BUILDING S.A.

PROYECTO DE ASFALTO DE LA VÍA CURARAY  
 - FCO. DE ORELLANA - 10 DE AGOSTO,  
 JATUMPACCHA HASTA EL KM 12 VIA 10 DE  
 AGOSTO - EL TRIUNFO



### PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS

CIA. AMAZONAS BUILDING S.A. ECUADOR. PUNO - PASTAZA.  
 DIRECCION: Vía Tarqui, Parroquia Madre Tierra, Sector San José  
 TEL: 032795 872 CELULAR: 0984508890

**ANEXO 16. Buzón de sugerencias**





**MAZONAS BUILDING S.A.**  
PUYO - PASTAZA - ECUADOR

**PLAN DE CONTINGENCIA**

**ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE  
ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO  
12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN  
PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**

PREPARADO PARA:

**GADP DE PASTAZA**



ELABORADO POR:

**ING. LESLIE CASTILLO POZO**

2022



Contenido

1. GENERALIDADES .....	3
2. OBJETIVOS .....	3
2. ENTIDADES DE APOYO ANTE UNA CONTINGENCIA .....	3
2.1. Cuerpo de bomberos .....	4
Tabla 1. Cuerpo de bomberos .....	4
2.2. Salud .....	4
TABLA 2. CENTROS DE SALUD .....	4
2.3. Policía .....	4
Tabla 3. Unidad de policía comunitaria .....	4
2.4. CRUZ ROJA .....	4
Tabla 4. Cruz roja ecuatoriana .....	4
3. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS .....	4
3.1. Recursos humanos .....	5
3.2. Recursos físicos y logísticos .....	5
3.3. Recursos físicos y logísticos .....	5
3.4. Recursos económicos .....	5
4. CAPACITACION .....	5
4.1. Divulgación .....	5
4.2. Capacitación .....	6
4.3. Entrenamiento .....	6
FIGURA 1. Organigrama para la atención de emergencia .....	6
5. PLANES DE RESPUESTA A CONTINGENCIAS .....	7
FIGURA 1. Organigrama para la atención de emergencia .....	7
6. Firma de responsabilidad .....	10



### PLAN DE CONTINGENCIA

**ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**

#### 1. GENERALIDADES

El Plan de Contingencias se presenta para hacer frente oportunamente a las contingencias ambientales, estas están referidas a la ocurrencia de efectos adversos sobre el ambiente debido a situaciones de origen natural o producto de actividades humanas, situaciones no previsibles que están en directa correlación con el potencial de riesgo y vulnerabilidad del área y del proceso productivo.

Las **actividades**, no ofrecen mayores riesgos de contingencia para el medio ambiente, sin embargo, puede considerarse como contingencias, los riesgos por derrame de hidrocarburos, incendios y sismos.

Es política del proyecto: "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", que trabajadores, así como todo usuario deberá tener en cuenta la seguridad física y de salud, en caso de emergencia dentro de las actividades relacionadas con materiales áridos y pétreos y en apoyo a las poblaciones cercanas.

#### 2. OBJETIVOS

- Establecer las medidas de prevención, atención y control requeridas para atender eventos o siniestros, con fin de manejar eventualidades naturales y accidentes laborales que pudieran ocurrir en el área de influencia del proyecto.
- Asignar funciones y responsabilidades dentro del personal vinculado al área, que permitan generar acciones operativas prácticas, eficaces, ágiles frente a la probable ocurrencia de un evento o siniestro.

Proporcionar la información necesaria al personal que labora en el **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**, para que puedan responder de forma inmediata y correcta a las situaciones de emergencia.

#### 3. ENTIDADES DE APOYO ANTE UNA CONTINGENCIA

Ante la posible ocurrencia de contingencia que por su magnitud e implicaciones no pueden ser atendidas totalmente por el **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**, es necesario el apoyo y participación de entidades públicas con objetivos e infraestructura diseñados para la atención de emergencias. En consecuencia, se relacionan las entidades de apoyo para la atención de contingencias en el área de influencia del **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**.



a. Cuerpo de bomberos

En la parroquia Madre Tierra donde se encuentran ubicada y operando del ASFALTADO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, al estar ubicada entre dos cantones, se puede contar con dos estaciones de bomberos los cuales prestan apoyo en una situación de emergencia.

Tabla 1. Cuerpo de bomberos

ESTACION	DIRECCION	TELÉFONO
Estacion de bomberos Mavi	La Moravia	032756123
Cuerpo de bomberos Puyo	Av. Alberto Zambrano, Km. Nueva Moravia	032980372

b. Salud

El sistema de salud de Ecuador está compuesto por dos sectores, público y privado. El sector público comprende al Ministerio de Salud Pública (MSP), y el sistema de seguridad social Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Tabla 2. Centros de salud

ESTACION	DIRECCION	TELÉFONO
Subcentro de salud	Cabecera parroquial	012884567
IESS	Calle Carlos María y Chacabuco	032840610

c. Policía

Las **Unidades de Policía Comunitaria (UPC)** juegan un papel fundamental en el nuevo modelo de gestión de la Policía Nacional, donde el acercamiento a la ciudadanía es la base para los programas de prevención de delitos, así como el centro de integración de los barrios y comunidades en torno a la seguridad.

Tabla 3. Unidad de policía comunitaria

ESTACION	DIRECCION	TELÉFONO
UPC	Cabecera parroquial, Av. Principal	01-032-213

d. SERVICIOS

La Cruz Roja, nacida del deseo de prestar auxilio sin discriminación, a todos los heridos en el campo de batalla, se fundamenta en su capacidad internacional y nacional de prevenir y aliviar el sufrimiento humano dondequiera que se encuentre. Su propósito es proteger la vida y la salud y hacer respetar a la vida humana. Promueve la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre los pueblos.

Tabla 4. Cruz roja ecuatoriana

ESTACION	DIRECCION	TELÉFONO
CRUZ ROJA	Calle 9 de octubre, esquina 1861 parcela 22 de mayo	01-288-5180

## 4. RECURSOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS





## AMAZONAS BUILDING S.A.

Puyo - Pastaza - Ecuador

Los recursos humanos, logísticos, físicos y económicos necesarios para atender las contingencias se enuncian a continuación:

### ii. Recursos humanos:

Los recursos humanos están representados por el personal capacitado y entrenado que conforma los comités y grupos mencionados anteriormente; adicionalmente se encuentra el personal perteneciente a las entidades de apoyo.

### iii. Recursos físicos y logísticos:

Dentro de estos recursos encontramos todos los elementos, equipos y maquinaria necesarios para afrontar una contingencia.

### iv. Recursos físicos y logísticos:

Dentro de estos recursos encontramos todos los elementos, equipos y maquinaria necesarios para afrontar una contingencia.

- Unidades móviles
- Celulares
- Equipos contra incendios
- Equipo de primeros auxilios
- Equipos para control de movimientos de remoción en masa

### v. Recursos económicos:

Se deberá disponer de un rubro económico que de visibilidad el Plan Contingencia y que cubra en gran medida los gastos correspondientes a la atención de emergencias.

## 5. CAPACITACION

Con el fin de asegurar un óptimo desarrollo del Plan de Contingencias se implementarán planes de capacitación, divulgación y entrenamiento para todo el personal que labore en la obra. Las actividades de capacitación, divulgación y entrenamiento irán dirigidas al personal directivo, profesional, técnico y obrero del ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

### ii. Divulgación:

El objetivo de la divulgación del Plan de Contingencias es de informar y dar herramientas al personal que labora en el ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA para realizar las acciones que deben seguir en el momento de afrontar una emergencia; adicionalmente se pretende comunicar las responsabilidades y la forma organizacional del Plan de Contingencias.

Para conseguir este objetivo se realizarán las siguientes actividades:

- **Charlas y conferencias:** se realizarán charlas y conferencias donde se traten los siguientes temas: definición, objetivos, estructura y alcance del plan de contingencias, causa magnitud y consecuencia de los riesgos, identificación de áreas más vulnerables (zonas de riesgo), seguridad industrial y salud ocupacional, medidas preventivas, primeros auxilios, comportamiento de las personas durante la emergencia, técnicas de orientación y movilización, manejo de información y medios de comunicación y equipos utilizados para la emergencia e instrucciones de manejo.
- **Folleto y cartillas:** se elaborarán folletos y cartillas didácticas, de forma sencilla donde se explique el manejo de equipos, información y medios de comunicación durante una



emergencia, pasos a seguir durante una emergencia y sitios seguros. Este material se entregará a todo el personal.

**b. Capacitación:**

Se iniciará un periodo de capacitación, en el cual participarán entidades especializadas en atención de emergencia y desastres como la Cruz Roja, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, entre otras.


**c. Entrenamiento:**

Con el propósito de que el personal que labora en el ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY- FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, tenga un mejor desenvolvimiento ante una situación de emergencia, se programarán cursos, talleres y simulacros, consiguiendo una mejor preparación de dicho personal.

Los talleres y cursos están enfatizados en temas como: manejo de contingencias, uso de equipos, sistema de evacuación, atención de heridas, sistema de comunicación de emergencias y prestación de primeros auxilios.

Los simulacros se planificarán con anterioridad a su ejecución, estos serán evaluados con el fin de corregir las fallencias presentadas al atender una emergencia.

FIGURA 1. Organigrama para la atención de emergencia.

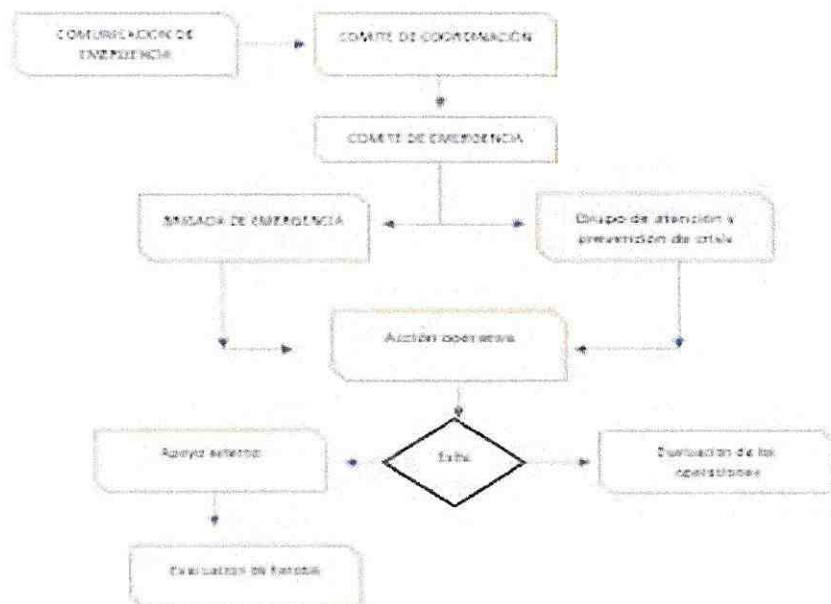



## 6. PLANES DE RESPUESTA A CONTINGENCIAS

En el presente numeral se describen los planes de atención de emergencias, que contienen los procedimientos y acciones particulares para atender a cada uno de los riesgos en el momento de su desarrollo.

### • Procedimiento

- Ubicar el lugar del accidente.
- Movilizar los recursos necesarios para atender los heridos.
- Identificar el personal herido.
- Retirar al personal herido a un lugar seguro para brindarle los primeros auxilios.
- Evaluar la condición del accidentado y su traslado a un centro de salud.
- Trasladar el (los) herido(s) al centro de salud más cercano a la obra.
- Evaluar las causas del accidente y describir las lesiones.

### CONTINGENCIA: ACCIDENTE DE TRABAJOS

#### AREA CRITICA

- Frentes de trabajo
- Campamentos.


#### MEDIDAS PREVENTIVAS

- Se debe cumplir cuidadosamente las normas de seguridad industrial.
- Usar elementos de protección personal.
- Realizar adecuadamente el trabajo designado a cada personal.
- Implementar medidas de seguridad en el ASFALTADO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.
- Colocación de advertencia y barreras en los sitios de mayor probabilidad de ocurrencia de accidentes.
- Utilizar rutas de viaje y medios seguros de acceso.
- Señalización clara que comunique al personal y a la comunidad al tipo de riesgo al que se exponen.

#### PROCEDIMIENTO EN CASO DE LA CONTINGENCIA

- Comunicar inmediatamente la contingencia al Comité Coordinador del plan, quien a su vez informará al Comité de Emergencias.
- El comité de emergencia atenderá de inmediato el evento, desplazando recursos como personal capacitado, vehículos para transportar heridos al lugar del accidente.
- Luego, según sea la gravedad del evento, se pedirá apoyo a las entidades externas, como hospitales, bomberos y otros del municipio de Soacha.
- Simultáneamente se evacuará todo el personal del lugar del accidente.
- Una vez controlada la emergencia se hará una evaluación de los hechos que originaron el accidente y la magnitud de su gravedad.

FIGURA 1. Organigrama para la atención de emergencia.

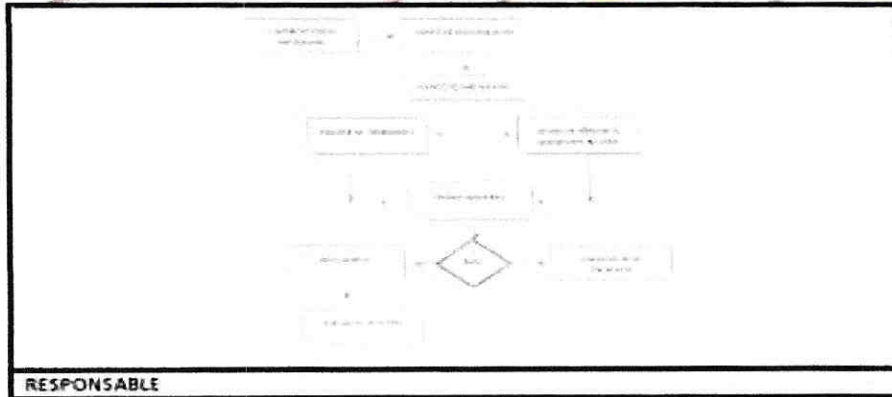

## CONTINGENCIA: ACCIDENTE DE TRABAJOS

### ÁREA CRÍTICA

- Manipulación de hidrocarburos, aceites, combustibles, grasas, aceites usados.

### MEDIDAS PREVENTIVAS

- El tanque donde se almacena los hidrocarburos, aceites, combustibles, grasas, aceites usados, deberá ser de materiales apropiados y no presentar escapes.
- Se colocará una señal cerca del depósito donde se indique que es prohibido fumar.
- El depósito deberá contar con el siguiente equipo: extintores portátiles.
- Durante el recibo y suministro de hidrocarburos, aceites, combustibles, grasas, aceites usados, se pueden presentar accidentes que ocasionen derrames, por lo que los encargados de esta labor deben ser personas capacitadas en el manejo de hidrocarburos.
- El aprovisionamiento de combustible a la maquinaria o equipo pesado se realizará en el mismo frente de trabajo, tomando todas las medidas preventivas del caso.

### PROCEDIMIENTO EN CASO DE LA CONTINGENCIA

- El comité de emergencias evaluará el evento determinando su magnitud.
- Se realizará un control inmediato de la fuente, en caso de presentarse el derrame durante el recibo o suministro, o por falla del tanque de almacenamiento.
- Se deberá aislar la zona del derrame y evitar que se acerque personal, pues se debe evitar la posibilidad de ocurrencia de un incendio.
- De manera inmediata se procederá a remover en su totalidad el hidrocarburo derramado.
- En caso de presentarse el derrame de hidrocarburos, aceites, combustibles, grasas, aceites usados, por el volcamiento de un vehículo, se dará aviso al comité coordinador, quien dependiendo de la magnitud del daño instruirá al comité de emergencias para activar el plan de acción que consiste en la intercepción del derrame mediante zanjas construidas en el camino de migración del combustible.
- Controlado el evento se realizará una evaluación de los efectos sobre el suelo, para posteriormente restaurar el área afectada.

RESPONSABLE: Departamento ambiental, seguridad y salud ocupacional.



### AREA CRITICA

Area de influencia del ASFALTADO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

### PROCEDIMIENTO EN CASO DE LA CONTINGENCIA

- El personal debe mantener la calma y controlar el pánico.
- Detener todas las actividades que estén siendo realizadas en ese momento.
- El personal deberá evacuar las áreas de trabajo inmediatamente y desplazarse a espacios abiertos para evitar ser atrapados.
- Se verificará si falta personal.
- Verificará el estado de las comunicaciones, de la infraestructura y del personal.
- Se convocará la Brigada de Emergencias para que rescate y de primeros auxilios a los heridos, la brigada activará el procedimiento ante emergencia descrito en el numeral.
- Una vez evacuados los heridos se evaluarán los daños producidos por el sismo.
- Seguidamente se procederá a adecuar la zona afectada eliminando riesgo de derrumbes, escombros, etc.
- Recuperar la estabilidad del lugar.

**RESPONSABLE:** Departamento ambiental, seguridad y salud ocupacional.

### CONTINGENCIA: INUNDACIONES

### AREA CRITICA

Area de influencia del ASFALTADO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

### PROCEDIMIENTO EN CASO DE LA CONTINGENCIA

- Si mientras se conduce se produjera en el trayecto una inundación, el conductor deberá disminuir la velocidad y ubicar, en las cercanías y a la brevedad posible, un lugar donde pueda estacionar la unidad de transporte en sitio apartado de zona de ocurrencia.
- Permanecer dentro de la cabina atento a la intensidad de la inundación y a la dirección de su desplazamiento las cuales podrían comprometer a la unidad de transporte.
  - Mantener la calma, evaluar la situación y de ser factible reubicar la posición de la unidad de transporte a otra más segura. Si la situación es crítica y se torna peligrosa para su integridad personal, descender del vehículo y buscar ponerse a salvo en otra zona.
  - De ser el caso, comunicar el evento a las autoridades locales.

**RESPONSABLE:** Departamento ambiental, seguridad y salud ocupacional.

### 7. Firma de responsabilidad

ELABORADO POR:

Ing. Leslie Castillo  
TÉCNICO AMBIENTAL DE LA COMPAÑÍA  
AMAZONAS BUILDING.



LESLIE  
VERÓNICA  
CASTILLO SOTO

APROBADO POR:

Sr. Odilo Guevara  
GERENTE DE LA COMPAÑÍA AMAZONAS  
BUILDING.



ODILO VINICIO  
GUEVARA MARÍN



Puyo, 28 de marzo del 2023

**Asunto:** Entrega informe ambiental. Periodo 01 de marzo al 31 de marzo del 2023

Sres.

KEYSZEN.S.A.S.

**FISCALIZACION EXTERNA DEL CONTRATO "PROYECTO DE ASFALTO DE LA VÍA CURARAY – FCO. DE ORELLANA – 10 DE AGOSTO, JATUMPACCHA HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO "CODIGO: LICO-GADPPz-006-2022**

**Presente. –**

**De mi consideración:**

Reciba un cordial y atento saludo.

La presente es para realizar la entrega del informe en tres ejemplares del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del "PROYECTO DE ASFALTO DE LA VÍA CURARAY – FCO. DE ORELLANA – 10 DE AGOSTO, JATUMPACCHA HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO " CODIGO: LICO-GADPPz-006-2022, del periodo 01 de marzo al 31 de marzo del 2023 para su respectiva CONFORMIDAD AMBIENTAL y sus fines pertinentes.

Dando fe y cumplimiento a lo actuado, me suscribo con altos sentimientos de consideración y estima.

Atentamente;



EDGAR RAÚL GASPATA  
CALO

Ing. Edgar Raúl Gaspata Calo

**TECNICO AMBIENTAL AMAZONAS BUILDING S.A.**

Adj: *Tres ejemplares con sus respectivos justificativos.*



**AMAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

## **INFORME AMBIENTAL MENSUAL**

**MARZO 2023**

**PROYECTO DE ASFALTO DE LA VÍA CURARAY - FCO. DE  
ORELLANA - 10 DE AGOSTO. JATUMPACCHA HASTA EL  
KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO**



**CIA. AMAZONAS BUILDING S.A ECUADOR.**

**PUYO - PASTAZA - ECUADOR**



## Contenido

1.- DATOS GENERALES.....	4
2. ANTECEDENTES.....	5
3. BASE LEGAL.....	5
4. OBJETIVOS.....	7
4.1. OBJETIVO GENERAL.....	7
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	8
5. IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES.....	8
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.....	8
7. ESCALA DE VALORES PARA CALIFICACIÓN DE IMPACTOS.....	10
8. ALCANCE DEL PMA.....	10
9. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ...	11
Programa de fortalecimiento de la organización social.....	11
Programa de Participación Social y Relaciones Comunitarias.....	12
Programa de capacitación de las organizaciones sociales.....	13
Plan de utilización de mano de obra local.....	14
Programa de saneamiento básico y salud rural.....	14
Plan de manejo de residuos sólidos.....	15
Programa de reforestación y diversificación agrícola.....	16
Programa de control de la erosión y de mantenimiento de drenajes naturales.....	17
Programa de Manejo de materiales no aprovechables.....	18
Programa de señalización.....	19
Programa de seguimiento y monitoreo.....	20
10. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES.....	21
10.1.GESTIÓN DE RESIDUOS.....	21
10.2 CONSUMO DE AGUA.....	23
10.3. EMISIONES ATMOSFÉRICAS.....	24
10.4. RUIDO.....	24
10.5. CONSUMO DE ENERGÍA.....	25
10.6. MAQUINARIA.....	25
10.7. PRODUCTOS QUÍMICOS.....	26



10.8.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.....	27
11.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	28
12.- FIRMA DE RESPONSABILIDAD.....	28





## INFORME MENSUAL

MARZO DEL 2023

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL "PROYECTO DE ASFALTO DE LA VÍA  
CURARAY – FCO. DE ORELLANA – 10 DE AGOSTO, JATUM PACCHA HASTA EL  
KM 12 VIA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO "

CODIGO: LICO-GADPPz-006-2022

### 1.- DATOS GENERALES.

<b>Actividad Económica.</b>	Construcción de asfaltos en caminos vecinales	
<b>Zona</b>	Rural	
<b>Ubicación Cartográfica (18 M)</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>
	169467	9837116
	169975	9837403
	170901	9838807
	173028	9840607
	173979	9841143
	175562	9841028
	176810	9841069
	178330	9841233
	178384	9841892
178743	9842171	
<b>Ubicación político - administrativa</b>	<b>PROVINCIA:</b> PASTAZA <b>CANTÓN:</b> PASTAZA <b>PARROQUIA:</b> 10 DE AGOSTO	
<b>Razón Social del contratista:</b>	Amazonas Building S.A.	
<b>RUC</b>	1691721260001	
<b>Datos de la Compañía</b>	Teléfono: 099 981 3185 Correo electrónico: <a href="mailto:jimmarinm@hotmail.com">jimmarinm@hotmail.com</a>	
<b>Dirección de la compañía</b>	Barrio El Dorado, Vía Puyo - Tarqui	
<b>Representante Legal</b>	Sr. Odilo Vinicio Guevara Marín ✓	
<b>Tiempo estimado de ejecución del contrato</b>	540 días ✓	
<b>Inicio de Actividades</b>	25 de enero del 2023	
<b>Periodo del informe</b>	Del 01 de marzo al 31 de marzo del 2023. ✓	
<b>Fiscalizadora Externa</b>	KEYSZEN.S.A.S	
<b>Descripción del proyecto:</b>	El presente proyecto corresponde al cambio de la capa de rodadura de lastre a Asfalto de de la vía Curaray – Fco. de Orellana – 10 de agosto, Jatum Paccha hasta el km 12 vía 10 de agosto – El Triunfo con una longitud de 14.59 Km. y un ancho de vía de 8 metros incluyendo cunetas. ✓	



## 2. ANTECEDENTES.

El presente informe pretende cumplir con lo establecido en el contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza y la Compañía Amazonas Building S.A. por un monto de USD \$4,650,521.23 (Cuatro millones seis cientos cincuenta mil quinientos veinte y uno dólares con 23/100) para el Asfalto de la vía Curaray – Fco. de Orellana – 10 de agosto, Jatun Paccha hasta el km 12 vía 10 de agosto – El Triunfo en la provincia de Pastaza, cantón Pastaza, Parroquia 10 de agosto.

En este sentido, en el presente informe se indicarán las actividades encaminadas a prevenir, controlar o mitigar los impactos ambientales de la fase de construcción, operación y mantenimiento del proyecto de acuerdo al plan de manejo ambiental aprobado por ministerio del Ambiente para su ejecución.

El informe ambiental toma como base para su elaboración los siguientes documentos:

1. Proyecto constructivo.
2. Ficha Ambiental aprobada por el Ministerio del ambiente del proyecto.

## 3. BASE LEGAL

El análisis legal efectuado describe los principales contenidos relacionados con la obligatoriedad de cumplir las leyes y reglamentos vigentes para el cumplimiento de los parámetros ambientales exigibles en la legislación ecuatoriana.

El Ministerio del Ambiente es el ente que dirige la gestión ambiental, a través de políticas normas e instrumentos de control, para lograr el uso sustentable y la conservación del capital natural del Ecuador, asegurar el derecho de sus habitantes a vivir en un ambiente sano y apoyar la competitividad del país.

El Estudio de Impacto Ambiental, considera el marco regulatorio ambiental ecuatoriano que se encuentra estipulado en varias leyes y reglamentos así:

Según la **Constitución Nacional** actual, Título VII del Régimen del Buen Vivir; Capítulo Segundo: Biodiversidad y Recursos Naturales; Sección Primera: Naturaleza y Ambiente; Párrafos 1 y 3 del Artículo 395, se manifiesta que:

“El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras”.

“El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales”.

En el Párrafo 2 del artículo 396 se expone que se deben “Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales”.



En la Sección Cuarta (Recursos Naturales) del capítulo en mención, en el Artículo 408 se manifiesta que “son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo....”.

- La **Ley de Gestión Ambiental**, publicada en el R.O. N° 245 del 30 de julio de 1999, que establece la necesidad de que las actividades que supongan riesgo ambiental cuenten con la licencia respectiva, previa la aprobación de estudios ambientales por parte de las instituciones respectivas del Estado.

**Artículo 6.** - Señala: El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en función de los intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico y de evaluación de impactos ambientales.

En el Capítulo IV, DE LA PARTICIPACION DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, Art. 13. - Los Consejos Provinciales y los Municipios, dictarán políticas ambientales, seccionales con Sujeción a la Constitución Política de la República y a la presente Ley. Respetarán las regulaciones Nacionales sobre el Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas, para determinar los usos del suelo y consultarán a los representantes de los Pueblos Indígenas y Afro Ecuatorianos y Poblaciones locales para la delimitación, manejo y administración de áreas de conservación y reserva ecológica.

- La **Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre**, establece la obligación de conservar las áreas naturales. Publicada en el Registro Oficial No 64, del 24 de agosto de 1981, y codificada por el H. Congreso Nacional (Comisión de Legislación y Codificación) en el R.O. No 418 del 10 de septiembre del 2004.

En el marco de la ley en mención, Título V: Disposiciones Generales, Artículo 101, menciona: “En los proyectos de desarrollo rural o industriales, construcción de carreteras, obras de riego, hidroeléctricas u otras, que pudieren originar deterioro de los recursos naturales renovables, el Ministerio del Ambiente y demás instituciones del sector público afectadas, determinarán las medidas y valores que los ejecutores de tales proyectos u obras deban efectuar o asignar para evitar dicho deterioro o para la reposición de tales recursos”.

Asimismo, en el Artículo 105, Título V: Disposiciones Generales, se insta que “Los propietarios de predios rurales colindantes, con carreteras, caminos vecinales, o cursos naturales de agua o que se hallen cruzados por éstos, están obligados a plantar árboles en los costados de estas vías y de tales cursos, según las normas legales y las que establezca el Ministerio del Ambiente en coordinación con el de Obras Públicas”.

- El **Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS)**, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3399 del 28 de noviembre de 2002, publicado en el Registro Oficial No. 725 del 16 de diciembre de 2002 y ratificado mediante Decreto Ejecutivo No. 3516, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 2 del 31 de marzo de 2003, contiene como mecanismos de aplicación las siguientes disposiciones legales:

- Políticas Básicas Ambientales (Título Preliminar).
- Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (Capítulo III, Título IV, Libro VI De la Calidad Ambiental).



Bajo lo expuesto, a continuación, se referencian las normas técnicas ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación; así:

- Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua, (Anexo 1, Libro VI, de la Calidad Ambiental).
- Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados, (Anexo 2, Libro VI, de la Calidad Ambiental).
- Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión, (Anexo 3, Libro VI, de la Calidad Ambiental).
- Norma de Calidad del Aire Ambiente, (Anexo 4, Libro VI, de la Calidad Ambiental).
- Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles, y para Vibraciones, (Anexo 5, Libro VI, de la Calidad Ambiental).
- Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos No Peligrosos, (Anexo 6, Libro VI, de la Calidad Ambiental).
- Listados Nacionales de Productos Químicos Prohibidos, Peligrosos y de Uso Severamente Restringido que se utilicen en el Ecuador, (Anexo 7, Libro VI, de la Calidad Ambiental).

- **Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo** (R.O. No. 565 del 17 de noviembre de 1986). Las disposiciones de este Reglamento son aplicables a las actividades de construcción en sus diferentes fases. Deberán observarse fundamentalmente procedimientos de seguridad y capacitación; y, se aprovecharán experiencias prácticas y técnicas actualizadas que coadyuven al mejoramiento en la producción; a la protección de los trabajos y a la conservación de la maquinaria empleada en los mismos y sus instalaciones, evitando, además, riesgos de accidentes y enfermedades profesionales.

- **Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas** en el Ecuador. Este Reglamento fue expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 1215 y publicado en el Registro Oficial No. 265 del 13 de febrero de 2001. El Artículo 1, señala el objeto de “regular las actividades hidrocarburíferas de exploración, desarrollo y producción, almacenamiento, transporte, industrialización y comercialización de petróleo crudo, derivados del petróleo, gas natural y afines, susceptibles de producir impactos ambientales en el área de influencia directa, definida en cada caso por el Estudio Ambiental respectivo”.

- El constructor del proyecto deberá regirse a las especificaciones técnicas estipuladas por el **Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador (MTOPE)**, referentes a la construcción de caminos y puentes, en especial a lo indicado en las siguientes secciones:

- Secciones 104, Marco de Actuación Ambiental.
- Capítulo 200, Medidas Generales de Control Ambiental.

## 4. OBJETIVOS

### 4.1. OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer las actividades ejecutadas en el cumplimiento en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y la aplicación de la seguridad y salud ocupacional del proyecto PROYECTO DE



ASFALTO DE LA VÍA CURARAY – FCO. DE ORELLANA – 10 DE AGOSTO, JATUMPACCHA HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO correspondiente al periodo del 26 de enero al 225 de febrero del 2023

## 4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Cumplir con lo establecido en el contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza y la compañía Amazonas Building S.A. en el que señala las obligaciones y responsabilidades por impactos ambientales generados el proyecto Asfalto de la Vía Curaray – Fco. De Orellana – 10 de Agosto, Jatum Paccha hasta el Km 12 Vía 10 de Agosto – El Triunfo
- Determinar las actividades ambientales cumplidas y no cumplidas para realizar medidas correctivas en el siguiente periodo de ejecución del proyecto.

## 5. IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

1. Reconfiguración de la subrasante y excavación para cunetas de drenaje en la vía existente (camino vecinal).
2. Colocación de una capa de material pétreo para estabilización de la subrasante, de un espesor de 60cm., perfectamente compactada y con sus alineaciones correspondientes.
3. Colocación de una capa de subbase clase 3 de espesor igual a 15 cm perfectamente compactada.
4. Colocación de una capa de base clase 4 de espesor igual a 10cm perfectamente compactada.
5. Colocación de una capa de rodadura de hormigón asfáltico de 2” de espesor.
6. Construcción de cunetas laterales de hormigón para drenaje.
7. Construcción de alcantarilladas de hormigón y metálicas para drenaje de aguas pluviales.

## 6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los atributos definidos son los siguientes:

- Carácter
- Extensión geográfica.
- Duración.
- Magnitud
- Probabilidad de ocurrencia
- Frecuencia
- Reversibilidad

La clasificación de estos atributos se presenta en la Tabla N° 1 siguiente:






TABLA N° 1

ATRIBUTO	CALIFICACIÓN	DEFINICIÓN
Carácter	Positivo	Beneficio neto para el usuario.
	Neutro	Ningún beneficio ni perjuicio neto para el recurso.
	Negativo	Perjuicio neto para el recurso.
Extensión geográfica	Directa	Confinada el área perturbada por el proyecto.
	Local	Sobrepasa las áreas directamente perturbadas, pero está dentro de los límites del área de estudio de evaluación que se especificaron para disciplina o indicador.
	Regional	Se extiende más allá de los límites locales o administrativos especificados para cada disciplina o indicador. Se considera como impacto indirecto.
Duración	A corto plazo	Menos de 1 año.
	A mediano plazo	Entre 1 y 5 años.
	A largo plazo	Más de 5 años.
	Ninguna	No se prevé ningún cambio.
Magnitud	Baja	Se pronostica que la perturbación será ligeramente mayor que las condiciones típicas existentes.
	Mediana	Se pronostica que los efectos están considerablemente por encima de las condiciones típicas existentes, pero sin exceder los criterios establecidos en los límites permisibles o sin causar cambios en los parámetros económicos, sociales, biológicos bajo los rangos de variabilidad natural.
	Alta	Los efectos predecibles exceden los límites permitidos asociados con efectos aduaneros potenciales o causan un cambio detectable en parámetros sociales, económicos y biológicos; más allá de la variabilidad natural o tolerancia social.
Frecuencia	Permanente	Ocurrirá continuamente.
	Temporal	Confinada a un período específico.
	Periódica/ocasional	Ocurre intermitente pero repetidamente a intervalos iguales de tiempo.
Probabilidad de ocurrencia	Baja	Poco probable
	Media	Posible o probable.
	Alta	Cierta.
Reversibilidad	Corto plazo	Puede ser revertido en un año o menos.
	Mediano plazo	Puede ser revertido en más de un año, pero menos de 10.
	Irreversible	Efectos permanentes.



## 7. ESCALA DE VALORES PARA CALIFICACIÓN DE IMPACTOS

<b>CARÁCTER ©</b>	
Negativo	-1
Positivo	1
Neutro	0
<b>MAGNITUD (M)</b>	
Alta	3
Media	2
Baja	1
<b>PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (Po)</b>	
Alta	1
Media	0.9 – 0.5
Baja	0.4 – 0.1
<b>DURACIÓN (Du)</b>	
Largo plazo	3
Mediano plazo	2
Corto plazo	1
<b>FRECUENCIA (F)</b>	
Permanente	3
Periódico	2
Temporal	1
<b>REVERSIBILIDAD (R)</b>	
Irreversible	3
Reversible a mediano plazo	2
Reversible a corto plazo	1
<b>EXTENSIÓN GEOGRÁFICA (E)</b>	
Regional	3
Local	2
Directa	1

## 8. ALCANCE DEL PMA.

El proyecto de Mejoramiento del Proyecto de Asfalto de la Vía Curaray – Fco. de Orellana – 10 de agosto, Jatumpaccha hasta el km 12 Vía 10 de agosto – El Triunfo, cantón y provincia de Pastaza, región amazónica ecuatoriana, en cumplimiento con la normativa ambiental vigente en el país, requirió de la elaboración del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental (EIA), previa la ejecución de las obras y actividades previstas en el mismo.

El camino vecinal que uniría a las poblaciones de Puyo, Fco. de Orellana, Jatumpaccha y 10 de agosto, tiene una longitud aproximada de 15600 metros (15.6 Km).



**9. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**

Programa de fortalecimiento de la organización social		DETALLE DE APLICACIÓN		CUMPLIMIENTO MENSUAL		JUSTIFICACION / ANEXOS DE VERIFICACION
IMPACTO	EFECTO ESPERADO	APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	
MEDIDA PROPUESTA	ETAPA DEL PROYECTO	RESPONSABLE DE LA EJECUCION	FRECUENCIA	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	
Fortalecimiento de las Organizaciones Locales mediante la creación de comités de vigilancia, como un mecanismo para lograr se verifique el cumplimiento de los planes y programas planteados en el proyecto.	Rehabilitación y mantenimiento	El Gobierno Provincial de Pastaza, los Gobiernos Parroquiales durante la operación, mantenimiento y cumplimiento de los planes y programas propuestos para el mejoramiento de los caminos vecinales.	Los procesos de integración y reuniones se plantean realizar en 4 reuniones del comité de vigilancia.	Número de reuniones del comité de vigilancia, número de informes de seguimiento.	Registro de reuniones del comité de vigilancia, informes de monitoreo y seguimiento de las acciones implementadas durante la ejecución del proyecto, registro fotográfico de las reuniones y las verificaciones in situ de las acciones implementadas.	
Participación comunitaria en el seguimiento al programa de operación y mantenimiento Proyecto de Asfalto de la Vía Curaray – Fco. de Orellana – 10 de Agosto, Jatun Paccha hasta el km 12 Vía 10 de Agosto – El Triunfo.						
Integración de la comunidad como parte del proceso de seguimiento del desarrollo del proyecto y operación del mismo.						
						De acuerdo al cronograma de trabajo y lo establecido en el PMA, se realizarán reuniones y socializaciones en el siguiente periodo a fin de conformar el comité de vigilancia y se realicen 4 veedurías trimestrales durante el tiempo de ejecución del proyecto

Programa de Participación Social y Relaciones Comunitarias														
IMPACTO	Conflicto Social por desconocimiento de la comunidad de las actividades que se realizan como parte del proyecto.													
	EFECTO ESPERADO	Participación activa de la comunidad en el conocimiento de las actividades a desarrollarse durante la ejecución del proyecto y empoderamiento del mismo como directos beneficiarios.												
MEDIDA PROPUESTA	ETAPA DEL PROYECTO	RESPONSABLE DE LA EJECUCION	FRECUENCIA	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	DETALLE DE APLICACION								
Convocatoria periódica a la comunidad a reuniones informativas sobre los avances en la ejecución del proyecto en su operación y mantenimiento.	Rehabilitación y mantenimiento	En orden de prelación serán responsables: 1. Constructora. 2. Fiscalización. 3. Juntas Parroquiales.	Se efectuarán 3 (tres) reuniones, con una frecuencia de tres meses entre cada una.	Es la magnitud utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o actividad. Es el resultado cuantitativo de comparar dos variables; en este contexto se compara el número de reuniones informativas, y el número de participantes por reunión.	Los medios de verificación se relacionan con los registros de asistencias de la comunidad, las memorias resultado de las reuniones, el registro fotográfico de las mismas.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CUMPLIMIENTO MENSUAL</th> <th rowspan="2">ANEXOS DE VERIFICACION</th> </tr> <tr> <th>CUMPLE</th> <th>NO CUMPLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>Las reuniones de informe de actividades y avance de obra se ejecutarán semestralmente a partir del mes de abril del presente año.</td> </tr> </tbody> </table>	CUMPLIMIENTO MENSUAL		ANEXOS DE VERIFICACION	CUMPLE	NO CUMPLE			Las reuniones de informe de actividades y avance de obra se ejecutarán semestralmente a partir del mes de abril del presente año.
CUMPLIMIENTO MENSUAL		ANEXOS DE VERIFICACION												
CUMPLE	NO CUMPLE													
		Las reuniones de informe de actividades y avance de obra se ejecutarán semestralmente a partir del mes de abril del presente año.												

Programa de capacitación de las organizaciones sociales														
IMPACTO	Falta de educación y conciencia socio-económica-ambiental de la población del Área de Influencia del proyecto.													
	Efecto Esperado		Medida Propuesta		RESPONSABLE DE LA EJECUCION		FRECUENCIA	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	DETALLE DE APLICACIÓN	CUMPLIMIENTO MENSUAL		ANEXOS DE VERIFICACION	
Implementar ciclos de Charlas, Cursos y Conferencias, dictadas por un especialista, en temas relativos a la realidad socio-económica de la región, como:	Rehabilitación y mantenimiento		Serán responsables en orden de prelación:		Se propone en un número de dos, repartidas en las comunidades.	En este contexto se compara el número de capacitaciones y el número de participantes por capacitación.	Registros de asistencia a las capacitaciones, memorias de las capacitaciones, registro fotográfico.		APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE		X

Plan de utilización de mano de obra local		Creación temporal de fuentes de empleo.				DETALLE DE APLICACIÓN		CUMPLIMIENTO MENSUAL		ANEXOS DE VERIFICACION	
IMPACTO	EFEECTO ESPERADO	ETAPA DEL PROYECTO	RESPONSABLE DE LA EJECUCION	FRECUENCIA	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	
Se considera la necesidad de mano de obra no calificada, la ocupación temporal de la fuerza laboral local de por lo menos el 50 % de la requerida.	Durante todo el proceso de rehabilitación y mejoramiento		Será responsable en orden de prelación: 1. Constructora. 2. Fiscalización.	La contratación es para todo el desarrollo del proyecto.	Número de contratos de mano de obra local	Registro de contratos, registro de personal, registro fotográfico de las labores que efectúa la mano de obra local contratada.		X			El proyecto se encuentra en la etapa de excavación y ensanchamiento de vía, se establece la contratación de mano de obra local no calificada para la construcción de cabezales y bordillos en la vía
Programa de saneamiento básico y salud rural		Evacuación de aguas lluvias y recolección de residuos sólidos.				DETALLE DE APLICACIÓN		CUMPLIMIENTO MENSUAL		ANEXOS DE VERIFICACION	
IMPACTO	EFEECTO ESPERADO	ETAPA DEL PROYECTO	RESPONSABLE DE LA EJECUCION	FRECUENCIA	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	
Coordinar con las instituciones públicas especializadas,	Durante todo el proceso de rehabilitación		Serán responsables en orden de prelación:	Se explicará durante las reuniones comunitarias y	Número de reuniones informativas, número de	Registro de reuniones de gestión, informes de gestión		X			El estudio cuenta con el presupuesto para la construcción de

la elaboración de proyectos de tratamiento y evacuación de aguas servidas, dispensarios médicos tipo o botiquín; así como la construcción y mantenimiento de cunetas laterales para escorrentía de agua lluvia	y mejoramiento	1. Organismos locales. 2. Instituciones públicas especializadas.	del comité de vigilancia los avances en las gestiones realizadas con los organismos estatales encargados de proporcionar el apoyo en materia de Saneamiento Básico a la Comunidad.	informes de avance de las gestiones realizadas	realizada y seguimiento de las mismas, registro fotográfico.		cunetas de hormigón cuya afluencia de agua desemboca en riachuelos cercanos y no se consideran nocivos debido a que son acumulaciones de agua lluvia.	
<b>Plan de manejo de residuos sólidos</b>								
<b>IMPACTO</b>	Residuos sólidos depositados en el ambiente, como basura, substancias contaminantes.							
<b>EFEECTO ESPERADO</b>	El sistema de contenedores tendrá por objeto la separación de los desechos sólidos por su naturaleza y recuperación; en materia inerte como vidrio y metales; materia fermentable u orgánica y material combustible como papel, cartón, madera, telas, cueros, cauchos y plásticos; debiendo el recipiente para materia fermentable tener un revestimiento asfáltico para su impermeabilización, cada uno irá pintado de café, verde y azul respectivamente.							
<b>MEDIDA PROPUESTA</b>	<b>ETAPA DEL PROYECTO</b>	<b>RESPONSABLE DE LA EJECUCION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>MEDIO DE VERIFICACION</b>	<b>DETALLE DE APLICACIÓN</b>	<b>CUMPLIMIENTO MENSUAL</b>	<b>ANEXOS DE VERIFICACION</b>
Esta medida se encuentra estrechamente relacionada con el Programa de Capacitación y Educación	Durante todo el proceso de rehabilitación y mejoramiento	Serán responsables en orden de prelación: 1. Constructora. 2. Gobierno Local.	Durante todo el desarrollo del proyecto	número de contenedores instalados	Registro de instalación de contenedores, actas de entrega-recepción de los contenedores, registro	APLICA APLICA NO APLICA	CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE	Instalación de contenedores de basura en el área de influencia del proyecto

Ambiental. Se propone implementar baterías de contenedores de desechos sólidos en escuelas, cuya definición es responsabilidad de cada comunidad.	3. Escuelas y Colegios. 4. Familia y Comunidad. 5. Empresa Privada.		fotográfico de las labores de recolección y reciclaje.			ANEXO 2.- Registro fotográfico de contenedores de basura				
<b>Programa de reforestación y diversificación agrícola</b>										
<b>IMPACTO</b>	Destrucción de la capa vegetal y generación de taludes que tienden a producir deslizamientos.									
<b>EFEECTO ESPERADO</b>	Recuperación del matorral nativo, permeabilidad del terreno, evitar la escorrentía superficial, recuperación y acopio de cobertura Vegetal, siembra de árboles y arbustos, estabilización de taludes.									
<b>MEDIDA PROPUESTA</b>	<b>RESPONSABLE DE LA EJECUCION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>MEDIO DE VERIFICACION</b>	<b>CUMPLIMIENTO MENSUAL</b>					
Implementar conjuntamente con las organizaciones sociales locales, así como de la empresa constructora, viveros forestales para la producción de plantas para	Serán responsables en orden de prelación: 1. Constructora. 2. Fiscalización 3. Escuelas, Colegios, Comunidad. 4. Gobiernos Locales.	Durante todo el desarrollo del proyecto.	Número de especies utilizadas en el proceso de reforestación.	Registro de siembra, registro de prendimiento de las especies vegetales, registro fotográfico del proceso de reforestación.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="932 331 1038 477">APLICA</td> <td data-bbox="1038 331 1345 477">NO APLICA</td> </tr> </table>	APLICA	NO APLICA	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="932 85 1038 331">CUMPLE</td> <td data-bbox="1038 85 1345 331">NO CUMPLE</td> </tr> </table>	CUMPLE	NO CUMPLE
APLICA	NO APLICA									
CUMPLE	NO CUMPLE									
				<b>X</b>	<b>ANEXOS DE VERIFICACION</b>  El proyecto aún se encuentra en la etapa de excavación y ampliación de la vía. Posteriormente se solicitará a fiscalización que se establezca las especies forestales para recuperación del bosque y					

la recuperación del bosque, para estabilización de taludes y laderas, zonas de bote de material no aprovechable o en rellenos, etc.	5. Empresa Privada.						estabilización de taludes
<b>Programa de control de la erosión y de mantenimiento de drenajes naturales</b>							
<b>IMPACTO</b>	Generación de procesos erosivos, sedimentación, etc.						
<b>EFECTO ESPERADO</b>	Encauzamiento adecuado de las aguas, a fin de disminuir la carga de arrastre sobre los taludes y laderas inferiores.						
<b>MEDIDA PROPUESTA</b>	<b>ETAPA DEL PROYECTO</b>	<b>RESPONSABLE DE LA EJECUCION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>MEDIO DE VERIFICACION</b>	<b>DETALLE DE APLICACION</b>	<b>CUMPLIMIENTO MENSUAL</b>
							<b>NO CUMPLE</b> <b>CUMPLE</b> <b>NO CUMPLE</b>
La construcción, reparación o ampliación de los encauzamientos, cunetas de pie, cunetas de borde, alcantarillas, pasos de agua, etc., estará definida y determinada por los requerimientos	Durante todo el proceso de rehabilitación y mejoramiento	Serán responsables en orden de prelación: 1. Constructora. 2. Comunidad y/o Micro empresa.	Durante todo el desarrollo del proyecto.	Diseño, ubicación y características técnicas de las cunetas.	Registro fotográfico in situ de la implementación de las cunetas.		<b>ANEXOS DE VERIFICACION</b>  En el presente periodo aún no se han construido cunetas de encauzamientos o cunetas laterales. El cambio de alcantarillas se realizó de acuerdo al cause existente de los riachuelos. <b>ANEXO 3.-</b> Registro fotográfico de cambios de alcantarillas

técnicos del proyecto vial.													
Programa de Manejo de materiales no aprovechables													
IMPACTO	Depósito de materiales no aprovechables gruesos, finos												
EFEECTO ESPERADO	Adecuado manejo de escombreras y facilidad para reutilización del material o disposición final en zonas de reconfomacion.												
MEDIDA PROPUESTA	ETAPA DEL PROYECTO	RESPONSABLE DE LA EJECUCION	FRECUENCIA	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	ANEXOS DE VERIFICACION			
Se dispondrá de áreas de bote o depósitos, de preferencia en depresiones del terreno u oquedades que no afecten a la topografía y al paisaje de la zona, que no vayan a alterar los patrones naturales de drenaje o a producir taponamientos a los cauces de las cuencas o micro cuencas hidrologicas Los materiales que serán	Durante todo el proceso de rehabilitación y mejoramiento	Será responsabilidad exclusiva de la empresa constructora el desalojo, acomodo y disposición final de los materiales no aprovechables o escombros.	Durante todo el desarrollo del proyecto.	Número de escombreras disponibles y utilizadas.	Registro de acumulación de material no aprovechable, registro fotográfico de la ubicación de las escombreras.		X			No se han realizado movimiento de tierras que requieran sitios de escombreras			

trasladados a las zonas de bote o de depósito serán acomodados y rasanteadas las superficies, se complementará con la medida de Reforestación.													
<b>Programa de señalización</b>													
<b>IMPACTO</b>	Mayores velocidades, riesgo de accidentes										<b>CUMPLIMIENTO MENSUAL</b>		
<b>EFEECTO ESPERADO</b>	Concientización de los usuarios de la vía, medida de seguridad e información a la comunidad y usuarios.										<b>APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>	<b>ANEXOS DE VERIFICACION</b>
<b>MEDIDA PROPUESTA</b>	<b>ETAPA DEL PROYECTO</b>	<b>RESPONSABLE DE LA EJECUCION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>MEDIO DE VERIFICACION</b>								
Incorporar al proyecto vial una serie de señales indicativas que permitan informar, normar y reglamentar el uso de la vía, para lo cual se aplicará el Manual de	Durante todo el proceso de rehabilitación y mejoramiento	Serán responsables en orden de prelación: a. Constructora. b. Fiscalización	Durante todo el desarrollo del proyecto.	Número de rótulos, ubicación y características técnicas de la señalización.	Registro fotográfico in situ de la implementación de la señalización.								
						<b>X</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>					
						La colocación e implementación de la señalética informativa, preventiva y reglamentaria se establece para la etapa final del proyecto tal como lo señala el cronograma de ejecución de obra							

Señalización Vial del MOP.											
Programa de seguimiento y monitoreo											
IMPACTO		Control de la ejecución del Plan de Manejo Ambiental									
EFECTO ESPERADO		Seguimiento continuo y cumplimiento de las acciones contempladas en el Plan respectivo.			DETALLE DE APLICACIÓN		CUMPLIMIENTO MENSUAL		ANEXOS DE VERIFICACION		
MEDIDA PROPUESTA		ETAPA DEL PROYECTO	RESPONSABLE DE LA EJECUCION	FRECUENCIA	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	
Control por parte del Técnico en Gestión Ambiental del Gobierno Provincial de Pastaza, el mismo que realizara visitas periódicas de verificación del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.		Durante todo el proceso de rehabilitación y mejoramiento	Serán responsables: a. Contratista b. personal técnico c. fiscalización d. comunidad	Durante todo el desarrollo del proyecto	Número de informes de Monitoreo y Seguimiento de las acciones implementadas.	Registro fotográfico in situ de la implementación de las paradas.			X		Se realizo la visita de seguimiento del Técnico Ambiental del GAD provincial de Pastaza con fecha 08 de marzo del 2013 en el que se realizaron varias observaciones que se subsanan en el presente informe.

**10. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES**  
**10.1. GESTIÓN DE RESIDUOS**

GESTIÓN DE RESIDUOS	APLICA (SI/NO)		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		MEDIOS DE VERIFICACION	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO / OBSERVACION
	SI	NO	CUMPLE	NO CUMPLE		
Poner los contenedores adecuados para la segregación de residuos al alcance de todos. Es necesario que estos contenedores estén señalizados y en un lugar acondicionado para el efecto.	X		X		Fotografías	En el primer periodo se construyó e instaló 1 punto ecológico compuestos por 3 basureros cada uno con su respectivo identificador para la clasificación de desechos orgánicos, papel y plásticos respectivamente. <b>ANEXO 2.-</b> Fotografías de contenedores de basura
Si las posibilidades lo permiten se deberá separar los residuos en su lugar de origen, esto es, en el momento en que se generen, depositándolos en los diferentes contenedores habilitados al efecto y separándolos correctamente, según tipos o características de los residuos producidos.	X		X		Fotografías	En el primer periodo se Colocaron adhesivos para identificar los tipos de residuos orgánicos, plásticos y de papel. <b>ANEXO 2.-</b> Fotografías de contenedores con sus respectivos identificativos.

Separando los residuos en el origen, se facilita su aprovechamiento y se evita o disminuye notablemente la contaminación por la eliminación de dichos residuos; así como el agotamiento de los recursos naturales.	X					
Priorizar la gestión diaria de los residuos, aplicando la estrategia de las "4R's": Reducción, Reutilización, Reciclaje, y Rechaza.	X					
El mantenimiento de equipos e instalaciones genera residuos peligrosos; entregar a un gestor autorizado que garantice su correcta eliminación evitando la contaminación ambiental.	X		SI		Registro de mantenimiento de maquinaria.	La revisión y mantenimiento de la maquinaria para el mes de marzo se realizó en los talleres de la compañía Amazonas Building, ubicados en la parroquia Madre Tierra el cual consta con todos los permisos y regularizaciones ambientales. <b>ANEXO 4.-</b> Registro de mantenimiento de maquinaria
Almacenar los residuos peligrosos en condiciones adecuadas (tubos fluorescentes agotados, botes de pintura, restos de grasa y lubricantes, pilas y baterías) en un espacio que brinde la seguridad de almacenamiento y la facilidad de transporte.	X		X		Fotografías	El campamento de Amazonas Building cuenta con espacios de almacenamiento de desechos peligrosos (Aceite quemado) <b>ANEXO 5.-</b> Fotografías de centro de acopio de desechos peligrosos

<p>Tanto los residuos peligrosos como los envases que los han contenido y no han sido reutilizados y los materiales (trapos, papeles, ropas) contaminados con estos productos deben ser entregados para ser gestionados por gestores autorizados.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>		<p>A la presente fecha aún no se han generado residuos de aceite quemado para realizar entregas a gestores ambientales.</p>
---	----------	----------	--	---

**10.2 CONSUMO DE AGUA**

CONSUMO DE AGUA	APLICA SI/NO)		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		MEDIOS DE VERIFICACION	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO / OBSERVACION
	SI	NO	CUMPLE	NO CUMPLE		
<p>No verter por el desagüe ningún producto o residuo peligroso que pueda alcanzar algún curso hídrico o que se infiltre en el suelo con la contaminación consecuente.</p>	<p>X</p>		<p>X</p>		<p>Fotografías</p> <p>Espacios libres de contaminación y desechos de combustibles en el suelo <b>ANEXO 6.-</b> Fotografía con Espacios libres de contaminación por combustibles.</p>	
<p>Instalar filtros adecuados para retener los restos orgánicos. Recoja derrames de productos químicos y aceites con ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos</p>	<p>X</p>				<p>Adquisición de un kit para derrames que constan de una salchicha y paños absorbentes. <b>ANEXO 7.-</b> Fotografía de kit antiderrames.</p>	
<p>Capacitar a los empleados a usar menos agua por instalación, ubicando carteles cerca de las áreas de uso, prohíba el uso de mangueras de agua como escobas, monitorear las instalaciones y mangueras de uso frecuentemente para controlar fugas.</p>	<p>X</p>					

### 10.3. EMISIONES ATMOSFÉRICAS

EMISIONES ATMOSFÉRICAS	APLICA SI/NO)		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		MEDIOS DE VERIFICACION	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO / OBSERVACION
	SI	NO	CUMPLE	NO CUMPLE		
Dar mantenimiento a las unidades de refrigeración calefacción, generadores, maquinaria, equipos, vehículos, impresoras, etc., para garantizar que no hay fugas. Si hay fugas, se realizará la reparación inmediata de las mismas. Los equipos deben contar con sistemas que controlen sus emisiones.	X		X		Fotografías	La maquinaria cuenta con sus respectivos filtros y silenciadores para evitar emisiones atmosféricas y ruidos excesivos <b>ANEXO 8.-</b> Fotografías de maquinarias con filtros y silenciadores.
Mantener los hornos y calderas en buenas condiciones de funcionamiento para ayudar a prevenir emisión fuera de lo normal.		X				
Mantener correctamente cerrados todos los botes de pinturas, colas y disolventes. Éstos contienen unas sustancias denominadas compuestos orgánicos volátiles (COV's) que se emiten a la atmósfera si no cerramos adecuadamente sus recipientes.		X				

### 10.4. RUIDO

RUIDO	APLICA SI/NO)		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		MEDIOS DE VERIFICACION	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO / OBSERVACION
	SI	NO	CUMPLE	NO CUMPLE		
Se pueden instalar o colocar barreras para evitar que el ruido salga del sitio donde opera el equipo estacionario		X				
Atender y controlar el ruido generado por los equipos	X		X		Fotografías	La maquinaria cuenta

auxiliares, puede ser causa de mal funcionamiento y puede generar molestias evitables.						con silenciadores para evitar ruidos excesivos. <b>ANEXO 8.-</b> Fotografía de maquinaria con silenciadores.
Colocar la señalética respectiva que indique el perjuicio para la salud la exposición prolongada a alto niveles de ruido.	X	X			Fotografías	Instalación de barreras horizontales que delimitan el área de trabajo <b>ANEXO 9.-</b> Fotografía barreras horizontales de protección.

#### 10.5. CONSUMO DE ENERGÍA

CONSUMO DE ENERGÍA	APLICA SI/NO)		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		MEDIOS DE VERIFICACION	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO / OBSERVACION
	SI	NO	CUMPLE	NO CUMPLE		
Ahorrar energía durante el desarrollo del trabajo aprovechando al máximo la luz natural, usando aparatos de bajo consumo.		X				
Seleccionar la maquinaria por criterios de eficiencia energética		X				
Persuadir al personal para que, en el caso de ser el último en abandonar el establecimiento, apaguen las luces cuando finalice su tarea.		X				

#### 10.6. MAQUINARIA

MAQUINARIA	APLICA	NIVEL DE	MEDIOS DE	INDICADOR DE
------------	--------	----------	-----------	--------------

	SI/(NO)		CUMPLIMIENTO		VERIFICACION	CUMPLIMIENTO / OBSERVACION
	SI	NO	CUMPLE	NO CUMPLE		
Emplear la maquinaria y las herramientas más adecuadas para cada trabajo, eso disminuirá la producción de residuos.	X		X		Fotografías	Establecimiento de carpas, lonas y plásticos para cubrir el material pétreo y evitar el levantamiento de polvo. <b>ANEXO 10.-</b> Fotografías de volquetas con cubiertas para evitar residuos en suspensión en el aire.
Tener en funcionamiento la maquinaria el tiempo imprescindible reducirá la emisión de ruido y contaminantes atmosféricos.		X				El horario de trabajo en el proyecto es de 7 am a 5 pm por lo tanto la maquinaria pasa en constante movimiento para cumplir con el cronograma establecido en el contrato
Reutilizar, en lo posible, materiales, componentes y también los envases.		X				El proyecto no contempla materiales reutilizables.
<b>10.7. PRODUCTOS QUÍMICOS.</b>						
	APLICA		NIVEL DE		MEDIOS DE	INDICADOR DE
<b>PRODUCTOS QUÍMICOS.</b>						

	SI/NO)		CUMPLIMIENTO		VERIFICACION	CUMPLIMIENTO / OBSERVACION
	SI	NO	CUMPLE	NO CUMPLE		
Emplear los productos químicos menos contaminantes.		X				
Usar los productos cuidando la dosificación recomendada por el fabricante para reducir la peligrosidad y el volumen de residuos.		X				
Usar los productos cuidando de vaciar completamente los recipientes, botes y contenedores.		X				
Minimizar, reutilizar o, en su caso entregar a un gestor autorizado, los residuos procedentes de la limpieza de herramientas, equipos e instalaciones		X				

**10.8.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.**

MAQUINARIA	OBSERVACIONES
Dotación de equipo de seguridad industrial	La entrega de EPPS se realizó en forma espontánea a operadores y ayudantes debido a que en esta etapa del proyecto no se requiere mayor número de mano de obra. Entrega de impermeables, gafas y chalecos a operadores de maquinaria pesada se realizó en el periodo anterior y tiene la vigencia de tres meses. <b>ANEXO. - 11.</b> Fotografías personales operativo con EPPs.
Charlas sobre seguridad y salud ocupacional	Está prevista la entrega de trípticos de utilización de EPPS al personal que labora en el proyecto. <b>ANEXO 12.- Tríptico de seguridad industrial y registro de entrega.</b> Se realizaron charlas y entrega de trípticos de manejo de desechos sólidos con volqueteros y ayudantes del proyecto El personal que labora se encuentra afiliado al IEES <b>ANEXO 13.- Nomina del personal afiliado al IEES</b>



## 11.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

### CONCLUSIONES

- Se elaboró el Informe Ambiental de cumplimiento del proyecto: ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA correspondiente al periodo 01 de marzo al 31 de marzo de 2023.
- Los trabajos del proyecto se ven afectados debido a las condiciones climáticas de la región
- La obra se encuentra en la fase de mejoramiento y ensanchamiento de vía en el tramo del Km 12 Vía 10 de agosto \_ El Triunfo hasta Jatun Paccha.
- La fragilidad del suelo del sector ha provocado un leve retraso en las actividades propuestas en el cronograma de la obra.

### RECOMENDACIONES

- El Plan de manejo ambiental propuesto para el proyecto NO APLICA para los trabajos realizados hasta la presente fecha por lo se solicita a fiscalización Externa se realicen los trámites pertinentes para la regularización y obtención de los respectivos permisos ambientales en el tramo del Km 12 Vía 10 de agosto \_ El Triunfo hasta Jatun Paccha desde la abscisa 0+000 hasta la abscisa 2+040 y desde la abscisa 2+500 hasta la 3+445 en tramo antes señalado.

## 12.- FIRMA DE RESPONSABILIDAD.

Elaborado por:



EDGAR RAUL GASPATA  
CALO

Ing. Edgar Raúl Gaspata Calo

**TECNICO AMBIENTAL AMAZONAS BUILDING S.A.**






**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

# ANEXOS





**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

# **ANEXO 1**

## **Folleto de manejo de desechos solidos proyecto**





## Código de colores para la recolección de residuos:

Existen diferentes códigos para la recolección de los residuos en tachos de diferentes colores según el tipo de residuos que se va a desechar. A continuación mencionaremos uno de los más usados.



<p><b>CANECA GRIS</b></p> <p><b>RESIDUOS APROVECHABLES</b> Papel y cartón son recuperables si están limpios.</p> 	<p><b>CANECA VERDE</b></p> <p><b>RESIDUOS ORDINARIOS</b> Sobrantes de comida, vasos, platos, cubiertos, desechables, papel de mecató, papel engrasado, carbón y aluminio.</p> 	<p><b>CANECA AZUL</b></p> <p><b>RESIDUOS APROVECHABLES</b> Vidrio y plástico, botellas retornables, bolsas plásticas.</p> 
--	---	---

No olvides que si no eres parte de la solución, eres parte del problema.

## AMAZONAS BUILDING S.A.

PROYECTO DE ASFALTO DE LA VÍA CURARAY - FCO. DE ORELLANA - 10 DE AGOSTO, JATUMPACCHA HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO



## PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS

CIA. AMAZONAS BUILDING S.A. ECUADOR. PUYO - PASTAZA. DIRECCION: Vía Tarqui, Parroquia Madre Tierra, Sector San José. TEL: 032795 872 CELULAR: 0984508890.



¡Los residuos sólidos separados no son basura!!!



### ¿Que son los residuos sólidos?

Son los restos de actividades humanas, considerados por sus generadores como inútiles, indeseables o desechables, pero que pueden tener utilidad para otras personas. En sí, es la basura que genera una persona.

### ¿Dónde se generan?

Los residuos sólidos tiene varias fuentes de generación tales como: hogares, mercados, centros educativos, comercios, fábricas, vías públicas, restaurantes, hospitales, entre muchos más.

### ¿Cómo se clasifican los residuos sólidos?

Los residuos sólidos se clasifican en:

#### Residuos orgánicos

##### Se descomponen

Son sustancias que se pueden descomponerse en un tiempo relativamente corto. Como por ejemplo, cáscaras de frutas, verduras, residuos de comida, hierbas, hojas y raíces; vegetales, madera, papeles, cartón y telas entre otros.



#### Residuos inorgánicos

##### No se descomponen

Son aquellos materiales y elementos que, no se descomponen fácilmente y sufren ciclos de degradabilidad muy largos. Entre ellos están los plásticos, loza, vidrio, hojalata, zinc, hierro, latas, desechos de construcción.

Los residuos sólidos inorgánicos, son los mayores generadores de impacto ambiental por su difícil degradación. Estos generan problemas a la hora de su disposición por no realizarse de manera adecuada, lo que da paso al deterioro del medio ambiente.



### Importancia del reciclaje

Los recursos renovables, como los árboles, pueden ser salvados.

En el aspecto financiero, podemos decir que el reciclaje puede generar muchos empleos. La utilización de productos reciclados disminuye el consumo de energía.

Se pueden salvar grandes cantidades de recursos naturales no renovables cuando en los procesos de producción se utilizan materiales reciclados.

Los desechos orgánicos pueden ser utilizados para fabricar abono, a utilizarse en la huerta o en el jardín, si se tiene la posibilidad. En cualquier casa que tenga un espacio de jardín se puede transformar la basura orgánica.

El papel puede ser acumulado para su venta o entrega a los comerciantes especializados, que van de casa en casa para tal fin. Los desechos inorgánicos deben ser enterrados o entregados para su recojo por el municipio, si existe dicho servicio. Si se entierran, debe hacerse un hoyo profundo en lugares seguros. En este caso también pueden ser vendidos o entregados a los comerciantes especializados.

De esta manera se puede aminorar la contaminación y contribuir a reutilizar la materia orgánica para fines productivos y para embellecer los barrios. Para esto se debe serio adquirir el hábito de hacerlo, y es deber de todos saberlo y enseñar a los demás.






**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

## **ANEXO 2**


# **Registro fotográfico de contenedores de basura**





# MAZONAS BUILDING S.A.

Puyo - Pastaza - Ecuador





**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

## **ANEXO 3**

# **Registro fotográfico de cambios de alcantarillas**







**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

**ANEXO 4**  
**Registro de**  
**mantenimiento de**  
**maquinaria**





## CONTROL DE MANTENIMIENTOS MAQUINARIA

Fecha:	<u>23/03/2023</u>	Lugar de Mantenimiento:	TALLER DE COMPANIA AMAZONAS BUILDING S.A.	RESPONSABLE	
--------	-------------------	-------------------------	---	-------------	--

VEHICULOS				ACEITE	TIPO DE ACEITE	TECNICO
MINICARGADORA KOMATSU SK 815-5		EXCAVADORA ORUGA DOOSAN DX225LCA 2			usado	
PLANTA ASFALTICA ADM SPL-110		EXCAVADORA ORUGA DOOSAN DX225LCA 3				
GENERADOR CUMMIS (PLANTA DE ASFALTO)		EXCAVADORA ORUGA DOOSAN DX225LCA 4				
GENERADOR KOLER (PLANTA DE ASFALTO)		GALLINETA				
BOMBA HORMIGON SCHIWING AMERICA INC. SP 750-1		Rodillo AMMAN <u>TANBO.</u>	<u>2.975.8</u>			
RODILLO TANDEM BOMAG BW 9AS		Rodillo AMMAN 2				
RODILLO TANDEM INGERSOLL SD100D		Rodillo Caterpila				
RODILLO NEUMATICO BASIC KUBOTA MODELO 700						
FINISHER LEE BOY 8500 T						
MOTONIVELADORA JHON DEERE 670B						
PLANTA DOSIFICADORA HORMIGON PA000362						

CAMBIO DE ACEITE MOTOR						
FECHA CAMBIO	<u>23.03/2023</u>	CANTIDAD	<u>1</u>	KILOMETRAJE HOROMETRO	<u>2.975.8</u>	PROXIMO CAMBIO
					<u>2.50</u>	<u>3.225.8</u>

CAMBIO FILTRO DE ACEITE						
FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		PROXIMO CAMBIO

CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE						
FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		PROXIMO CAMBIO

CAMBIO FILTRO DE AIRE						
FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		PROXIMO CAMBIO

CAMBIO ACEITE HIDRAULICO						
FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		PROXIMO CAMBIO

CAMBIO DE ACEITE DE GIRO						
FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		PROXIMO CAMBIO

CAMBIO DE ACEITE DEPURADORES						
FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		PROXIMO CAMBIO

CAMBIO DE ACEITE CATALINA						
FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		PROXIMO CAMBIO

CAMBIO DE ACEITE RUEDAS GUIAS						
FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		PROXIMO CAMBIO

CAMBIO DE UÑAS - RETENEDORES - RUEDAS						
FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		PROXIMO CAMBIO

OTROS MANTENIMIENTOS						
DETALLAR OBSERVACIONES:						

Revisión sistema eléctrico y sistema hidraulico





## CONTROL DE MANTENIMIENTOS MAQUINARIA

Fecha:	23-03-2023	Lugar de Mantenimiento:	TALLER DE COMPANIA AMAZONAS BUILDING S.A	RESPONSABLE	
--------	------------	-------------------------	--	-------------	--

VEHICULOS				ACEITE	TIPO DE ACEITE	RESPONSABLE
MINICARGADORA KOMATSU SK 815-5		EXCAVADORA ORUGA DOOSAN DX225LCA 2			15W40	
PLANTA ASFALTICA ADM SPL-110		EXCAVADORA ORUGA DOOSAN DX225LCA 3				
GENERADOR CUMMIS (PLANTA DE ASFALTO)		EXCAVADORA ORUGA DOOSAN DX225LCA 4			TECNICO	
GENERADOR KOLER (PLANTA DE ASFALTO)		GALLINETA				
BOMBA HORMIGON SCHIWIWING AMERICA INC. SP 750-1		Rodillo AMMAN			CANTIDAD	
RODILLO TANDEM BOMAG BW 9AS		Rodillo AMMAN 2 TAMBORE ✓ 2512.4				
RODILLO TANDEM INGERSOLL SD100D		Rodillo Caterpila			4.605	
RODILLO NEUMATICO BASIC KUBOTA MODELO 700						
FINISHER LEE BOY 8500 T						
MOTONIVELADORA JHON DEERE 670B						
PLANTA DOSIFICADORA HORMIGON PA000362						

### CAMBIO DE ACEITE MOTOR

FECHA CAMBIO	CANTIDAD	KILOMETRAJE HOROMETRO	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO
23-03-2023	Rodillo Amman 1		2512.4	2815.9

### CAMBIO FILTRO DE ACEITE

FECHA CAMBIO	CANTIDAD	KILOMETRAJE HOROMETRO	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO

### CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE

FECHA CAMBIO	CANTIDAD	KILOMETRAJE HOROMETRO	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO

### CAMBIO FILTRO DE AIRE

FECHA CAMBIO	CANTIDAD	KILOMETRAJE HOROMETRO	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO

### CAMBIO ACEITE HIDRAULICO

FECHA CAMBIO	CANTIDAD	KILOMETRAJE HOROMETRO	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO

### CAMBIO DE ACEITE DE GIRO

FECHA CAMBIO	CANTIDAD	KILOMETRAJE HOROMETRO	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO

### CAMBIO DE ACEITE DEPURADORES

FECHA CAMBIO	CANTIDAD	KILOMETRAJE HOROMETRO	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO

### CAMBIO DE ACEITE CATALINA

FECHA CAMBIO	CANTIDAD	KILOMETRAJE HOROMETRO	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO

### CAMBIO DE ACEITE RUEDAS GUIAS


FECHA CAMBIO	CANTIDAD	KILOMETRAJE HOROMETRO	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO

### CAMBIO DE UÑAS - RETENEDORES - RUEDAS

FECHA CAMBIO	CANTIDAD	KILOMETRAJE HOROMETRO	NUMERACION	PROXIMO CAMBIO

### OTROS MANTENIMIENTOS

DETALLAR OBSERVACIONES:  
 - Revisión de sistema eléctrico y sistema hidráulico





# AMAZONAS BUILDING S.A.

Puyo - Pastaza - Ecuador



## CONTROL DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS

Fecha:	10/03/23	Lugar de Mantenimiento:	TALLER DE COMPANIA AMAZONAS BUILDING S.A. (1)
VEHICULOS		PLACA	TBJ5817
HINO DUTRO 300		TOYOTA FORTUNER	TIPO DE ACEITE
HINO FM 500		VITARA ROJO	15W40
HINO FS700		MIXER HYUNDAI HD270	ACEITE
TRAILER FREIGHTLINER		TANQUERO MERCEDES	CANTIDAD
Volqueta Chevrolet Azul		FORD AZUL	16 1/4
GREAT WALL 5 BLANCA	X		
GREAT WALL 7 PLOMA			
JAC ROJO			

RESPONSABLE

TECNICO

### CAMBIO DE ACEITE MOTOR

FECHA CAMBIO	10/03/23	CANTIDAD	1 1/4	KILOMETRAJE HOROMETRO	65845	PROXIMO CAMBIO	70845 KM	NUMERACION	Gulf
--------------	----------	----------	-------	-----------------------	-------	----------------	----------	------------	------

### CAMBIO FILTRO DE ACEITE

FECHA CAMBIO	10/03/23	CANTIDAD	1	KILOMETRAJE HOROMETRO	"	PROXIMO CAMBIO	"	NUMERACION	Libertad PH820
--------------	----------	----------	---	-----------------------	---	----------------	---	------------	----------------

### CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE

FECHA CAMBIO	10/03/23	CANTIDAD	1	KILOMETRAJE HOROMETRO	"	PROXIMO CAMBIO	"	NUMERACION	Sukura FC150L
--------------	----------	----------	---	-----------------------	---	----------------	---	------------	---------------

### CAMBIO FILTRO DE AIRE

FECHA CAMBIO	10/03/23	CANTIDAD	1	KILOMETRAJE HOROMETRO	"	PROXIMO CAMBIO	75845 KM	NUMERACION	Sukura A-38270
--------------	----------	----------	---	-----------------------	---	----------------	----------	------------	----------------

### CAMBIO ACEITE DE CORONAS

FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		PROXIMO CAMBIO		NUMERACION	
--------------	--	----------	--	-----------------------	--	----------------	--	------------	--

### CAMBIO DE ACEITE DE CAJA

FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		PROXIMO CAMBIO		NUMERACION	
--------------	--	----------	--	-----------------------	--	----------------	--	------------	--

### CAMBIO DE GRASAS DE LAS RUEDAS

FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		PROXIMO CAMBIO		NUMERACION	
--------------	--	----------	--	-----------------------	--	----------------	--	------------	--

### CAMBIO DE DE RUEDAS

FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		PROXIMO CAMBIO		NUMERACION	
--------------	--	----------	--	-----------------------	--	----------------	--	------------	--

### OTROS MANTENIMIENTOS

DETALLAR OBSERVACIONES :





# AMAZONAS BUILDING S.A.

Puyo - Pastaza - Ecuador

AMAZONAS BUILDING S.A.



## CONTROL DE MANTENIMIENTOS MAQUINARIA

Fecha:	07/03/23	Lugar de Mantenimiento:	TALLER DE COMPANIA AMAZONAS BUILDING S.A.	RESPONSABLE
--------	----------	-------------------------	---	-------------

### VEHICULOS

VEHICULOS	TIPO DE ACEITE	RESPONSABLE
MINICARGADORA KOMATSU SK 815-5	ACEITE	TECNICO
PLANTA ASFALTICA ADM SPL-110		
GENERADOR CUMMIS (CALDERO DE P. ASFALTO)		
GENERADOR KOLER (PLANTA DE Luz)		
BOMBA HORMIGON SCHIWING AMERICA INC. SP 750-1		
RODILLO TANDEM BOMAG BW 9AS		
RODILLO TANDEM INGERSOLL SD100D		
RODILLO NEUMATICO BASIC KUBOTA MODELO 700		
FINISHER LEE BOY 8500 T		
MOTONIVELADORA JHON DEERE 670B		
PLANTA DOSIFICADORA HORMIGON PA000362	5 1/4	

### CAMBIO DE ACEITE MOTOR

FECHA CAMBIO	07/03/23	CANTIDAD	5 1/4	KILOMETRAJE HOROMETRO	408 H	NUMERACION	650 H	PROXIMO CAMBIO
--------------	----------	----------	-------	-----------------------	-------	------------	-------	----------------

### CAMBIO FILTRO DE ACEITE

FECHA CAMBIO	"	CANTIDAD	2	KILOMETRAJE HOROMETRO	408 H	NUMERACION	DP 079320 H	PROXIMO CAMBIO	650 H
--------------	---	----------	---	-----------------------	-------	------------	-------------	----------------	-------

### CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE

FECHA CAMBIO	"	CANTIDAD	2	KILOMETRAJE HOROMETRO	408 H	NUMERACION	DP 9317 F	PROXIMO CAMBIO	650 H
--------------	---	----------	---	-----------------------	-------	------------	-----------	----------------	-------

### CAMBIO FILTRO DE AIRE

FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		NUMERACION		PROXIMO CAMBIO	
--------------	--	----------	--	-----------------------	--	------------	--	----------------	--

### CAMBIO ACEITE HIDRAULICO

FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		NUMERACION		PROXIMO CAMBIO	
--------------	--	----------	--	-----------------------	--	------------	--	----------------	--

### CAMBIO DE ACEITE DE GIRO

FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		NUMERACION		PROXIMO CAMBIO	
--------------	--	----------	--	-----------------------	--	------------	--	----------------	--

### CAMBIO DE ACEITE DEPURADORES

FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		NUMERACION		PROXIMO CAMBIO	
--------------	--	----------	--	-----------------------	--	------------	--	----------------	--

### CAMBIO DE ACEITE CATALINA

FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		NUMERACION		PROXIMO CAMBIO	
--------------	--	----------	--	-----------------------	--	------------	--	----------------	--

### CAMBIO DE ACEITE RUEDAS GUIAS

FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		NUMERACION		PROXIMO CAMBIO	
--------------	--	----------	--	-----------------------	--	------------	--	----------------	--

### CAMBIO DE UÑAS - RETENEDORES - RUEDAS

FECHA CAMBIO		CANTIDAD		KILOMETRAJE HOROMETRO		NUMERACION		PROXIMO CAMBIO	
--------------	--	----------	--	-----------------------	--	------------	--	----------------	--

### OTROS MANTENIMIENTOS

DETALLAR OBSERVACIONES:

*[Handwritten signature]*







**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

**ANEXO 5**

**Fotografías de centro de  
acopio de desechos  
peligrosos**







**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

## **ANEXO 6**

**Fotografía con Espacios  
libres de contaminación  
por combustibles.**





# MAZONAS BUILDING S.A.

Puyo - Pastaza - Ecuador





**MAZONAS BUILDING S.A.**  
Puyo - Pastaza - Ecuador

**ANEXO 7**  
**Fotografía de kit**  
**antiderrames**





**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador





**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

## **ANEXO 8**

**Fotografía de maquinaria  
con silenciadores.**







**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

**ANEXO 9**  
**Fotografías barreras**  
**horizontales de**  
**protección.**





# MAZONAS BUILDING S.A.

Puyo - Pastaza - Ecuador






**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

## **ANEXO 10**

**Fotografías de volquetas  
con cubiertas para evitar  
residuos en suspensión  
en el aire.**





# MAZONAS BUILDING S.A.

Puyo - Pastaza - Ecuador





**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

## **ANEXO 11**

**Fotografías del personal  
operativo con EPPs.**





# MAZONAS BUILDING S.A.

Puyo - Pastaza - Ecuador





**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

**ANEXO 12**  
**Tríptico de seguridad**  
**industrial y registro de**  
**entrega.**





AMAZONAS  
BUILDING S.A.  
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS

## ELECCION DE LOS E.P.P.

Para la elección de los E.P.P. se recomienda llevar a cabo las siguientes actuaciones:

- Analizar y evaluar los riesgos que no puedan evitarse o limitarse suficientemente por otros medios.
- Definir las características que deben reunir los E.P.P. en función tanto de la naturaleza y magnitud del riesgo, como de las condiciones ambientales del lugar y de las características del trabajador.
- Comparar las características de los E.P.P. existentes en el mercado con las señaladas en el apartado anterior.
- Consultar a los trabajadores y escoger de entre todos los E.P.P. que reúnen las características buscadas el que mejor se adapta a sus necesidades.

## UTILIZACION Y MANTENIMIENTO

La utilización, mantenimiento, limpieza, almacenamiento y reparación de los E.P.P. se efectuará según lo especificado por el fabricante. El manual de instrucciones, estará a disposición de los trabajadores.

Solo podrán utilizarse para los usos previstos, excepto en casos excepcionales. Deberán ser revisados antes de su utilización para detectar posibles anomalías.

El trabajador debe informar inmediatamente a su superior jerárquico directo de cualquier defecto o daño apreciado en su equipo que pueda entrañar una pérdida de su eficacia.

Cualquier equipo defectuoso, dañado o caducado será retirado y sustituido inmediatamente por otro nuevo.

En aquellas zonas en las que la utilización de un E.P.P. es obligatoria deberá colocarse la correspondiente señal de uso obligatorio.

## RECUERDE:

Proteger la integridad física del trabajador en su puesto de trabajo es un derecho y deber que todos tenemos, y el uso correcto de los E.P.P. contribuye a ello.

Olvidarse de utilizar un E.P.P. o utilizado de forma incorrecta, es un hecho preocupante, si no grave, ya que en ello va implicada nuestra seguridad y salud.

El uso de E.P.P. no certificados, modificados de forma no prevista por el fabricante, caducados o en mal estado equivale a no llevar nada, es decir, a estar expuesto a cualquier riesgo laboral.



## RECOMENDACIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



CIA. AMAZONAS BUILDING S.A. ECUADOR  
PUYO - PASTAZA  
TEL: 032 251 472 CELULAR: 998450060

ASFALTO DE LA VÍA CURARAY - FCO. DE ORELLANA - 10 DE AGOSTO, JATUMPACCHA HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO



## QUE SON LOS E.P.P.?

Se considera un E.P.P. a:

"Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin"

Los más comúnmente utilizados son:

- Para la protección de la cabeza: el casco.
- Para la protección de los oídos: los tapones y las ojeeras.
- Para la protección de los ojos y a cara: las gafas de seguridad y las pantallas.
- Para la protección de la nariz y mascarillas autofiltrantes y los equipos de respiración autónoma.
- Para la protección contra caídas de altura: los cinturones y arneses de seguridad.
- Para la protección de manos y brazos: los guantes.
- Para la protección de pies y piernas: el calzado de seguridad.
- Para la protección del resto del cuerpo: los mandiles de cuero, los trajes aislantes del calor o el frío, etc.

## QUE NO SON E.P.P.

- ⇒ La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajador.
- ⇒ Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.
- ⇒ Los equipos de protección individual de los militares, policías, de las personas dedicadas al mantenimiento del orden y de los medios de transporte por carretera.
- ⇒ El material de deporte, de autodefensa o de disuasión.
- ⇒ Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos.

## CLASIFICACION

En función de la gravedad de los riesgos frente a los que protegen, los E.P.P. se dividen en:

**Categoría I:** Protegen frente a riesgos mínimos (guantes de jardinería, dedales, etc.).

**Categoría II:** Los no incluidos en las categorías III (Muchos tipos de calzado de seguridad).

**Categoría III:** Protegen de un peligro mortal o que puede dañar seriamente la salud (protecciones respiratorias filtrantes que protegen de gases tóxicos, etc.).



## CRITERIOS PARA SU EMPLEO

Los E.P.P. se utilizarán cuando los riesgos no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos (protección colectiva, procedimientos o métodos de organización del trabajo) y queden aún una serie de riesgos de cuantía significativa.

## CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR

Los E.P.P. deberán, a fin de que el operario trabaje lo más cómodo y seguro posible:

- Ser adecuados a las condiciones existentes en el lugar de trabajo: temperatura, humedad ambiental, concentración de oxígeno, etc.
- Tener en cuenta las condiciones anatómicas, fisiológicas y de salud del trabajador; que no reduzcan la capacidad visual, auditiva, respiratoria. Considerar el peso y volumen del equipo.
- Adaptarse al trabajador tras los ajustes necesarios: si tiene barba, utiliza gafas, tiene algún defecto facial, etc.
- Si se utilizan varios E.P.P. simultáneamente, deberán ser compatibles entre sí y mantener la eficacia que tenían por separado.
- Deben ir acompañados de un folleto informativo sobre sus características, modo de empleo, modo de almacenamiento, correcto mantenimiento, accesorios y piezas de repuesto adecuadas y fecha de caducidad.
- Cumplir con la legislación en lo relativo a su diseño y fabricación. Los E.P.P. de las categorías I y II deben llevar marcadas las siglas CE. En los de categoría III aparecerá a continuación del marcado CE un número de cuatro cifras que indica el "organismo notificado" que le ha concedido el marcado.



**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

## **ANEXO 13**

# **Nómina del personal afiliado al IEES**





## INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

### Consulta Rol Empleados

Información de la Empresa

Fecha: 28/03/2023

Nombre del Empleador: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A  
 Ruc: 1081710080001  
 Nombre Sucursal: 0001 AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A

N°	Nombre	Cedula	Actividad	Actividad Sectorial	Relación de Trabajo	Forma Pago	% Aportación	% Cesantía Aportación	Sueldo	Sueldo Extra	Días mod	Valor días Mod	Total Afiliado	
1	ALERO MARILENA ZUÑIGA	709463808	OPERADOR DE ENCAVADORA	40645000045	RECOBRO DEL TRABAJO	CT	F	20.6	0.0	521.42	0.00	0	0.00	521.42
2	AMALUY CEDENO JOSE ALBERTO	312406288	OPER. VOLQUETAS	71804000050	RECOBRO DEL TRABAJO	CT	F	20.6	0.0	691.69	0.00	0	0.00	691.69
3	ARROYO CHIMBO NUBIA PATRICIA	809294380	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	81800000081	RECOBRO DEL TRABAJO	CT	F	20.6	0.0	458.30	0.00	0	0.00	458.30
4	CHAMPANA CHAMPANA JOSE ALEJANDRO	302353090	TRABAJADOR EN GENERAL	818040000100	RECOBRO DEL TRABAJO	CT	F	20.6	0.0	450.00	0.00	0	0.00	450.00
5	CHAMPANA CHAMPANA JOSE PEDRO	302174280	TRABAJADOR EN GENERAL	818040000100	RECOBRO DEL TRABAJO	CT	F	20.6	0.0	450.00	0.00	0	0.00	450.00
6	GUARMA CASTILLO GERMAN JOSE	300360780	TRABAJADOR EN GENERAL	818040000100	RECOBRO DEL TRABAJO	CT	F	20.6	0.0	450.00	0.00	0	0.00	450.00
7	SARBA RIVERA YESY CAROL	302850804	PROFESIONALES CON TITULO DE TERCER NIVEL	91000000043	RECOBRO DEL TRABAJO	CT	F	20.6	0.0	494.67	0.00	0	0.00	494.67
8	LAGUNE RODRIGUEZ TOVON RAQUEL	300340202	PROF. DE INGENIERIA	71809000001	RECOBRO DEL TRABAJO	CT	F	20.6	0.0	691.69	0.00	0	0.00	691.69
9	LAGUNE RODRIGUEZ JENNY BERTHA	300267494	PROFESIONALES CON TITULO DE TERCER NIVEL	91000000043	RECOBRO DEL TRABAJO	CT	F	20.6	0.0	494.67	0.00	0	0.00	494.67
10	SARIN JACOME JENNY PATRICIA	300671780	TRABAJADOR EN GENERAL	818040000100	RECOBRO DEL TRABAJO	CT	F	20.6	0.0	450.00	0.00	0	0.00	450.00
11	SARIN JACOME KENY MATEO JOSE	300498770	ASISTENTE TECNICO EN SERVICIOS EN GENERAL	82900000041	RECOBRO DEL TRABAJO	CT	F	20.6	0.0	450.04	0.00	0	0.00	450.04
12	SARIN MONTANO KLEVER JAVIER	300290710	ADMINISTRADOR GENERAL	81803000045	RECOBRO DEL TRABAJO	CT	F	20.6	0.0	680.00	0.00	0	0.00	680.00
13	SARIN PUEZ AIDY ALEXANDER	300860676	ASISTENTE TECNICO EN SERVICIOS EN GENERAL	82900000041	RECOBRO DEL TRABAJO	CT	F	20.6	0.0	450.04	0.00	0	0.00	450.04
14	SARIN PUEZ ANDREY ANAHEA	300900508	ASISTENTE TECNICO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	81800000000	RECOBRO DEL TRABAJO	CT	F	20.6	0.0	458.72	0.50	0	0.00	458.72
15	SHANDA AMO ROSARIO JUDITH	300171632	TRABAJADOR EN GENERAL	818040000100	RECOBRO DEL TRABAJO	CT	F	20.6	0.0	450.00	0.00	0	0.00	450.00
16	MONTANO ESPINOSA KATY ESTHER	300439804	ASISTENTE TECNICO EN SERVICIOS EN GENERAL	82900000041	RECOBRO DEL TRABAJO	CT	F	20.6	0.0	450.04	0.00	0	0.00	450.04
17	FRANCO JELASTOVA CARLOS VICENTE	300679302	PROFESIONALES CON TITULO DE TERCER NIVEL	91000000043	RECOBRO DEL TRABAJO	CT	F	20.6	0.0	494.67	0.00	0	0.00	494.67
18	SUNDA CAZALIANO PINO BRITTA	300724808	ASISTENTE TECNICO EN SERVICIOS EN GENERAL	82900000041	RECOBRO DEL TRABAJO	CT	F	20.6	0.0	450.04	0.00	0	0.00	450.04
19	SOTAMBA MA TRIN PATRICIA BOLIVAR	300428861	OPERADOR DE ENCAVADORA	40645000045	RECOBRO DEL TRABAJO	CT	F	20.6	0.0	521.42	0.00	0	0.00	521.42

N°	Nombre	Cedula	Actividad	Actividad Sectorial	Relación de Trabajo	Forma Pago	% Aportación	% Cesantía Aportación	Sueldo	Sueldo Extra	Días mod	Valor días Mod	Total Afiliado	
20	FRANCO TAPIA CESAR LUIS	300177461	TRABAJADOR GENERAL	818030000100	RECOBRO DEL TRABAJO	CT	F	20.6	0.0	450.00	0.00	0	0.00	450.00
21	ROSA VEGA JOSE BENEDICTO	300860158	TRABAJADOR EN GENERAL	818040000100	RECOBRO DEL TRABAJO	CT	F	20.6	0.0	450.00	0.50	0	0.00	450.00
Total Rol									10457.53	0.00		0.00	10457.53	



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

marzo 28 del 2023 08:47

GUEVARA MARIN ODILO VINICIO

**DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO**

(CANCELADO: (2023-03-15))  
(BANCO GUAYAQUIL S.A.)

No. Comprobante: 0000000167593605

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES.	Emitido en:	2023-03-06
No. RUC / REGISTRO:	1691710080001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2023-03-15
Nombre / Razón Social / Organización:	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. - AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.		
Periodo de Pago:	2023 - 02		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

AFILIADOS								
PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2023 - 2	06	1720483009	ACERO UMAQUENIA JUAN ISARD	633.75	30	NNA	130.55	0.00
2023 - 2	06	1312006288	AMAGLAY CEDAÑO JOSE ALFREDO	691.69	30	NNA	142.48	0.00
2023 - 2	06	1600354383	BRAVO CHANCO NUBIA TATHIANA	510.35	30	NNA	105.13	0.00
2023 - 2	06	0503030510	CHASPRANTA CHASPRANTA JOSE AUGUSTO	724.58	30	NNA	148.20	0.00
2023 - 2	06	0503774580	CHASPRANTA CHASPRANTA JOSE PEDRO	500.00	30	NNA	115.36	0.00
2023 - 2	06	1600459331	DOMEZ BARRERO DAVID ALEJANDRO	191.20	11	NNA	39.39	0.00
2023 - 2	06	0603907080	GUAMAN CASTILLO GEREMIAS JOSE	590.79	30	NNA	121.70	0.00
2023 - 2	06	1600257404	HERAS PINEDA VERONICA ANDREA	232.94	15	NNA	47.99	0.00
2023 - 2	06	0922852834	IBARRA RIVERA JESSELY SARAY	634.40	30	NNA	130.69	0.00
2023 - 2	06	1600342222	JACOME RODRIGUEZ EDWIN FLORIO	691.69	30	NNA	142.49	0.00
2023 - 2	06	1600267484	JACOME RODRIGUEZ JENNY BEATRIZ	924.09	30	NNA	190.30	0.00
2023 - 2	06	1600671700	MARIN JACOME JENNYFER BRITHREY	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2023 - 2	06	1600496770	MARIN JACOME KENYA MERYJOSEPH	450.04	30	NNA	92.71	0.00
2023 - 2	06	1600290717	MARIN MONTERO KLEVER JANSOF	882.19	30	NNA	202.33	0.00
2023 - 2	06	1600695876	MARIN PEREZ JOSE ALEXANDER	450.04	30	NNA	92.71	0.00
2023 - 2	06	1600695808	MARIN PEREZ KRISLEY ARIANNA	458.72	30	NNA	94.50	0.00
2023 - 2	06	0601710327	MIRANDA AMBLEDGAR JUVENAL	500.00	30	NNA	115.36	0.00
2023 - 2	06	1600439804	MONTERO ESPINOSA KATTY JESSICA	450.04	30	NNA	92.71	0.00
2023 - 2	06	1004320641	SOTAMINSA BELTRAN PATRICIO BOLIVAR	1195.71	30	NNA	246.32	0.00
2023 - 2	06	0604593434	TAMAY GUAMAN LUIS GERARDO	330.28	19	NNA	68.03	0.00
2023 - 2	06	1600177461	TAPUY TAPUY CESAR LUIS	450.00	30	NNA	92.70	0.00
2023 - 2	06	0500660158	VEIGA VEIGA JOSE GREGORIO	500.00	30	NNA	115.36	0.00
				<b>12722.47</b>			<b>2620.84</b>	<b>0.00</b>



## DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

Valor	2748.07
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	2748.07
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	2748.07

### Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

\*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

\*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrado, Coopimego

\*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido)

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.





**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

# FACTURAS

"ASOCIADO DE LA VIACURARAY -FRANCISCO DE ORELLANA-JATUN PALCHA, HASTA EL KILOMETRO  
12 VIA 10 DE AGOSTO -EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1701952069001

FACTURA

No. 001-014-000000705

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


3103202301170195206900120010140000007050000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/03/2023 08:30:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3103202301170195206900120010140000007050000000014

FUENTES FLORES MARIA DEL CARMEN

E/S AZOR SHELL

Dirección: AV. PADRE JUS. VIZCARRA  
Matriz:

Dirección: AV. BARRIO LAS PALMAS, AV. ALBERTO ZAMBRANO  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1701952069001

Fecha: 31/03/2023

Placa / Matricula: ABC8999

Guía

Dirección: BARRIO MIRAFLORES

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	3	1002.89	DIESEL PREMIUM		1.56	1.53	3.09	0.00	1567.01

Información Adicional

Num\_Factura: 001-014-000000705  
E\_MAIL: shellazor.efactura@gmail.com  
Direccion\_Cliente: BARRIO MIRAFLORES  
Telefono\_Cliente: 009  
Codigo\_Cliente: 45548

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1765.05

SUBTOTAL 12%	1567.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1567.01
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA	188.04
IVA 12%	188.04
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1755.05

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	3471.87
AHORRO POR SUBSIDIO. (Incluye IVA cuando corresponda)	1716.81

332

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1715603211001

FACTURA

No. 001-002-000000055

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3103202301171560321100120010020000000552022112117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/03/2023 16:28:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3103202301171560321100120010020000000552022112117

COFRE HERRERA MIGUEL ANGEL

MCORP LUBRICANTES Y REPUESTOS

Dirección: AV. MALDONADO DPTO 704 Y JOAQUIN GUTIERREZ  
Matriz:

Dirección: AV. MALDONADO DPTO 704 Y JOAQUIN GUTIERREZ  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S. A.

Identificación: 1691710080021

Fecha: 31/03/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: PUYO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000183	300426-00012A	1.00	PANEL GAUGE		1654.28	0.00	0.00	0.00	1654.28

Información Adicional

Dirección: PUYO

Teléfonos: 032884846

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1852.79

SUBTOTAL 12%	1654.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1654.28
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	198.51
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1852.79

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO. (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1701952069001

FACTURA

No. 001-014-000000702

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2903202301170195206900120010140000007020000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/03/2023 08:50:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2903202301170195206900120010140000007020000000010

FUENTES FLORES MARIA DEL CARMEN

E/S AZOR SHELL

Dirección: AV. PADRE LUIS JACOBO  
Matriz:

Dirección: AV. BARRIO LAS PALMAS, AV. ALBERTO ZAMBRANO  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 29/03/2023

Placa / Matrícula: ZZZ9999

Gula

Dirección: BARRIO MIRAFLORES

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	3	1000.00	DIESEL PREMIUM		1.56	1.53	3.09	0.00	1562.50

Información Adicional

Num\_Factura: 001-014-000000702  
E\_MAIL: shellazor.efactura@gmail.com  
Direccion\_Cliente: BARRIO MIRAFLORES  
Telefono\_Cliente: 000  
Codigo\_Cliente: 45948

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1750.00

SUBTOTAL 12%	1562.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1562.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	187.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1750.00

332 %

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	3461.87
AHORRO POR SUBSIDIO. (Incluye IVA cuando corresponda)	1711.87

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1600249997001

FACTURA

No. 001-100-000002730

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803202301160024999700120011000000027302303280213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2023 14:05:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2803202301160024999700120011000000027302303280213

QUISPE QUINTEROS MARCIA ALEXANDRA

LUBRICADORA TAPIA Q HNOS

Dirección: AVDA. ALBERTO ZAMBRANO Y TARQUI,  
Matriz:

Dirección: AVDA ALBERTO ZAMBRANO Y TARQUI  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AMAZONAS BUILDING

Identificación: 16917100000001

Fecha: 28/03/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: PUYO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MOBIL15 W40MX	MOBIL15 W40MX	3.00	15W40MX CNC 5GLN		84.82	0.00	0.00	0.00	254.46
LFP780	LFP780	3.00	FIL ACE LUBER FINER VARIOS		13.39	0.00	0.00	0.00	40.18
GUAUPE	GUAUPE	40.00	GUAUPE		0.89	0.00	0.00	0.00	35.71
FS1212	FS1212	2.00	FIL COMB FLEETGUARD		15.18	0.00	0.00	0.00	30.36
FS1280	FS1280	1.00	FUEL VARIOS		16.07	0.00	0.00	0.00	16.07
AO1318	AO1318	1.00	OIL HINO, 3/4 X16		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
KND20W50	KND20W50	2.00	20W50 LT		6.25	0.00	0.00	0.00	12.50
REFRIGERTEVERD	REFRIGERTEVERD	1.00	LUBRISTONE VERDE LITRO		2.68	0.00	0.00	0.00	2.68
PH820	PH820	3.00	OIL FORD 150, GREAT WALL.		10.71	0.00	0.00	0.00	32.14
AFP5138	AFP5138	1.00	FUEL NHR NPR DMAX DIESEL DAIHT DELTA		7.14	0.00	0.00	0.00	7.14
SH966	SH966	1.00	OIL VARIOS		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
BFI174	BFI174	1.00	FIL COMB TYT HILUX 2.7 ALG 3084 KR		8.93	0.00	0.00	0.00	8.93
FC5704	FC5704	1.00	FUEL MANN SCANIA OTROS		8.93	0.00	0.00	0.00	8.93

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P72010AO	P72010AO	1.00	AIR BOMBA		55.36	0.00	0.00	0.00	55.36
LAF1544	LAF1544	1.00	AIR BOMBA		42.86	0.00	0.00	0.00	42.86
FC2904	FC2904	1.00	FUEL WINGLE DIESEL 2.0 GREAT WALL JACT6		13.39	0.00	0.00	0.00	13.39
FC1501	FC1501	2.00	FUEL DMAX ISUZU NHR NPR NKR		9.82	0.00	0.00	0.00	19.64
AFE1112	AFE1112	1.00	FILTRO COMBST HINO DUTRO 2008 2012 DUTRO CITY = EF 1112		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
AFE1507	AFE1507	1.00	FILTRO COMBUST HINO FC FTR FSR FVR = F1507		13.39	0.00	0.00	0.00	13.39
SH2849A	SH2849A	1.00	FILT ACE SHOGUN MAZDA FORD COURIER		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
FC353	FC353	1.00	FIL COMB SHOGUN MITSUBISHI HYUNDAI VARIOS		7.14	0.00	0.00	0.00	7.14
SF191130	SF191130	1.00	FILTRO RACOR ELEMENTO = 2010		8.93	0.00	0.00	0.00	8.93
AO1314	AO1314	1.00	OIL HINO DUTRO 500 GH GD FS		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
FF5138	FF5138	1.00	FUEL HINO VARIOS		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
SF191130 S	SF191130 S	1.00	FUEL HINO 500		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
O1323	O1323	1.00	OIL HINO 700		19.64	0.00	0.00	0.00	19.64
O1325	O1325	1.00	OIL HINO 700		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
SEF1301	SEF1301	1.00	FILTRO COMBUS HINO 700		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
P551670	P551670	1.00	FIL ACE DONALDSON KOMATSU 670		22.32	0.00	0.00	0.00	22.32
C8001	C8001	1.00	OIL PAISTER		8.93	0.00	0.00	0.00	8.93
3027FR	3027FR	1.00	PROTECTOR UV3 SILICONA FRESA		5.36	0.00	0.00	0.00	5.36
A38270	A38270	1.00	AIR GREAT WALL HAVAL H5		13.39	0.00	0.00	0.00	13.39
SFF2241	SFF2241	1.00	FUEL JAC IVECO		13.39	0.00	0.00	0.00	13.39
ATE DOT3	ATE DOT3	1.00	LIQUIDO FRENO ATE DOT3 LITRO		10.71	0.00	0.00	0.00	10.71
SH8A	SH8A	2.00	OIL FORD EXPLORER, F150, TYT LAND CRUISER DODGE		5.36	0.00	0.00	0.00	10.71
P551430	P551430	1.00	FUEL CATERPILLAR JHON DEERE = FS 19555		26.79	0.00	0.00	0.00	26.79
JONES WAY	JONES WAY	1.00	PINZA MANUAL		13.42	0.00	0.00	0.00	13.42

Información Adicional	
Email para retencion:	maralex.70m@gmail.com
RIMPE:	Contribuyente Régimen RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	953.00

SUBTOTAL 12%	850.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	850.89
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	102.11
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	953.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792733545001

FACTURA

No. 001-100-000001124

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803202301179273354500120011000000011240000112417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2023 16:45:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2803202301179273354500120011000000011240000112417

REPATEKCIA CIA. LTDA.

Dirección: CUMBAYA, AV. FRANCISCO DE ORELLANA, PORTÓN DE CUMBAYA L49

Dirección Sucursal: CUMBAYA, AV. FRANCISCO DE ORELLANA, PORTÓN DE CUMBAYA L49

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 7

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 28/03/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: AV. TARQUI Y LOS LAURELES PUYO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
851117HD		2.00	CADENA ARMADA CON TRAVESAÑOS Y ESLABONES		3817.92	0.00	0.00	0.00	7635.84
860030V		2.00	PIÑONES SUPERIORES		84.35	0.00	0.00	0.00	168.70
860035V		2.00	PIÑÓN EJE SINFIN		96.30	0.00	0.00	0.00	192.60

Información Adicional

emailCliente: jinmarim@hotmail.com, jparedes@repatek.com.ec  
direccionCliente: AV. TARQUI Y LOS LAURELES PUYO  
Teléfono: 0984888822  
Comentarios: DE ACUERDO A OFERTA N 051-22

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8956.80

1,75%  
30%

SUBTOTAL 12%	7997.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7997.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	959.66
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8956.80
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	8956.80
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1600573032001

FACTURA

No. 001-100-000000004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803202301160057303200120011000000000047215852012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2023 12:46:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2803202301160057303200120011000000000047215852012

MUÑOZ VELASTEGUI CARLOS VICENTE

Dirección Matriz: Calle: 9 DE OCTUBRE Número: SN Intersección: 24 DE MAYO

Dirección Sucursal: Calle: 9 DE OCTUBRE Número: SN Intersección: 24 DE MAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1600573032001

Fecha: 28/03/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0001		1.00	CONTROL Y MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA PESADA		819.00	0.00	0.00	0.00	819.00
Información Adicional					SUBTOTAL 12%				819.00
Telefono: 098444708					SUBTOTAL 0%				0.00
Email: amazonasbuilding2009@hotmail.com					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
					SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				819.00
					TOTAL DESCUENTO				0.00
					ICE				0.00
					IVA 12%				98.28
					TOTAL DEVOLUCION IVA				0.00
					IRBPNR				0.00
					PROPINA				0.00
					VALOR TOTAL				917.28
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				0.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	917.28

10 %  
100 %

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1000100899001

FACTURA

No. 001-014-000001518

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703202301100010089900120010140000015180000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/03/2023 09:29:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703202301100010089900120010140000015180000000014

VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL

E/S AZOR

Dirección: LAS PALMAS AV ALBERTO ZAMBRANO S/N VIA PUYO  
Matriz:

Dirección: LAS PALMAS AV ALBERTO ZAMBRANO  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 18917100899001

Fecha: 27/03/2023

Placa / Matricula: ABE4997

Guía

Dirección: BARRIO MIRAFLORES

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	3	3223.78	DIESEL PREMIUM		1.56	1.53	3.09	0.00	5037.16

Información Adicional

m\_Factura: 001-014-000001518  
E\_MAIL: jinns@amazonas.com  
Direccion\_Cliente: BARRIO MIRAFLORES  
Telefono\_Cliente: 0  
Codigo\_Cliente: 66

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5641.62

SUBTOTAL 12%	5037.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5037.16
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	604.46
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5641.62

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	11160.31
AHORRO POR SUBSIDIO. (Incluye IVA cuando corresponda)	5518.69

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1490820317001

FACTURA

No. 001-002-000001058

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202301149082031700120010020000010580000105817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/03/2023 09:22:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202301149082031700120010020000010580000105817

TRANSCARRERA-ROBLES S.A.

TRANSCARRERA-ROBLES S.A.

Dirección Matriz: SOASTI Y RAFAEL RIVADENEIRA

Dirección Sucursal: SOASTI Y RAFAEL RIVADENEIRA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 10/03/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: LUIS MOLINA S/N Y FIDEL RODRIGUEZ

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0100032	0100032	34940.00	TRANSPORTE DE ASFALTO ESM. - PUYO		0.04	0.00	0.00	0.00	1397.60

Información Adicional	
Identificación:	LUIS MOLINA S/N Y FIDEL RODRIGUEZ
email:	yailin.milan@petroleosyservicios.com
Nota:	GUIA 006-041-000109882 PLACA IA10925

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1397.60

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1397.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1397.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1397.60
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

TIENE LOGO

R.U.C.: 1490820317001

FACTURA

No. 001-002-000001060

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1503202301149082031700120010020000010600000106019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/03/2023 08:04:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1503202301149082031700120010020000010600000106019

TRANSCARRERA-ROBLES S.A.

TRANSCARRERA-ROBLES S.A.

Dirección Matriz: SOASTI Y RAFAEL RIVADENEIRA

Dirección Sucursal: SOASTI Y RAFAEL RIVADENEIRA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 15/03/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: LUIS MOLINA S/N Y FIDEL RODRIGUEZ

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0100032	0100032	35930.00	TRANSPORTE DE ASFALTO ESM. 100%		0.04	0.00	0.00	0.00	1437.20

Información Adicional

Nombre: LUIS MOLINA S/N Y FIDEL RODRIGUEZ

email: yaillin.milan@petroleosyservicios.com

Nota: GUIA 006-041-000110135 PLACA PCC6086

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1437.20

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1437.20
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1437.20
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1437.20
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

TIENE LOGO

R.U.C.: 1000100899001

FACTURA

No. 001-014-000001515

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2303202301100010089900120010140000015150000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2023 08:58:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303202301100010089900120010140000015150000000011

VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL

E/S AZOR

Dirección LAS PALMAS AV ALBERTO ZAMBRANO S/N VIA PUYO  
Matriz:

Dirección LAS PALMAS AV ALBERTO ZAMBRANO  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 23/03/2023

Placa / Matrícula: ZZ29999

Guía

Dirección: BARRIO MIRAFLORES

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	3	1000.00	DIESEL PREMIUM		1.56	1.53	3.09	0.00	1562.50

Información Adicional

L\_Factura: 001-014-000001515  
E\_MAIL: jinmarinn@hotmail.com  
Direccion\_Cliente: BARRIO MIRAFLORES  
Telefono\_Cliente: 0  
Codigo\_Cliente: 66

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1750.00

SUBTOTAL 12%	1562.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1562.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	187.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1750.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	3461.87
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1711.87

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1691711648001

FACTURA

No. 001-001-000000046

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203202301169171164800120010010000000461234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/03/2023 17:53:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2203202301169171164800120010010000000461234567818

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOYANSA S.A.

TOYANSA S.A.

Dirección: CESLAO MARIN 275 Y JAVIER VARGAS  
Matriz:

Dirección: Barrio: AMAZONAS Calle: CESLAO MARIN Numero: 275  
Sucursal: Intersección: JAVIER VARGAS.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AMAZONAS BUILDING S.A

Identificación: 1691711648001

Fecha: 22/03/2023

Placa / Matricula:

Guía

001-001-000000046

Dirección: VIA TARQUI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
22104	SERVICIO	1.00	SERVICIO DE TRANSPORTE		6370.40	0.00	0.00	0.00	6370.40

Información Adicional

Observaciones: VIAJES DE TRANSPORTE MES DE DICIEMBRE 2022 \$6370.40

Correo electronico: amazonasbuilding2009@hotmail.com

Agente de Retención: No Resolución 1

Telefono: 0524508800

Dirección: VIA TARQUI

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6370.40

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	6370.40
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6370.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
IRBPNR	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6370.40
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO. (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791282299001

FACTURA

No. 001-016-000001521

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803202301179128229900120010160000015210000099912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/03/2023 12:43:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803202301179128229900120010160000015210000099912

PETROLEOS Y SERVICIOS C.A.

PETROLEOS Y SERVICIOS C.A.

Dirección Matriz: Av. 6 de Diciembre #30-182 y Alpallana

Dirección Sucursal: AV. 6 DE DICIEMBRE #30-182 Y ALPALLANA

Contribuyente Especial 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A

Identificación: 1691710080001

Fecha: 08/03/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
49	49	34940.00	ASFALTO AC OP		0.28	0.00	0.00	0.00	9755.25

**Información Adicional**

Factura\_num\_factura: 000001521

E-MAIL: yaillin.milan@petroleosyservicios.com

Dirección\_Cliente: SEC RODRIGO DE TRIANA SN VIA A PUYO-MADRE TIERRA KM 1.

Teléfono\_Cliente: 032884649

Código\_Cliente: 1524

SUBTOTAL 12%	9755.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9755.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1170.63
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10925.88
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10925.88

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791282299001

FACTURA

No. 001-016-000001528

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


1103202301179128229900120010160000015280000099912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/03/2023 14:33:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1103202301179128229900120010160000015280000099912

PETROLEOS Y SERVICIOS C.A.

PETROLEOS Y SERVICIOS C.A.

Dirección: Av. R. de Triana N°30-182 y Alpullana  
Matriz:

Dirección: AV. 6 DE DICIEMBRE N30-182 Y ALPALLANA  
Sucursal:

Contribuyente Especial 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A

Identificación 1691710080001

Fecha 11/03/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
49	49	35930.00	ASFALTO AC OP		0.28	0.00	0.00	0.00	10031.66

Información Adicional

Numero\_num\_factura: 000001528  
E-MAIL: yaillin.milan@petroleosyservicios.com  
Direccion\_Cliente: SEC RODRIGO DE TRIANA SN VIA A PUYO-MADRE TIERRA KM 1.  
Telefono\_Cliente: 032884549  
Codigo\_Cliente: 1524

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11235.46

SUBTOTAL 12%	10031.66
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10031.66
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1203.80
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11235.46

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792107423001

FACTURA

No. 048-001-000000786

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2103202301179210742300120480010000007861789235817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/03/2023 10:35:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202301179210742300120480010000007861789235817

SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.

SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.

Dirección: SANCHEZ AVILA M3735 Y NINI JL  
Matriz:

Dirección: ALPAYACU Y ALBERTO ZAMBRANO  
Sucursal:

Contribuyente Especial 571

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080003

Fecha: 21/03/2023 Placa / Matricula: Guía

Dirección: AV TAROQUI S/N Y LOS LAURELES PUYO PASTAZA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
33/008171 7/000000	VEHICULO S PESADOS	1.00	POLIZA NUEVA DE SEGUROS		11845.41	0.00	0.00	0.00	11845.41

Información Adicional	
Prima Neta:	11381.16
Super de Bancos:	398.34
Seg.Soc.Campesino:	56.91
Derecho de Emision:	9.00
Prima Total:	13266.86
Forma de Pago:	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Email:	amazonask19@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13266.86

SUBTOTAL 12%	11845.41
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11845.41
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1421.45
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13266.86
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792107423001

FACTURA

No. 048-001-000000787

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2103202301179210742300120480010000007871789235812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/03/2023 10:36:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202301179210742300120480010000007871789235812

SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.

SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.

Dirección: SANCHEZ AVILA MIZAS Y NUNILL  
Matriz:

Dirección: ALPAYACU Y ALBERTO ZAMBRANO  
Sucursal:

Contribuyente Especial 571

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1801710080001

Fecha: 21/03/2023 Placa / Matricula: Guía

Dirección: AV TARQUI SIN Y LOS LAURELES PUYO PASTAZA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
33/008171 8/000000	VEHICULO S PESADOS	1.00	POLIZA NUEVA DE SEGUROS		11845.41	0.00	0.00	0.00	11845.41

Información Adicional	
Prima Neta:	11321.15
Super de Bancos:	392.34
Seg.Soc.Campesino:	56.91
Deracho de Emision:	9.00
Prima Total:	13266.86
Forma de Pago:	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Email:	amiz@19@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13266.86

SUBTOTAL 12%	11845.41
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11845.41
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1421.45
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13266.86
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792107423001

FACTURA

No. 048-001-000000785

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2103202301179210742300120480010000007851789235811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/03/2023 10:34:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202301179210742300120480010000007851789235811

SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.

SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.

Dirección: SANCHEZ AVILA M2735 Y NIJUL  
Matriz:

Dirección: ALPAYACU Y ALBERTO ZAMBRANO  
Sucursal:

Contribuyente Especial 571

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1891710080001

Fecha: 21/03/2023 Placa / Matricula: Guía

Dirección: AV TARQUI 58 Y LOS LAURELES PUYO PASTAZA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
33/0081716/000000	VEHICULOS	1.00	POLIZA NUEVA DE SEGUROS		11845.41	0.00	0.00	0.00	11845.41

Información Adicional	
Prima Neta:	11381.16
Super de Bancos:	398.34
Seg.Soc.Campesino:	56.91
Derecho de Emisión:	9.00
Prima Total:	13266.86
Forma de Pago:	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Email:	amazonas10@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13266.86

SUBTOTAL 12%	11845.41
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11845.41
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1421.45
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13266.86
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

TIENE LOGO

R.U.C.: 1792107423001

FACTURA

No. 048-001-000000675

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0203202301179210742300120480010000006751789235810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/03/2023 12:11:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0203202301179210742300120480010000006751789235810

SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.

SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.

Dirección Matriz: SANCHEZ M. O. L. M. 375 Y M. N. U. U.

Dirección Sucursal: ALPAYACU Y ALBERTO ZAMBRANO

Contribuyente Especial 571

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 02/03/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: AV TARQUI S/N Y LOS LAURELES PUYO PASTAZA

Cod. Principal	Cod. Auxillar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
33/008133 U/NNNNN	VEHICULO S. PESADOS	1,00	POLIZA NUEVA DE SEGUROS		11845.41	0.00	0.00	0.00	11845.41

Información Adicional

Prima Neta:	11381.16
Super de Bancos:	398.34
Seg. Soc. Campesino:	56.91
Reserva de Emisión:	0.00
Prima Total:	13286.86
Forma de Pago:	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Email:	jinmariano@hinetmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13286.86

SUBTOTAL 12%	11845.41
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11845.41
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1421.45
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13266.86

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
IMPORTE POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

TIENE LOGO

R.U.C.: 1792107423001

FACTURA

No. 048-001-000000677

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0203202301179210742300120480010000006771789235811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/03/2023 12:17:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0203202301179210742300120480010000006771789235811

SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.

SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.

Dirección Matriz: SANCHEZ AVILA M2725 Y NNUU

Dirección Sucursal: ALPAYACU Y ALBERTO ZAMBRANO

Contribuyente Especial 571

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 02/03/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: AV TARQUI S/N Y LOS LAURELES PUYO PASTAZA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
33/008134 4/000000	VEHICULO S PESADOS	1.00	POLIZA NUEVA DE SEGUROS		11845.41	0.00	0.00	0.00	11845.41

Información Adicional

Prima Neta:	11381.16
Super de Bancos:	398.34
Seg. Soc. Campesino:	56.91
Costo de Emisión:	0.00
Prima Total:	13286.86
Forma de Pago:	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Email:	jinmarkam@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13286.86

SUBTOTAL 12%	11845.41
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11845.41
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1421.45
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13286.86
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

TIENE LOGO

R.U.C.: 1792107423001

FACTURA

No. 048-001-000000676

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

020320230117921074230012048001000000676179235816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/03/2023 12:14:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0203202301179210742300120480010000006761789235816

SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.

SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.

Dirección: SANchez H OLANO 9375 Y MANU  
Matriz:

Dirección: ALPAYACU Y ALBERTO ZAMBRANO  
Sucursal:

Contribuyente Especial 571

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación 1691710080001

Fecha 02/03/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: AV TARQUI S/N Y LOS LAURELES PUYO PASTAZA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
33/008134 3/000000	VEHICULO S PESADOS	1.00	POLIZA NUEVA DE SEGUROS		11845.41	0.00	0.00	0.00	11845.41

Información Adicional	
Prima Neta:	11381.16
Super de Bancos:	398.34
Seg. Soc. Campesino:	56.91
Transmisión:	✓
Prima Total:	13266.86
Forma de Pago:	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Email:	jinmaria@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13266.86

SUBTOTAL 12%	11845.41
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11845.41
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1421.45
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13266.86

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1701952069001

FACTURA

No. 001-014-000000697

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2003202301170195206900120010140000006970000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/03/2023 08:30:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202301170195206900120010140000006970000000014

FUENTES FLORES MARIA DEL CARMEN

E/S AZOR SHELL

Dirección: AV. PADRE LUIS VACCONE  
Matriz:

Dirección: AV. BARRIO LAS PALMAS, AV. ALBERTO ZAMBRANO  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 20/03/2023 Placa / Matrícula: ZZZ9999 Guía

Dirección: BARRIO MIRAFLORES

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0121	3	928.65	DIESEL PREMIUM		1.56	1.53	3.08	0.00	1451.01

Información Adicional

Numero\_Factura: 001-014-000000697  
E\_MAIL: shellazor.efactura@gmail.com  
Direccion\_Cliente: BARRIO MIRAFLORES  
Telefono\_Cliente: 000  
Codigo\_Cliente: 45848

SUBTOTAL 12%	1451.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1451.01
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	174.12
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1625.13

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1625.13

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 3214.85  
AHORRO POR SUBSIDIO: 1589.72  
(Incluye IVA cuando corresponda)

TIENE LOGO

R.U.C.: 1791282299001

FACTURA

No. 001-006-000831194

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

180320230117912822990012001006000831194000000110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/03/2023 17:41:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



180320230117912822990012001006000831194000000110

PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C A

PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C A

Dirección Matriz: AV 6 DE DICIEMBRE N 30 182 Y ALPALLANA

Dirección Sucursal: AV 6 DE DICIEMBRE N 30 182 Y ALPALLANA

Contribuyente Especial 02239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S A		
Identificación	1691710080001	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	18/03/2023		
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
309	309	35000.00	ASFALTO AC 20 O.P.		0.28	0.00	0.00	0.00	9772.00

Información Adicional	
Ubicación:	SEC RODRIGO DE TRIANA SN Y VÍA PUYO MADR
Teléfono:	2884649
Código Cliente/Petro:	07033478/07033478
Mail Cliente:	ijmarin@pctmail.com
Nombre Estación:	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S A
Número Factura Banco:	26831194
Fecha Despacho:	18/03/2023
Fecha Vencimiento:	03/04/2023
Contribuyente Especial:	RESOLUCION NO. 02239 - 07/05/1996
Punto De Partida:	ESMERALDAS

SUBTOTAL 12%	9772.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9772.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1172.64
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10944.64

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10944.64

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

TIENE LOGO

R.U.C.: 1791282299001

FACTURA

No. 001-016-000001547

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1803202301179128229900120010160000015470000099918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/03/2023 11:58:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1803202301179128229900120010160000015470000099918

PETROLEOS Y SERVICIOS C.A.

PETROLEOS Y SERVICIOS C.A.

Dirección Matriz: Av. Santa Teresita #30-182 y Alpallana

Dirección Sucursal: AV. 6 DE DICIEMBRE #30-182 Y ALPALLANA

Contribuyente Especial 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A  
Identificación: 1691710080001  
Fecha: 18/03/2023 Placa / Matrícula: Guía  
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Desuento	Precio Total
49	49	35920.00	ASFALTO AC OP		0.28	0.00	0.00	0.00	10028.86

Información Adicional  
\_num\_factura: 000001547  
E-MAIL: yailin.milan@petroleosyservicios.com  
Direccion\_Cliente: SEC RODRIGO DE TRIANA SN VIA A PUYO-MADRE TIERRA KM 1.  
Telefono\_Cliente: 032884849  
Codigo\_Cliente: 1524

SUBTOTAL 12%	10028.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10028.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1203.46
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11232.32
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11232.32

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1600232332001

**FACTURA**

No. 001-100-000000003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


1403202301160023233200120011000000000037611051411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/03/2023 16:35:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1403202301160023233200120011000000000037611051411

LASCANO COELLO WASHINGTON EDUARDO

Dirección: Barrio: LA MERCED Calle: SADOG VALLADARES  
Matriz: Intersección: MEDARDO ANGEL SILVA

Dirección: Barrio: LA MERCED Calle: SADOG VALLADARES  
Sucursal: Intersección: MEDARDO ANGEL SILVA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 14/03/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: PUYO AV. TARIQUI Y LOS LAURELES

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		780.00	0.00	0.00	0.00	780.00

Información Adicional	
Teléfono:	0984508890
Email:	Amazo_Building2009@hotmail.com

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	783.80

SUBTOTAL 12%	780.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	780.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	93.80
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	873.80
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1660000170001

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

No. 001-010-000020694

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1703202307166000017000120010100000206941438920216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 29/03/2023 12:40:18

AMBIENTE: ~~PRODUCCIÓN~~

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1703202307166000017000120010100000206941438920216

GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

Dirección Matriz: FCO. DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING S.A.  
Identificación 1691710080001  
Fecha 17/03/2023

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	0011010000000185	14/03/2023	03/2023	23038.42	IVA	100.0	23038.42
FACTURA	0011010000000185	14/03/2023	03/2023	191986.80	Impuesto a la Renta	2.0	3839.74

**Información Adicional**

Información Adicional

Email: jms@amazonas.com  
Dirección: MADRE TIERRA  
Teléfono: 0953326972

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600343295001

FACTURA

No. 002-011-000000128

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


1603202301160034329500120020110000001280000012815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/03/2023 15:09:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202301160034329500120020110000001280000012815

JARAMILLO NARANJO PAUL ALEJANDRO

DEWALT SERVICIO AUTORIZADO JARAMILLO

Dirección Matriz: GENERAL VILLAMIL Y FRANCISCO DE ORELLANA

Dirección Sucursal: FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y GENERAL VILLAMIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING S.A

Identificación: 1691710080001

Fecha: 16/03/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: SD

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		3.00	FILTRO DE AIRE PARA COMPRESOR 1/2 COMP		6.25	0.00	0.00	0.00	18.75

Información Adicional

RÉGIMEN POSITIVO: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

CORREO ELECTRONICO: sincorreo@correo.com

CONTROL: 0301F0000128

VENDEDOR: VENDEDOR 1

FORMA\_PAGO: CONTADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.00

SUBTOTAL 12%	18.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.25
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1600254377001

FACTURA

No. 001-100-00000040

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202301160025437700120011000000000401144145919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/03/2023 14:45:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202301160025437700120011000000000401144145919

TENEMAZA GUAMAN LUIS ALBERTO

Dirección: Calle: LOJA Intersección: CHIMBORAZO  
Matriz:

Dirección: Calle: LOJA Intersección: CHIMBORAZO  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 16/03/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6		1.00	CORTINA ENROLLABLE	CORTINA	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00

Información Adicional

mail: amazonasbuilding2009@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	250.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	250.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	250.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	250.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1702962331001

FACTURA

No. 001-003-000001638

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803202301170296233100120010030000016380000163817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/03/2023 16:19:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803202301170296233100120010030000016380000163817

ROMO PROANO ANGEL ENRIQUE

TODO FIERRO

Dirección: LIBERTAD ARAJUNO S/N Y CURARAY  
Matriz:

Dirección: LIBERTAD ARAJUNO S/N Y CURARAY  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING

Identificación: 1691710080001

Fecha: 08/03/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: AV TARQUI Y LOS LAURE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CHUMP21		2.00	CHUMACERA 210 ISB		28.57	0.00	0.00	0.00	57.14
AP2		2.00	GRAPAS DE 2 PULGADAS		102.68	0.00	0.00	0.00	205.36

Información Adicional

Email: jinmarinm@hotmail.com  
Dirección: AV TARQUI Y LOS LAURE  
cliente: 00000000  
AGENTE DE RETENCION: No.RESOLUCION: 0001

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	294.00

SUBTOTAL 12%	262.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	262.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	31.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	294.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 294.00  
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1702962331001

**FACTURA**

No. 001-003-000001625

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803202301170296233100120010030000016250000162518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/03/2023 11:34:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803202301170296233100120010030000016250000162518

ROMO PROANO ANGEL ENRIQUE

TODO FIERRO

Dirección Matriz: LIBERTAD ARAJUNO S/N Y CURARAY

Dirección Sucursal: LIBERTAD ARAJUNO S/N Y CURARAY

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AMAZONAS BUILDING

Identificación 1691710080001

Fecha 08/03/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: AV TARQUI Y LOS LAURE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
EJECUAD		1.00	EJE CUADRADO		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
PER		6.00	PERNOS VARIOS		5.36	0.00	0.00	0.00	32.14
PIN60BX1 6T		1.00	PINON DE 16 DIENTES PASO 60B		15.18	0.00	0.00	0.00	15.18
CAD60BK ANA		1.00	CADENA N 60 KANA		42.86	0.00	0.00	0.00	42.86

Taller Eléctrico Altamirano  
Altamirano Suarez Oscar Norberto  
Dir.: Calle Roberto de la Torre s/n y José Joaquín de Olmedo  
\* \* Puyo - Pastaza \*\*

NOTA DE VENTA  
001-001-  
00000101

RUC: 1800117715001  
Autorización SRI N° 1131003720

Fecha de Emisión  
15 03 2023  
DÍA MES AÑO

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Sr(es) Amazonas Building Amazonbuild S.A.

Dirección: Puyo, Via Tarqui Telf.:

RUC/CI: 1691710080001 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V./ VENTA
01	Servicios Prestados	865.00	865.00

FORMA DE PAGO  
Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta De Crédito/ Débito  Otras  TOTAL USD 865.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME Original: Adquirente / Copia: Emisor

\*Imp. & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 \*Aut.: 14093 \*RUC:1803599388001\* José Luis Cárdenas Fonseca  
Impreso desde N° 000101 al 000150 Fecha Impresión: 16-02-2023 Válido hasta: 16 de Febrero -/2024

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1891783198001

FACTURA

No. 001-103-000001653

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1503202301189178319800120011030000016530000165314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/03/2023 09:18:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1503202301189178319800120011030000016530000165314

CECFECONSULTORES CL

CECFE

Dirección Matriz: GUAYAQUIL 03-46 Y AV. CEVALLOS

Dirección Sucursal: GUAYAQUIL 03-46 Y AV. CEVALLOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación 1691710080001

Fecha 15/03/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: PASTAZA / PASTAZA / PUYO / LUIS MOLINA S/N Y FIDEL RODRIGUEZ

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		1.00	ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO		703.99	0.00	0.00	0.00	703.99

Información Adicional	
MENIMPOSITIVO:	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
AGENTE RETENCION:	Agente de Retención RESOLUCION No. 1
CORREO ELECTRONICO:	sincorreos@correo.com
CONTROL:	1301E0001653
VENDEDOR:	00001
FORMA_PAGO:	CREDITO
FECHA_VENCIMIENTO:	15/03/2023

SUBTOTAL 12%	703.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	703.99
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	84.48
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	788.47
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE  
**REA SANGOQUIZA JAZMIN PAOLA**  
 VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE  
 WESSIR Y CALZADO. - ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS.  
 Dir.: Luis Molina sn y Vinicio Kubes  
**PUYO - PASTAZA**

RUC: 1600498735001  
**NOTA DE VENTA 001-001-**  
**000000067**  
 AUTORIZACION SRI # 1130953892

Fecha de Emisión: 

DIA	MES	AÑO
14	03	2023

Original: ADQUIRENTE  
 Copia: EMISOR

Cliente: Amazonas Building  
 RUC/C.I.: 1691710080001  
 Dir.: Av. Tarqui

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
01	Servicios Prestados Febrero 2023		340,00

FORMA DE PAGO	EFECTIVO DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS	VALOR TOTAL	340,00
---------------	--------------------------------	--------------------------------------	-------------	--------

  
 Firma Autorizada

Recibí Conforme  
 JESUS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesus del Gran Poder" - Aut. 1105 - Av. Alberto Zambrano Telf: 2885 032  
 (RUC: 0691582935001 - del 0000051 al 0000100 - Fecha Autorización 30-ENERO-2023 - Fecha Caducidad 30-ENERO-2024)

**JACOME RODRIGUEZ JENNY BEATRIZ**

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS

Dir.: E1 24 y Av. 10 de Agosto

QUITO - PICHINCHA

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Fecha de Emisión: 15 03 2023  
DIA MES AÑO

RUC: 1600267494001

**NOTA DE VENTA**

001 - 001 -

0000009

Aut. SRI N°1130794287

Sr.(es): Amazonas Building Amazonbuild S.A

Dirección: Puyo, Vía Tarqui

RUC/CI: 1691710080001 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. / VENTA
01	Servicios Prestados	594,00	594,00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	X

TOTAL \$ 594,00

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Carrión Jenny del Carmen - Calle Cumenda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo - Telef.: 2888-287 - Aut. 3308 - RUC. 1600097692001 - F. Impresión 05/12/2022 del 0000001 al 0000080 - Válido 05/12/2023

  
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Juanito Klover

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE  
**JACOME RODRIGUEZ EDGAR GONZALO**  
 Actividades de servicios diversos  
 Dir.: Av. de la Unidad sn y Agustín Ruales  
 SHELL - PASTAZA

RUC: 1600318826001  
 NOTA DE VENTA 001-001-

Nº 0000082

AUTORIZACIÓN SRI # 1130838836

Fecha de Emisión: 

DIA	MES	AÑO
14	03	2023

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Cliente: Amazonas Building Amazonbuild S.A.

RUC/C.I.: 1691710080001

Dir.: Puyo, Vía Targui

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
01	Servicios Prestados	750,00	750,00

FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> ESECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	VALOR TOTAL	750,00
	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO				



Firma Autorizada

Recibi Conforme

BUS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "El Gran Poder" - Av. 1195 - Av. Alberto Zambrano Tel: 2854 032  
 RUC: 090152238501-del 000079 al 000100 -Fecha Autorización 19-DICIEMBRE-2022-Fecha Caducidad 19-DICIEMBRE-2023

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1802916104001

FACTURA

No. 001-098-000009798

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1403202301180291610400120010980000097980000979817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/03/2023 12:23:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1403202301180291610400120010980000097980000979817

LASCANO SANCHEZ JAVIER SANTIAGO

COMERCIAL LASCANO SANCHEZ

Dirección: CESLAO MARIN S.N.V. MANABI  
Matriz:

Dirección: CESLAO MARIN S.N.V. MANABI  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	AMAZONAS BUILDING		
Identificación:	1691710000001		
Fecha:	14/03/2023	Placa / Matricula:	Guía
Dirección:	PUYO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		1.00	LAVADORA DE ROPA WHIRLPOOL 19KG		446.43	0.00	0.00	0.00	446.43

Información Adicional	
AGENTERETENCION:	Agencias de Retencion Resolucion No. 1
CORREOELECTRONICO:	jinmarin@hotmail.com
CONTROL:	0101E0009798
OBSERVACIONES:	LAS GARANTIAS DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS COMERCIALIZADOS EN ESTE ALMACEN SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS FABRICANTES
VENDEDOR:	10001 VENDEDOR 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	500.00

SUBTOTAL 12%	446.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	446.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	53.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	500.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

J. Marin



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1801662469001

FACTURA

No. 001-002-000000009

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1403202301180166246900120010020000000091234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/03/2023 11:11:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1403202301180166246900120010020000000091234567812

TIRADO MOYA JOSE ANTONIO

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Dirección: TENIENTE HUGO VALENCIA S/N Y 22 DE ENERO  
Matriz:

Dirección: TENIENTE HUGO VALENCIA S/N Y 22 DE ENERO  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 14/03/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: PUYO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001	009	1.00	CONSTRUCCION DE UN ESTRIADO INTERIOR		141.07	0.00	0.00	0.00	141.07

Información Adicional

Dirección: PUYO

Email: jinmarasm@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	158.00

SUBTOTAL 12%	141.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	141.07
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	16.93
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	158.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO. (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0401467592001

FACTURA

No. 001-100-000000004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


140320230104014675920012001100000000049884096616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/03/2023 20:00:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



140320230104014675920012001100000000049884096616

NAULA GUANO WASHINGTON VINICIO

Dirección Matriz: Barrio: LA MONTANA Calle: VIA PUYO BAÑOS Número: S/N

Dirección Sucursal: Barrio: LA MONTANA Calle: VIA PUYO BAÑOS Número: S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 14/03/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: AV TARQUI Y LOS LAURELES

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	POR SERVICIOS PERSONALES PRESTADOS FEBRERO 2023		702.00	0.00	0.00	0.00	702.00

Información Adicional  
Email: jinmarinm@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	786.24

SUBTOTAL 12%	702.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	702.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	84.24
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	786.24
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992211237001

FACTURA

No. 004-002-000022249

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1403202301099221123700120040020000222491234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/03/2023 16:34:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1403202301099221123700120040020000222491234567816

ESLIVE S A

ESLIVE S A

Dirección Matriz: HURTADO 212 y MACHALA

Dirección Sucursal: HURTADO 212 y MACHALA

Contribuyente Especial 00048

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 14/03/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6105AZLG -IX081ARL	6105AZLG -IX081ARL	2.00	FILTRO DE ACEITE DOPU 1000424655-WP10B24D WP12B288	*	14.00	0.00	0.00	0.00	28.00
9317F	FF9317F	2.00	FILTRO COMBUSTIBLE DOPU 1000422384-612600080934 WD615-WP10-WP12-WP13	*	16.35	0.00	0.00	0.00	32.70

Información Adicional

Mail Cliente: jinmarinm@hotmail.com  
Telefono Cliente: NA  
Direccion Cliente: PASTAZA / PASTAZA / PUYO / AV. TARQUI SIN Y LOS LAURELES  
Regimen: NA  
Agente de Retención: NA  
ordenCompra: SIN DATO

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	67.98

SUBTOTAL 12%	60.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.28
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	67.98
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600282295001

FACTURA

No. 001-100-000000005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

140320230116002822950012001100000000053043287817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/03/2023 10:44:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



140320230116002822950012001100000000053043287817

GASPATA CALO EDGAR RAUL

Dirección: Barrio: MARISCAL Calle: AV. ALBERTO ZAMBRANO  
Matriz: Número: S/N Intersección: AMAZONAS

Dirección: Barrio: MARISCAL Calle: AV. ALBERTO ZAMBRANO  
Sucursal: Número: S/N Intersección: AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación 1691710080001

Fecha 14/03/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		25.00	SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2023		60.00	0.00	0.00	0.00	1500.00

Información Adicional

Telefono: 0999813185

Email: Amazo\_Building2009@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1680.00

SUBTOTAL 12%	1500.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1500.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	180.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1680.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1691713381001

FACTURA

No. 001-010-000000050

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


1403202301169171338100120010100000000501234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/03/2023 10:30:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1403202301169171338100120010100000000501234567817

TRANSPORTE PESADO FREIRE CORTEZ S.A

TRANSPORTE PESADO FREIRE CORTEZ S.A

Dirección Matriz: VIA PUYO - TENA LAS AMERICAS

Dirección Sucursal: VIA PUYO - TENA LAS AMERICAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A		
Identificación	1691710080001	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	14/03/2023		
Dirección:	AVENIDA TARQUI		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1001	1001	1.00	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO		1676.40	0.00	0.00	0.00	1676.40

Información Adicional	
Dirección:	AVENIDA TARQUI
Email:	jinmarianm@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - TRANSFERENCIA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1676.40

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1676.40
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1676.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1676.40
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1660000170001

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

No. 001-010-000020705

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1703202307166000017000120010100000207051438920214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 29/03/2023 11:26:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1703202307166000017000120010100000207051438920214

GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

Dirección Matriz: FCO. DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING S.A.  
Identificación 1691710080001  
Fecha 17/03/2023

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	0011010000000784	14/03/2023	03/2023	5968.07	IVA	100.0	5968.07
FACTURA	001101000000084	14/03/2023	03/2023	49733.90	Impuesto a la Renta	1.75	870.34

**Información Adicional**

Información Adicional	
Email:	amazonasbuilding.com
Dirección:	MADRE TIERRA
Teléfono:	0993328972

R.U.C.: 1691710080001

**FACTURA**

No. 001-101-000000094

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**


2106202301169171008000120011010000000940000009410

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:**

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISION:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2106202301169171008000120011010000000940000009410

**AMAZONBUILD SA 2023**

**AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S A**

**Direccion Matriz:**  
BARRIO EL DORADO,AV TARQUI SN Y LOS LAURELES

**Telf.:**  
**E-mail:** jinmarinm@hotmail.com  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**Agente de Retencion RESOLUCION No. 1**

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

**RUC / CI:** 1660000170001

**Fecha Emisión:** 21/06/2023

**Dirección:** FRANCISCO DE ORELLANA 739 Y 27 DE FEBRERO

Codigo	Descripción - Serie	Cant.	Unidad	P.Unitario	Desc.	Valor Total
\SVF-0001	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nº 2	1.00		95,049.92	0.00	95,049.92
\SVF-0001	REAJUSTE (PROVISIONAL) PLANILLA Nº 2	1.00		2,234.33	0.00	2,234.33

**INFORMACION ADICIONAL:**

**Forma de pago:** CREDITO 0 días

**Vendedor:** 00002 JENNY PUNINA

**Observaciones:** PLANILLA DE AVANCE OBRA 2:"ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO,CANTÓN PASTAZA"

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
20 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	108958.36	0	DIAS

<b>SUBTOTAL:</b>	<b>97,284.25</b>
TOTAL DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%:	97,284.25
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUB TOTAL No Objeto IVA:	0.00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:</b>	<b>97,284.25</b>
IVA 12%:	11,674.11
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>108,958.36</b>
