

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**  
**COMPROBANTE DE PAGO N° 52**

Fecha: 19/01/2024

Asiento N° 91

1BCE PRINCIPAL Cta Cte No 01210014

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **AMAZONAS BUILDING S.A.**

**USD 93,845.31**

LA SUMA DE: **NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO Dolares 31/100 CtvS**

PUYO, 19 de Enero del 2024

DETALLE DEL COMPROBANTE:

AMAZONAS BUILDING S.A..-PAGO DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°03 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°03 DEL PROYECTO: ASFALTADO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA. REFERENCIA ASIEN TO DE DIARIO N°5539 DE FECHA 24/11/2023


Usuario: ERIKA


DOCUMENTOS BANCARIOS


| No                             | Beneficiario           | Valor     |
|--------------------------------|------------------------|-----------|
| CTA 4020442268                 | AMAZONAS BUILDING S.A. | 93,845.31 |
| TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD |                        | 93,845.31 |

APLICACION CONTABLE

| Código            | Descripción                                | Debe      | Haber     |
|-------------------|--|-----------|-----------|
| 1.1.2.03.01.001   | ANTICIPO A CONTRATISTAS                    | 93,845.31 |           |
| 1.1.1.03.01.001   | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014 |           | 93,845.31 |
| SUMAN o PASAN USD |  | 93,845.31 | 93,845.31 |

  
LCDO. ANDRÉ GRANDA  
Prefecto Provincial

  
LCDA. MARILU ORDOÑEZ.  
Directora Financiera E.

  
ING. ALEXANDRA POZO  
Jefe De Contabilidad E.

  
ING. GABRIEL SOS  
Tesorero

19/01/2024 8:38

Página 1/1

TPB 15  
19/01/2024

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**COMPROBANTE DE DIARIO N° 47**

Fecha: 25/01/2024

Asiento N° 168

DETALLE DEL COMPROBANTE:

**AMAZONAS BUILDING S.A.. - PAGO Y COBRO ASIENTO N°91 DE FECHA 19/01/2024**

Usuario: ERIKA

**APLICACION CONTABLE**


| Código            | Descripción                        | Debe       | Haber      |
|-------------------|------------------------------------|------------|------------|
| 2.1.3.98.01.001   | CXP PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES  | 93,845.31  |            |
| 2.2.4.98.01.075   | CXP AÑOS ANTERIORES OBRAS PUBLICAS | 93,845.31  |            |
| 1.1.2.03.01.001   | ANTICIPO A CONTRATISTAS            |            | 93,845.31  |
| 2.1.3.98.01.001   | CXP PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES  |            | 93,845.31  |
| SUMAN o PASAN USD |                                    | 187,690.62 | 187,690.62 |

**APLICACION PRESUPUESTARIA**

| Partida Presupuestaria                             | Compromiso | Devengado | Pago      |
|--|------------|-----------|-----------|
| 05.01.D512.519.970101.000.000 DE CUENTAS POR PAGAR | 93,845.31  | 93,845.31 | 93,845.31 |
| TOTAL GASTOS USD                                   | 93,845.31  | 93,845.31 | 93,845.31 |

  
Ing. Alexandra Pozo  
Jefe De Contabilidad

  
Ing. Erika Inmunda  
Contador 1



Orden de Pago Nro. GADPPZ-GADPPZ-2024-1082-GOP

Puyo, 18 de enero de 2024

**PARA:** Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes  
**Directora Financiera (E)**

**ASUNTO:** ORDEN DE PAGO A FAVOR DE AMAZONAS BUILDING S.A.

De mi consideración:

En conformidad con la solicitud orden de pago Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2024-1110-SOLOP del 18 de enero del 2024, considerando que la Dirección Financiera ha realizado el control previo del trámite de la “ **PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 03 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE LA OBRA N° 03 DEL PROYECTO: ASFALTO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA**”, autorizo proceda con el pago en observancia de las disposiciones legales, a favor de **AMAZONAS BUILDING S.A.**, por el valor de 93,845.31 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. André Mauricio Granda Garrido  
**PREFECTO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA**

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Ing. Ariana Estefania Cuji Gualinga - Asistente Administrativo 1 --> Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes - Directora Financiera (E)



Firmado electrónicamente por:  
**ANDRÉ MAURICIO  
GRANDA GARRIDO**

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA****COMPROBANTE DE DIARIO N° 3001**

Fecha: 24/11/2023

Asiento N° 5539

Compromiso N° 1107

Retención N° 001-010-000021651

## DETALLE DEL COMPROBANTE:


AMAZONAS BUILDING S.A..- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°03 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°03 DEL PROYECTO: ASFALTADO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

Usuario: ERIKA

| DOCUMENTOS |           |                            |            |
|------------|-----------|----------------------------|------------|
| Fecha      | Documento | No Autorización            | Valor      |
| 20/11/2023 | FACTURA   | 00110100000010660000010616 | 106,978.88 |

| APLICACION CONTABLE |  |            |            |
|---------------------|--|------------|------------|
| Código              | Descripción                            | Debe       | Haber      |
| 1.1.3.81.01.001     | CUENTAS POR COBRAR IVA                 | 11,462.02  |            |
| 1.5.1.51.05.001     | OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS    | 95,516.86  |            |
| 2.1.3.75.01.001     | CXP OBRAS PUBLICAS                     |            | 93,845.31  |
| 2.1.3.75.01.112     | IMPUESTO A LA RENTA 1.75%              |            | 1,671.55   |
| 2.1.3.81.14.001     | CXP IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI |            | 11,462.02  |
| SUMAN o PASAN USD   |  | 106,978.88 | 106,978.88 |

| APLICACION PRESUPUESTARIA   |            |           |      |
|---|------------|-----------|------|
| Partida Presupuestaria  | Compromiso | Devengado | Pago |
| 05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS |            | 95,516.86 |      |
| TOTAL GASTOS USD  | 0.00       | 95,516.86 | 0.00 |



Ing. Alexandra Pozo  
Jefe De Contabilidad



Ing. Erika Inmunda  
Contador 1

R.U.C.: 1691710080001

**FACTURA**

No. 001-101-000000106

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**

2011202301169171008000120011010000001060000010616

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:**

20/11/2023 16:07:11

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISION:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2011202301169171008000120011010000001060000010616

**AMAZONBUILD SA 2023**

**AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S A**

**Dirección Matriz:**

BARRIO EL DORADO, AV TARQUI SN Y LOS LAURELES

**Telf.:**

**E-mail:** jinmarinm@hotmail.com

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**Agente de Retención RESOLUCION No. 1**

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

**RUC / CI:** 1660000170001

**Fecha Emisión:** 20/11/2023

**Dirección:** FRANCISCO DE ORELLANA 739 Y 27 DE FEBRERO

| Codigo   | Descripción - Serie                  | Cant. | Unidad | P.Unitario | Desc. | Valor Total |
|----------|--------------------------------------|-------|--------|------------|-------|-------------|
| SVF-0001 | PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 03     | 1.00  |        | 93,191.56  | 0.00  | 93,191.56   |
| SVF-0001 | REAJUSTE (PROVISIONAL) PLANILLA N° 3 | 1.00  |        | 2,325.30   | 0.00  | 2,325.30    |

**INFORMACION ADICIONAL:**

**Forma de pago:** CREDITO 0 dias

**Vendedor:** 00002 JENNY PUNINA

**Observaciones:** PLANILLA DE AVANCE OBRA 3:"ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA"

| Forma de Pago                                   | Valor     | Plazo | Tiempo |
|---|-----------|-------|--------|
| 20 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 106978.88 | 0     | DIAS   |




|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>SUBTOTAL:</b>               | <b>95,516.86</b>  |
| TOTAL DESCUENTO:               | 0.00              |
| SUBTOTAL 12%:                  | 95,516.86         |
| SUBTOTAL 0%:                   | 0.00              |
| SUB TOTAL No Objeto IVA:       | 0.00              |
| <b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:</b> | <b>95,516.86</b>  |
| IVA 12%:                       | 11,462.02         |
| <b>VALOR TOTAL:</b>            | <b>106,978.88</b> |

Compromiso

#1107.

com 1107

## GAD PROVINCIAL DE PASTAZA CONTROL PREVIO

| "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY- FRANCISCO DE ORELLANA –<br>JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN<br>PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA" |  | OBRAS PÚBLICAS  |  | FINANCIERO      |          |
|--|--|-----------------|--|-----------------|----------|
| CONTRATISTA:   | AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A  | TIPO DE PROCESO |  | TIPO DE PROCESO |          |
| DOCUMENTO:   | PAGO DE PLANILLA   | CONTRATO        | PLANILLA   | CONTRATO        | PLANILLA |
| CONCEPTO:  | PLANILLA No. 3 DE AVANCE DE OBRA   |                 | X  |                 |          |
| FECHA DEL DOCUMENTO:   | 22 de junio de 2023  |                 | X  |                 |          |
| TIPO DE PROCESO  | LICO-GADPPz-006-2022   |                 | X  |                 |          |
| VALOR LÍQUIDO PLANILLA + REAJUSTE (SIN IVA):   | \$ 95,516.86   | APLICA          |  | APLICA          |          |
| CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  |  | SI              | NO   | SI              | NO       |
| 1  | Requerimiento  |                 |  |                 |          |
| 2  | Estudios del proyecto  |                 |  |                 |          |
| 3  | Informe técnico y económico  |                 |  |                 |          |
| 4  | Factibilidad Ambiental   |                 |  |                 |          |
| 5  | Certificación POA  |                 |  |                 |          |
| 6  | Certificación Presupuestaria   |                 |  |                 |          |
| 7  | Convenio   |                 |  |                 |          |
| 8  | Pliegos del Procedimiento  |                 |  |                 |          |
| 9  | Informe Técnico de Evaluación de Ofertas   |                 |  |                 |          |
| 10   | Resolución de Adjudicación   |                 |  |                 |          |
| 11   | Garantía Original de fiel Cumplimiento del contrato  |                 |  |                 |          |
| 12   | Garantía Original de Buen Uso del Anticipo   |                 |  |                 |          |
| 13   | Certificado de no Adeudar al GADPPz  |                 |  |                 |          |
| 14   | Documentos Personales / Representante Legal  |                 |  |                 |          |
| 15   | Certificación Bancaria   |                 |  |                 |          |
| 16   | Certificado de cumplimiento Tributario (SRI)   | X               |  |                 |          |
| 17   | RUC Actualizado  | X               |  |                 |          |
| 18   | Contrato original y disposición escrita de trabajo (proceso completo)  | X               |  |                 |          |
|  | Planilla de Reajuste de precios del Anticipo   |                 | X  |                 |          |
| 19   | Orden de Inicio de Trabajos  | X               |  |                 |          |
| 20   | Planilla de obra con informe de Fiscalización  | X               |  | /               |          |
| 21   | Anexos de Obra   | X               |  | /               |          |
| 22   | Cuadro de Diferencia de Cantidades   |                 | X  | /               |          |
| 23   | Conformidad Ambiental  | X               |  | /               |          |
| 24   | Informe de avance de Obra de Administrador de contrato   | X               |  | /               |          |
| 25   | Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales ( IESS) Planilla  | X               |  | /               |          |
| 26   | Certificado de no ser obra nueva   |                 | X  |                 |          |
| 27   | Multa  |                 | X  |                 |          |
| 28   | Autorizacion de la máxima Autoridad para prórroga de Plazos  |                 | X  |                 |          |
| 29   | Autorizacion de la máxima Autoridad para Rubros Nuevos   |                 | X  |                 |          |
| 30   | Certificado que no es obra nueva   |                 | X  |                 |          |
| 31   | Solicitud de recepción de Obra   |                 | X  |                 |          |
| 32   | Solicitud de pago del Administrador del Contrato   | X               |  | /               |          |
| 33   | Solicitud de pago del Director de la Unidad al Financiero  | X               |  | /               |          |
| 34   | Factura/Nota de Venta  | X               |  | /               |          |
| 35   | Validación de la factura/Nota de Venta   |                 |  | /               |          |
| 36   | Acta de repesion provisional   |                 |  |                 |          |
| <b>OBSERVACIONES:</b>  |  |                 |  |                 |          |
| Revisado por:  | <br><small>Identificado electrónicamente por:</small><br><b>ERYKA MIREYA SILVA MANZANO</b><br><br><b>ING. ERYKA SILVA M.</b><br><b>ADMINISTRADOR DE LA OBRA</b><br><b>DEPARTAMENTO</b><br><b>SOLICITANTE DEL TRAMITE</b> |                 | <br><small>Identificado electrónicamente por:</small><br><b>MERCY JOHANNA QUISHPI CUENCA</b><br><b>DEPARTAMENTO</b><br><b>FINANCIERO</b> |                 |          |



# ESTADO DE TRANSFERENCIA

GENERADO POR: SOSA ESPINEL GABRIEL ALEJANDRO  
Fecha: 22/01/2024 08:45:53

Producto: SISTEMA SERVICIO DE PAGOS  
Identificación Beneficiario: 1691710080001

Fecha Inicio: 18/01/2024  
Fecha Fin: 22/01/2024

Cuenta Ordenante: 1210014

| # REF. BCE   | # CUENTA ORDENANTE | INSTITUCIÓN ORDENANTE | INSTITUCIÓN FINANCIERA | # CUENTA BENEFICIARIO | MONTO     | IDENTIFICADOR DEL BENEFICIARIO | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | TIPO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO | FECHA DEL PROCESO DE LA EFI | ESTADO    | OBSERVACIÓN                |   |
|--------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------|---|
| 19442468     | 1210014            | GAD PROV PASTAZA      | BANEQUADOR B.P.        | 4020442268            | 93,845.31 | 1691710080001                  | AMAZONAS BUILDING S.A.  | 02                              | 22/01/2024 08:23:11         | AFFECTADA | OPI ACREDITADA             |   |
| MONTO TOTAL: |                    |                       |                        |                       |           |                                |                         |                                 |                             | 93,845.31 | TOTAL NÚMERO DE REGISTROS: | 1 |



RUC: 1660000170001

COMPROBANTE DE RETENCION

Nº 001-010-000021651

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2411202307166000017000120010100000216511438935211

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

30/11/2023 11:59:05

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2411202307166000017000120010100000216511438935211

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA

Dirección: Francisco de Orellana y 27 de Febrero

Teléfono: 032885380 / Fax: 032886179

E-mail: financiero@pastaza.gob.ec

Web: www.pastaza.gob.ec

Contribuyente Especial: 590

Razon Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING S.A.

RUC/CI: 1691710080001

Fecha Emisión: 24 de Noviembre del 2023

Guía de Remisión:

| Número de Documento | Cód. SRI | Descrip. Reten.             | % Reten. | Base Retención | Valor Retenido |
|---------------------|----------|-----------------------------|----------|----------------|----------------|
| 001-101-000000106   | 346      | 1.75% IMPUESTO A LA RENTA   | 1.75     | 95,516.86      | 1,671.55       |
| 001-101-000000106   | 731      | 100% SRI RESOLUCION 074 075 | 100.00   | 11,462.02      | 11,462.02      |
|                     |          |                             |          | Total          | 13,133.57      |

Información Adicional:

Dirección:

Teléfono:



**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5609-M**

**Puyo, 29 de junio de 2023**

**PARA:** Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes  
**Directora Financiera (E)**

**ASUNTO:** TRÁMITE DE PAGO DE LA PLANILLA DE OBRA AVANCE 3 DEL PROYECTO:  
"ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY FRANCISCO DE ORELLANA -  
JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO,  
CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA"

En referencia a los documentos: KEYOFICIO-031-2023, de fecha 18 de mayo de 2023, suscrito por la ingeniera Jessica Jaramillo – Gerente General KEYSZEN S.A.S; Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD VIAL-2023-7590-M y Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5566-M, de fechas 22 de mayo de 2023 y 23 de junio de 2023 respectivamente, suscritos por la ingeniera Eryka Silva – Subdirectora de Fiscalización (Administrador de Contrato), hago hincapié lo siguiente:

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado 408-17 Administrador del contrato, que indica: *"El administrador del contrato velará porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegación y supervisión de esas tareas, la comunicación constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicación de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de sí para lograr el éxito del proyecto.- Es función del administrador del contrato establecer un sistema que evalúe el logro de los objetivos, mediante el cual pueda obtenerse información sobre su estado. Esto con el fin de tomar oportunamente acciones correctivas o para informar a las autoridades de la entidad sobre el desarrollo del proyecto"*

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado 408-18 Jefe de Fiscalización, indica: *"El Jefe de Fiscalización establecerá un sistema para asegurar la correcta ejecución de la obra, mediante el control de la calidad, el avance físico y el avance financiero de la obra. Dichos controles conllevan una evaluación mensual, de los aspectos mencionados y la comunicación de resultados a los mandos superiores, incluyendo los problemas surgidos, especialmente cuando afectan las condiciones pactadas en relación al plazo, presupuesto y calidad de la obra.- El Jefe de Fiscalización, se asegurará de que la obra se ejecute de conformidad con las bases establecidas en los estudios de preinversión, es decir, de acuerdo con el diseño definitivo, las especificaciones y demás normas técnicas aplicables, para lograr obtener del proyecto los beneficios esperados"*.

Con estos antecedentes, adjunto al presente la Planilla de Avance N° 3 (con todos los anexos), del proyecto "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA", documentación que ha sido revisada y aprobada por el Administrador de Contrato y Fiscalizador Externo; por lo que, en base a los informes anexos, se determina como viable y procedente realizar el pago de \$ 95.516,86 USD (NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISÉIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 86/100), a favor de AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD, S.A de acuerdo al siguiente

**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5609-M**

**Puyo, 29 de junio de 2023**

detalle:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| PLANILLA DE AVANCE N° 03            | \$ 93.191,56 USD |
| REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA N° 03 | \$ 2.325,30 USD  |
| VALOR TOTAL                         | \$ 95.516,86 USD |

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

**Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas  
DIRECTOR DE FISCALIZACION**

Referencias:

- GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5566-M

Anexos:

- check\_list\_tramites\_de\_pago\_3-signed.pdf
- informe\_adm\_obra\_avance\_3\_correg-signed.pdf
- planta\_y\_perfil\_lamina\_02\_curaray.pdf
- planta\_y\_perfil\_lamina\_01\_jatunpaccha.pdf
- planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no.\_03.pdf
- memo\_de\_pago\_planilla\_de\_avance\_no.\_03.pdf
- secciones\_lamina\_02\_curaray.pdf
- anexo\_rubro\_17.pdf
- anexo\_rubro\_18.pdf
- anexo\_rubro\_21.pdf
- anexo\_rubro\_22.pdf
- anexo\_rubro\_23.pdf
- anexo\_rubro\_39.pdf
- cronograma\_valorado\_de\_trabajo0874146001684765667.pdf
- informe\_mensual\_de\_avance\_obra\_no.\_03.pdf
- anexo\_rubro\_19.pdf
- 03.of\_correccion\_de\_planilla\_3.pdf
- anexo\_rubro\_04\_justificativo.pdf
- anexo\_rubro\_04.pdf
- anexo\_rubro\_17\_justificativo.pdf
- 01.ofi\_entrega\_planilla\_3\_jatunpaccha.pdf
- informe\_adm\_obra\_avance\_3-signed.pdf
- anexo\_rubro\_02.pdf
- anexo\_rubro\_01.pdf
- 31\_oficio\_planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no.\_03.pdf
- memorando\_nro.\_gadppz-unidad-vial-2023-7590-m.pdf
- secciones\_lamina\_01\_jatunpaccha.pdf
- reajuste\_de\_precios\_planilla\_03.pdf
- 29\_oficio\_devolucion\_de\_planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no.\_03.pdf
- memorando\_nro.\_gadppz-fiscalizacion-2023-5566-m.pdf



**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5609-M**

**Puyo, 29 de junio de 2023**

Copia:

Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - **Secretaria Ejecutiva 2 /**

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - Secretaria Ejecutiva 2

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA



Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL

Pastaza

**29 JUN 23**

Fecha:

Ejecutar el control previo y efectuar  
La contabilización, conforme leyes y  
Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA



Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL

Pastaza

**29 JUN 2023**

Fecha:

Ejecutar el control previo al pago  
Conforme leyes y reglamentos  
Vigentes.

175% = 1671,5511

Ant = 0

Benef = 93.845,3111



Firmado electrónicamente por:  
JAIRO FERNANDO  
LEDESMA BASTIDAS

113-7



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DIEZ DE AGOSTO

Registro Oficial 193-viernes 27 de octubre del 2000  
DIEZ DE AGOSTO – PASTAZA - ECUADOR



|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA |                    |
| Recibido:                      | <i>AN</i>          |
| Fecha:                         | <b>06 ABR 2023</b> |
| HORA:                          | <i>12:59</i>       |
| NÚMERO:                        | <i>16819-E</i>     |

Diez de Agosto, 06 de abril del 2023.  
Oficio N.- 121-GADPRD-A-2023.

Ingeniero.  
Jaime Guevara  
**PREFECTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA.**  
Presente.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo en representación y a nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Diez de Agosto, a su vez deseándole éxitos en sus delicadas funciones a usted encomendadas.

Estimado Prefecto, mediante el presente queremos poner en conocimiento a usted que el día de ayer se realizó un recorrido en los trabajos del Proyecto de ASFALTO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA, donde me manifiestan los señores operadores de la empresa constructora que el asfalto solo va a llegar hasta la abscisa 3.308 que hasta ahí queda por terminado faltando 140 metros aproximados para llegar al puente de la comunidad Jatun Paccha.

Manifiestar el pedido de los moradores y dirigentes de la comunidad Jatun Paccha perteneciente a la parroquia Diez de Agosto solicitan muy comedidamente se vea una solución para que el asfalto llegue hasta el puente de la comunidad que va a beneficiar a todos los moradores teniendo carreteras de primera.

Con la seguridad de tener una respuesta favorable a esta petición, me despido, no sin antes reiterarle mis sentimientos de alta consideración y estima.

Atentamente,

Sr. Wellington Vásquez  
C.I.1200567053.  
**PRESIDENTE DEL GADPR-DIEZ DE AGOSTO**



*MR. CORP PRECISE INFORMED TECHNICO PARA SELECCION INTERNE CONTRATA DE ASFALTO. 2023-04-06*

*21*

Diez de Agosto  
Pastaza - Ecuador  
Km. 10 vía Puyo - Arajuno  
Tlf: (03) 3031-078/ (03) 3030- 853  
Website: www.gad10deagosto.gob.ec  
Email: gadpr10deagosto@gmail.com



**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5566-M**

**Puyo, 23 de junio de 2023**

**PARA:** Sr. Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas  
**Director de Fiscalización**

**ASUNTO:** CORRECCIÓN A LA PLANILLA DE OBRA AVANCE 3: "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA"

En calidad de Administradora de contrato, tengo a bien presentar las correcciones de la Planilla de Avance N° 03 del proyecto: **"ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**,

Particular que comunico para continuar con el trámite pertinente correspondiente al pago.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Eryka Mireya Silva Manzano  
**SUBDIRECTOR DE FISCALIZACION**

Referencias:

- GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5423-M

Anexos:

- 29\_oficio\_devolucion\_de\_planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no.\_03.pdf
- reajuste\_de\_precios\_planilla\_03.pdf
- secciones\_lamina\_01\_jatunpaccha.pdf
- memorando\_nro.\_gadppz-unidad-vial-2023-7590-m.pdf
- 31\_oficio\_planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no.\_03.pdf
- anexo\_rubro\_01.pdf
- anexo\_rubro\_02.pdf
- informe\_adm.\_obra\_avance\_3-signed.pdf
- 01.ofi.\_entrega\_planilla\_3\_jatunpaccha.pdf
- anexo\_rubro\_17\_justificativo.pdf
- anexo\_rubro\_04.pdf
- anexo\_rubro\_04\_justificativo.pdf
- 03.of.\_correccion\_de\_planilla\_3.pdf
- anexo\_rubro\_19.pdf
- informe\_mensual\_de\_avance\_obra\_no.\_03.pdf
- cronograma\_valorado\_de\_trabajo0874146001684765667.pdf
- anexo\_rubro\_39.pdf
- anexo\_rubro\_23.pdf
- anexo\_rubro\_22.pdf

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN



Pastaza  
Fecha:

**23 JUN 2023**

Recibido: EM

Número: 5566 Hora: 18:25

**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5423-M**

**Puyo, 09 de junio de 2023**

**PARA:** Sr. Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas  
**Director de Fiscalización**

**ASUNTO:** CORRECCIÓN A LA PLANILLA DE OBRA AVANCE 3: "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA"

En respuesta al Documento No. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2023-7590-M, tengo a bien presentar las correcciones de la Planilla de Avance N° 03 del proyecto: "ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA",

Particular que comunico para continuar con el trámite pertinente correspondiente al pago.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Eryka Mireya Silva Manzano  
**SUBDIRECTOR DE FISCALIZACION**

Referencias:

- GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5330-M

Anexos:

- 29\_oficio\_devolucion\_de\_planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no.\_03.pdf
- secciones\_lamina\_01\_jatunpaccha.pdf
- reajuste\_de\_precios\_planilla\_03.pdf
- planta\_y\_perfil\_lamina\_02\_curaray.pdf
- planta\_y\_perfil\_lamina\_01\_jatunpaccha.pdf
- planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no.\_03.pdf
- memo\_de\_pago\_planilla\_de\_avance\_no.\_03.pdf
- secciones\_lamina\_02\_curaray.pdf
- anexo\_rubro\_17.pdf
- anexo\_rubro\_18.pdf
- anexo\_rubro\_21.pdf
- anexo\_rubro\_22.pdf
- anexo\_rubro\_23.pdf
- anexo\_rubro\_39.pdf
- cronograma\_valorado\_de\_trabajo0874146001684765667.pdf
- informe\_mensual\_de\_avance\_obra\_no.\_03.pdf
- anexo\_rubro\_19.pdf
- 03.of\_correccion\_de\_planilla\_3.pdf
- anexo\_rubro\_04\_justificativo.pdf
- anexo\_rubro\_04.pdf

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA



DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Pastaza  
Fecha:

09 JUN 2023

Recibido:

SOMERO M

Número:

Hora: 08h36



**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5423-M**

**Puyo, 09 de junio de 2023**

- anexo\_rubro\_17\_justificativo.pdf
- 01\_ofi.\_entrega\_planilla\_3\_jatunpaccha.pdf
- informe\_adm.\_obra\_avance\_3-signed.pdf
- anexo\_rubro\_02.pdf
- anexo\_rubro\_01.pdf
- 31\_oficio\_planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no.\_03.pdf
- memorando\_nro.\_gadppz-unidad-vial-2023-7590-m.pdf
- informe\_adm.\_obra\_avance\_3\_correg-signed.pdf



Firmado electrónicamente por:  
**ERYKA MIREYA SILVA  
MANZANO**

## INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRA

PLANILLA No. 3 DE AVANCE DE OBRA  
Período de Ejecución: 01/04/2023 al 30/04/2023

### A) ANTECEDENTES:

Con fecha 07 de noviembre de 2022, el GAD Provincial de Pastaza suscribe con la CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A., el contrato para la ejecución de la obra: "ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Mediante RESOLUCIÓN N° 713-GADPPz-2022, Art 2.- DESIGNAR a la Ing. Eryka Mireya Silva Manzano, como Administradora del contrato de la Obra: "ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

### B) DATOS GENERALES:

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Código del proceso de contratación: | <b>LICO-GADPPz-006-2022</b>   |
| Objeto del contrato:                | "ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA". |
| Monto del contrato:                 | \$ 4,650,521.23USD sin incluir IVA  |
| Fecha del contrato                  | 07 de noviembre del 2022  |
| Monto del anticipo:                 | -   |
| Fecha de inicio de plazo:           | 25 de enero del 2023  |
| Fecha de terminación contractual:   | 18 de julio de 2024   |
| Contratista:                        | AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A   |
| Administrador de Contrato:          | Ing. Eryka Silva M.   |

### C) PLAZOS Y AVANCE

#### C.1 PLAZO DEL CONTRATO

Plazo total inicial: 540 días.

## C.2 AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA DE LA PLANILLA

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Fecha de aprobación:          |  |
| Días de ampliación aprobados: |  |
| Motivación:                   |  |

## C.3 PARALIZACIONES EN EL MES A PLANILLAR

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Fecha de suspensión: | NINGUNA |
| Fecha de reinicio:   | NINGUNA |

## C.4 REPROGRAMACIONES

| No. | Fecha            | Motivación                         |
|-----|------------------|------------------------------------|
| 1   | 25 de enero 2023 | Reprogramado a la fecha de inicio. |
| 2   |                  |                                    |

## C.5 CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

| No. | Fecha de suscripción | Código de contrato | Monto | Motivación |
|-----|----------------------|--------------------|-------|------------|
| 1   | NINGUNA              |                    | 0.00  |            |

## D) DESARROLLO DEL PLANILLAJE

PLANILLA: MONTO LÍQUIDO A PAGAR: ANTICIPO DEVENGADO:

|                         |                     |            |
|-------------------------|---------------------|------------|
| PLANILLA 3              | \$ 93.191,56        | USD        |
| REAJUSTE PROV. AVANCE 3 | 2.325,30            | USD        |
| <b>TOTAL</b>            | <b>\$ 95.516,86</b> | <b>USD</b> |

|   |               |
|---|---------------|
| MONTO DE AVANCE 3 ECONÓMICO TOTAL:              | \$ 93.191,56  |
| MONTO REAJUSTE PROV. AVANCE 3                   | 2.325,30      |
| TOTAL, ANTICIPO DEVENGADO:                      |               |
| % DE AVANCE TOTAL:                              | % <b>6,96</b> |
| MULTA PLANILLA 3:                               | \$ 0,00       |
| TOTAL MULTAS:                                   | \$ 0,00       |
| VALOR LÍQUIDO A PAGAR EN ESTA PLANILLA:         | \$ 95.516,86  |
| (VALOR TOTAL - MULTA - % DE ANTICIPO DEVENGADO) |               |

## E) ANÁLISIS DEL PERÍODO DE PLANILLAJE

### E.1 ANÁLISIS DE PLANILLAJE

| ÍTEM | PARÁMETRO DE CUMPLIMIENTO                    | SI | NO | OBSERVACIONES |
|------|--|----|----|---------------|
| A    | Avance de obra de acuerdo al cronograma      | X  |    |               |
| B    | Retardo parcial en el período de la planilla |    | X  |               |
| C    | Disposiciones del Administrador              | X  |    |               |
| D    | Disposiciones del Fiscalizador               | X  |    |               |
| E    | Cumplimiento de especificaciones técnicas    | X  |    |               |
| F    | Utilización de maquinaria ofertada           | X  |    |               |
| G    | Asistencia a las reuniones                   | X  |    |               |
| H    | Asistencia del personal ofertado             | X  |    |               |

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| I | Obstaculización de trabajos a otros contratistas o al contratante |   | X |  |
| J | Demora en la presentación de planillas a Fiscalización            |   | X |  |
| K | Normativa de Seguridad Industrial y Seguro Ocupacional            | X |   |  |
| L | Normativa de Manejo Ambiental                                     | X |   |  |

## E.2 ANÁLISIS DE MULTAS (del periodo planillado)

| ÍTEM   | DETALLE DEL OBJETO DE SANCIÓN | MONTO BASE PARA CÁLCULO | % | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | No. DE DÍAS | VALOR DE LA MULTA |
|--|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------|------------------|-------------|-------------------|
| A  |                               |                         |   |                 |                  |             |                   |
| B  |                               |                         |   |                 |                  |             |                   |
| C  |                               |                         |   |                 |                  |             |                   |
| D  |                               |                         |   |                 |                  |             |                   |
| TOTAL DE MULTAS EN ESTE PERÍODO DE PLANILLAJE: |                               |                         |   |                 |                  |             |                   |

## F) CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN

|  |           |
|--|-----------|
| GARANTÍA DE BUEN USO DEL ANTICIPO          | VIGENTE   |
| GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | VIGENTE   |
| SEGURO SOCIAL                              | SI CUMPLE |

En virtud del presente informe y en calidad de Administrador de Obra, **SE APRUEBA Y SE SOLICITA** se proceda con el pago de la **Planilla de Avance de Obra No.3**, con el siguiente detalle.

|   |              |
|---|--------------|
| PORCENTAJE DE AVANCE PARCIAL EN ESTE PERÍODO        | 2,00 %       |
| PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO                      | 6,96 %       |
| VALOR TOTAL DE LA PRESENTE PLANILLA AVANCE 3        | \$ 93.191,56 |
| VALOR TOTAL DE REAJUSTE PROV. AVANCE 3              | \$ 2.325,30  |
| DEVENGACIÓN DEL ANTICIPO EN ESTE PERÍODO            | -            |
| DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTAS PARA ESTA PLANILLA | \$0.00       |
| VALOR LIQUIDO A PAGAR:                              | \$ 95.516,86 |

SON: noventa y cinco mil quinientos dieciséis 86/100 centavos de dólar.

TODAS LAS RETENCIONES TRIBUTARIAS SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL GADPPz.

Att,



Ing. Eryka Silva M.  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**



## INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRA

**PLANILLA No. 3 DE AVANCE DE OBRA**  
Período de Ejecución: 01/04/2023 al 30/04/2023

### A) ANTECEDENTES:

Con fecha 07 de noviembre de 2022, el GAD Provincial de Pastaza suscribe con la CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A., el contrato para la ejecución de la obra: "ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Mediante RESOLUCIÓN N° 713-GADPPz-2022, Art 2.- DESIGNAR a la Ing. Eryka Mireya Silva Manzano, como Administradora del contrato de la Obra: "ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

### B) DATOS GENERALES:

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Código del proceso de contratación: | LICO-GADPPz-006-2022 ✓  |
| Objeto del contrato:                | "ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA". ✓ |
| Monto del contrato:                 | \$ 4,650,521.23USD sin incluir IVA ✓  |
| Fecha del contrato                  | 07 de noviembre del 2022 ✓  |
| Monto del anticipo:                 | -   |
| Fecha de inicio de plazo:           | 25 de enero del 2023 ✓  |
| Fecha de terminación contractual:   | 18 de julio de 2024 ✓   |
| Contratista:                        | AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A ✓   |
| Administrador de Contrato:          | Ing. Eryka Silva M. ✓   |

### C) PLAZOS Y AVANCE

#### C.1 PLAZO DEL CONTRATO

Plazo total inicial: 540 días.

### C.2 AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA DE LA PLANILLA

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Fecha de aprobación:          |  |
| Días de ampliación aprobados: |  |
| Motivación:                   |  |

### C.3 PARALIZACIONES EN EL MES A PLANILLAR

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Fecha de suspensión: | NINGUNA |
| Fecha de reinicio:   | NINGUNA |

### C.4 REPROGRAMACIONES

| No. | Fecha            | Motivación                         |
|-----|------------------|------------------------------------|
| 1   | 25 de enero 2023 | Reprogramado a la fecha de inicio. |
| 2   |                  |                                    |

### C.5 CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

| No. | Fecha de suscripción | Código de contrato | Monto | Motivación |
|-----|----------------------|--------------------|-------|------------|
| 1   | NINGUNA              |                    | 0.00  |            |

### D) DESARROLLO DEL PLANILLAJE

PLANILLA: MONTO LÍQUIDO A PAGAR: ANTICIPO DEVENGADO:

PLANILLA 3 \$ 93.191,56 USD  
 REAJUSTE PROV. AVANCE 3 2.225,30 USB

**TOTAL \$ 97.284,25 USD**

MONTO DE AVANCE 3 ECONÓMICO TOTAL: \$ 93.191,56 ✓

MONTO REAJUSTE PROV. AVANCE 3 2.325,30

TOTAL, ANTICIPO DEVENGADO:

% DE AVANCE TOTAL: % 6,96

MULTA PLANILLA 3: \$ 0,00

TOTAL MULTAS: \$ 0,00

VALOR LÍQUIDO A PAGAR EN ESTA PLANILLA: \$ 95.516,86

(VALOR TOTAL - MULTA - % DE ANTICIPO DEVENGADO)

### E) ANÁLISIS DEL PERÍODO DE PLANILLAJE

#### E.1 ANÁLISIS DE PLANILLAJE

| ÍTEM | PARÁMETRO DE CUMPLIMIENTO                    | SI | NO | OBSERVACIONES |
|------|--|----|----|---------------|
| A    | Avance de obra de acuerdo al cronograma      | X  |    |               |
| B    | Retardo parcial en el período de la planilla |    | X  |               |
| C    | Disposiciones del Administrador              | X  |    |               |
| D    | Disposiciones del Fiscalizador               | X  |    |               |
| E    | Cumplimiento de especificaciones técnicas    | X  |    |               |
| F    | Utilización de maquinaria ofertada           | X  |    |               |
| G    | Asistencia a las reuniones                   | X  |    |               |
| H    | Asistencia del personal ofertado             | X  |    |               |



|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| I | Obstaculización de trabajos a otros contratistas o al contratante |   | X |  |
| J | Demora en la presentación de planillas a Fiscalización            |   | X |  |
| K | Normativa de Seguridad Industrial y Seguro Ocupacional            | X |   |  |
| L | Normativa de Manejo Ambiental                                     | X |   |  |

E.2 ANÁLISIS DE MULTAS (del periodo planillado)

| ÍTEM   | DETALLE DEL OBJETO DE SANCIÓN | MONTO BASE PARA CÁLCULO | % | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | No. DE DÍAS | VALOR DE LA MULTA |
|--|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------|------------------|-------------|-------------------|
| A  |                               |                         |   |                 |                  |             |                   |
| B  |                               |                         |   |                 |                  |             |                   |
| C  |                               |                         |   |                 |                  |             |                   |
| D  |                               |                         |   |                 |                  |             |                   |
| TOTAL DE MULTAS EN ESTE PERÍODO DE PLANILLAJE: |                               |                         |   |                 |                  |             |                   |

F) CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN

|  |           |
|--|-----------|
| GARANTÍA DE BUEN USO DEL ANTICIPO          | VIGENTE   |
| GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | VIGENTE   |
| SEGURO SOCIAL                              | SI CUMPLE |

En virtud del presente informe y en calidad de Administrador de Obra, **SE APRUEBA Y SE SOLICITA** se proceda con el pago de la **Planilla de Avance de Obra No.2**, con el siguiente detalle.

|   |              |
|---|--------------|
| PORCENTAJE DE AVANCE PARCIAL EN ESTE PERÍODO        | 2,00 %       |
| PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO                      | 6,96 %       |
| VALOR TOTAL DE LA PRESENTE PLANILLA AVANCE 3        | \$ 93.191,56 |
| VALOR TOTAL DE REAJUSTE PROV. AVANCE 3              | \$ 2.325,30  |
| DEVENGACIÓN DEL ANTICIPO EN ESTE PERÍODO            | -            |
| DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTAS PARA ESTA PLANILLA | \$0.00       |
| VALOR LIQUIDO A PAGAR:                              | \$ 95.516,86 |

SON: noventa y cinco mil quinientos dieciséis 86/100 centavos de dólar.

TODAS LAS RETENCIONES TRIBUTARIAS SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL GADPPz.

Att,



Ing. Eryka Silva M.  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**

**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5330-M**

**Puyo, 31 de mayo de 2023**

**PARA:** Sra. Ing. Eryka Mireya Silva Manzano  
**Subdirector de Fiscalización**

**ASUNTO:** OBSERVACIÓN A LA PLANILLA DE OBRA AVANCE 3: "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA"

En relación al Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2023-7590-M, de fecha 22 de mayo de 2023, se procede a devolver el trámite de la Planilla de Avance N° 03 del proyecto: **"ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**, una vez que se ha realizado el control a la documentación, se ha encontrado la siguiente observación:

1. Observación en informe del Administrador de Contrato
2. Observaciones formato y legalización de libro de obra.
3. Documentación IESS (desglose de personal empleado).

Con estos antecedentes, se solicita subsanar el hallazgo encontrado, con el fin de dar continuidad al trámite administrativo pertinente; **adicional aquello, toda información deberá ser anexada en el Sistema de Gestión Documental Yasuni Quipux y de forma física.**

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas  
**DIRECTOR DE FISCALIZACION**

Referencias:

- GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2023-7590-M

Anexos:

- 29\_oficio\_devolucion\_de\_planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no.\_03.pdf
- 31\_oficio\_planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no.\_03.pdf
- anexo\_rubro\_01.pdf
- anexo\_rubro\_02.pdf
- informe\_adm.\_obra\_avance\_3-signed.pdf
- 01.ofi.\_entrega\_planilla\_3\_jatunpaccha.pdf
- anexo\_rubro\_17\_justificativo.pdf
- anexo\_rubro\_04.pdf
- anexo\_rubro\_04\_justificativo.pdf
- 03.of.\_correccion\_de\_planilla\_3.pdf
- anexo\_rubro\_19.pdf

**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5330-M**

**Puyo, 31 de mayo de 2023**

- informe\_mensual\_de\_avance\_obra\_no.\_03.pdf
- cronograma\_valorado\_de\_trabajo0874146001684765667.pdf
- anexo\_rubro\_39.pdf
- anexo\_rubro\_23.pdf
- anexo\_rubro\_22.pdf
- anexo\_rubro\_21.pdf
- anexo\_rubro\_18.pdf
- anexo\_rubro\_17.pdf
- secciones\_lamina\_02\_curaray.pdf
- memo\_de\_pago\_planilla\_de\_avance\_no.\_03.pdf
- planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no.\_03.pdf
- planta\_y\_perfil\_lamina\_01\_jatunpaccha.pdf
- planta\_y\_perfil\_lamina\_02\_curaray.pdf
- reajuste\_de\_precios\_planilla\_03.pdf
- secciones\_lamina\_01\_jatunpaccha.pdf
- memorando\_nro.\_gadppz-unidad-vial-2023-7590-m.pdf

Copia:

Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - **Secretaria Ejecutiva 2** /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - Secretaria Ejecutiva 2



Firmado electrónicamente por:  
**JAIR FERNANDO  
LEDESMA BASTIDAS**

Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2023-7590-M

Puyo, 22 de mayo de 2023

**PARA:** Sr. Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas  
**Director de Fiscalización**

**ASUNTO:** PLANILLA DE OBRA AVANCE 3: "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA"

De acuerdo a los Art(s). 70. de la LOSNCP; 121. del RLOSNCP; 408 - 16 y 408 - 17 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS (Acuerdo 039-CG), en lo que refiere a la "ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO", en atribuciones exclusivas y únicas a lo que la Ley señala para mi designación como Administrador de Contrato; en relación al contrato "ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", a la presente fecha una vez que el Ing. Fiscalizador Externo ha procedido a remitir la PLANILLA DE AVANCE 3 correspondiente al mes y periodo desde el 01/04/2023 al 30/04/2023 con un VALOR LIQUIDO A PAGAR de \$ 93.191,56 USD Dólares Americanos SIN IVA, con un REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA N° 3 de \$2.325,30/USD Dólares Americanos SIN IVA, una vez revisada la información me permito manifestar la conformidad de la documentación adjunta para su debido proceso.

En virtud de lo expuesto y en cumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas en el CONTRATO - CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO, solicito por medio de su persona SE PROCEDA CON EL PAGO de la PLANILLA DE AVANCE 3 a favor del AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A Contratista responsable de la obra.

Una vez efectuada todas las correcciones necesarias requeridas es conveniente continuar con el trámite pertinente. Adjunto información para su debido proceso.

Particular que se comunica para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Eryka Mireya Silva Manzano  
**FISCALIZADOR 1**

Anexos:

- informe\_adm\_obra\_avance\_3-signed.pdf
- 01.ofi\_entrega\_planilla\_3\_jatunpaccha.pdf
- 03.of\_correccion\_de\_planilla\_3.pdf
- 29\_oficio\_devolucion\_de\_planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no\_03.pdf
- 31\_oficio\_planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no\_03.pdf
- anexo\_rubro\_01.pdf
- anexo\_rubro\_02.pdf

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA



DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Pastaza

22 MAY 2023

Fecha:

Recibido:

EM

Número:

7590

Hora:

15:15

**Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2023-7590-M**

**Puyo, 22 de mayo de 2023**

- anexo\_rubro\_04\_justificativo.pdf
- anexo\_rubro\_04.pdf
- anexo\_rubro\_17\_justificativo.pdf
- anexo\_rubro\_17.pdf
- anexo\_rubro\_18.pdf
- anexo\_rubro\_19.pdf
- anexo\_rubro\_21.pdf
- anexo\_rubro\_22.pdf
- anexo\_rubro\_23.pdf
- anexo\_rubro\_39.pdf
- cronograma\_valorado\_de\_trabajo0874146001684765667.pdf
- informe\_mensual\_de\_avance\_obra\_no.\_03.pdf
- memo\_de\_pago\_planilla\_de\_avance\_no.\_03.pdf
- planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no.\_03.pdf
- planta\_y\_perfil\_lamina\_01\_jatunpaccha.pdf
- planta\_y\_perfil\_lamina\_02\_curaray.pdf
- reajuste\_de\_precios\_planilla\_03.pdf
- secciones\_lamina\_01\_jatunpaccha.pdf
- secciones\_lamina\_02\_curaray.pdf



Firmado electrónicamente por:  
**MERYKA MIREYA SILVA  
MANZANO**

Puyo, 18 de mayo del 2023

Ingeniera

Eryka Mireya Silva Manzano

Administrador de Contrato

Contrato LICO-GADPPz-006-2022

GAD Provincial de Pastaza

Presente. –

De mi consideración:

Mediante Contrato LICO-GADPPz-006-2022 suscrito el 07 de noviembre del 2022, dentro del Proceso de LCC-GADPPz-004-2022, para la ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, entre la Compañía AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, con un Anticipo del 0%, por un monto de USD \$ 4'650.521,23 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 23/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) SIN INCLUIR IVA, y un Plazo de 540 Días contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Obra.

En referencia al Oficio 123 CABA/GADPPz, de fecha 15 de mayo del 2023, suscrito por el Señor Odilo Vinicio Guevara Marín. Esta fiscalización aprueba este documento para continuar los tramites de aprobación permitientes y extiende la Planilla de Avance de Obra No. 03, del Periodo: 01 de abril al 30 de abril del 2023.

Por la atención al presente le anticipo mis sinceros agradecimientos.

Sin otro particular por el momento, me despido.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
JESSICA MARIELA  
JARAMILLO  
ARMIÑOS

**KEYSZEN** **S.A.S.**  
INGENIERIA & CONSTRUCCION  
Machala - El Oro - Ecuador

Ing. Jessica Jaramillo

C.C. 0704239128

Gerente General

KEYSZEN S.A.S.

RUC 0791840462001

CC. Administrador del Contrato

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03

Oficina 072 785 269

keyszen.sas@gmail.com

www.keyszen.com

Machala – El oro - Ecuador

Recibido  
18/05/2023

**OFICIO N° GADPPz-ES-2023-001**

**Puyo, 25 de enero de 2023.**

Señor  
Odilo Guevara  
REPRESENTANTE LEGAL DE AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S. A.  
**CONTRATISTA**  
Presente. -

**De mi consideración:**

Una vez revisado toda la documentación con respecto al contrato cuyo objeto es: **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY – FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**, se remite el acta de inicio de obra de los trabajos a ejecutarse para dicho mantenimiento, en donde se da como fecha de inicio de la obra el **25 de enero de 2023**.

**Particular que comunico, para los fines pertinentes.**

**Atentamente,**



**ERYKA MIREYA SILVA  
MANZANO**

**Ing. Eryka Silva M.  
ADMINISTRADORA DE CONTRATO**

Puyo, 08 de junio del 2023

Ingeniera  
Eryka Mireya Silva Manzano  
Administrador de Contrato  
Contrato LICO-GADPPz-006-2022  
GAD Provincial de Pastaza  
Presente. –

De mi consideración:

Mediante Contrato LICO-GADPPz-006-2022 suscrito el 07 de noviembre del 2022, dentro del Proceso de LCC-GADPPz-004-2022, para la ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, entre la Compañía AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, con un Anticipo del 0%, por un monto de USD \$ 4'650.521,23 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 23/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) SIN INCLUIR IVA, y un Plazo de 540 Días contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Obra.

En referencia al Oficio 130 CABA/GADPPz, de fecha 07 de junio del 2023, suscrito por el Señor Odilo Vinicio Guevara Marín. Esta fiscalización, una vez revisadas las correcciones solicitadas se aprueba este documento para continuar los tramites de aprobación permitentes y extiende la Planilla de Avance de Obra No. 03, del Periodo: 01 de abril al 30 de abril del 2023.

Por la atención al presente le anticipo mis sinceros agradecimientos.

Sin otro particular por el momento, me despido.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
JESSICA MARIELA  
JARAMILLO  
ARMIJOS

**KEYSZEN** S A S  
INGENIERIA & CONSTRUCCION  
Machala - El Oro - Ecuador

Ing. Jessica Jaramillo  
C.C. 0704239128  
Gerente General  
KEYSZEN S.A.S.  
RUC 0791840462001

CC. CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
Oficina 072 785 269  
keyszen.sas@gmail.com  
www.keyszen.com  
Machala – El oro - Ecuador



Recibido  
08/06/2023  
*[Signature]*

AMAZONS BUILDING AMAZONBU...  
AMAZONS BUILDING S.A.

PROYECTO: "ASEALTADO DE LA VÍA CURARAY -  
FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL  
KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTO  
PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

PLANILLA DE AVANCE No.3

PERIODO: 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2023

CONTRATISTA: Amazonas Building Amazonbuild S.A.  
FISCALIZADOR EXTERNO: Keyzen S.A.S.  
PUYO, PASTAZA - ECUADOR  
2023



**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

# PLANILLA DE AVANCE N.3

"ASFALTADO DE LA VIACURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO  
12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA  
LIQUIDACIÓN DE LA PLANILLA No. 3



PROYECTO:

ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

FECHA DE CONTRATO: 7 DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 CONTRATISTA: CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
 VALOR CONTRATO \$: 4,650,521.23  
 PLAZO: 540 DIAS  
 PERIODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

| CONCEPTO                                   | TOTAL ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL ECHA |
|--|----------------|--------------|------------|
| VALOR PLANILLA DE AVANCE DE OBRA           | 230,516.37     | 93,191.56    | 323,707.93 |
| MULTAS                                     | -              | -            | -          |
| VALOR REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL      | 4,207.96       | 2,325.30     | 6,533.26   |
| VALOR REAJUSTE DEFINITIVO ANTICIPO DE OBRA | -              | -            | -          |
| VALOR PLANILLA TOTAL                       | 234,724.33     | 95,516.86    | 330,241.19 |
| ANTICIPO                                   | -              | -            | -          |
| VALOR LIQUIDO A PAGAR                      | 234,724.33     | 95,516.86    | 330,241.19 |

FECHA DEL ANTICIPO: -  
 VALOR DEL ANTICIPO \$: -  
 VALOR AMORTIZADO \$: -  
 SALDO POR AMORTIZAR \$: -

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



Firmado electrónicamente por:  
 ODILO VINICIO  
 GUEVARA MARIN

CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
 CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:  
 JESSICA MARIELA  
 JARAMILLO ARMIJOS

KEYSZEN S.A.S.  
 FISCALIZADOR EXTERNO

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

DPTO. **FISCALIZACIÓN**

**PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO. 03**

OBRA : ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA - HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

FECHA DE CONTRATO : Lunes, 7 de noviembre de 2022

CONTRATISTA : CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONABUILD S.A.

PLAZO : 540 Días a partir de la orden de inicio

AMPLIACIONES : 0 Días

SUSPENSIÓN : 0 Días

TOTAL : 540 Días

V. CONTRATO : \$4 650 521,23

V. PLANILLAS : 993 191,56

V. EXCEDENTES : 0,00

% DE AVANCE EJECUTADO : 2,00%

% DE AVANCE PROGRAMADO : 4,82%

PARCIAL

\$4 650 521,23

ACUMULADO

\$323 707,93

0,00

6,96%

1,68%

FECH. DEL PLAZO : 25 de enero de 2023

INDIC. DEL PLAZO : 18 de julio de 2024

TERMINACION DEL PLAZO : 01-abr-23

PERICUO : A

30-abr-23

| ITEMS | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD | CANTIDAD     | PRECIO CONTRATO | TOTAL            | CANTIDADES  |              |             | IMPORTE |             |              |             |
|-------|---|--------|--------------|-----------------|------------------|-------------|--------------|-------------|---------|-------------|--------------|-------------|
|       |   |        |              |                 |                  | F. ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL FECHA | % TOTAL | F. ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL FECHA |
| 1     | Destrozo, desbrozo y limpieza                                   | Ha     | 29,18        | 444,42          | \$ 12 968,176    | 6,00        | 1,57         | 7,57        | 25,94%  | 2 666,52    | 697,74       | 3 364,26    |
| 2     | Replanteo y nivelación a nivel de asfalto                       | km     | 14,59        | 1 383,97        | \$ 20 192,122    | 1,60        | 5,19         | 6,79        | 46,54%  | 2 214,35    | 7 182,80     | 9 397,15    |
| 3     | Remoción de alcantarillas                                       | m      | 243,00       | 26,76           | \$ 6 502,680     | 62,00       |              | 62,00       | 25,51%  | 1 659,12    |              | 1 659,12    |
| 4     | Excavación sin clasificar (mov. de tierra)                      | m³     | 68 863,54    | 1,02            | \$ 70 240,811    | 7 338,80    | 1 733,21     | 9 072,01    | 13,17%  | 7 485,57    | 1 767,87     | 9 253,44    |
| 5     | Excavación de cunetas de coronación                             | m³     | 613,80       | 1,29            | \$ 791,802       |             |              |             | 0,00%   |             |              |             |
| 6     | Excavación para cunetas y encauzamiento                         | m³     | 8 576,91     | 5,02            | \$ 43 056,088    |             |              |             | 0,00%   |             |              |             |
| 7     | Excavación y relleno de estructuras metálicas                   | m³     | 7 720,00     | 5,08            | \$ 39 217,600    | 2 171,59    |              | 2 171,59    | 28,13%  | 11 031,68   |              | 11 031,68   |
| 8     | Limpieza de derrumbes   | m²     | 8 746,43     | 0,82            | \$ 7 172,073     |             |              |             | 0,00%   |             |              |             |
| 9     | S.C. Tubería de acero corrugado D= 0,80 m, e=2,5 mm, PM-100     | m      | 126,00       | 166,33          | \$ 20 957,580    |             |              |             | 0,00%   |             |              |             |
| 10    | S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m, e=2,5 mm, PM-100     | m      | 263,00       | 272,20          | \$ 71 588,600    | 49,00       |              | 49,00       | 18,63%  | 13 337,80   |              | 13 337,80   |
| 11    | S.C. Tubería de acero corrugado D= 2,20 m, e=2,5 mm, PM-100     | m      | 46,00        | 562,20          | \$ 25 861,200    |             |              |             | 0,00%   |             |              |             |
| 12    | Hormigón para cunetas (FC=180 KG/C <sup>3</sup> M)              | m³     | 4 746,82     | 167,21          | \$ 793 715,772   |             |              |             | 0,00%   |             |              |             |
| 13    | Muro de H.S. fc=180kg/cm2 tipo B(Ca bezzales)                   | m³     | 763,00       | 167,20          | \$ 127 573,600   |             |              |             | 0,00%   |             |              |             |
| 14    | Hormigón simple en obras de arte FC=240 KG/C <sup>3</sup> M2    | m³     | 78,47        | 162,46          | \$ 12 748,236    |             |              |             | 0,00%   |             |              |             |
| 15    | Hierro estructural fy=4200 kg/cm²                               | kg     | 8 288,90     | 1,94            | \$ 16 080,466    |             |              |             | 0,00%   |             |              |             |
| 16    | Muro de gaviones - calibre N° 12                                | m³     | 400,00       | 70,12           | \$ 28 046,000    |             |              |             | 0,00%   |             |              |             |
| 17    | Material pétreo de mejoramiento (min. 3da. cargada y regada)    | m³     | 83 263,76    | 3,00            | \$ 249 791,280   | 14 490,40   | 4 024,12     | 18 514,52   | 22,24%  | 43 471,20   | 12 072,36    | 55 543,56   |
| 18    | Material de subbase clase 3                                     | m³     | 21 010,98    | 12,44           | \$ 261 376,591   | 1 125,00    | 1 580,98     | 2 705,98    | 12,86%  | 13 995,00   | 19 667,39    | 33 662,39   |
| 19    | Material de base granular de agregado S                         | m³     | 13 031,28    | 15,78           | \$ 205 633,598   |             | 947,16       | 947,16      | 7,27%   |             | 14 946,18    | 14 946,18   |
| 20    | Transporte material de desabrido                                | m³-km  | 8 746,43     | 1,02            | \$ 8 921,359     | 2 090,00    |              | 2 090,00    | 23,90%  | 2 131,80    |              | 2 131,80    |
| 21    | Transporte de material pétreo de mejoramiento                   | m³-km  | 3 398 493,83 | 0,25            | \$ 827 373,458   | 477 893,40  | 63 935,69    | 541 829,09  | 16,37%  | 119 473,35  | 15 983,92    | 135 457,27  |
| 22    | Transporte de material pétreo de subbase clase 3                | m³-km  | 781 104,32   | 0,25            | \$ 195 276,080   | 37 102,50   | 52 140,56    | 89 243,06   | 11,43%  | 9 275,63    | 13 035,14    | 22 310,77   |
| 23    | Transporte de material pétreo de base granular de agregados     | m³-km  | 484 450,99   | 0,25            | \$ 121 112,748   |             | 31 237,45    | 31 237,45   | 6,45%   |             | 7 809,36     | 7 809,36    |
| 24    | Impregnación con emulsión asfáltica                             | Lt     | 171 247,08   | 0,76            | \$ 130 147,781   |             |              |             | 0,00%   |             |              |             |
| 25    | C. rodadura hormigón asf. Mezzadato e <sup>1</sup> planta, e=2" | m²     | 122 319,34   | 9,74            | \$ 1 191 390,372 |             |              |             | 0,00%   |             |              |             |
| 26    | Bordillo de H.S. (fc=210 kg/cm² - 0,14x <sup>3</sup> .40)       | m      | 2 000,00     | 14,64           | \$ 29 280,000    |             |              |             | 0,00%   |             |              |             |
| 27    | Aceras de H.S. fc=180kg/cm² E=7cm e <sup>1</sup> scabiado       | m²     | 3 000,00     | 19,32           | \$ 57 960,000    |             |              |             | 0,00%   |             |              |             |

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

DPTO. FISCALIZACIÓN

**PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO. 03**

OBRA : ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNFACCHA - HASTA EL KM 12 VIA 19 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA  
 FECHA DE CONTRATO : Lunes, 7 de noviembre de 2022  
 CONTRATISTA : CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
 PLAZO : 540 Días a partir de la orden de inicio  
 AMPLIACIONES : 0 Días  
 SUSPENSIÓN : 0 Días  
 TOTAL : 540 Días

PARCIAL : \$4 650 521.23  
 ACUMULADO : \$323 707.93  
 V. CONTRATOS : \$93 191.56  
 V. PLANILLAS : 0.00  
 V. EXCEDENTES : 0.00  
 % DE AVANCE EJECUTADO : 2.00%  
 % DE AVANCE PROGRAMADO : 1.68%

FECHA DE PLANILLA : 5 de mayo de 2023  
 INICIO DEL PLAZO : 28 de enero de 2023  
 TERMINACIÓN DEL PLAZO : 18 de julio de 2024  
 PERIODO : 01-ab-23

| ITEMS           | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD | CANTIDAD  | PRECIO CONTRATO | TOTAL                  | CANTIDADES  |              | IMPORTANTE  |              | TOTAL FECHA         | TOTAL FECHA          |
|-----------------|--|--------|-----------|-----------------|------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|
|                 |  |        |           |                 |                        | T. ANTERIOR | ESTE PERIODO | T. ANTERIOR | ESTE PERIODO |                     |                      |
| 28              | Marcas en pavimento  | m      | 43 626.97 | 0.40            | \$ 17 469,788          | -           | -            | -           | -            | -                   | -                    |
| 29              | Marcas sobre salidas de pavimento (unidireccionales y bidireccionales) | u      | 3 895.00  | 7.32            | \$ 28 511,400          | -           | -            | -           | -            | -                   | -                    |
| 30              | Pancarta informativa (letrero)-con estructura                          | u      | 1.00      | 1 179.51        | \$ 1 179,510           | 1.00        | -            | 1 179.51    | -            | 1 179.51            | -                    |
| 31              | Señales ecológicas (2.40x1.20M)  | u      | 2.00      | 354.87          | \$ 709,740             | -           | -            | -           | -            | -                   | -                    |
| 32              | Señales informativas (2.40x1.20M)                                      | u      | 4.00      | 354.87          | \$ 1 419,480           | -           | -            | -           | -            | -                   | -                    |
| 33              | Señales reglamentarias (0.75 x 0.75M)                                  | u      | 10.00     | 111.50          | \$ 1 115,000           | -           | -            | -           | -            | -                   | -                    |
| 34              | Señales preventivas (0.75 x 0.75 M)                                    | u      | 200.00    | 111.50          | \$ 22 300,000          | -           | -            | -           | -            | -                   | -                    |
| 35              | Señales informativas y reglamentarias (0.60mx0.80m) móviles            | u      | 4.00      | 78.18           | \$ 312,720             | 4.00        | -            | 312.72      | -            | 312.72              | -                    |
| 36              | Señales preventivas tipo barrera (1.22mx0.60m) móviles                 | u      | 4.00      | 163.34          | \$ 653,360             | 4.00        | -            | 653.36      | -            | 653.36              | -                    |
| 37              | Contenedores metálicos de 55 galones                                   | u      | 4.00      | 17.57           | \$ 70,280              | 4.00        | -            | 70.28       | -            | 70.28               | -                    |
| 38              | Kit antiderrames   | u      | 4.00      | 157.50          | \$ 630,000             | 4.00        | -            | 630.00      | -            | 630.00              | -                    |
| 39              | Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)                      | m      | 1 000.00  | 0.32            | \$ 320,000             | 180.00      | -            | 180.00      | -            | 180.00              | -                    |
| 40              | SIC Como de seguridad con protección UV, 71cm Inch, cinta reflectiva   | u      | 20.00     | 22.48           | \$ 449,600             | 20.00       | -            | 449.60      | -            | 449.60              | -                    |
| 41              | Suministro de paleta de alto y siga                                    | u      | 4.00      | 30.32           | \$ 121,280             | 4.00        | -            | 121.28      | -            | 121.28              | -                    |
| 42              | Capacitación sobre preservación de recursos naturales (de 2 a 3 horas) | u      | 1.00      | 100.00          | \$ 100,000             | 1.00        | -            | 100.00      | -            | 100.00              | -                    |
| 43              | Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a 3 horas)      | u      | 1.00      | 100.00          | \$ 100,000             | 1.00        | -            | 100.00      | -            | 100.00              | -                    |
| 44              | Capacitación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3 horas)         | u      | 1.00      | 100.00          | \$ 100,000             | 1.00        | -            | 100.00      | -            | 100.00              | -                    |
|                 |  |        |           |                 | <b>\$ 4 650 521.23</b> |             |              |             |              | <b>\$ 93 191.56</b> | <b>\$ 323 707.93</b> |
| DESCUENTOS:     |  |        |           |                 |                        |             |              |             |              |                     |                      |
| Anticipo        |  |        |           |                 |                        |             |              |             |              | \$ 0.00             | \$ 0.00              |
| Mora 0 días     |  |        |           |                 |                        |             |              |             |              | \$ 0.00             | \$ 0.00              |
| VALOR A PAGARSE |  |        |           |                 |                        |             |              |             |              | \$ 230 \$16,37      | \$ 93 191.56         |
|                 |  |        |           |                 |                        |             |              |             |              | \$ 0.00             | \$ 0.00              |
|                 |  |        |           |                 |                        |             |              |             |              | \$ 0.00             | \$ 0.00              |
|                 |  |        |           |                 |                        |             |              |             |              | \$ 230 \$16,37      | \$ 323 707.93        |

SON: NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN DÓLARES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS



ERIKAMIRREYA  
SILVA MANTANO



JESSICA MARTEL  
RAMILLO ARRIJOS



ODILIO VINICIO  
GURVARA MARIN

ING. ERYKA SILVA  
ADMINISTRADOR GADPPP

KEYSEN S.A.S.  
FISCALIZADOR EXTERNO

CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
CONTRATISTA



**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

# REAJUSTE

# PROVISIONAL

"ASFALTADO DE LA VIACURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO  
12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA



REAJUSTE (PROVISIONAL) PLANILLA 3

PROYECTO: ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
UBICACIÓN: PARROQUIA 10 DE AGOSTO-CANTON PASTAZA-PROVINCIA DE PASTAZA
CONTRATISTA: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.
ANEJO: REAJUSTE (PROVISIONAL) PLANILLA 3
FECHA: viernes, 5 de mayo de 2023
POR: \$ 2,325.30

NOTA:

FORMULA POLINOMICA DE REAJUSTE

Pr=Po(0.143 B1/Bp + 2.672 C1/Cp + 0.034 COM1/COMo + 0.372 E1/Eo + 0.128 F1/Fo + 0.002 H1/Ho + 0.057 M1/Mo + 0.147 P1/Po + 0.023 T1/To + 0.022 X1/Xo)

CUADRILLA TIPO

Table with columns: DESCRIPCION, COEFICIENTE, JORNAL T.D, TOTAL for ago-22 and abr-23. Includes rows for OPERADOR EQUIPO PESADO C1, OPERADOR EQUIPO PESADO C2, SIN TITULO T2, ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3, CHOFER C1, ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1, ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2, ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2, ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2.

Table with columns: DESCRIPCION, SIMBOLO, COEFICIENTE E (a), PRECIO O INDICE (b), PRECIO (I) INDICE (c), RELACION d=(c/b), TERMINO c=d\*a, OBSERVACIONES. Includes rows for MANO DE OBRERA, CEMENTO PORTLAND SACOS, COMBUSTIBLES, EQUIPO Y MAQUINARIA, BETUN PETROLEO, ACERO EN BARRAS, MADERA ASERRADA, MATERIALES PETREOS, ALCANTARILLAS DE LAMINAS DE METAL Y ACC, VARIOS IPC ASBATO.

Summary table with columns: VALOR DE PLANILLA (\$ 93,191.56), VALOR A REAJUSTE (Po) (\$ 93,191.56), VALOR REAJUSTADO (Pr=Po\*f) (\$ 95,516.86), VALOR DE REAJUSTE PRECIOS (Pr-Po) (\$ 2,325.30).

REAJUSTE: 1.0249518
OBSERVACIONES: Sub-indices ago-22, Sub-indices abr-23

A FAVOR DEL CONTRATISTA: SON: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO DÓLARES CON TREINTA CENTAVOS

JESSICA MARIELA JARAMILLO ARMILLOS

KEYSSEN S.A.S. FISCALIZADOR EXTERNO

ERYKA MIRREYA SILVA MANZANO

ING. ERYKA SILVA ADMINISTRADOR GADPPZ

ODILIO VINCICIO GUEVARA MARIN

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. CONTRATISTA

ANEXOS  
 INDICES AGOSTO - 2022  
 (BASE ABRIL/12 2000 = 100,00)

| DENOMINACIÓN                                     | 2021                                     |         |           |           | 2022   |         |        |        |        |        |        |        |
|--|--|---------|-----------|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | SEPTIEMBRE                               | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO  | FEBRERO | MARZO  | ABRIL  | MAYO   | JUNIO  | JULIO  | AGOSTO |
|  | Aceites lubricantes: hidráulicos y otros | 382.04  | 390.53    | 390.53    | 390.53 | 390.53  | 392.54 | 394.53 | 394.53 | 394.88 | 404.21 | 407.44 |
| Aceero en barras                                 | 290.43                                   | 290.43  | 290.43    | 290.43    | 290.43 | 290.43  | 290.43 | 290.43 | 290.43 | 290.43 | 290.43 | 290.43 |
| Aceero estructural para puentes                  | 395.84                                   | 393.14  | 391.42    | 397.24    | 403.39 | 406.58  | 409.54 | 410.79 | 404.30 | 411.44 | 409.23 | 412.31 |
| Aceiteno   | 250.34                                   | 250.34  | 250.34    | 250.34    | 255.28 | 255.28  | 255.28 | 255.28 | 255.28 | 255.28 | 255.28 | 255.39 |
| Aditivos para hormigones castillos (3)           | 246.85                                   | 252.28  | 247.85    | 240.55    | 241.88 | 241.50  | 243.82 | 255.48 | 253.84 | 259.90 | 249.30 | 249.44 |
| Alambres y cables para instal. eléctricas        | 252.04                                   | 253.20  | 253.74    | 253.74    | 261.22 | 267.20  | 271.70 | 278.09 | 278.09 | 278.09 | 278.09 | 268.73 |
| Alambres y cables para instal. telefónicas       |  |         |           |           |        |         |        |        |        |        |        |        |
| Exteriores (1) 2/                                | 243.99                                   | 246.43  | 249.84    | 254.72    | 251.59 | 254.85  | 267.72 | 271.30 | 274.48 | 272.46 | 258.42 | 259.15 |
| Interiores                                       | 351.20                                   | 356.50  | 358.97    | 358.97    | 359.82 | 360.02  | 360.02 | 362.68 | 362.68 | 362.68 | 362.68 | 359.98 |
| Alambres de metal                                | 308.77                                   | 308.77  | 308.77    | 310.77    | 311.25 | 311.25  | 323.20 | 324.44 | 334.83 | 338.58 | 338.58 | 338.58 |
| Alcantarillas de láminas de metal y Acc.         | 138.93                                   | 138.93  | 138.93    | 138.93    | 202.06 | 202.06  | 202.06 | 202.06 | 202.06 | 202.06 | 202.06 | 202.06 |
| Artículos de soldadura                           | 330.67                                   | 337.37  | 340.47    | 340.47    | 347.23 | 347.23  | 347.23 | 347.23 | 347.23 | 347.23 | 347.23 | 347.23 |
| Ascensores                                       | 130.00                                   | 132.44  | 133.32    | 146.13    | 145.16 | 148.25  | 149.29 | 160.68 | 151.41 | 151.41 | 151.20 | 151.33 |
| Azuveles, cerámicos vitrificadas/pavos cerámicos | 177.85                                   | 177.85  | 177.90    | 177.90    | 179.91 | 178.77  | 185.80 | 186.98 | 189.47 | 189.24 | 183.51 | 183.51 |
| Baldosas de vinil (1) 5/                         | 108.56                                   | 109.71  | 109.71    | 109.71    | 109.71 | 109.71  | 111.08 | 111.08 | 111.08 | 114.56 | 114.56 | 114.56 |
| Beñín petrolero (Adulto) (D)                     | 746.20                                   | 746.20  | 746.20    | 746.20    | 746.20 | 746.20  | 746.20 | 746.20 | 746.20 | 746.20 | 746.20 | 746.20 |
| Bombas de Agua                                   | 173.98                                   | 173.45  | 173.55    | 173.45    | 182.01 | 180.44  | 183.20 | 182.89 | 183.73 | 185.82 | 192.19 | 192.19 |
| Calderas   | 183.77                                   | 184.57  | 184.59    | 197.49    | 197.49 | 212.45  | 212.45 | 222.47 | 218.74 | 218.74 | 223.91 | 221.04 |
| Cal química                                      | 292.19                                   | 292.19  | 292.19    | 292.19    | 292.19 | 292.19  | 292.19 | 292.19 | 292.19 | 292.19 | 292.19 | 292.19 |
| Carpint. de hierro (puertas escaleras)           | 273.96                                   | 273.96  | 273.96    | 273.96    | 273.96 | 271.09  | 273.92 | 276.16 | 276.16 | 276.16 | 276.16 | 276.16 |
| Cementina  | 210.31                                   | 210.31  | 210.31    | 210.31    | 210.31 | 210.31  | 210.31 | 210.31 | 210.31 | 210.31 | 210.31 | 210.31 |
| Cemento Portland                                 | 176.50                                   | 176.50  | 176.50    | 176.50    | 182.45 | 185.91  | 185.91 | 185.91 | 185.91 | 185.91 | 185.91 | 185.91 |
| Iscos  | 175.31                                   | 175.31  | 175.31    | 175.31    | 181.38 | 184.78  | 184.78 | 184.78 | 184.78 | 184.78 | 184.78 | 184.78 |
| Granel   | 182.20                                   | 182.20  | 182.20    | 182.20    | 187.42 | 191.24  | 191.24 | 191.24 | 191.24 | 191.24 | 191.24 | 191.24 |
| Centrales telefónicas                            | 46.51                                    | 46.75   | 46.13     | 46.84     | 47.34  | 47.34   | 49.17  | 48.58  | 71.11  | 69.14  | 72.85  | 73.35  |
| Cerámicas y similares                            | 410.80                                   | 410.14  | 410.14    | 410.14    | 435.87 | 437.45  | 437.45 | 437.45 | 437.45 | 437.45 | 437.45 | 437.45 |

INDICES DE MATERIAS, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN  
 (BASE ABRIL/12 2000 = 100,00)

| DENOMINACIÓN  | 2021                            |         |           |           | 2022   |         |        |        |        |        |        |        |
|---|---------------------------------|---------|-----------|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   | SEPTIEMBRE                      | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO  | FEBRERO | MARZO  | ABRIL  | MAYO   | JUNIO  | JULIO  | AGOSTO |
|   | Ductos de plomadas galvanizadas | 494.44  | 494.44    | 494.44    | 494.44 | 543.44  | 543.44 | 543.44 | 543.44 | 575.14 | 575.14 | 575.14 |
| Emulsionadas (1) 1/                                       | 234.53                          | 234.53  | 234.53    | 234.53    | 234.53 | 234.53  | 234.53 | 249.04 | 249.04 | 249.04 | 271.74 | 280.83 |
| Equipos de aire acondicionado                             | 157.29                          | 156.74  | 158.42    | 159.23    | 147.21 | 147.51  | 181.72 | 181.52 | 181.50 | 182.58 | 186.43 | 187.91 |
| Equipos de circuito cerrado de televisión                 | 131.18                          | 131.52  | 132.85    | 133.04    | 134.03 | 134.44  | 141.85 | 140.94 | 141.82 | 141.42 | 142.03 | 142.13 |
| Equipos para detección de trampas                         | 100.28                          | 100.28  | 102.23    | 102.23    | 109.25 | 109.25  | 109.45 | 109.45 | 109.45 | 109.45 | 109.45 | 109.45 |
| Equipos para lavado y secado de ropa                      | 109.49                          | 110.89  | 112.35    | 112.35    | 116.41 | 122.38  | 122.38 | 121.93 | 123.74 | 123.74 | 123.55 | 123.72 |
| Equipos para tratamiento de aguas residuales              | 144.27                          | 144.73  | 147.00    | 147.74    | 170.84 | 171.46  | 175.81 | 184.00 | 184.72 | 190.45 | 194.21 | 194.80 |
| Equipos y maquinaria de Construcción                      | 142.78                          | 142.24  | 148.43    | 150.19    | 178.18 | 171.92  | 171.78 | 173.93 | 173.21 | 179.48 | 179.72 | 184.33 |
| Equipos y maquinaria para: sitio de obra y otras labores  | 172.28                          | 174.21  | 174.56    | 175.07    | 181.20 | 182.79  | 185.70 | 188.30 | 187.07 | 189.15 | 194.43 | 198.43 |
| Explosivos y Adhesivos                                    | 244.28                          | 240.93  | 240.93    | 240.93    | 280.93 | 280.93  | 280.93 | 280.93 | 350.93 | 350.93 | 350.93 | 350.93 |
| Grifería y similares                                      | 243.40                          | 243.40  | 243.40    | 243.40    | 243.40 | 243.40  | 243.40 | 243.40 | 243.40 | 243.40 | 243.40 | 243.40 |
| Grupos electrogenos                                       | 142.74                          | 144.27  | 172.44    | 172.97    | 177.02 | 179.84  | 180.43 | 182.23 | 183.13 | 184.21 | 187.51 | 188.22 |
| Hidráulicos   | 175.74                          | 175.74  | 175.74    | 175.74    | 175.74 | 175.74  | 175.74 | 175.74 | 175.74 | 175.74 | 175.74 | 175.74 |
| Hormigón premezclado                                      | 216.71                          | 216.66  | 216.69    | 216.91    | 219.24 | 222.07  | 222.33 | 223.24 | 224.24 | 224.66 | 224.66 | 224.66 |
| Instalaciones eléctricas (viviendas)                      | 247.70                          | 247.39  | 272.88    | 278.38    | 280.18 | 284.93  | 287.42 | 289.15 | 289.15 | 289.04 | 288.98 | 284.73 |
| Instalaciones sanitarias (viviendas)                      | 248.78                          | 248.73  | 248.71    | 249.38    | 249.54 | 249.13  | 251.40 | 251.83 | 253.43 | 253.44 | 253.40 | 253.34 |
| Instalaciones y térmicas comerciales (edif.)              | 212.25                          | 208.10  | 208.10    | 208.10    | 208.10 | 211.47  | 211.47 | 211.47 | 211.47 | 211.47 | 211.47 | 211.47 |
| Láminas de acero (galvanizadas)                           | 309.95                          | 309.95  | 308.76    | 308.76    | 314.28 | 314.27  | 314.88 | 314.88 | 322.24 | 322.21 | 322.61 | 322.61 |
| Láminas de acero de espesor superior a 10 mm              | 183.80                          | 184.14  | 193.02    | 193.02    | 204.03 | 208.34  | 208.48 | 208.03 | 207.74 | 207.74 | 208.98 | 208.42 |
| Láminas y placas de aluminio                              | 285.23                          | 285.23  | 285.23    | 285.23    | 285.23 | 285.23  | 285.23 | 285.23 | 285.23 | 285.23 | 284.17 | 284.17 |
| Láminas y placas de aluminio (cubiertas y recubrimientos) | 147.43                          | 147.43  | 147.43    | 148.00    | 170.93 | 170.93  | 170.93 | 170.93 | 170.93 | 170.93 | 160.93 | 148.44 |
| Luminarias para: interiores, exteriores y Acc. eléctricos |                                 |         |           |           |        |         |        |        |        |        |        |        |
| Para alumbrado público                                    | 117.70                          | 117.70  | 117.70    | 117.70    | 117.70 | 117.70  | 117.70 | 117.70 | 117.70 | 117.70 | 117.70 | 117.70 |
| Para interiores   | 124.01                          | 124.01  | 124.01    | 124.01    | 124.01 | 124.01  | 124.01 | 124.01 | 124.01 | 124.01 | 124.01 | 124.01 |
| Madera aserrada, asplanchada y/o esquinada (preparada)    | 511.53                          | 511.53  | 512.49    | 514.38    | 514.38 | 514.38  | 514.92 | 514.92 | 517.44 | 514.32 | 514.32 | 512.78 |
| Madera tratada químicamente (aserrada)                    | 317.43                          | 317.43  | 317.43    | 317.43    | 317.43 | 317.43  | 317.43 | 317.43 | 324.58 | 324.67 | 324.67 | 324.67 |
| Mallas de acero (tambuchos)                               | 334.08                          | 334.08  | 334.08    | 342.85    | 344.92 | 344.92  | 358.14 | 349.47 | 371.83 | 374.95 | 374.95 | 374.95 |
| Mallas metálicas (galvanizadas)                           | 338.23                          | 338.23  | 338.23    | 343.74    | 345.04 | 345.04  | 344.40 | 344.03 | 351.41 | 358.32 | 358.32 | 358.32 |
| Mallas metálicas para: cerramientos                       | 349.18                          | 349.18  | 349.18    | 349.64    | 346.98 | 346.98  | 349.74 | 344.44 | 357.10 | 347.07 | 347.07 | 347.07 |

| DENOMINACIÓN                          | 2021                  |         |           |           | 2022   |         |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------|-----------------------|---------|-----------|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                       | SEPTIEMBRE            | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO  | FEBRERO | MARZO  | ABRIL  | MAYO   | JUNIO  | JULIO  | AGOSTO |
|                                       | Adoquines de hormigón | 330.44  | 320.44    | 320.44    | 320.44 | 344.33  | 349.92 | 349.92 | 349.92 | 349.92 | 349.92 | 349.92 |
| Bloques de hormigón                   | 347.94                | 347.94  | 344.99    | 347.98    | 348.94 | 349.02  | 349.02 | 349.02 | 349.02 | 347.39 | 348.19 | 347.02 |
| Ladrillos comunes de arcilla          | 304.24                | 304.24  | 304.24    | 304.24    | 304.24 | 304.24  | 304.24 | 304.24 | 304.24 | 304.24 | 304.24 | 304.24 |
| Materiales pétreos                    | 215.49                | 215.13  | 215.56    | 215.13    | 215.29 | 215.29  | 215.29 | 215.29 | 215.29 | 215.44 | 215.44 | 215.44 |
| Tubos de hormigón simple y acanalados | 281.77                | 281.77  | 281.77    | 281.77    | 282.72 | 284.74  | 284.74 | 284.74 | 293.12 | 293.12 | 293.12 | 293.12 |

INDICES DE GRUPOS DE MATERIAS, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN  
 BASE ABRIL/12 2000 = 100,00

| DENOMINACIÓN                      | 2021                                  |         |           |           | 2022   |         |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                   | SEPTIEMBRE                            | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO  | FEBRERO | MARZO  | ABRIL  | MAYO   | JUNIO  | JULIO  | AGOSTO |
|                                   | Equipos para instalaciones eléctricas | 146.33  | 143.77    | 171.97    | 174.02 | 172.79  | 181.40 | 187.45 | 183.70 | 183.43 | 184.41 | 189.28 |
| Equipos y maquinaria              | 188.89                                | 180.41  | 141.24    | 145.82    | 170.17 | 170.33  | 171.84 | 173.52 | 174.26 | 175.84 | 179.31 | 180.82 |
| Materiales eléctricos             | 213.39                                | 213.54  | 214.46    | 215.68    | 216.70 | 217.77  | 218.40 | 219.43 | 219.43 | 219.19 | 218.99 | 217.52 |
| Productos de hormigón armado      | 291.43                                | 291.41  | 291.41    | 291.41    | 291.41 | 291.41  | 292.00 | 293.41 | 293.75 | 297.24 | 297.24 | 297.24 |
| Productos de hormigón simple      | 321.14                                | 321.09  | 321.12    | 321.21    | 322.29 | 323.88  | 323.88 | 323.88 | 324.31 | 327.39 | 327.39 | 327.43 |
| Productos metálicos               | 243.54                                | 243.46  | 244.44    | 244.84    | 246.05 | 247.83  | 249.80 | 250.94 | 253.99 | 253.14 | 252.13 | 249.80 |
| Índice General de la Construcción | 247.47                                | 243.43  | 273.46    | 274.17    | 278.39 | 281.82  | 283.73 | 284.99 | 286.73 | 284.91 | 285.84 | 283.33 |
| Índice General de Consumidor      | 104.58                                | 105.87  | 108.18    | 108.34    | 107.02 | 107.02  | 107.02 | 108.02 | 108.43 | 108.94 | 108.51 | 108.31 |

| 2022   |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Combustibles (precios nacionales subvencionados) (D) |  | 372.40 | 372.40 | 372.40 | 372.40 | 372.40 | 371.05 | 372.13 | 372.13 | 372.13 | 372.13 | 372.13 |
| Combustibles (precios internacionales)               |  | 313.31 | 313.55 | 314.00 | 314.7  |        |        |        |        |        |        |        |

Anexo IPCO – ABRIL 2023

| DENOMINACIÓN                                       | ÍNDICES  |          |          | VARIACIONES PORCENTUALES |       |
|--|----------|----------|----------|--------------------------|-------|
|  | ABRIL/22 | MARZO/23 | ABRIL/23 | MENSUAL                  | ANUAL |
| Aceites: utilizantes, hidrául. y afines *          | 394.53   | 430.77   | 430.77   | 0.00                     | 9.19  |
| Acero en barras *                                  | 296.41   | 301.35   | 301.35   | 0.00                     | 1.67  |
| Alcantarillas de laminas de metal y Acc. *         | 202.06   | 202.06   | 202.06   | 0.00                     | 0.00  |
| Artículos de soldadura *                           | 367.23   | 368.42   | 368.42   | 0.00                     | 0.32  |
| Ascensores:  | 150.68   | 154.84   | 158.44   | 2.32                     | 5.15  |
| Azulejos y cerámicos vitrificadas **               | 186.98   | 182.39   | 180.86   | -0.84                    | -3.27 |
| Baldosas de vinil (V) S/ *                         | 111.08   | 117.94   | 117.94   | 0.00                     | 6.18  |
| Berún pétreo (Asfalto) (O) *                       | 746.20   | 746.20   | 746.20   | 0.00                     | 0.00  |
| Cemento Portland *                                 | 185.91   | 185.64   | 185.64   | 0.00                     | -0.15 |
| Gravel *   | 191.24   | 192.19   | 192.19   | 0.00                     | 0.50  |
| Sacos *  | 184.78   | 184.30   | 184.30   | 0.00                     | -0.26 |
| Centrales telefónicas                              | 68.58    | 72.03    | 72.03    | 0.00                     | 5.03  |
| Cerraduras y señales *                             | 437.45   | 431.11   | 431.11   | 0.00                     | -1.45 |
| Combustibles (O)                                   | 272.40   | 252.13   | 252.13   | 0.00                     | -7.44 |
| Equipo y maquinaria de Construcción vial           | 173.93   | 192.31   | 193.13   | 0.43                     | 11.04 |
| Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (resaca) | 516.92   | 514.32   | 516.36   | 0.40                     | -0.11 |
| <b>Tungurahua</b>                                  |          |          |          |                          |       |
| Adoquines de hormigón                              | 245.92   | 245.92   | 245.92   | 0.00                     | 0.00  |
| Bloques de hormigón                                | 249.02   | 247.73   | 247.73   | 0.00                     | -0.52 |
| Ladrillos comunes de arcilla                       | 204.54   | 204.54   | 204.54   | 0.00                     | 0.00  |
| Materiales pétreos                                 | 218.68   | 219.72   | 218.72   | 0.00                     | 0.48  |
| Tubos de hormigón simple y accesorios              | 286.74   | 298.14   | 298.14   | 0.00                     | 3.98  |



**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

**ANEXOS**  
**GRÁFICOS**  
**VOL DE OBRA**

"ASFALTADO DE LA VIACURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO  
12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"





**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA  
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO**



|                     |  |                  |           |
|---------------------|--|------------------|-----------|
| <b>PROYECTO:</b>    | ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA |                  |           |
| <b>CONTRATISTA:</b> | CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  |                  |           |
| <b>PLANILLA N°:</b> | 3  | <b>N° RUBRO:</b> | 1         |
| <b>PERIODO:</b>     | 01-abr-23  | -                | 30-abr-23 |
|                     |  | <b>UNIDAD:</b>   | Ha        |

**Desbroce, desbosque y limpieza**



| TRAMO        | ABRUCISADO |          | LONGITUD (m) | ANCHO (m) | ÁREA (m2) | CANTIDAD PLANILLADA (Ha) | OBSERVACIONES |
|--------------|------------|----------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
|              | DESDE      | HASTA    |              |           |           |                          |               |
| 1            | 3+000.00   | 3+445.00 | 445.00       | 20.00     | 8 900.00  | 0.89                     | Jatunpaccha   |
| 2            | 0+000.00   | 0+340.00 | 340.00       | 20.00     | 6 800.00  | 0.68                     | Curaray       |
| <b>TOTAL</b> |            |          |              |           |           | <b>1.57</b>              |               |

|   |       |    |
|---|-------|----|
| <b>PLANILLADO ANTERIORMENTE =</b>                 | 6.00  | Ha |
| <b>TOTAL CONTRATADO =</b>                         | 29.18 | Ha |
| <b>CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =</b> | 1.67  | Ha |
| <b>CANTIDAD PLANILLADA =</b>                      | 7.67  | Ha |
| <b>EXCEDENTES =</b>                               | -     | Ha |



Identificación electrónica por  
**GODILLO YINICIO**  
**GUEVARA MARIN**

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
CONTRATISTA



Identificación electrónica por  
**JESSICA MARIELA**  
**JARAMILLO ARMIJOS**

KEYSZEN S.A.S  
FISCALIZADOR EXTERNO



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA  
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO**



|                     |  |                  |                   |
|---------------------|--|------------------|-------------------|
| <b>PROYECTO:</b>    | ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA |                  |                   |
| <b>CONTRATISTA:</b> | CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  |                  |                   |
| <b>PLANILLA Nº:</b> | 3  | <b>Nº RUBRO:</b> | 2                 |
| <b>PERIODO:</b>     | 01-abr-23  | 30-abr-23        | <b>UNIDAD:</b> km |

**Replanteo y nivelación a nivel de asfalto**



| TRAMO        | ABSCISADO |          | LONGITUD (m) | LONGITUD (Km) | CANTIDAD EJECUTADA | OBSERVACIONES |
|--------------|-----------|----------|--------------|---------------|--------------------|---------------|
|              | DESDE     | HASTA    |              |               |                    |               |
| 1            | 1+6300.00 | 3+445.00 | 1 845.00     | 1.85          | 1.85               | Jatunpaccha   |
| 2            | 0+0000.00 | 3+340.00 | 3 340.00     | 3.34          | 3.34               | Curaray       |
| <b>TOTAL</b> |           |          |              |               | <b>5.19</b>        |               |

|   |          |
|---|----------|
| <b>PLANILLADO ANTERIORMENTE =</b>               | 1.60 km  |
| <b>TOTAL CONTRATADO =</b>                       | 14.59 km |
| <b>CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA</b> | 5.19 km  |
| <b>CANTIDAD PLANILLADA =</b>                    | 6.79 km  |
| <b>EXCEDENTES =</b>                             | - km.    |



ODILO VINICIO  
GUEVARA MARIN



JESSICA MARIELA  
JARAMILLO ARMIJOS

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
CONTRATISTA

KEYSZEN S.A.S  
FISCALIZADOR EXTERNO




**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA  
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO**



|                     |  |                  |                   |
|---------------------|--|------------------|-------------------|
| <b>PROYECTO:</b>    | ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA |                  |                   |
| <b>CONTRATISTA:</b> | CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  |                  |                   |
| <b>PLANILLA N°:</b> | 3  | <b>N° RUBRO:</b> | 4                 |
| <b>PERIODO:</b>     | 01-abr-23  | 30-abr-23        | <b>UNIDAD:</b> m³ |

Excavación sin clasificar (mov. de tierra)

**SECCIÓN TRANSVERSAL TIPO  
EXCAVACIÓN DE CAJERAS Y TALUDES**



| TRAMO        | ABSCISADO |          | CANTIDAD EJECUTADA (m3) | VOLUMEN EXCAVADO (m3) | OBSERVACIONES                   |
|--------------|-----------|----------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|              | DESDE     | HASTA    |                         |                       |                                 |
| 1            | 3+000.00  | 3+445.00 | 1 660.31                | 1 660.31              | Ver anexo justificativo Rubro 4 |
| 2            | 0+000.00  | 0+340.00 | 72.90                   | 72.90                 | Ver anexo justificativo Rubro 4 |
| <b>TOTAL</b> |           |          |                         | <b>1733.21</b>        |                                 |

|  |              |
|--|--------------|
| PLANILLADO ANTERIORMENTE =                 | 7 338.80 m³  |
| TOTAL CONTRATADO =                         | 68 863.54 m³ |
| CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA = | 1 733.21 m³  |
| CANTIDAD PLANILLADA =                      | 9 072.01 m³  |
| EXCEDENTES =                               | - m³         |



Firmado electrónicamente por:  
**OSIELO VINICIO  
GONZALEZ MARIN**

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
**CONTRATISTA**



Firmado electrónicamente por:  
**JESSICA MARIELA  
JARAMILLO ARMIJOS**

KEYSZEN S.A.S  
**FISCALIZADOR EXTERNO**





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA  
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO



| PROYECTO:                                | ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA |              |                |                     |                    |              |                        |
|--|--|--------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------------|
| CONTRATISTA:                             | CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  |              |                |                     |                    |              |                        |
| PLANILLA N°:                             | 3  |              |                | N° RUBRO            | 4                  |              |                        |
| PERIODO:                                 | 01-abr-23  |              | -              | 30-abr-23           |                    | UNIDAD:      | m³                     |
| Excavación sin clasificar(mov.de tierra) |  |              |                |                     |                    |              |                        |
| Abs. 3+000 a la 3+445                    |  |              |                |                     |                    |              |                        |
| VÍA JATUNPACCHA                          |  |              |                |                     |                    |              |                        |
| ABSCISAS                                 | LONGITUD (M)   | CAJERAS (M2) | ÁREA CORTE(M2) | AREA T. CORTE. (M2) | ÁREA PROMEDIO (M2) | VOLUMEN (M3) | VOLUMEN ACUMULADO (M3) |
| 3+000.00                                 |  | 2.42         | 0.60           | 3.02                |                    |              |                        |
|  | 20.00  |              |                |                     | 3.72               | 74.40        | 74.40                  |
| 3+020.00                                 |  | 2.75         | 1.66           | 4.414               |                    |              |                        |
|  | 20.00  |              |                |                     | 3.51               | 70.20        | 144.60                 |
| 3+040.00                                 |  | 2.32         | 0.29           | 2.61                |                    |              |                        |
|  | 20.00  |              |                |                     | 2.61               | 52.20        | 196.80                 |
| 3+060.00                                 |  | 2.47         | 0.14           | 2.61                |                    |              |                        |
|  | 20.00  |              |                |                     | 3.40               | 68.00        | 264.80                 |
| 3+080.00                                 |  | 2.78         | 1.41           | 4.19                |                    |              |                        |
|  | 20.00  |              |                |                     | 3.56               | 71.20        | 336.00                 |
| 3+100.00                                 |  | 2.43         | 0.50           | 2.93                |                    |              |                        |
|  | 20.00  |              |                |                     | 3.03               | 60.60        | 396.60                 |
| 3+120.00                                 |  | 2.33         | 0.79           | 3.12                |                    |              |                        |
|  | 20.00  |              |                |                     | 4.00               | 80.00        | 476.60                 |
| 3+140.00                                 |  | 2.69         | 2.19           | 4.879               |                    |              |                        |
|  | 20.00  |              |                |                     | 5.32               | 106.40       | 583.00                 |
| 3+160.00                                 |  | 3.26         | 2.51           | 5.77                |                    |              |                        |
|  | 20.00  |              |                |                     | 5.41               | 108.20       | 691.20                 |
| 3+180.00                                 |  | 3.27         | 1.77           | 5.04                |                    |              |                        |
|  | 20.00  |              |                |                     | 4.94               | 98.80        | 790.00                 |
| 3+200.00                                 |  | 3.26         | 1.58           | 4.84                |                    |              |                        |
|  | 20.00  |              |                |                     | 5.36               | 107.20       | 897.20                 |
| 3+220.00                                 |  | 3.25         | 2.62           | 5.87                |                    |              |                        |
|  | 20.00  |              |                |                     | 4.71               | 94.20        | 991.40                 |
| 3+240.00                                 |  | 3.06         | 0.49           | 3.546               |                    |              |                        |
|  | 20.00  |              |                |                     | 3.59               | 71.80        | 1 063.20               |
| 3+260.00                                 |  | 3.32         | 0.31           | 3.63                |                    |              |                        |
|  | 20.00  |              |                |                     | 4.79               | 95.80        | 1 159.00               |
| 3+280.00                                 |  | 3.51         | 2.45           | 5.956               |                    |              |                        |
|  | 20.00  |              |                |                     | 5.44               | 108.80       | 1 267.80               |
| 3+300.00                                 |  | 2.43         | 2.49           | 4.92                |                    |              |                        |
|  | 8.00   |              |                |                     | 5.04               | 40.32        | 1 308.12               |
| 3+308.00                                 |  | 3.67         | 1.48           | 5.15                |                    |              |                        |
|  | 12.00  |              |                |                     | 3.32               | 39.84        | 1 347.96               |
| 3+320.00                                 |  | 1.42         | 0.07           | 1.49                |                    |              |                        |
|  | 20.00  |              |                |                     | 2.12               | 42.40        | 1 390.36               |
| 3+340.00                                 |  | 1.59         | 1.16           | 2.75                |                    |              |                        |
|  | 20.00  |              |                |                     | 2.05               | 41.00        | 1 431.36               |
| 3+360.00                                 |  | 1.32         | 0.02           | 1.34                |                    |              |                        |
|  | 20.00  |              |                |                     | 1.49               | 29.80        | 1 461.16               |
| 3+380.00                                 |  | 1.59         | 0.04           | 1.63                |                    |              |                        |
|  | 20.00  |              |                |                     | 1.70               | 34.00        | 1 495.16               |


| ABSCISAS                        | LONGITUD (M) | CAJERAS (M2) | ÁREA CORTE(M2) | AREA T. CORTE. (M2) | ÁREA PROMEDIO (M2) | VOLUMEN (M3)           | VOLUMEN ACUMULADO (M3) |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| 3+400.00                        |              | 1.61         | 0.15           | 1.76                |                    |                        |                        |
|                                 | 20.00        |              |                |                     | 2.06               | 41.20                  | 1 536.36               |
| 3+420.00                        |              | 1.67         | 0.69           | 2.36                |                    |                        |                        |
|                                 | 20.00        |              |                |                     | 2.18               | 43.60                  | 1 579.96               |
| 3+440.00                        |              | 1.39         | 0.61           | 2                   |                    |                        |                        |
|                                 | 5.00         |              |                |                     | 1.49               | 7.45                   | 1 587.41               |
| 3+445.00                        |              | 0.97         | 0.01           | 0.98                |                    |                        |                        |
| Abs. 0+000 a la 0+340           |              |              |                |                     |                    |                        |                        |
| VIA ANTIGUA CURARAY             |              |              |                |                     |                    |                        |                        |
| ABSCISAS                        | LONGITUD (M) | CAJERA       |                | AREA T. CORTE. (M2) | VOLUMEN (M3)       | VOLUMEN ACUMULADO (M3) |                        |
|                                 |              | ALTO(M)      | ANCHO (M)      |                     |                    |                        |                        |
| 0+120.00                        | 9            | 3.40         | 1.50           | 5.10                | 45.90              | 45.90                  |                        |
| 0+180.00                        | 9            | 1.50         | 1.50           | 3.00                | 27.00              | 72.90                  |                        |
| <b>SUB TOTAL EJECUTADO (M3)</b> |              |              |                |                     |                    | <b>1 660.31</b>        |                        |

|  |  |
|--|--|
|  <p style="font-size: small;"> <small>Escaneado a través de:</small><br/> <small>ODILO VINICIO</small><br/> <small>GUEVARA MARIN</small> </p> |  <p style="font-size: small;"> <small>Escaneado a través de:</small><br/> <small>JESSICA MARIELA</small><br/> <small>JARAMILLO ARMIJOS</small> </p> |
| <b>CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.</b><br><b>CONTRATISTA</b>   | <b>KEYSZEN S.A.S</b><br><b>FISCALIZADOR EXTERNO</b>  |




**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA  
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO**



|                     |   |                  |                               |
|---------------------|---|------------------|-------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b>    | ASIFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA |                  |                               |
| <b>CONTRATISTA:</b> | C/A. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.   |                  |                               |
| <b>PLANILLA N°:</b> | 3   | <b>N° RUBRO:</b> | 17                            |
| <b>PERIODO:</b>     | 01-abr-23   | - 30-abr-23      | <b>UNIDAD:</b> m <sup>3</sup> |

**Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)**

**SECCIÓN TRANSVERSAL TIPO  
MEJORAMIENTO DE CAJERAS Y TERRAPLEN**



| TRAMO        | ABSCISADO |          | CANTIDAD EJECUTADA (m3) | OBSERVACIONES   |
|--------------|-----------|----------|-------------------------|---|
|              | DESDE     | HASTA    |                         |   |
| 1            | 3+000.00  | 3+445.00 | 1 938.62                | Ver anexo justificativo Rubro 17 (Estructura de via)                |
| 2            | 0+000.00  | 0+340.00 | 2 012.60                | Ver anexo justificativo Rubro 17 (Estructura de via)                |
| 3            | 0+000.00  | 0+340.00 | 72.90                   | Ver anexo justificativo Rubro 17 mejoramiento localizado para Dren. |
| <b>TOTAL</b> |           |          | <b>4 024.12</b>         |   |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| PLANILLADO ANTERIORMENTE =                 | 14 490.40 m <sup>3</sup> |
| TOTAL CONTRATADO =                         | 68 863.54 m <sup>3</sup> |
| CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA = | 4 024.12 m <sup>3</sup>  |
| CANTIDAD PLANILLADA =                      | 18 614.62 m <sup>3</sup> |
| EXCEDENTES =                               | - m <sup>3</sup>         |



Atestado electrónicamente por:  
**RODILLO VINICIO  
GUEVARA MARIN**

C/A. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
**CONTRATISTA.**



Atestado electrónicamente por:  
**JESSICA MARIELA  
JARAMILLO ARMIJOS**

KEYSZEN S.A.S  
**PROVEEDOR EXTERNO**



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA  
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO



AMAZONAS BUILDING S.A.

| PROYECTO:   | ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA |              |                  |              |               |              |                        |
|---|--|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------|
| CONTRATISTA:  | CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  |              |                  |              |               |              |                        |
| PLANILLA No.  | 3  |              |                  | Nº RUBRO     | 17            |              |                        |
| PERIODO:  | 01-abr-23  |              | -                | 30-abr-23    |               | UNIDAD:      | m³                     |
| <b>Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)</b> |  |              |                  |              |               |              |                        |
| VIA JATUNPACCHA   |  |              |                  |              |               |              |                        |
| Abs. 3+000 a la 3+445   |  |              |                  |              |               |              |                        |
| ABSCISAS  | LONGITUD (M)   | CAJERAS (M2) | ÁREA RELLENO(M2) | AREA T. (M2) | ÁREA PROMEDIO | VOLUMEN (M3) | VOLUMEN ACUMULADO (M3) |
| 3+000.00  |  | 2.42         | 0                | 2.42         |               |              |                        |
|   | 20.00  |              |                  |              | 2.59          | 51.80        | 51.80                  |
| 3+020.00  |  | 2.75         | 0                | 2.754        |               |              |                        |
|   | 20.00  |              |                  |              | 3.02          | 60.40        | 112.20                 |
| 3+040.00  |  | 2.32         | 0.97             | 3.29         |               |              |                        |
|   | 20.00  |              |                  |              | 21.00         | 420.00       | 532.20                 |
| 3+060.00  |  | 2.47         | 0.65             | 3.12         |               |              |                        |
|   | 20.00  |              |                  |              | 20.75         | 415.00       | 947.20                 |
| 3+080.00  |  | 2.78         | 0.02             | 2.8          |               |              |                        |
|   | 20.00  |              |                  |              | 2.91          | 58.20        | 1 005.40               |
| 3+100.00  |  | 2.43         | 0.58             | 3.01         |               |              |                        |
|   | 20.00  |              |                  |              | 3.00          | 60.00        | 1 065.40               |
| 3+120.00  |  | 2.33         | 0.65             | 2.98         |               |              |                        |
|   | 20.00  |              |                  |              | 2.91          | 58.20        | 1 123.60               |
| 3+140.00  |  | 2.69         | 0.16             | 2.849        |               |              |                        |
|   | 20.00  |              |                  |              | 3.05          | 61.00        | 1 184.60               |
| 3+160.00  |  | 3.26         | 0                | 3.26         |               |              |                        |
|   | 20.00  |              |                  |              | 3.35          | 67.00        | 1 251.60               |
| 3+180.00  |  | 3.27         | 0.16             | 3.43         |               |              |                        |
|   | 20.00  |              |                  |              | 3.36          | 67.20        | 1 318.80               |
| 3+200.00  |  | 3.26         | 0.03             | 3.29         |               |              |                        |
|   | 20.00  |              |                  |              | 3.28          | 65.60        | 1 384.40               |
| 3+220.00  |  | 3.25         | 0.01             | 3.26         |               |              |                        |
|   | 20.00  |              |                  |              | 3.74          | 74.80        | 1 459.20               |
| 3+240.00  |  | 3.06         | 1.17             | 4.226        |               |              |                        |
|   | 20.00  |              |                  |              | 4.11          | 82.20        | 1 541.40               |
| 3+260.00  |  | 3.32         | 0.67             | 3.99         |               |              |                        |
|   | 20.00  |              |                  |              | 3.75          | 75.00        | 1 616.40               |
| 3+280.00  |  | 3.51         | 0                | 3.506        |               |              |                        |
|   | 20.00  |              |                  |              | 3.27          | 65.40        | 1 681.80               |
| 3+300.00  |  | 2.43         | 0.61             | 3.04         |               |              |                        |
|   | 8.00   |              |                  |              | 2.09          | 16.72        | 1 698.52               |
| 3+308.00  |  | 3.67         | 2.956            | 1.147        |               |              |                        |
|   | 12.00  |              |                  |              | 1.60          | 19.20        | 1 717.72               |
| 3+320.00  |  | 1.42         | 0.64             | 2.06         |               |              |                        |
|   | 20.00  |              |                  |              | 1.92          | 38.40        | 1 756.12               |
| 3+340.00  |  | 1.59         | 0.19             | 1.78         |               |              |                        |
|   | 20.00  |              |                  |              | 1.59          | 31.80        | 1 787.92               |
| 3+360.00  |  | 1.32         | 0.07             | 1.393        |               |              |                        |
|   | 20.00  |              |                  |              | 1.61          | 32.20        | 1 820.12               |
| 3+380.00  |  | 1.59         | 0.23             | 1.82         |               |              |                        |
|   | 20.00  |              |                  |              | 1.80          | 36.00        | 1 856.12               |
| 3+400.00  |  | 1.61         | 0.17             | 1.78         |               |              |                        |
|   | 20.00  |              |                  |              | 1.76          | 35.20        | 1 891.32               |
| 3+420.00  |  | 1.67         | 0.07             | 1.74         |               |              |                        |
|   | 20.00  |              |                  |              | 1.83          | 36.60        | 1 927.92               |
| 3+440.00  |  | 1.39         | 0.53             | 1.92         |               |              |                        |
|   | 5.00   |              |                  |              | 2.14          | 10.70        | 1 938.62               |
| 3+445.00  |  | 0.97         | 1.39             | 2.36         |               |              |                        |
| <b>SUB TOTAL EJECUTADO (M3)</b>                                   |  |              |                  |              |               |              | <b>1 938.62</b>        |
| Abs. 0+000 a la 0+340   |  |              |                  |              |               |              |                        |
| VIA ANTIGUA CURARAY   |  |              |                  |              |               |              |                        |
| 0+000.00  |  |              | 4.86             | 4.86         |               |              |                        |
|   | 20.00  |              |                  |              | 5.33          | 106.60       | 106.60                 |
| 0+020.00  |  |              | 5.79             | 5.79         |               |              |                        |
|   | 20.00  |              |                  |              | 5.63          | 112.60       | 219.20                 |

|          |       |  |      |      |      |        |          |
|----------|-------|--|------|------|------|--------|----------|
| 0+040.00 |       |  | 5.47 | 5.47 |      |        |          |
|          | 20.00 |  |      |      | 5.31 | 106.20 | 325.40   |
| 0+060.00 |       |  | 5.15 | 5.15 |      |        |          |
|          | 20.00 |  |      |      | 5.37 | 107.40 | 432.80   |
| 0+080.00 |       |  | 5.58 | 5.58 |      |        |          |
|          | 20.00 |  |      |      | 5.88 | 117.60 | 550.40   |
| 0+100.00 |       |  | 6.18 | 6.18 |      |        |          |
|          | 20.00 |  |      |      | 6.21 | 124.20 | 674.60   |
| 0+120.00 |       |  | 6.23 | 6.23 |      |        |          |
|          | 20.00 |  |      |      | 6.15 | 123.00 | 797.60   |
| 0+140.00 |       |  | 6.07 | 6.07 |      |        |          |
|          | 20.00 |  |      |      | 5.94 | 118.80 | 916.40   |
| 0+160.00 |       |  | 5.81 | 5.81 |      |        |          |
|          | 20.00 |  |      |      | 6.01 | 120.20 | 1 036.60 |
| 0+180.00 |       |  | 6.21 | 6.21 |      |        |          |
|          | 20.00 |  |      |      | 5.83 | 116.60 | 1 153.20 |
| 0+200.00 |       |  | 5.44 | 5.44 |      |        |          |
|          | 20.00 |  |      |      | 5.39 | 107.80 | 1 261.00 |
| 0+220.00 |       |  | 5.33 | 5.33 |      |        |          |
|          | 20.00 |  |      |      | 5.42 | 108.40 | 1 369.40 |
| 0+240.00 |       |  | 5.5  | 5.5  |      |        |          |
|          | 20.00 |  |      |      | 5.86 | 117.20 | 1 486.60 |
| 0+260.00 |       |  | 6.22 | 6.22 |      |        |          |
|          | 20.00 |  |      |      | 5.78 | 115.60 | 1 602.20 |
| 0+280.00 |       |  | 5.34 | 5.34 |      |        |          |
|          | 20.00 |  |      |      | 5.98 | 119.60 | 1 721.80 |
| 0+300.00 |       |  | 6.62 | 6.62 |      |        |          |
|          | 20.00 |  |      |      | 7.17 | 143.40 | 1 865.20 |
| 0+320.00 |       |  | 7.71 | 7.71 |      |        |          |
|          | 20.00 |  |      |      | 7.37 | 147.40 | 2 012.60 |
| 0+340.00 |       |  | 7.03 | 7.03 |      |        |          |

**SUB TOTAL 2 EJECUTADO (M3)**

**2 012.60**

**VIA ANTIGUA CURARAY (MEJORAMIENTO LOCALIZADO PARA DRENAJE)**

| ABSCISAS | LONGITUD (M) | CAJERA  |           | AREA T. CORTE. (M2) | VOLUMEN (M3) | VOLUMEN ACUMULADO (M3) |
|----------|--------------|---------|-----------|---------------------|--------------|------------------------|
|          |              | ALTO(M) | ANCHO (M) |                     |              |                        |
| 0+120.00 | 9            | 3.40    | 1.50      | 5.10                | 45.90        | 45.90                  |
| 0+180.00 | 9            | 1.50    | 1.50      | 3.00                | 27.00        | 72.90                  |

**SUBTOTAL 2 EJECUTADO (M3)**

**72.90**



Firmado electrónicamente por:  
**RODILLO VINICIO GUEVARA MARIN**

**CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.**  
**CONTRATISTA**



Firmado electrónicamente por:  
**JESSICA MARIELA JARAMILLO ARMIJOS**

**KEYSZEN S.A.S**  
**FISCALIZADOR EXTERNO**



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA  
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO**



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>PROYECTO:</b>                   | ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA |
| <b>CONTRATISTA:</b>                | CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  |
| <b>PLANILLA N°:</b>                | 3  |
| <b>PERIODO:</b>                    | 01-abr-23 - 30-abr-23  |
| <b>N° RUBRO:</b>                   | 18   |
| <b>UNIDAD:</b>                     | m²   |
| <b>Material de subbase clase 3</b> |  |



| ABSCISADO    |          |              | ANCHO DE SUB-BASE |         | ANCHO TOTAL | ESPESOR | CANTIDAD | PERALTE | ALTURA      | CANTIDAD | EJECUTADA       | OBSERVACIONES |
|--------------|----------|--------------|-------------------|---------|-------------|---------|----------|---------|-------------|----------|-----------------|---------------|
| DESDE        | HASTA    | LONGITUD (m) | IZQUIERDA         | DERECHA | SUB-BASE    | (m)     | (a)      | E       | PERALTE (m) | (b)      | m³ (a+b)        |               |
| 2+080.00     | 2+080.00 | 20.00        | 3.60              | 3.90    | 7.50        | 0.15    | 22.5     | x       | 0.25        | 0.4875   | 22.99           | SOBRE ANCHO   |
| 2+080.00     | 2+100.00 | 20.00        | 3.60              | 3.90    | 7.50        | 0.15    | 22.5     | x       | 0.25        | 0.4875   | 22.99           | SOBRE ANCHO   |
| 2+100.00     | 2+120.00 | 20.00        | 3.60              | 3.90    | 7.50        | 0.15    | 22.5     | x       | 0.25        | 0.4875   | 22.99           | SOBRE ANCHO   |
| 2+120.00     | 2+140.00 | 20.00        | 3.60              | 3.90    | 7.50        | 0.15    | 22.5     | x       | 0.25        | 0.4875   | 22.99           | SOBRE ANCHO   |
| 2+140.00     | 2+160.00 | 20.00        | 3.60              | 3.90    | 7.50        | 0.15    | 22.5     | x       | 0.25        | 0.4875   | 22.99           | SOBRE ANCHO   |
| 2+160.00     | 2+180.00 | 20.00        | 3.60              | 3.80    | 7.40        | 0.15    | 22.2     |         |             | 0        | 22.20           | SOBRE ANCHO   |
| 2+180.00     | 2+200.00 | 20.00        | 3.60              | 3.60    | 7.20        | 0.15    | 21.6     |         |             | 0        | 21.60           |               |
| 2+200.00     | 2+220.00 | 20.00        | 3.60              | 3.60    | 7.20        | 0.15    | 21.6     |         |             | 0        | 21.60           |               |
| 2+220.00     | 2+240.00 | 20.00        | 3.60              | 3.60    | 7.20        | 0.15    | 21.6     |         |             | 0        | 21.60           |               |
| 2+240.00     | 2+260.00 | 20.00        | 3.60              | 3.60    | 7.20        | 0.15    | 21.6     |         |             | 0        | 21.60           |               |
| 2+260.00     | 2+280.00 | 20.00        | 3.60              | 3.60    | 7.20        | 0.15    | 21.6     |         |             | 0        | 21.60           |               |
| 2+280.00     | 2+300.00 | 20.00        | 3.60              | 3.60    | 7.20        | 0.15    | 21.6     |         |             | 0        | 21.60           |               |
| 2+300.00     | 2+320.00 | 20.00        | 3.80              | 3.60    | 7.40        | 0.15    | 22.38    |         |             | 0        | 22.38           | SOBRE ANCHO   |
| 2+320.00     | 2+340.00 | 20.00        | 3.60              | 3.60    | 7.20        | 0.15    | 21.6     |         |             | 0        | 21.60           |               |
| 2+340.00     | 2+360.00 | 20.00        | 3.60              | 3.60    | 7.20        | 0.15    | 21.6     |         |             | 0        | 21.60           |               |
| 2+360.00     | 2+380.00 | 20.00        | 3.60              | 3.60    | 7.20        | 0.15    | 21.6     | x       | 0.18        | 0.324    | 21.92           |               |
| 2+380.00     | 2+400.00 | 20.00        | 3.60              | 4.00    | 7.60        | 0.15    | 22.8     | x       | 0.3         | 0.6      | 23.40           | SOBRE ANCHO   |
| 2+400.00     | 2+420.00 | 20.00        | 3.60              | 4.20    | 7.80        | 0.15    | 23.7     | x       | 0.3         | 0.645    | 24.35           | SOBRE ANCHO   |
| 2+420.00     | 2+440.00 | 20.00        | 3.60              | 4.30    | 7.90        | 0.15    | 23.7     | x       | 0.3         | 0.645    | 24.35           | SOBRE ANCHO   |
| 2+440.00     | 2+460.00 | 20.00        | 3.60              | 4.30    | 7.90        | 0.15    | 23.7     | x       | 0.3         | 0.645    | 24.35           | SOBRE ANCHO   |
| 2+460.00     | 2+480.00 | 20.00        | 3.60              | 3.62    | 7.22        | 0.15    | 21.68    | x       | 0.15        | 0.2715   | 21.93           | SOBRE ANCHO   |
| 2+480.00     | 2+500.00 | 20.00        | 3.60              | 3.60    | 7.20        | 0.15    | 21.6     |         |             | 0        | 21.60           |               |
| 2+500.00     | 2+520.00 | 20.00        | 3.60              | 3.60    | 7.20        | 0.15    | 21.6     |         |             | 0        | 21.60           |               |
| 2+520.00     | 2+540.00 | 20.00        | 3.60              | 3.60    | 7.20        | 0.15    | 21.6     |         |             | 0        | 21.60           |               |
| 2+540.00     | 2+560.00 | 20.00        | 3.60              | 3.60    | 7.20        | 0.15    | 21.6     |         |             | 0        | 21.60           |               |
| 2+560.00     | 2+580.00 | 20.00        | 3.60              | 3.60    | 7.20        | 0.15    | 21.6     |         |             | 0        | 21.60           |               |
| 2+580.00     | 2+600.00 | 20.00        | 3.60              | 3.60    | 7.20        | 0.15    | 21.6     |         |             | 0        | 21.60           |               |
| 2+600.00     | 2+620.00 | 20.00        | 3.80              | 3.8     | 7.20        | 0.15    | 21.6     |         |             | 0        | 21.60           |               |
| 2+620.00     | 2+640.00 | 20.00        | 3.80              | 3.8     | 7.20        | 0.15    | 21.6     |         |             | 0        | 21.60           |               |
| 2+640.00     | 2+660.00 | 20.00        | 3.80              | 3.8     | 7.20        | 0.15    | 21.6     |         |             | 0        | 21.60           |               |
| 2+660.00     | 2+680.00 | 20.00        | 3.60              | 3.8     | 7.20        | 0.15    | 21.6     | x       | 0.25        | 0.45     | 22.05           |               |
| 2+680.00     | 2+700.00 | 20.00        | 4.10              | 3.8     | 7.70        | 0.15    | 23.1     | x       | 0.25        | 0.45     | 23.55           | SOBRE ANCHO   |
| 2+700.00     | 2+720.00 | 20.00        | 4.10              | 3.8     | 7.70        | 0.15    | 23.1     | x       | 0.175       | 0.315    | 23.42           | SOBRE ANCHO   |
| 2+720.00     | 2+740.00 | 20.00        | 4.10              | 3.8     | 7.70        | 0.15    | 23.1     |         |             | 0        | 23.10           | SOBRE ANCHO   |
| 2+740.00     | 2+760.00 | 20.00        | 3.94              | 3.8     | 7.54        | 0.15    | 22.82    |         |             | 0        | 22.82           | SOBRE ANCHO   |
| 2+760.00     | 2+780.00 | 20.00        | 3.80              | 3.8     | 7.20        | 0.15    | 21.6     |         |             | 0        | 21.60           |               |
| 2+780.00     | 2+800.00 | 20.00        | 3.80              | 3.8     | 7.20        | 0.15    | 21.6     |         |             | 0        | 21.60           |               |
| 2+800.00     | 2+820.00 | 20.00        | 3.80              | 3.8     | 7.20        | 0.15    | 21.6     |         |             | 0        | 21.60           |               |
| 2+820.00     | 2+840.00 | 20.00        | 3.98              | 3.8     | 7.88        | 0.15    | 22.74    | x       | 0.2         | 0.36     | 23.10           | SOBRE ANCHO   |
| 2+840.00     | 2+860.00 | 20.00        | 4.10              | 3.8     | 7.70        | 0.15    | 23.1     | x       | 0.25        | 0.488    | 23.57           | SOBRE ANCHO   |
| 2+860.00     | 2+880.00 | 20.00        | 3.97              | 3.8     | 7.57        | 0.15    | 22.71    | x       | 0.2         | 0.36     | 23.07           | SOBRE ANCHO   |
| 2+880.00     | 2+900.00 | 20.00        | 3.80              | 3.8     | 7.20        | 0.15    | 21.6     |         |             | 0        | 21.60           |               |
| 2+900.00     | 2+920.00 | 20.00        | 3.80              | 3.8     | 7.20        | 0.15    | 21.6     |         |             | 0        | 21.60           |               |
| 2+920.00     | 2+940.00 | 20.00        | 3.60              | 3.8     | 7.20        | 0.15    | 21.6     | x       | 0.3         | 0.54     | 22.14           |               |
| 2+940.00     | 2+960.00 | 20.00        | 3.80              | 4.3     | 7.90        | 0.15    | 23.7     | x       | 0.3         | 0.645    | 24.35           | SOBRE ANCHO   |
| 2+960.00     | 2+980.00 | 20.00        | 3.60              | 4.3     | 7.90        | 0.15    | 23.7     | x       | 0.3         | 0.645    | 24.35           | SOBRE ANCHO   |
| 2+980.00     | 3+000.00 | 20.00        | 3.60              | 4.3     | 7.90        | 0.15    | 23.7     | x       | 0.25        | 0.5375   | 24.24           | SOBRE ANCHO   |
| 3+000.00     | 3+020.00 | 20.00        | 3.80              | 4.22    | 7.82        | 0.15    | 23.46    |         |             | 0        | 23.46           | SOBRE ANCHO   |
| 3+020.00     | 3+040.00 | 20.00        | 3.80              | 3.8     | 7.20        | 0.15    | 21.6     | x       | 0.41        | 0.738    | 22.34           |               |
| 3+040.00     | 3+060.00 | 20.00        | 4.40              | 3.8     | 8.00        | 0.15    | 24       | x       | 0.41        | 0.738    | 24.74           | SOBRE ANCHO   |
| 3+060.00     | 3+080.00 | 20.00        | 4.40              | 3.8     | 8.00        | 0.15    | 24       | x       | 0.41        | 0.738    | 24.74           | SOBRE ANCHO   |
| 3+080.00     | 3+100.00 | 20.00        | 4.40              | 3.8     | 8.00        | 0.15    | 24       | x       | 0.41        | 0.738    | 24.74           | SOBRE ANCHO   |
| 3+100.00     | 3+120.00 | 20.00        | 4.40              | 3.8     | 8.00        | 0.15    | 24       | x       | 0.46        | 0.828    | 24.83           | SOBRE ANCHO   |
| 3+120.00     | 3+140.00 | 20.00        | 3.80              | 3.8     | 7.20        | 0.15    | 21.6     |         |             | 0        | 21.60           |               |
| 3+140.00     | 3+160.00 | 20.00        | 3.80              | 3.8     | 7.20        | 0.15    | 21.6     |         |             | 0        | 21.60           |               |
| 3+160.00     | 3+180.00 | 20.00        | 3.80              | 3.8     | 7.20        | 0.15    | 21.6     |         |             | 0        | 21.60           |               |
| 3+180.00     | 3+200.00 | 20.00        | 3.80              | 3.8     | 7.20        | 0.15    | 21.6     |         |             | 0        | 21.60           |               |
| 3+200.00     | 3+220.00 | 20.00        | 3.80              | 4.16    | 7.76        | 0.15    | 23.28    | x       | 0.36        | 0.728    | 24.01           | SOBRE ANCHO   |
| 3+220.00     | 3+240.00 | 20.00        | 3.80              | 4.7     | 8.30        | 0.15    | 24.9     | x       | 0.65        | 1.5275   | 26.43           | SOBRE ANCHO   |
| 3+240.00     | 3+260.00 | 20.00        | 3.80              | 4.16    | 7.76        | 0.15    | 23.28    | x       | 0.32        | 0.6656   | 23.95           | SOBRE ANCHO   |
| 3+260.00     | 3+280.00 | 20.00        | 3.80              | 3.8     | 7.20        | 0.15    | 21.6     |         |             | 0        | 21.60           |               |
| 3+280.00     | 3+300.00 | 20.00        | 3.80              | 3.8     | 7.20        | 0.15    | 21.6     |         |             | 0        | 21.60           | SOBRE ANCHO   |
| 3+300.00     | 3+320.00 | 20.00        | 4.40              | 3.8     | 8.00        | 0.15    | 24       |         |             | 0        | 24.00           | SOBRE ANCHO   |
| 3+320.00     | 3+340.00 | 20.00        | 4.40              | 3.8     | 8.00        | 0.15    | 24       | x       | 0.28        | 0.488    | 24.47           | SOBRE ANCHO   |
| 3+340.00     | 3+360.00 | 20.00        | 4.80              | 3.8     | 8.10        | 0.15    | 24.3     | x       | 0.27        | 0.486    | 24.78           | SOBRE ANCHO   |
| 3+360.00     | 3+380.00 | 20.00        | 4.70              | 3.8     | 8.30        | 0.15    | 24.9     | x       | 0.27        | 0.486    | 25.38           | SOBRE ANCHO   |
| 3+380.00     | 3+400.00 | 20.00        | 4.70              | 3.8     | 8.30        | 0.15    | 24.9     | x       | 0.27        | 0.488    | 25.38           | SOBRE ANCHO   |
| 3+400.00     | 3+420.00 | 20.00        | 4.70              | 3.8     | 8.30        | 0.15    | 24.9     | x       | 0.273       | 0.4914   | 25.39           | SOBRE ANCHO   |
| 3+420.00     | 3+440.00 | 20.00        | 3.80              | 3.8     | 7.20        | 0.15    | 21.6     |         |             | 0        | 21.60           |               |
| 3+440.00     | 3+445.00 | 5.00         | 3.60              | 3.6     | 7.20        | 0.15    | 5.4      | x       | 0.18        | 0.288    | 5.69            |               |
| <b>TOTAL</b> |          |              |                   |         |             |         |          |         |             |          | <b>1 580.98</b> |               |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| PLANILLADO ANTERIORMENTE =                 | m <sup>3</sup>           |
| TOTAL CONTRATADO =                         | 13 031.28 m <sup>3</sup> |
| CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA = | 1 580.98 m <sup>3</sup>  |
| CANTIDAD PLANILLADA =                      | 1 580.98 m <sup>3</sup>  |
| EXCEDENTES =                               | - m <sup>3</sup>         |



ODILO VILLACID  
GUEVARA MERRIN

CIA. AMAZONAS BUILDING AND CONSTRUCTION S.A.  
CONTRATISTA



JESSICA MARIELA  
JARAMILLO ARMijos

KEYSEN S.A.S  
FISCALIZADOR EXTERNO




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO



PROVINCIAL DE PASTAZA  
ANEXO - MEMORIA DE CALCULO

|  |  |           |         |                |
|--|--|-----------|---------|----------------|
| PROYECTO:                              | ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HABTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA |           |         |                |
| CONTRATISTA:                           | CIA. AMAZONAS BUILDING S.A   |           |         |                |
| PLANILLA N°:                           | 3  | N° RUBRO: | 19      |                |
| PERIODO:                               | 01-abr-23  | 30-abr-23 | UNIDAD: | m <sup>3</sup> |
| Material de base granular de agregados |  |           |         |                |

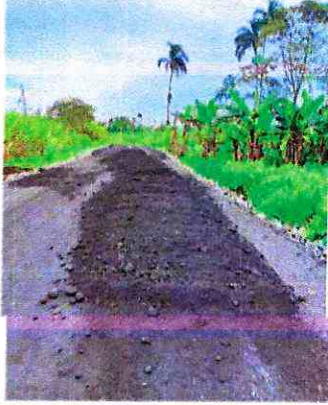

| ABSCISADO |          | ANCHO DE BASE |           | ANCHO TOTAL | ESPESOR (m) | CANTIDAD (a) m <sup>3</sup> | PERALTE | ALTURA PERALTE (m) | CANTIDAD (b) | EJECUTADA m <sup>3</sup> (a+b) | OBSERVACIONES |             |
|-----------|----------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------------------------|---------|--------------------|--------------|--------------------------------|---------------|-------------|
| DESDE     | HASTA    | LONGITUD (m)  | IZQUIERDA |             |             |                             |         |                    |              |                                |               | DERECHA     |
| 2+090.00  | 2+090.00 | 20.00         | 3.2       | 3.5         | 6.70        | 0.1                         | 13.4    | x                  | 0.25         | 0.40                           | 13.80         |             |
| 2+080.00  | 2+100.00 | 20.00         | 3.2       | 3.5         | 6.70        | 0.1                         | 13.4    | x                  | 0.25         | 0.40                           | 13.80         |             |
| 2+100.00  | 2+120.00 | 20.00         | 3.2       | 3.5         | 6.70        | 0.1                         | 13.4    | x                  | 0.25         | 0.40                           | 13.80         |             |
| 2+120.00  | 2+140.00 | 20.00         | 3.2       | 3.5         | 6.70        | 0.1                         | 13.4    | x                  | 0.25         | 0.40                           | 13.80         |             |
| 2+140.00  | 2+160.00 | 20.00         | 3.2       | 3.5         | 6.70        | 0.1                         | 13.4    | x                  | 0.25         | 0.40                           | 13.80         |             |
| 2+160.00  | 2+180.00 | 20.00         | 3.2       | 3.4         | 6.60        | 0.1                         | 13.2    |                    |              | 0.00                           | 13.20         |             |
| 2+180.00  | 2+200.00 | 20.00         | 3.2       | 3.2         | 6.40        | 0.1                         | 12.8    |                    |              | 0.00                           | 12.80         |             |
| 2+200.00  | 2+220.00 | 20.00         | 3.2       | 3.2         | 6.40        | 0.1                         | 12.8    |                    |              | 0.00                           | 12.80         |             |
| 2+220.00  | 2+240.00 | 20.00         | 3.2       | 3.2         | 6.40        | 0.1                         | 12.8    |                    |              | 0.00                           | 12.80         |             |
| 2+240.00  | 2+260.00 | 20.00         | 3.2       | 3.2         | 6.40        | 0.1                         | 12.8    |                    |              | 0.00                           | 12.80         |             |
| 2+260.00  | 2+280.00 | 20.00         | 3.2       | 3.2         | 6.40        | 0.1                         | 12.8    |                    |              | 0.00                           | 12.80         |             |
| 2+280.00  | 2+300.00 | 20.00         | 3.2       | 3.2         | 6.40        | 0.1                         | 12.8    |                    |              | 0.00                           | 12.80         |             |
| 2+300.00  | 2+320.00 | 20.00         | 3.46      | 3.2         | 6.66        | 0.1                         | 13.32   |                    |              | 0.00                           | 13.32         |             |
| 2+320.00  | 2+340.00 | 20.00         | 3.2       | 3.2         | 6.40        | 0.1                         | 12.8    |                    |              | 0.00                           | 12.80         |             |
| 2+340.00  | 2+360.00 | 20.00         | 3.2       | 3.2         | 6.40        | 0.1                         | 12.8    |                    |              | 0.00                           | 12.80         |             |
| 2+360.00  | 2+380.00 | 20.00         | 3.2       | 3.2         | 6.40        | 0.1                         | 12.8    | x                  | 0.18         | 0.28                           | 13.08         |             |
| 2+380.00  | 2+400.00 | 20.00         | 3.2       | 3.6         | 6.80        | 0.1                         | 13.6    | x                  | 0.3          | 0.48                           | 14.08         |             |
| 2+400.00  | 2+420.00 | 20.00         | 3.2       | 3.9         | 7.10        | 0.1                         | 14.2    | x                  | 0.3          | 0.48                           | 14.68         |             |
| 2+420.00  | 2+440.00 | 20.00         | 3.2       | 3.9         | 7.10        | 0.1                         | 14.2    | x                  | 0.3          | 0.48                           | 14.68         |             |
| 2+440.00  | 2+460.00 | 20.00         | 3.2       | 3.9         | 7.10        | 0.1                         | 14.2    | x                  | 0.3          | 0.48                           | 14.68         |             |
| 2+460.00  | 2+480.00 | 20.00         | 3.2       | 3.22        | 6.42        | 0.1                         | 12.84   | x                  | 0.15         | 0.24                           | 13.08         |             |
| 2+480.00  | 2+500.00 | 20.00         | 3.2       | 3.2         | 6.40        | 0.1                         | 12.8    |                    |              | 0.00                           | 12.80         |             |
| 2+500.00  | 2+520.00 | 20.00         | 3.2       | 3.2         | 6.40        | 0.1                         | 12.8    |                    |              | 0.00                           | 12.80         |             |
| 2+520.00  | 2+540.00 | 20.00         | 3.2       | 3.2         | 6.40        | 0.1                         | 12.8    |                    |              | 0.00                           | 12.80         |             |
| 2+540.00  | 2+560.00 | 20.00         | 3.2       | 3.2         | 6.40        | 0.1                         | 12.8    |                    |              | 0.00                           | 12.80         |             |
| 2+560.00  | 2+580.00 | 20.00         | 3.2       | 3.2         | 6.40        | 0.1                         | 12.8    |                    |              | 0.00                           | 12.80         |             |
| 2+580.00  | 2+600.00 | 20.00         | 3.2       | 3.2         | 6.40        | 0.1                         | 12.8    |                    |              | 0.00                           | 12.80         |             |
| 2+600.00  | 2+620.00 | 20.00         | 3.2       | 3.2         | 6.40        | 0.1                         | 12.8    |                    |              | 0.00                           | 12.80         |             |
| 2+620.00  | 2+640.00 | 20.00         | 3.2       | 3.2         | 6.40        | 0.1                         | 12.8    |                    |              | 0.00                           | 12.80         |             |
| 2+640.00  | 2+660.00 | 20.00         | 3.2       | 3.2         | 6.40        | 0.1                         | 12.8    |                    |              | 0.00                           | 12.80         |             |
| 2+660.00  | 2+680.00 | 20.00         | 3.2       | 3.2         | 6.40        | 0.1                         | 12.8    | x                  | 0.25         | 0.40                           | 13.20         |             |
| 2+680.00  | 2+700.00 | 20.00         | 3.7       | 3.2         | 6.90        | 0.1                         | 13.8    | x                  | 0.25         | 0.40                           | 14.20         | SOBRE ANCHO |
| 2+700.00  | 2+720.00 | 20.00         | 3.7       | 3.2         | 6.90        | 0.1                         | 13.8    | x                  | 0.175        | 0.28                           | 14.08         | SOBRE ANCHO |
| 2+720.00  | 2+740.00 | 20.00         | 3.7       | 3.2         | 6.90        | 0.1                         | 13.8    |                    |              | 0.00                           | 13.80         | SOBRE ANCHO |
| 2+740.00  | 2+760.00 | 20.00         | 3.64      | 3.2         | 6.74        | 0.1                         | 13.48   |                    |              | 0.00                           | 13.48         | SOBRE ANCHO |
| 2+760.00  | 2+780.00 | 20.00         | 3.2       | 3.2         | 6.40        | 0.1                         | 12.8    |                    |              | 0.00                           | 12.80         |             |
| 2+780.00  | 2+800.00 | 20.00         | 3.2       | 3.2         | 6.40        | 0.1                         | 12.8    |                    |              | 0.00                           | 12.80         |             |
| 2+800.00  | 2+820.00 | 20.00         | 3.2       | 3.2         | 6.40        | 0.1                         | 12.8    |                    |              | 0.00                           | 12.80         |             |
| 2+820.00  | 2+840.00 | 20.00         | 3.68      | 3.2         | 6.78        | 0.1                         | 13.56   | x                  | 0.2          | 0.32                           | 13.88         | SOBRE ANCHO |
| 2+840.00  | 2+860.00 | 20.00         | 3.7       | 3.2         | 6.90        | 0.1                         | 13.8    | x                  | 0.26         | 0.42                           | 14.22         | SOBRE ANCHO |
| 2+860.00  | 2+880.00 | 20.00         | 3.67      | 3.2         | 6.77        | 0.1                         | 13.54   | x                  | 0.2          | 0.32                           | 13.86         | SOBRE ANCHO |
| 2+880.00  | 2+900.00 | 20.00         | 3.2       | 3.2         | 6.40        | 0.1                         | 12.8    |                    |              | 0.00                           | 12.80         |             |
| 2+900.00  | 2+920.00 | 20.00         | 3.2       | 3.2         | 6.40        | 0.1                         | 12.8    |                    |              | 0.00                           | 12.80         |             |
| 2+920.00  | 2+940.00 | 20.00         | 3.2       | 3.2         | 6.40        | 0.1                         | 12.8    | x                  | 0.3          | 0.48                           | 13.28         |             |
| 2+940.00  | 2+960.00 | 20.00         | 3.2       | 3.9         | 7.10        | 0.1                         | 14.2    | x                  | 0.3          | 0.48                           | 14.70         | SOBRE ANCHO |
| 2+960.00  | 2+980.00 | 20.00         | 3.2       | 3.9         | 7.10        | 0.1                         | 14.2    | x                  | 0.3          | 0.48                           | 14.70         | SOBRE ANCHO |
| 2+980.00  | 3+000.00 | 20.00         | 3.2       | 3.9         | 7.10        | 0.1                         | 14.2    | x                  | 0.25         | 0.48                           | 14.68         | SOBRE ANCHO |
| 3+000.00  | 3+020.00 | 20.00         | 3.2       | 3.82        | 7.02        | 0.1                         | 14.04   |                    |              | 0.00                           | 14.04         | SOBRE ANCHO |
| 3+020.00  | 3+040.00 | 20.00         | 3.2       | 3.2         | 6.40        | 0.1                         | 12.8    | x                  | 0.41         | 0.66                           | 13.46         |             |
| 3+040.00  | 3+060.00 | 20.00         | 4         | 3.2         | 7.20        | 0.1                         | 14.4    | x                  | 0.41         | 0.66                           | 15.06         | SOBRE ANCHO |
| 3+060.00  | 3+080.00 | 20.00         | 4         | 3.2         | 7.20        | 0.1                         | 14.4    | x                  | 0.41         | 0.66                           | 15.06         | SOBRE ANCHO |
| 3+080.00  | 3+100.00 | 20.00         | 4         | 3.2         | 7.20        | 0.1                         | 14.4    | x                  | 0.41         | 0.66                           | 15.06         | SOBRE ANCHO |
| 3+100.00  | 3+120.00 | 20.00         | 4         | 3.2         | 7.20        | 0.1                         | 14.4    | x                  | 0.48         | 0.74                           | 15.14         | SOBRE ANCHO |
| 3+120.00  | 3+140.00 | 20.00         | 3.2       | 3.2         | 6.40        | 0.1                         | 12.8    |                    |              | 0.00                           | 12.80         |             |
| 3+140.00  | 3+160.00 | 20.00         | 3.2       | 3.2         | 6.40        | 0.1                         | 12.8    |                    |              | 0.00                           | 12.80         |             |
| 3+160.00  | 3+180.00 | 20.00         | 3.2       | 3.2         | 6.40        | 0.1                         | 12.8    |                    |              | 0.00                           | 12.80         |             |
| 3+180.00  | 3+200.00 | 20.00         | 3.2       | 3.2         | 6.40        | 0.1                         | 12.8    |                    |              | 0.00                           | 12.80         |             |
| 3+200.00  | 3+220.00 | 20.00         | 3.2       | 3.76        | 6.96        | 0.1                         | 13.92   | x                  | 0.35         | 0.66                           | 14.58         | SOBRE ANCHO |
| 3+220.00  | 3+240.00 | 20.00         | 3.2       | 4.3         | 7.50        | 0.1                         | 15      | x                  | 0.65         | 1.40                           | 16.40         | SOBRE ANCHO |
| 3+240.00  | 3+260.00 | 20.00         | 3.2       | 3.76        | 6.96        | 0.1                         | 13.92   | x                  | 0.32         | 0.60                           | 14.52         | SOBRE ANCHO |
| 3+260.00  | 3+280.00 | 20.00         | 3.2       | 3.2         | 6.40        | 0.1                         | 12.8    |                    |              | 0.00                           | 12.80         |             |
| 3+280.00  | 3+300.00 | 20.00         | 3.5       | 3.2         | 6.70        | 0.1                         | 13.4    |                    |              | 0.00                           | 13.40         | SOBRE ANCHO |
| 3+300.00  | 3+320.00 | 20.00         | 4         | 3.2         | 7.20        | 0.1                         | 14.4    |                    |              | 0.00                           | 14.40         | SOBRE ANCHO |

|              |          |       |     |     |      |     |      |   |       |      |               |             |
|--------------|----------|-------|-----|-----|------|-----|------|---|-------|------|---------------|-------------|
| 3+320.00     | 3+345.00 | 20.00 | 4   | 3.2 | 7.20 | 0.1 | 14.4 | x | 0.26  | 0.42 | 14.82         | SOBRE ANCHO |
| 3+340.00     | 3+350.00 | 20.00 | 4.1 | 3.2 | 7.30 | 0.1 | 14.6 | x | 0.27  | 0.43 | 15.03         | SOBRE ANCHO |
| 3+350.00     | 3+360.00 | 20.00 | 4.3 | 3.2 | 7.50 | 0.1 | 15   | x | 0.27  | 0.43 | 15.43         | SOBRE ANCHO |
| 3+380.00     | 3+400.00 | 20.00 | 4.3 | 3.2 | 7.50 | 0.1 | 15   | x | 0.27  | 0.43 | 15.43         | SOBRE ANCHO |
| 3+400.00     | 3+420.00 | 20.00 | 4.3 | 3.2 | 7.50 | 0.1 | 15   | x | 0.273 | 0.44 | 15.44         | SOBRE ANCHO |
| 3+420.00     | 3+440.00 | 20.00 | 3.2 | 3.2 | 6.40 | 0.1 | 12.8 |   |       | 0.00 | 12.80         |             |
| 3+440.00     | 3+445.00 | 5.00  | 3.2 | 3.2 | 6.40 | 0.1 | 3.2  | x | 0.16  | 0.26 | 3.46          |             |
| <b>TOTAL</b> |          |       |     |     |      |     |      |   |       |      | <b>947.16</b> |             |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| PLANILLADO ANTERIORES =                    | 1 125.00 m <sup>3</sup>  |
| TOTAL CONTRATADO =                         | 21 010.88 m <sup>3</sup> |
| CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA = | 947.16 m <sup>3</sup>    |
| CANTIDAD PLANILLADA =                      | 2 072.16 m <sup>3</sup>  |
| EXCEDENTES =                               | 0 m <sup>3</sup>         |



firmado electrónicamente por:  
**ODILO VINICIO**  
**GUEVARA MARIN**



firmado electrónicamente por:  
**JESSICA MARIELA**  
**JARAMILLO ARMIJOS**

CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
 CONTRATISTA

KEYBZEN S.A.S  
 FISCALIZADOR EXTERNO



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
 PROVINCIAL DE PASTAZA  
 ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO



PROYECTO: ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

CONTRATISTA: CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

PLANILLA N°: 3 N° RUBRO: 21

PERIODO: 01-abr-23 - 30-abr-23 UNIDAD: m³ - km

Transporte de material pétreo de mejoramiento



| TRAMO            | ABSCISADO |          | CANTIDAD EJECUTADA (m3) | DISTANCIA MINA - INICIO PROYECTO (Km) | CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO (Km) | DISTANCIA TOTAL (Km) | TOTAL (m³ - Km)  | OBSERVACIONES                                       |
|------------------|-----------|----------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|---|
|                  | DESDE     | HASTA    |                         |                                       |                                      |                      |                  |   |
| 1                | 3+000.00  | 3+445.00 | 1 938.82                | 31.33                                 | 1.65                                 | 32.98                | 63 935.69        | Cantidades detalladas en Anexo 17 - Vía Jatunpaccha |
| 2                | 0+000.00  | 0+340.00 | 2 012.60                | 26.98                                 | 6.00                                 | 32.98                | 66 375.55        | Cantidades detalladas en Anexo 17 - Vía Curaray     |
| <b>SUB TOTAL</b> |           |          |                         |                                       |                                      |                      | <b>63 935.69</b> |   |

|  |              |         |
|--|--------------|---------|
| PLANILLADO ANTERIORMENTE =                 | 477 893.40   | m³ - km |
| TOTAL CONTRATADO =                         | 3 309 493.83 | m³ - km |
| CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA = | 63 935.69    | m³ - km |
| CANTIDAD PLANILLADA                        | 541 829.09   | m³ - km |
| EXCEDENTES                                 | -            | m³ - km |



ODILO VIVICIO  
 GUEVARA MARIN



JESSICA MARIELA  
 JARAMILLO ARMIJOS

CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
 CONTRATISTA

KEYSZEN S.A.S  
 FISCALIZADOR EXTERNO



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

PROVINCIAL DE PASTAZA  
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO



PROYECTO: ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

CONTRATISTA: CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
PLANILLA N°: 3 N° RUBRO: 22  
PERIODO: 01-abr-23 - 30-abr-23 UNIDAD: m³ - km

Transporte de material pétreo de subbase clase 3



| TRAMO            | ABSCISADO |          | CANTIDAD EJECUTADA (m³) | DISTANCIA MINA - INICIO PROYECTO (Km) | CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO (Km) | DISTANCIA TOTAL (Km) | TOTAL (m³ - Km)  | OBSERVACIONES                                     |
|------------------|-----------|----------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|---|
|                  | DESDE     | HASTA    |                         |                                       |                                      |                      |                  |   |
| 1                | 2+060.00  | 3+445.00 | 1 580.98                | 31.33                                 | 1.85                                 | 32.98                | 52 140.56        | Cantidades detalladas en Anexo 18-vía Jatunpaccha |
| <b>SUB TOTAL</b> |           |          |                         |                                       |                                      |                      | <b>52 140.56</b> |   |

|  |                    |
|--|--------------------|
| PLANILLADO ANTERIORMENTE =                 | 37 102.60 m³ - km  |
| TOTAL CONTRATADO =                         | 781 104.32 m³ - km |
| CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA = | 52 140.56 m³ - km  |
| CANTIDAD PLANILLADA                        | 89 243.06 m³ - km  |
| EXCEDENTES =                               | - m³ - km          |



Firmado electrónicamente por:  
ODILO VIVAZO  
GUEVARA MARIN

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:  
JESSICA MARIELA  
JARAMILLO ARMIJO

KEYSZEN S.A.S  
FISCALIZADOR EXTERNO



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
 PROVINCIAL DE PASTAZA  
 ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO



PROYECTO: ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

CONTRATISTA: CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
 PLANILLA N°: 3 N° RUBRO: 23  
 PERIODO: 01-abr-23 30-abr-23 UNIDAD: m³ - km

Transporte de material pétreo de base granular de agregados



| TRAMO     | ABSCISADO |          | CANTIDAD EJECUTADA (m3) | DISTANCIA MINA - INICIO PROYECTO (Km) | CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO (Km) | DISTANCIA TOTAL (Km) | TOTAL (m³ - Km) | OBSERVACIONES                                      |
|-----------|-----------|----------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|--|
|           | DESDE     | HASTA    |                         |                                       |                                      |                      |                 |  |
| 1         | 2+060.00  | 3+445.00 | 947.16                  | 31.33                                 | 1.65                                 | 32.98                | 31 237.45       | Cantidades detalladas en Anexo 18-Via Jatun Paccha |
| SUB TOTAL |           |          |                         |                                       |                                      |                      | 31 237.45       |  |

|  |                    |
|--|--------------------|
| PLANILLADO ANTERIORMENTE =                 | m³ - km            |
| TOTAL CONTRATADO =                         | 484 450.99 m³ - km |
| CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA = | 31 237.45 m³ - km  |
| CANTIDAD PLANILLADA                        | 31 237.45 m³ - km  |
| EXCEDENTES =                               | - m³ - km          |



Firmado electrónicamente por:  
 ODILO VINICIO  
 GUEVARA MARIN



Firmado electrónicamente por:  
 JESSICA MARIELA  
 JARAMILLO ARMIJOS

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
 CONTRATISTA

KEYSZEN S.A.S  
 FISCALIZADOR EXTERNO



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA  
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO**



|                     |  |                  |                                 |
|---------------------|--|------------------|---------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b>    | ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA |                  |                                 |
| <b>CONTRATISTA:</b> | CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  |                  |                                 |
| <b>PLANILLA N°:</b> | 3  | <b>N° RUBRO:</b> | 39                              |
| <b>PERIODO:</b>     | 01-abr-23  | - 30-abr-23      | <b>UNIDAD:</b> align="center">m |

Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)



| DESCRIPCIÓN                                       | UNIDAD       | OBSERVACIONES |
|---|--------------|---------------|
| Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno) | 90.00        |               |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>90.00</b> |               |

|  |            |
|--|------------|
| PLANILLADO ANTERIORMENTE =                 | 180.00 m   |
| TOTAL CONTRATADO =                         | 1 000.00 m |
| CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA = | 90.00 m    |
| CANTIDAD PLANILLADA                        | 270.00 m   |
| EXCEDENTES =                               | - m        |



RODILLO VINICIO  
GUEVARA MARIN

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
CONTRATISTA




JESSICA MARIELA  
JARAMILLO ARMIJOS

KEYSZEN S.A.S  
FISCALIZADOR EXTERNO

172300.000

9846600.000



**Administración  
2019-2023**

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA**

ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO  
DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KIM  
12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN  
PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

CLASE: EXCAVACION HOJA: 1 DE 2  
DESDE: 2+500 ESCALA H: 1:2000  
HASTA: 3+445 ESCALA V: 1:500

CONTENIDO: PLANTA Y PERFIL DE LA VIA-JATUNPACCHA

ESTUDIO: DEFINITIVO DIBUJO: KM

FISCALIZADOR EXTERNO:

Firmado electrónicamente por:  
**RODILLO VINICIO  
GUEVARA MARIN**

Firmado electrónicamente por:  
**JESSICA MARIELA  
JARAMILLO ARMIJOS**

A MARIN  
ONAS BUILDING S.A

ING. JESSICA JARAMILLO  
GERENTE GENERAL KEYSZEN S.A.S

**Administración  
2019-2023**

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA**

ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO  
DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM  
12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN  
PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

CLASE: EXCAVACION

HOJA: 2 DE 2

DESDE: 0+000

ESCALA H: 1:1000

HASTA: 0+340

ESCALA V: 1:100

CONTENIDO: PLANTA Y PERFIL DE LA VIA

ESTUDIO: DEFINITIVO

DIBUJO: KM

FISCALIZADOR EXTERNO:















Firmado electrónicamente por:  
**RODOLFO VINICIO  
GUEVARA MARÍN**









Firmado electrónicamente por:  
**JESSICA MARIELA  
JARAMILLO ARMIÑOS**

A MARÍN  
ONAS BUILDING S.A

ING. JESSICA JARAMILLO  
GERENTE GENERAL KEYSZEN S.A.S

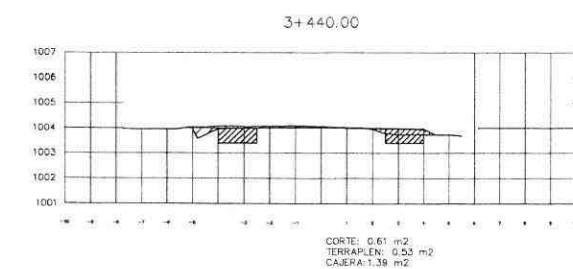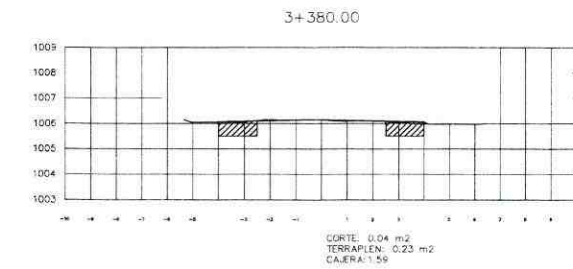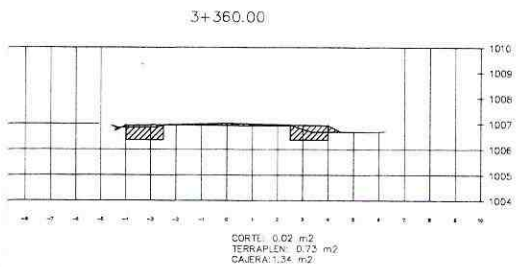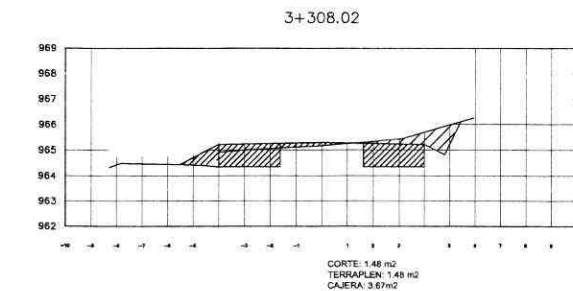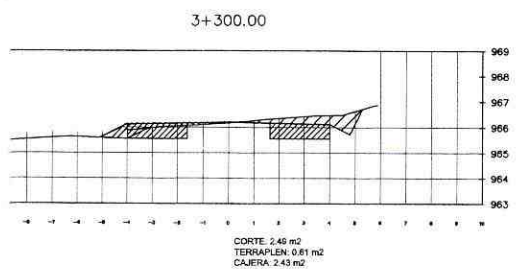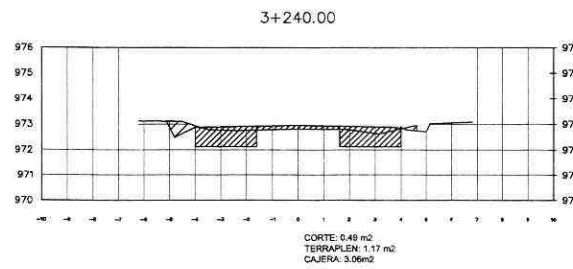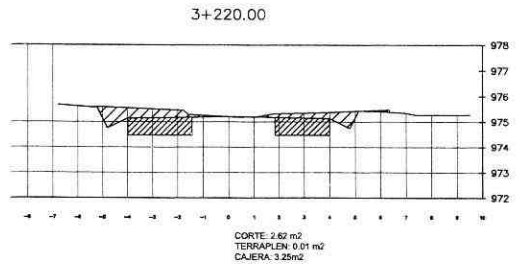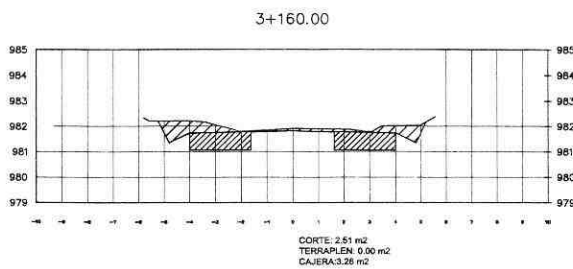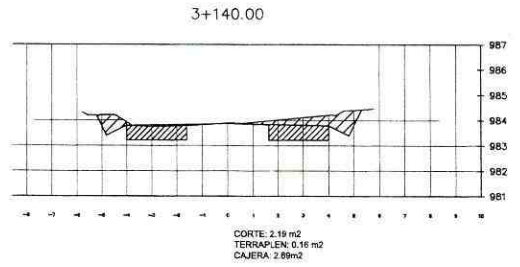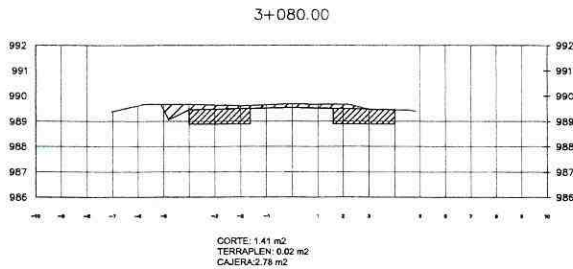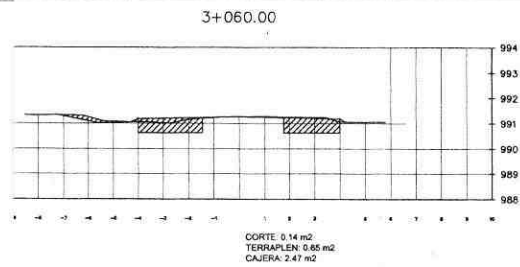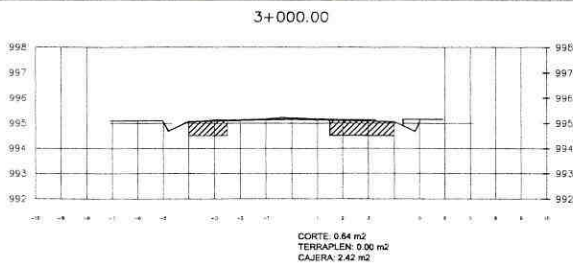

|  |  |   |                    |                  |
|--|--|---|--------------------|------------------|
|  <p><b>Administración 2019-2023</b></p> <p><b>GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA</b></p> | <p>ASFALTADO DE LA VÍA CURURAY - PARQUEO DE OBEJUNA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 16 DE AGOSTO - EL TRUJICO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA</p> |   | CLASE EXCA/RELLENO | HOJA: 1 DE 2     |
|  | <p>CONTENIDO: SECCIONES TRANSVERSALES DE CORTE Y RELLENO</p>   |   | DESDE: 3+000       | ESCALA H: 1:1000 |
| <p>CONTRATISTA: </p>  |  | <p>HASTA: 3+445</p>   |                    | ESCALA V: 1:100  |
| <p>FISCALIZADOR EXTERNO: </p>   |  | <p>ESTUDIO: DEFINITIVO</p>                                      |                    | DIBUJO: KM       |
| <p>SR. ODILIO CUEVARA MARIN<br/>INTE. GENERAL AMAZONAS BUILDING S.A</p>  |  | <p>ING. JESSICA JARAMILLO<br/>GERENTE GENERAL KEYSZEN S.A.S</p> |                    |                  |

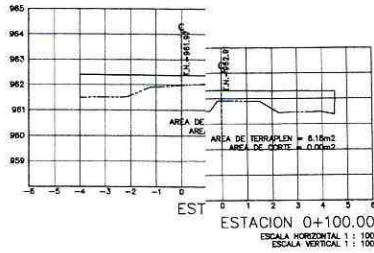

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|                  | <b>Administración 2019-2023</b>  | <b>GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA</b> |   |
|   | ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 DE VÍA 16 DE AGOSTO - EL TRUCCO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA | CLASE: EXCA/RELLENO<br>DESDE: 0+000<br>HASTA: 0+340            | HOJA: 8 DE 8<br>ESCALA H: 1:1000<br>ESCALA V: 1:100 |
| CONTENIDO: SECCIONES TRANSVERSALES DE CORTE Y RELLENO-CURARAY                                       | ESTUDIO: DEFINITIVO  | DIBUJO: KM   |   |
| CONTRATISTA:<br> | FISCALIZADOR EXTERNO:<br>   |  |   |
| SR. ODILIO GUEVARA MARIN<br>NTE GENERAL AMAZONAS BUILDING S.A                                       | ING. JESSICA JARAMILLO<br>GERENTE GENERAL KEYSZEN S.A.S  |  |   |



PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 01 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: Desbroce, desbrosque y limpieza Abi= 3+000 Abf= 3+050

- Excavación sin elasticar (cajeras) - Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada, regada) Abi= 3+000 Abf= 3+050

- Desbrosque, Desbroce y limpieza de la vía Curaray Abi=0+000 Abf= 0+050 - Replanteo y nodación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

CONDICIÓN DEL TIEMPO: MAÑANA: Nublado TARDE: Nublado NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| QUETA                        | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFIA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

  
 CONTRATISTA  
 CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

  
 FISCALIZADOR  
 KEYSZEN S.A.S



N: .....

PROYECTO : ASFALTADO DEL AVIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DEL AVIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 02 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Desbruce, desbasque y limpieza Jatunpaccha Abi= 3+050 Abf= 3+100 y Vía Curaray  
 Abi= 0+050 Abf= 0+125  
 - Excavación sin clasificar (cojeras) - Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y segada)  
 Abi= 3+050 Abf= 3+100 - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

CONDICIÓN DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvioso TARDE: Lluvioso NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO              |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|-------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                       | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                       | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS       | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA               | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                     | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA                | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEM DUBLE TAMBORES | 1  | TUPUSKAPU            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO       | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO  | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                      | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA               | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO        | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO       | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS     | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO     | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA            | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO             | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO       | -  |                      |    |
| QUETA                         | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                   | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                 | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA        | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO             | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA

CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

FISCALIZADOR  
KEYSZEN S.A.S

PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 03 Mes 04 Año 2023

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Desbroce, desbosque y limpieza Jatunpaccha Abi= 3+100 Abf= 3+200 y Coraray  
Abi= 0+125 Abf= 0+175 - Excavación sin clasificar (cajeras) en Jatunpaccha.  
- Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada) - Replanteo y nivelación  
Abi= 3+200 Abf= 3+200

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

| MAÑANA:                      |    | TARDE:               |  | NOCHE: |    |
|------------------------------|----|----------------------|--|--------|----|
| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |  |        |    |
| MAQUINA                      | No | CARGO                |  |        | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      |  |        | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            |  |        | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  |  |        | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad |  |        | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        |  |        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            |  |        | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             |  |        | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           |  |        | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             |  |        | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             |  |        | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO |  |        | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          |  |        | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            |  |        | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           |  |        | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           |  |        | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |  |        |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |  |        |    |
| QUETA                        | 5  |                      |  |        |    |
| CARRILLO MIXER               | 1  |                      |  |        |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |  |        |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |  |        |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |  |        |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA

CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

FISCALIZADOR

KEYSZEN S.A.S

N: .....

PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 04 Mes 04 Año 2023

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Espacio para el contratista

TRABAJS REALIZADOS: - Desbroce, desbrosque y limpieza Jatunpaccha Abi= 3+200 Abf= 3+300  
 Curaray Abi= 0+175 Abf= 0+240 - Excavación sin clasificar (cajeras) en Jatunpaccha.  
 - Material pélico de mejoramiento (minada, corgada y regada) Abi= 3+200 Abf= 3+260  
 - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

| MAÑANA: Nublado              |    | TARDE: Soleado       |  | NOCHE: |    |
|------------------------------|----|----------------------|--|--------|----|
| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |  |        |    |
| MAQUINA                      | No | CARGO                |  |        | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      |  |        | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            |  |        | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  |  |        | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad |  |        | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        |  |        | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | TUPUSKATO            |  |        | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | CADENERO             |  |        | 2  |
| TANQUERO                     | 1  | OPERADORES           |  |        | 6  |
| ESCALA MECÁNICA              | -  | CHOFERES             |  |        | 5  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | MECÁNICO             |  |        | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO |  |        | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | INSPECTORES          |  |        | 1  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | ALBAÑILES            |  |        | -  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | SOLDADORES           |  |        | 1  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  | JORNALEROS           |  |        | 4  |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |  |        |    |
| QUETA                        | 5  |                      |  |        |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |  |        |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |  |        |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |  |        |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |  |        |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)



CONTRATISTA  
CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.



FISCALIZADOR  
KEYSZEN S.A.S

N.º .....

**PROYECTO :** ASFALTADO DEL AVIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

**OBJETO DEL CONTRATO :** ASFALTADO DEL AVIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

**UBICACIÓN :** PROVINCIA PASTAZA

**CONTRATISTA :** CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

**CONTRATO :** Monto USD 4 650 521.23 **FECHA:** 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

**FISCALIZADOR :** KEYSZEN S.A.S

**FECHA DE REPORTE N.º :** Día 05 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

**TRABAJOS REALIZADOS:** - Desbroce, desbroce y limpieza Curaray Abi= 0+240 Abf= 0+300  
 - Excavación sin clasificar (cajas) - Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada, regada)  
 Abi= 3+260 Abf= 3+300 - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

**ESTADO DEL TIEMPO:** MAÑANA: Soleado TARDE: lluvia fuerte. NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| QUETA                        | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

**INSTRUCCIONES:** (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

**AUTORIZACIONES:** (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

**OBSERVACIONES:** (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

**VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES:** (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

  
**CONTRATISTA**  
 CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

  
**FISCALIZADOR**  
 KEYSZEN S.A.S

N.º .....

**PROYECTO :** ASFALTADO DEL AVIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

**OBJETO DEL CONTRATO :** ASFALTADO DEL AVIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

**UBICACIÓN :** PROVINCIA PASTAZA

**CONTRATISTA :** CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

**CONTRATO :** Monto USD 4 650 521.23 **FECHA:** 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

**FISCALIZADOR :** KEYSZEN S.A.S

**FECHA DE REPORTE N :** Día 06 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

**TRABAJOS REALIZADOS:** - Desbroce, desbosque y limpieza Jatunpaccha Abi= 3+300 Abf= 3+340 Curaray  
 Abi= 0+300 Abf= 0+320  
 - Visita Técnica de autoridades competentes y comunidad.  
 - Colocación cinta peligro colores intensos

**NOTA:** (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

Se solicita a Fiscalización se autorice realizar los rubros correspondientes hasta llegar al puente de Jatunpaccha (rubros existentes en el contrato vigente) y por pedido de la comunidad y el presidente del CAD Parroquial de la 10 de Agosto Sr. Wellington Vásquez

**ORDEN DEL TIEMPO:** MAÑANA: Lluvia fuerte. TARDE: Lluvia fuerte. NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TAMBOR DOBLE TAMBOR  | 1  | СУПЕРКАР             | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| QUETA                        | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFIA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

**INSTRUCCIONES:** (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

**AUTORIZACIONES:** (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

**OBSERVACIONES:** (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

**VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES:** (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)



CONTRATISTA

CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.



FISCALIZADOR

KEYSZEN S.A.S



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 07 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Desbroce, desbaste y limpieza Jatunpaccha Abi = 3+340 Abf = 3+380 Puraray  
 se remueve vegetación - Excavación sin clasificar (cajones) - Material pétreo de mejoramiento  
 (caminada, cargada y regada) Abi = 3+300 Abf = 3+340 - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

| CONDICIÓN DEL TIEMPO:        | MAÑANA: Lluvioso | TARDE: Lluvioso      | NOCHE: |
|------------------------------|------------------|----------------------|--------|
| EQUIPO UTILIZADO             |                  | PERSONAL UTILIZADO   |        |
| MAQUINA                      | No               | CARGO                | No     |
| TRACTOR                      | -                | SUPERINTENDENTE      | 1      |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3                | RESIDENTE            | 2      |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1                | Ingeniero ambiental  | 1      |
| CARGADORA                    | -                | Técnico en seguridad | 1      |
| MOTONIVELADORA               | 1                | ING. AYUDANTE        | 1      |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1                | TOPÓGRAFO            | 1      |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1                | CADENERO             | 2      |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1                | OPERADORES           | 6      |
| TANQUERO                     | 1                | CHOFERES             | 5      |
| ESCABA MECÁNICA              | -                | MECÁNICO             | 1      |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1                | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1      |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1                | INSPECTORES          | 1      |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -                | ALBAÑILES            | -      |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -                | SOLDADORES           | 1      |
| PLANTA TRITURADORA           | 1                | JORNALEROS           | 4      |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1                |                      |        |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -                |                      |        |
| QUETA                        | 5                |                      |        |
| CARRO MIXER                  | 1                |                      |        |
| MINICARGADORA                | 1                |                      |        |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1                |                      |        |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2                |                      |        |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato, - se ratifica mediante comunicación)

Fiscalización autoriza que se continúe con los trabajos de construcción de proyecto hasta el puente de Jatunpaccha, correspondiente a la abscisa 3+445.

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA

CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

FISCALIZADOR

KEYSZEN S.A.S

PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 08 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Desbroce, desbroque y limpieza Jatunpaccha Abi= 3+380 Abf= 3+445  
- Excavación sin clasificar (cajeras) - Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)  
Abi= 3+340 Abf= 3+365 - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

CONDICIÓN DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado TARDE: Lluvioso NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TAMBOR DOBLE TAMBOR  | 1  | TRIPULANTE           | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| QUETA                        | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)



CONTRATISTA

CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.



FISCALIZADOR  
KEYSZEN S.A.S



PROYECTO : ASFALTADO DEL AVIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DEL AVIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 09 Mes 04 Año 2023

Trabajos realizados: - Excavación sin clasificar (cajeras) - Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada) - Abi= 3+365 Abf= 3+350 - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

CONDICIÓN DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvia fuerte TARDE: Lluvia fuerte NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| QUETA                        | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA  
CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

FISCALIZADOR  
KEYSZEN S.A.S



N.º .....

PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 10 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Excavación o clasificar y regada) - Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)

Abi = 3+390 Abf = 3+415 - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

DO DEL TIEMPO: MAÑANA: Nublado TARDE: Lluvioso NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | TUPOGRAFIA           | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | CADENERO             | 2  |
| TANQUERO                     | 1  | OPERADORES           | 6  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | CHOFERES             | 5  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | MECÁNICO             | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | INSPECTORES          | 1  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| QUETA                        | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA  
CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

FISCALIZADOR  
KEYSZEN S.A.S



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 11 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Excavación sin clasificar - Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)

Abi = 3+415 Abf = 3+445 - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvioso TARDE: Lluvia fuerte NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANQUE DUBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| QUETA                        | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFIA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

  
 CONTRATISTA  
 CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

  
 FISCALIZADOR  
 KEYSZEN S.A.S

PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 12 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Material de Subbase clase 3 (descarga - compactada) Abf = 3+445  
Abf = 3+325 en Jatunpaccha. - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

| MAÑANA: Nublado              |    | TARDE: Soleado       |    | NOCHE: |  |
|------------------------------|----|----------------------|----|--------|--|
| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |        |  |
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |        |  |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |        |  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |        |  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |        |  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |        |  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |        |  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |        |  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |        |  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |        |  |
| TANQUERO                     | 1  | CHÓFERES             | 5  |        |  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |        |  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |        |  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |        |  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |        |  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |        |  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |        |  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |        |  |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |        |  |
| QUETA                        | 5  |                      |    |        |  |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |        |  |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |        |  |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |        |  |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |        |  |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

  
CONTRATISTA  
CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

  
FISCALIZADOR  
KEYSZEN S.A.S



PROYECTO : ASFALTADO DEL AVIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DEL AVIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 13 Mes 04 Año 2023

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Material de subbase clase 3 (descarga - compactada) Abi = 3+325  
 Abf = 3+215 en Jatunpaccha = Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Nublado TARDE: Soleado NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO              |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|-------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                       | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                       | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS       | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA               | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                     | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA                | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEM TUBO ELÉCTRICO | 1  | TRIPULANTE           | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO       | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO  | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                      | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA               | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO        | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO       | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS     | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO     | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA            | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO             | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO       | -  |                      |    |
| QUETA                         | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                   | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                 | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFIA        | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO             | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

  
 CONTRATISTA  
 CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

  
 FISCALIZADOR  
 KEYSZEN S.A.S

PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 14 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Material de subbase clase 3 (descarga - compactada) en Jatunpaccha  
- Replanteo y nivelación

Abi = 3 + 215      Abf = 3 + 095

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvia fuerte      TARDE: Lluvia fuerte.      NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| QUETA                        | 5  |                      |    |
| CONCRETO MIXER               | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

  
CONTRATISTA  
CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

  
FISCALIZADOR  
KEYSZEN S.A.S



PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 15 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Material de subbase clase 3 (descarga - compactada) Jatunpaccha.  
 Abi= 3+095 Abf= 2+975 - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Nublado TARDE: Nublado NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| QUETA                        | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFIA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

  
 CONTRATISTA  
 CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

  
 FISCALIZADOR  
 KEYSZEN S.A.S



PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 16 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Material de subbase clase 3 (descarga - compactada) Jatunpaccha

Abi = 2 + 975      Abf = 2 + 855      - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado      TARDE: Soleado      NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | TUMBERO              | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | CADENERO             | 2  |
| TANQUERO                     | 1  | OPERADORES           | 6  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | CHOFERES             | 5  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | MECÁNICO             | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | INSPECTORES          | 1  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| QUETA                        | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

  
 CONTRATISTA  
 CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

  
 FISCALIZADOR  
 KEYSZEN S.A.S



PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 17 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Material de sobbase clase 3 (descarga y compactada) Jatunpaccha  
 Abi= 2+855 Abf= 2+745 - Replanteo y nivelación.

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

CONDICIÓN DEL TIEMPO: MAÑANA: Nublado TARDE: lluvia fuerte NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| QUETA                        | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

  
 CONTRATISTA  
 CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

  
 FISCALIZADOR  
 KEYSZEN S.A.S



PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOEORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOEORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 18 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Material de subbase clase 3 (descarga - compactada) Jatunpaccha

Abi = 2 + 45 - Abf = 2 + 635 - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

CONDICIÓN DEL TIEMPO: MAÑANA: Nublado TARDE: Soleado NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEM TUBEL TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | -  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| QUETA                        | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA  
CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

FISCALIZADOR  
KEYSZEN S.A.S



PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 19 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Material de subbase clase 3 (descargo - compactado) Jatunpaccha  
 Abi = 2 + 635 Abf = 2 + 530 - Replanteo y nivelación.

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvioso TARDE: Soleado NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TÁNDEM DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| QUETA                        | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFIA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA  
CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

FISCALIZADOR  
KEYSZEN S.A.S



PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOEORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOEORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FECHA DE REPORTE N : Día 20 Mes 04 Año 2023

Trabajos realizados: - Material de subbase clase 3 (descarga - compactada) Jatunpaccha  
 Abi= 2+530 Abf= 2+410 - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

AVANCE DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvia fuerte TARDE: Lluvia fuerte NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO              |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|-------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                       | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                       | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS       | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA               | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                     | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA                | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEM DOBLE TAMBORES | 1  | TOPOGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO       | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO  | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                      | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA               | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO        | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO       | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS     | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO     | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA            | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO             | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO       | -  |                      |    |
| QUETA                         | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                   | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                 | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFIA        | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO             | 2  |                      |    |

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos especificos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

  
 CONTRATISTA  
 CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

  
 FISCALIZADOR  
 KEYSZEN S.A.S



PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOEORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOEORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 21 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Material de subbase clase 3 (descarga - compactada) Jatunpaccha  
 Abi = 21 410 Abf = 21 300 - Replenteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvioso TARDE: Lluvioso NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | TUPOGRAF             | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | CADENERO             | 2  |
| TANQUERO                     | 1  | OPERADORES           | 6  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | CHOFERES             | 5  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | MECÁNICO             | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | INSPECTORES          | 1  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| QUETA                        | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFIA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos especificos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

  
 CONTRATISTA  
 CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

  
 FISCALIZADOR  
 KEYSZEN S.A.S

PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 22 Mes 04 Año 2023

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Material de subbase clase 3 (descarga - compactado) Jatunpaccha.  
Abi = 2+300 - Abf = 2+180 - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

| ESTADO DEL TIEMPO:           |    | MAÑANA: lluvioso     | TARDE: lluvioso | NOCHE: |
|------------------------------|----|----------------------|-----------------|--------|
| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |                 |        |
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No              |        |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1               |        |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2               |        |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1               |        |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1               |        |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1               |        |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1               |        |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2               |        |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6               |        |
| TANQUERO                     | 1  | CHÓFERES             | 5               |        |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1               |        |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1               |        |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1               |        |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -               |        |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1               |        |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4               |        |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |                 |        |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |                 |        |
| QUETA                        | 5  |                      |                 |        |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |                 |        |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |                 |        |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |                 |        |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |                 |        |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

  
CONTRATISTA  
CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

  
FISCALIZADOR  
KEYSZEN S.A.S



PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOEORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOEORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 23 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Material de subbase clase 3 (descarga - compactada) Jatunpaccha.  
 Abt = 2+180 Abf = 2+060 - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

CONDICIÓN DEL TIEMPO: MAÑANA: Nublado TARDE: Lluvioso NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | OPERADORES           | 6  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | CHOFERES             | 5  |
| TANQUERO                     | 1  | MECÁNICO             | 1  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | ALBAÑILES            | -  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  |                      |    |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| QUETA                        | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFIA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA  
CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

FISCALIZADOR  
KEYSZEN S.A.S



PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 24 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Material de base granular de agregadas en Jatunpaccha Abi=3+445 Abf=3+215

- Excavación sin clasificar (cajeras) - Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada) en Curaray Abi=0+000 Abf=0+080 - Replanteo y nivelación

- Colocación cinta peligro colores intensos

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

TIPO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado TARDE: Lluvia fuerte. NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | 1  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| QUETA                        | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

  
CONTRATISTA

CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

  
FISCALIZADOR  
KEYSZEN S.A.S



PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 25 Mes 04 Año 2023

Trabajos realizados: - Material de base granular de agregados en Jatunpaccha Abi = 3+215 Abf = 2+965

- Excavación sin clasificar (cajeras) Abi = 0+080 Abf = 0+140 - Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada) en Curaray Abf = 0+140 - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Nublado TARDE: Lluvioso NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | TUPÓGRAFOS           | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | CADENERO             | 2  |
| TANQUERO                     | 1  | OPERADORES           | 6  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | CHOFERES             | 5  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | MECÁNICO             | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | INSPECTORES          | 1  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| QUETA                        | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA  
CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

FISCALIZADOR  
KEYSZEN S.A.S



PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 26 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Material de base granular de agregados en Jatunpaccha Abi= 2+965 Abf= 2+755  
 - Excavación sin elasticar - Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada) en Curaray Abi= 0+140 Abf= 0+180 - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvioso TARDE: Lluvioso NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| QUETA                        | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

  
 CONTRATISTA  
 CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

  
 FISCALIZADOR  
 KEYSZEN S.A.S



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 27 Mes 04 Año 2023

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Trabajos realizados: - Material de base granular de agregados Jatunpaccha Abi= 2+755 Abf= 2+525  
 - Excavación sin clasificar - Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada) en Curaray Abi= 0+180 Abf= 0+200 - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

CONDICIÓN DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvioso TARDE: Soleado NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TÁNDEM DUBEL TAMBOR  | 1  | TUPUSKATO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| QUETA                        | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

  
 CONTRATISTA  
 CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

  
 FISCALIZADOR  
 KEYSZEN S.A.S



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 28 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Material de base granular de agregados en Jatunpaccha Abi= 2+525 Abf= 2+310  
 - Excavación sin clasificar (cajeras) - Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada) en Curaray Abi= 0+200 Abf= 0+240 - Replanteo y Nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvioso TARDE: Soleado NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| QUETA                        | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 9  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a trámites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

  
 CONTRATISTA  
 CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

  
 FISCALIZADOR  
 KEYSZEN S.A.S



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 29 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Material de base granular de agregados Jatunpaccha Abi= 2+310 Abf= 2+060  
 - Excavación sin elasticar - Material pétreo de mejoramiento (minado, cargada y regada) en Curaray  
 Abi= 0+240 Abf= 0+300 - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

CONDICIÓN DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado TARDE: Soleado NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEM DUBLE TAMBOR  | 1  | ТУРБУКАТО            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| QUETA                        | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 9  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos especificos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

  
 CONTRATISTA  
 CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

  
 FISCALIZADOR  
 KEYSZEN S.A.S

**PROYECTO :** ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA  
**OBJETO DEL CONTRATO :** ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA  
**UBICACIÓN :** PROVINCIA PASTAZA  
**CONTRATISTA :** CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
**CONTRATO :** Monto USD 4 650 521.23 **FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022**  
**FISCALIZADOR :** KEYSZEN S.A.S  
**FECHA DE REPORTE N :** Día 30 Mes 04 Año 2023

**Espacio para el contratista**  
**TRABAJOS REALIZADOS:** - Material de base granular de agregadas Cregado y compactado en  $Ab = 2+060$   
 - Excavación sin clasificar (cajeras) - Material petreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)  
 Curaray  $Abi = 0+300$   $Abf = 0+340$  - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

**CONDICIÓN DEL TIEMPO:** MAÑANA: Soleado TARDE: Lluvioso NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | TUMUGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | CADENERO             | 2  |
| TANQUERO                     | 1  | OPERADORES           | 6  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | CHOFERES             | 5  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | MECÁNICO             | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | INSPECTORES          | 1  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| QUETA                        | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFIA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

**Espacio para la fiscalización**  
**INSTRUCCIONES:** (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

**AUTORIZACIONES:** (trabajos especificos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

**OBSERVACIONES:** (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

**VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES:** (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

**CONTRATISTA**  
 CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

**FISCALIZADOR**  
 KEYSZEN S.A.S



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

junio 06 del 2023 09:55

GUEVARA MARIN ODILO VINICIO

## DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2023-05-09))

(BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO)

No. Comprobante: 0000000170126933

|                                       |   |                            |             |            |
|---------------------------------------|---|----------------------------|-------------|------------|
| Concepto:                             | PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,   |                            | Emitido en: | 2023-05-08 |
| No. RUC / REGISTRO:                   | 1691710080001 - 0001  | Fecha de Vigencia de Pago: | 2023-05-15  |            |
| Nombre / Razón Social / Organización: | AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. - AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. |                            |             |            |
| Periodo de Pago:                      | 2023 - 04   |                            |             |            |
| Forma de pago:                        | Fondos propios  |                            |             |            |
| Observación:                          |   |                            |             |            |

### AFILIADOS

| PERIODO  | RT | CEDULA     | NOMBRE                             | SUELDO | DIAS | OBS. | VALOR           | TIEMPO PARCIAL |             |
|----------|----|------------|------------------------------------|--------|------|------|-----------------|----------------|-------------|
| 2023 - 4 | 06 | 1720483609 | ACERO UMAQUINGA JUAN ISAAC         | 521.45 | 30   | NNA  | 107.42          | 0.00           |             |
| 2023 - 4 | 06 | 1600786873 | AMAGUAY CEDEÑO CARLOS ALEXANDER    | 492.69 | 30   | NNA  | 101.49          | 0.00           |             |
| 2023 - 4 | 06 | 1312506288 | AMAGUAY CEDEÑO JOSE ALFREDO        | 691.69 | 30   | NNA  | 142.49          | 0.00           |             |
| 2023 - 4 | 06 | 0503530610 | CHASIPANTA CHASIPANTA JOSE AUGUSTO | 450.00 | 30   | NNA  | 92.70           | 0.00           |             |
| 2023 - 4 | 06 | 0503774580 | CHASIPANTA CHASIPANTA JOSE PEDRO   | 450.00 | 30   | NNA  | 92.70           | 0.00           |             |
| 2023 - 4 | 06 | 1600203267 | GREFA CHIMBO AURELIO               | 450.04 | 30   | NNA  | 92.71           | 0.00           |             |
| 2023 - 4 | 06 | 0603907080 | GUAMAN CASTILLO GEREMIAS JOSE      | 450.00 | 30   | NNA  | 92.70           | 0.00           |             |
| 2023 - 4 | 06 | 1600342222 | JACOME RODRIGUEZ EDWIN HUGO        | 691.69 | 30   | NNA  | 142.49          | 0.00           |             |
| 2023 - 4 | 06 | 1600267494 | JACOME RODRIGUEZ JENNY BEATRIZ     | 494.67 | 30   | NNA  | 101.90          | 0.00           |             |
| 2023 - 4 | 06 | 1600671760 | MARIN JACOME JENNYFER BRITHNEY     | 450.00 | 30   | NNA  | 92.70           | 0.00           |             |
| 2023 - 4 | 06 | 1600496770 | MARIN JACOME KENYA MERY JOSEPH     | 450.04 | 30   | NNA  | 92.71           | 0.00           |             |
| 2023 - 4 | 06 | 1600296717 | MARIN MONTERO KLEVER JINSOP        | 680.00 | 30   | NNA  | 140.08          | 0.00           |             |
| 2023 - 4 | 06 | 1600695876 | MARIN PEREZ JOSE ALEXANDER         | 450.04 | 30   | NNA  | 92.71           | 0.00           |             |
| 2023 - 4 | 06 | 1600695868 | MARIN PEREZ KRISLEY ARIANNA        | 458.72 | 30   | NNA  | 94.50           | 0.00           |             |
| 2023 - 4 | 06 | 2100210505 | MESTANZA LEON JORGE DAVID          | 691.69 | 30   | NNA  | 142.49          | 0.00           |             |
| 2023 - 4 | 06 | 0601716327 | MIRANDA AMBI EDGAR JUVENAL         | 450.00 | 30   | NNA  | 92.70           | 0.00           |             |
| 2023 - 4 | 06 | 1600439804 | MONTERO ESPINOSA KATTY JESSENIA    | 450.04 | 30   | NNA  | 92.71           | 0.00           |             |
| 2023 - 4 | 06 | 1600573032 | MUÑOZ VELASTEGUI CARLOS VICENTE    | 494.67 | 30   | NNA  | 101.90          | 0.00           |             |
| 2023 - 4 | 06 | 1600724809 | PUNINA CAIZAGUANO JENNY MARITZA    | 450.04 | 30   | NNA  | 92.71           | 0.00           |             |
| 2023 - 4 | 06 | 1004325641 | SOTAMINGA BELTRAN PATRICIO BOLIVAR | 521.45 | 30   | NNA  | 107.42          | 0.00           |             |
| 2023 - 4 | 06 | 1600177461 | TAPUY TAPUY CESAR LUIS             | 450.00 | 30   | NNA  | 92.70           | 0.00           |             |
| 2023 - 4 | 06 | 0500865159 | UGSHA VEGA JOSE GREGORIO           | 450.00 | 30   | NNA  | 92.70           | 0.00           |             |
|          |    |            |                                    |        |      |      | <b>11138.92</b> | <b>2294.63</b> | <b>0.00</b> |

|  |                |
|--|----------------|
|  |                |
| <b>Por mora (+)</b>                    |                |
| <b>Seguro Salud Tiempo Parcial (+)</b> | 0.00           |
| <b>Honorarios Abogado (+)</b>          | 0.00           |
| <b>Gastos Administrativos (+)</b>      | 0.00           |
| <b>Subtotal (=)</b>                    | 2406.03        |
| <b>Notas de Crédito (-)</b>            | 0.00           |
|  | <b>2406.03</b> |

### Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

\*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

\*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

\*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



Puyo, 02 de junio del 2023

Señor  
Odilo Vinicio Guevara Marín  
**Gerente General**  
**AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.**  
Presente. –

De mi consideración:

Mediante Contrato LICO-GADPPz-006-2022 suscrito el 07 de noviembre del 2022, dentro del Proceso de LCC-GADPPz-004-2022, para la ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, entre la Compañía AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, con un Anticipo del 0%, por un monto de USD \$ 4'650.521,23 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 23/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) SIN INCLUIR IVA, y un Plazo de 540 Días contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Obra.

En referencia al OFICIO N° GADPPz-ES-2023-003, suscrito por Ing. Eryka Silva, de fecha 01 de junio del 2023.

Adjunto subsanar el hallazgo encontrado de la Planilla de Avance de obra No. 03:

- 1.- Observaciones formato y legalización de libro de obra.
- 2.- Documentación IESS (desglose de personal empleado).
- 3.- Favor hacer entrega los anexos al mail [keyszen.sas@gmail.com](mailto:keyszen.sas@gmail.com)

Por la atención al presente le anticipo mis sinceros agradecimientos.

Sin otro particular por el momento, me despido.

Atentamente,



firmado electrónicamente por  
JESSICA MARIELA  
JARAMILLO ARMIÑOS

Ing. Jessica Jaramillo  
C.C. 0704239128  
Gerente General  
**KEYSZEN S.A.S.**  
RUC 0791840462001

**KEYSZEN** S.A.S  
INGENIERIA & CONSTRUCCION  
Machala - El Oro - Ecuador

RECIBIDO  
Jenny Ponina  
06/06/2023  
09H52

CC. Administrador del Contrato

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
Oficina 072 785 269  
[keyszen.sas@gmail.com](mailto:keyszen.sas@gmail.com)  
[www.keyszen.com](http://www.keyszen.com)  
Machala – El oro - Ecuador

Recibido  
05/06/2023

**OFICIO Nº GADPPz-ES-2023-003**

Puyo, 01 de junio de 2023

Señor  
KEYSZEN.S.A.S  
**CONTRATISTA**  
Presente. -

De mi **consideración**:

Mediante Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5330-M emitido por el Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas - DIRECTOR DE FISCALIZACION, realiza observaciones se la planilla de Avance 3 de la obra: **"ASFALTADO DE LA VIA CURARAY – FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**, en donde se solicita subsanar el hallazgo encontrado, con el fin de dar continuidad al trámite administrativo pertinente.

1. **Observaciones** formato y legalización de libro de obra.
2. **Documentación** IESS (desglose de personal empleado).


Particular **que** comunico, para los fines pertinentes.

Atentamente.



Empleada digitalmente por:  
**ERYKA MIREYA SILVA**  
**MANZANO**

Ing. Eryka Silva M.  
**ADMINISTRADORA DE CONTRATO**

Recibido  
02-06-2023  


Cc: Odilo Guevara, REPRESENTANTE LEGAL DE AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S. A. -  
CONTRATISTA



**ACTA DE INICIO DE OBRA  
PROCESO: CODIGO-LICO-GADPPz-006-2022**

En la ciudad de Puyo, a los veinticinco de enero del 2023, se procede a la entrega en sitio donde se ejecutarán los trabajos concernientes al Contrato suscrito con fecha 07 de noviembre del 2022, cuyo objeto de contratación es: **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY – FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**, por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza con su representante legal el Ing. Jaime Guevara, Prefecto de Pastaza; por otro lado, en calidad de contratista **AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S. A.**, representado legalmente por el Sr. Odho Guevara Marín; **KEYSZEN.S.A.S.** en calidad de Fiscalizador Externo y la Ing. Eryka Silva M. en calidad de Administradora de Contrato; con la finalidad de suscribir la presente Acta de Inicio de obra, la misma que consta de las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES. -**

Con fecha 07 de noviembre del 2022 se suscribió el contrato cuyo objeto de contratación es: **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY – FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**. Los trabajos se ejecutarán en varias comunidades de la provincia de Pastaza, con sujeción a diseños, especificaciones y más documentos contractuales, por un monto de U.S.D. \$4'650.521,23 en un plazo de 540 días.

Mediante Memorando Nro. GADPPZ-PROCURADURIA-2023-4383-M con fecha 06 de enero del 2023 se recibe la NOTIFICACIÓN DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO mediante Resolución N° 713- GADPPz-2022, de fecha 01 de diciembre, Resuelve mediante el Art. 2.- DESIGNAR a la Ing. Eryka Silva M. como Administradora de Contrato.

Con fecha 25 de enero de 2023, y según las Normas de control Interno de Contraloría (NCI) Art. 408-17., literal g, la Administradora de Contrato procede a la autorización de inicio de obra para dicha contratación cuyo objeto es: **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY – FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**, signado con el código LICO-GADPPz-006-2022.

**CLÁUSULA SEGUNDA: REVISIÓN DE DOCUMENTOS, INSPECCIÓN DE CAMPO Y ENTREGA DE SITIO EN OBRA. -**

Los documentos revisados son: El Contrato, los Pliegos (condiciones particulares y Condiciones generales); las especificaciones técnicas, la oferta presentada por el contratista, presupuesto, cronograma valorado de trabajos, garantías, resolución de adjudicación y la notificación de inicio de obra.

La obra materia del contrato consta de lo siguiente:

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

| No. | Rubro / Descripción  | Unidad | Cantidad     | Precio unitario | Precio global       |
|-----|--|--------|--------------|-----------------|---------------------|
| 1   | DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA   | HA     | 29.18        | 444.42          | 12,968.18           |
| 2   | REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO                              | KM     | 14.59        | 1,383.97        | 20,192.12           |
| 3   | REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS  | M      | 243.00       | 26.76           | 6,502.68            |
| 4   | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR(MOV.DE TIERRA)                               | MP     | 68,863.54    | 1.02            | 70,240.81           |
| 5   | EXCAVACIÓN DE CUNETAS DE CORONACION                                    | M3     | 613.80       | 1.39            | 713.80              |
| 6   | EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO                                | MP     | 8,578.91     | 5.02            | 43,056.09           |
| 7   | EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES                            | MP     | 7,720.00     | 5.08            | 39,217.60           |
| 8   | LIMPIEZA DE DERRUMBES  | MP     | 8,746.43     | 0.82            | 7,172.07            |
| 9   | TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 0.80 M ,E=2.5 MM, MP-100                 | ML     | 126.00       | 166.33          | 20,957.58           |
| 10  | TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1.20 M ,E=2.5 MM, MP-100                 | ML     | 263.00       | 272.20          | 71,588.60           |
| 11  | TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 2.20 M ,E=3.0 MM ,MP-100                 | ML     | 46.00        | 562.20          | 25,861.20           |
| 12  | HORMIGON PARA CUNETAS (F'C=180 KG/CM)                                  | MP     | 4,746.82     | 167.21          | 793,715.77          |
| 13  | MURO DE H.S. F'C=180KG./CM2 TIPO B(CABEZALES)                          | MP     | 763.00       | 167.20          | 127,573.60          |
| 14  | HORMIGON SIMPLE EN OBRAS DE ARTE F'C=240 KG/CM2                        | M3     | 78.47        | 162.48          | 12,748.24           |
| 15  | HIERRO/ESTRUCTURAL FY=4200' KG/CM2                                     | KG     | 8,288.90     | 1.94            | 16,080.47           |
| 16  | MURO DE GAVIONES - CALIBRE N° 12                                       | M3     | 400.00       | 70.12           | 28,048.00           |
| 17  | MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO( MINADA , CARGADA Y REGADA)            | MP     | 83,263.76    | 3.00            | 249,791.28          |
| 18  | MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3  | MP     | 21,010.98    | 12.44           | 261,376.59          |
| 19  | MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS                                 | MP     | 13,031.28    | 15.78           | 205,633.60          |
| 20  | TRANSPORTE MATERIAL DE DESALOJO  | MP     | 8,746.43     | 1.02            | 8,921.36            |
| 21  | TRANSPORTE MATERIAL PETREO DE MEJORAMIENTO                             | MP-KM  | 3,309,493.83 | 0.25            | 827,373.46          |
| 22  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE CLASE 3                              | MP-KM  | 781,104.32   | 0.25            | 195,276.08          |
| 23  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS                   | MP-KM  | 484,450.99   | 0.25            | 121,112.75          |
| 24  | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA                                     | LT     | 171,247.08   | 0.76            | 130,147.78          |
| 25  | C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2"                     | M2     | 122,918.34   | 9.74            | 1,191,990.37        |
| 26  | BORDILLO DE H.S.(F'C=210 KG/CM2 - 0.14X0.40)                           | M      | 2,000.00     | 14.84           | 29,280.00           |
| 27  | ACERAS DE H.S. F'C=180KG/CM2 E=7CM-ESCOBILLADO                         | MP     | 3,000.00     | 19.32           | 57,960.00           |
| 28  | MARCAS EN PAVIMENTO  | M      | 43,626.97    | 0.40            | 17,450.79           |
| 29  | MARCAS SOBRE SALIDAS DE PAVIMENTO (UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES) | U      | 3,895.00     | 7.32            | 28,511.40           |
| 30  | PANFLETO INFORMATIVO DE LA OBRA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA               | U      | 1.00         | 1,179.51        | 1,179.51            |
| 31  | SEÑALES ECOLOGICAS (2.44X1.22)M2                                       | U      | 2.00         | 354.87          | 709.74              |
| 32  | SEÑALES INFORMATIVAS (2.44X1.22)M2                                     | U      | 4.00         | 354.87          | 1,419.48            |
| 33  | SEÑALES REGLAMENTARIAS (0.75 X0.75)M2                                  | U      | 10.00        | 111.50          | 1,115.00            |
| 34  | SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 X0.75 )M2                                    | U      | 200.00       | 111.50          | 22,300.00           |
| 35  | SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.60M) MÓVILES            | U      | 4.00         | 78.18           | 312.72              |
| 36  | SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES                 | U      | 4.00         | 163.34          | 653.36              |
| 37  | CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES                                   | U      | 4.00         | 17.57           | 70.28               |
| 38  | KIT ANTIDERRAMES   | U      | 4.00         | 157.50          | 630.00              |
| 39  | CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO),                     | M.     | 1,000.00     | 0.32            | 320.00              |
| 40  | S/C CONO DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN UV, 71CM INCLY. CINTA REFLECTIVA  | U      | 20.00        | 22.48           | 449.60              |
| 41  | SUMINISTRO DE PALETA DE ALTO Y SIGA                                    | U      | 4.00         | 30.32           | 121.28              |
| 42  | CAPACITACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (DE 2 A 3 HORAS) | U      | 1.00         | 100.00          | 100.00              |
| 43  | CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (DE 2 A 3 HORAS)      | U      | 1.00         | 100.00          | 100.00              |
| 44  | CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (DE 2 A 3 HORAS)         | U      | 1.00         | 100.00          | 100.00              |
|     |  |        |              | <b>TOTAL:</b>   | <b>4,850,821.23</b> |

SON : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO DOLARES, 23/100 CENTAVOS  
 PLAZO TOTAL: 540 DIAS

En la inspección realizada al sitio donde se ejecutarán los trabajos, el Administrador, Fiscalizador y Contratista determinan la necesidad de recorrer y entregar los sitios donde se ejecutarán los trabajos de dicho mantenimiento.

Se deja constancia que las condiciones climáticas imperantes son apropiadas para realizar los trabajos y que las vías de acceso están libres de interrupción por lo que, se acuerda iniciar los trabajos a partir del 25 de enero de 2023.

### CLÁUSULA TERCERA: PLAZO

En conformidad con lo previsto en la Cláusula Octava del contrato, el plazo previsto para ejecutar la totalidad de los trabajos es de quinientos cuarenta días (540 días), contados a partir de la fecha de suscripción de contrato, de donde la notificación por escrito de administrador de Contrato y Fiscalización llega con fecha 25 de enero de 2023, por tanto, se inicia a partir de la misma dando como resultado los siguientes plazos contractuales:

- **Firma del contrato:** 06 de enero del 2023
- **Fecha Notificación de Administrador de Contrato:** 06 de diciembre 2022.
- **Fecha Notificación de Inicio de obra:** 25 de enero de 2023
- **Fecha de Inicio plazo contractual:** 25 de enero de 2023
- **Fecha de terminación de plazo contractual:** 18 de julio de 2024

Por tanto, la fecha de terminación del plazo contractual es el 03 de julio de 2024 en conformidad con el cronograma valorado de trabajos previsto en el proceso de contratación de las obras (ajustado a la fecha de inicio de obra).

### CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES

El contratista ejecutará las obras contratadas en los plazos y en las cantidades establecidas en el contrato, observará y cumplirá todas las leyes y reglamentos en cuanto a uso de maquinaria y personal vigentes en el país. De igual forma a disponer del personal técnico de acuerdo a lo especificado en su propuesta.

La fiscalización y administración cumplirá con todas las funciones y actividades necesarias para que la ejecución de la obra, observando los documentos precontractuales, el contrato vigente, las especificaciones técnicas, técnicas constructivas adecuadas, leyes y reglamentos vigentes en el país para este tipo de actividades.

### CLÁUSULA QUINTA: DISPOSICIONES DE FISCALIZACIÓN.

Las inquietudes de tipo general que tenga el contratista, serán absueltas durante el proceso constructivo por parte de Fiscalización, caso contrario si hubiera controversias entre el Contratista y el Fiscalizador podrá intervenir el Administrador de Contrato.

Para constancia de lo actuado y por lo antes expuesto, en unidad de acto se suscribe la presente Acta de inicio de obra.



JESSICA MARICELA JURAMILLO ARMIJOS

-----  
Ing. ~~Jessica~~ ~~Maricela~~ Juramillo Armijos  
Representante Legal  
KEYSZEN.S.A.S  
FISCALIZADOR EXTERNO



ODILIO VANDER GUEVARA MAREN

-----  
Sr. Odilio Guevara  
Representante Legal  
AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S. A.  
CONTRATISTA



ERYKA MIREYA SILVA MANZANO

-----  
Ing. Eryka Silva M.  
ADMINISTRADORA DE CONTRATO GADPP2



**Memorando Nro. GADPPZ-PROCURADURIA-2023-4383-M.**

Puyo, 06 de enero de 2023

**PARA:** Sr. Ing. Daniel Anibal Ramos Campaña  
Director de Obras Publicas

**ASUNTO:** CAMBIO DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO: "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

En respuesta al Documento No. GADPPZ-OBRAS-PUBLICAS-2022-8665-M

se adjunta la Resolución de Cambio, Administrador de Contrato, de la obra: "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", cuyo código de proceso es LICITACIÓN DE LA OBRA GADPPZ-006-2022, para la **continuación** del tramite correspondiente.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Alejandro Bolivar Torres Altamirano  
PROCURADOR SÍNDICO (E)

Referencias:

- GADPPZ-OBRAS-PUBLICAS-2022-8665-M

Anexos:

- presupuesto\_asfalto\_curary\_jatumpaccha\_2022\_completo.pdf
- sercop-dsp-2022-5216-of.pdf
- acta\_de\_respuestas.pdf
- acta\_de\_calificacion\_comision.pdf
- acta\_de\_designacion\_de\_secretario\_curaray-signed-signed-signed-signed0963056001660252882.pdf
- cert\_presupuestaria\_plurianual.pdf
- cert\_poa.pdf
- cert\_pae\_consolidado\_socce0741270001665764948.pdf
- autorizacion\_lico\_.pdf
- acuerdo multipartes\_lico\_006-signed0164837001665764948.pdf
- acta\_de\_convalidacion\_curaray-signed-signed-signed-signed0840089001665764947.pdf
- a\_2\_desagregacion\_tecnologica\_curaray\_2022-signed-signed-signed-signed0605949001665764947.pdf
- et.pdf
- estudios\_y\_fisicos\_actualizados.pdf
- estado\_procesos\_lico\_006.pdf
- ege\_informe\_de\_pertinencia.pdf
- certificacion\_pac-signed-signed08422110016603191810088810001665765019.pdf
- certificacion\_catalogo\_electronico-signed04872870016603191810806138001665765018.pdf

**Memorando Nro. GADPPZ-PROCURADURIA-2023-4383-M.**

**Puyo, 06 de enero de 2023**

- reporte\_de\_ofertas\_cargadas\_al\_soce.pdf
- parametros\_curaray\_lico006.pdf
- obras\_publicas-2022-5861-mcomision\_lico005.pdf
- ficha\_ambiental\_curaray\_-\_jatunpacch.jpg
- equipo\_asfalto\_curaray\_jatunpaccha\_2022\_completo\_1\_1-signed.pdf
- croquis\_asfalto\_curaray\_jatunpaccha\_2022\_completo\_1\_1-signed.pdf
- analisis\_pu\_vae\_asfalto\_curaray\_jatunpaccha\_2022\_completo.pdf
- resolucion\_de\_inicio0089864001665765086.pdf
- resolucion\_aprobacion\_dt.pdf
- requerimiento\_curaray\_2022-signed-signed-signed-signed-signed-signed0372464001665765085.pdf
- material\_asfalto\_curaray\_jatunpaccha\_2022\_completo\_1\_1-signed.pdf
- formula\_asfalto\_curaray\_jatunpaccha\_2022\_completo\_1\_1-signed.pdf
- cuadrilla\_asfalto\_curaray\_jatunpaccha\_2022\_completo\_1\_1-signed.pdf
- obra\_asfalto\_curaray\_jatunpaccha\_2022\_completo\_1\_1-signed.pdf
- 12\_via\_10\_de\_agosto\_-\_el\_trunfo\_canton\_y\_provincia\_pastaza.docx-signed-5-signed-signed-signed.pdf
- ppem\_vae\_cpc\_asfalto\_curaray\_jatunpaccha\_2022\_completo\_1\_1-signed.pdf
- obra\_asfalto\_curaray\_jatunpaccha\_2022\_completo\_1\_1-signed0696815001665765104.pdf
- reclamo0086782001665765174.pdf
- c&h\_ingenieria\_y\_proyectos\_mypes0933315001665765173.pdf
- amazonas\_building\_amazonbuild\_sa\_mypes0828350001665765173.pdf
- alvarado-ortiz\_constructores\_cia\_revision\_mypes0090502001665765173.pdf
- o\_de\_orellana\_-\_jatunpaccha\_hasta\_km\_12\_via\_10\_de\_agosto\_-\_el\_trunfo.docx-signed-signed-signed.pdf
- notificacion\_administrador\_ing\_roberth\_quintana\_lico\_006-2022-signed.pdf
- obras\_publicas\_2022\_8665-m.pdf
- cambio\_de\_adm\_asfalto\_curaray-signed-signed-signed0295437001673025564.pdf

Copia:

Sra. Ing. Lucy Cristina Carvajal Caicedo - Secretaría Ejecutiva 2 / Sr. Ing. Álvaro Renato Sosa Castro - Director de Fiscalización / Sr. Ing. Jaime Andres Silva Cordova - Analista de Unidad Vial 1 / Sra. Ing. Eryka Mireya Silva Manzano - Fiscalizador 1 / Srta. Ing. Gabriela Tatiana Lazuriaga Rosado - Jefe de Compras Públicas (E) /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sr. Abg. Elvis José Yanez Lara - Abogado 1



Pliego Electrónico Puyo  
**ALEJANDRO BOLIVAR TORRES ALTAMIRANO**

## RESOLUCIÓN N° 713-GADPPz-2022

Ing. Jaime Guevara Blaschke  
PREFECTO DEL GOBIERNO  
AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

### CONSIDERANDO:

Que, el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia según el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador; por lo tanto, las compras gubernamentales que realicen las entidades que integran el sector público deben tener respaldo constitucional; en tal virtud, el Art. 288 Ibídem, expresamente determina que: *"Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas"*;

Que, el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador al hablar de seguridad jurídica establece: *"la seguridad jurídica y confianza legítima se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes"* el Art. 238 reconoce a los Gobiernos Autónomos Descentralizados: *"autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional"*;

Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece el principio de legalidad y la obligatoriedad de sujeción al universo jurídico que regula la Administración Pública: *"Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos, y las personas que actúan en virtud de una personería estatal, ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución"*;

Que, el Art. 49 del COOTAD, determina que *"Prefecto o prefecta provincial. - El prefecto o prefecta provincial es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado provincial, elegido en binomio con el Viceprefecto o Viceprefecta por votación popular, de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstos en la ley de la materia electoral"* mientras que con relación a las Atribuciones del Prefecto Provincial la norma Ibídem determina: *"Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo; expedir la estructura orgánico - funcional del gobierno autónomo descentralizado provincial; nombrar y remover a los funcionarios de dirección, procurador síndico y demás servidores públicos de libre nombramiento y remoción del gobierno autónomo descentralizado provincial; suscribir contratos,*



*convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo descentralizado provincial, de acuerdo con la ley”;*

~~Que, mediante segundo Suplemento del Registro Oficial No. 31 de fecha 07 de julio del 2017, la Asamblea Nacional en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la República y el numeral 6 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expide el siguiente: Código Orgánico Administrativo;~~

~~Que, el Art. 39 del COA, dice: Respeto al ordenamiento jurídico y a la autoridad legítima: Las personas cumplirán, sin necesidad de requerimiento adicional, con lo dispuesto en la Constitución, las leyes y el ordenamiento jurídico en general y las decisiones adoptadas por autoridad competente;~~

Que, el Art. 44 del Código Orgánico Administrativo al respecto de las entidades públicas establece: **“Administración Pública.** La administración pública comprende las entidades del sector público previstas en la Constitución de la República” en relación a quien ejerce la máxima autoridad el Art. 47 de la norma *Ibidem* determina: “Representación legal de las administraciones públicas. La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley”;

Que, el Art. 98 Código Orgánico Administrativo determina: “Acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital, y quedará constancia en el expediente administrativo”, respecto de este ordenamiento jurídico esta Autoridad actúa con estricto apego a los requisitos de validez establecidos en el siguiente artículo de la norma citada, situación que garantiza el cumplimiento y respecto de la seguridad jurídica con la cual se actuado en el proceso de contratación”, de tal forma que el presente acto jurídico cumple con lo indicado en la normativa administrativa;

Que, el Art. 110 del COA, dice: Reglas generales de convalidación. El acto administrativo con vicios subsanables se considera convalidado cuando, previa rectificación de los vicios, conste en el expediente la declaración de la administración pública, en este sentido o por preclusión del derecho de impugnación. La convalidación se efectúa respecto del acto administrativo viciado íntegramente, por lo que no cabe la convalidación parcial. Producida la convalidación, los vicios del acto administrativo se entienden subsanados y no afectan la validez del procedimiento o del acto administrativo. La convalidación produce efectos retroactivos desde la fecha en que se expidió el acto originalmente viciado;



Que, el Art. 121 del COA, dice: Instrucción, orden de servicio o sumilla. Los órganos administrativos pueden dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes a través de una instrucción, orden de servicio o sumilla claras, precisas y puestas en conocimiento de la persona destinataria. Pueden constar insertas en el mismo documento al que se refieren o por separado. Para su instrumentación se puede emplear cualquier mecanismo tecnológico. Su incumplimiento no afecta la validez del acto, independientemente de la responsabilidad disciplinaria de la o el servidor público;

Que, el ACUERDO No. 039-CG NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS, 408-16 Administración del Contrato y Administración de la Obra, en su inciso final, dice: *En las organizaciones donde se cuenta con un Director de Obras Públicas o un Jefe de la unidad, éste generalmente asume las funciones de administrador del contrato o administrador de la obra. En otras entidades, con muchos proyectos, el administrador del contrato puede asumir la supervisión o manejo de varias obras;*

Que, el Art. 70 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública conforme "*Administración del contrato. - Los contratos contendrán estipulaciones específicas relacionadas con las funciones y deberes de los administradores del contrato, así como de quienes ejercerán la supervisión o fiscalización (...)*";

Que, el Art. 22 de la LOSEP, dice: Deberes de las o los servidores públicos. - Son deberes de las y los servidores público: *b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia que emplean generalmente en la administración de sus propias actividades;*

Que, mediante Memorando Nro. GADPPZ-GADPPZ-2022-4706-M, de fecha 22 de noviembre de 2022, suscrito por el Ing. Jaime Guevara, Prefecto Provincial, para el Sr. Alejandro Torres, Procurador Sindico (E) del GADPPz, en el cual manifiesta que, "*Señor Procurador Sindico, por requerimiento institucional dispongo se proceda al cambio de Administrador de Contrato del proyecto "ASFALTO VÍA CURARAY- FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA". Se designa a la Ing. Eryka Miveya Silva Manzana, en calidad de Administradora de Contrato del referido proyecto, para que actúe de conformidad con lo dispuesto en la Ley.*", por lo que mediante sumilla inserta de la Máxima Autoridad del GADPPz, Ing. Jaime Guevara Blaschke, Prefecto Provincial, dispone: "*CAMBIO DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO PROYECTO: "ASFALTO VÍA CURARAY- FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"*;

Por las **consideraciones** expuestas en el presente acto administrativo, y en uso de mis atribuciones legales y Constitucionales esta Autoridad.

**RESUELVE:**

**Art. 1.- DEJAR SIN EFECTO** la designación del Ing. Robert Quintana Muñoz, como Administrador del contrato para el "ASFALTO VÍA CURARAY- FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".



**Art 2.- DESIGNAR** a la Ing. Eryka Mireya Silva Manzano, como Administradora del contrato ~~para~~ la "ASFALTO VÍA CURARAY- FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", desde el 22 de noviembre de 2022 en adelante, conforme a la sumilla inserta de la Máxima Autoridad del GADPPZ, ~~en el~~ ~~memorandum~~ No. GADPPZ-GADPPZ-2022-4706-M, de fecha 22 de noviembre de 2022, a fin de que supervise la fiel ejecución del presente objeto de contratación de conformidad con los Artículos 70 y 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con el Art. 295 del Reglamento de la norma referida y el capítulo II, sección I, de la Codificación de Resoluciones en la que se realizan las Disposiciones Comunes sobre Administradores de Contratos;

Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, hoy 01 de diciembre de 2022.

Notifíquese y Cúmplase. -


 Firmado electrónicamente por  
**JAIIME PATRICIO  
 GUEVARA  
 BLASCHKE**

Ing. Jaime Guevara Blaschke.  
**PREFECTO DEL GOBIERNO  
 AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA.**

|                |                       |   |  |
|----------------|-----------------------|---|--|
| Elaborado por: | Abg. Paul Benavidez G |  | Firmado electrónicamente por<br><b>PAUL ANDRES<br/>BENAVIDEZ<br/>GUEVARA</b>   |
| Revisado por:  | Mgs. Alejandro Torres |  | Firmado electrónicamente por<br><b>ALEJANDRO BOLIVAR<br/>TORRES ALTAMIRANO</b> |

**ACTA DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS DE PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO "ASFALTO DE LA VÍA CURARAY – FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".**

En la ciudad de Puyo a los veintiocho días del mes de diciembre del 2022, comparecen en calidad de contratista AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S. A., representado legalmente por el Sr. Odilo Guevara Marín; Ing. Eryka Silva M. en calidad de Administradora de contrato con la finalidad de suscribir el Acta de Cumplimiento de Parámetros del Personal Técnico Mínimo y Equipo Mínimo requerido en la etapa precontractual de la obra antes mencionada; y así dar cumplimiento a lo determinado en la resolución Nro. RE-SERCOP-2019-0000100.

**PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO POR LA ENTIDAD**

| CANTIDAD | FUNCIÓN                                   | NIVEL DE ESTUDIO        | TITULACIÓN ACADÉMICA   | EXPERIENCIA | PARTICIPACIÓN |
|----------|---|-------------------------|--|-------------|---------------|
| 1        | SUPERINTENDENTE DE OBRA                   | TERCER NIVEL CON TÍTULO | INGENIERO/A CIVIL  | 7 AÑOS      | 100%          |
| 1        | RESIDENTE DE OBRA 1                       | TERCER NIVEL CON TÍTULO | INGENIERO/A CIVIL CON LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN REGISTRADO EN EL SENESCYT | 5 AÑOS      | 100%          |
| 1        | RESIDENTE DE OBRA 2                       | TERCER NIVEL CON TÍTULO | INGENIERO/A CIVIL CON LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN REGISTRADO EN EL SENESCYT | 5 AÑOS      | 100%          |
| 1        | TÉCNICO AMBIENTAL                         | TERCER NIVEL CON TÍTULO | INGENIERO/A AMBIENTAL O A FIN, CON LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN.             | 3 AÑOS      | 50%           |
| 1        | TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD OCCUPACIONAL | TERCER NIVEL CON TÍTULO | INGENIERO/A INDUSTRIAL O A FIN, ESPECIALIZADO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.                    | 2 AÑOS      | 50%           |
| 1        | TOPOGRAFO                                 | TERCER NIVEL CON TÍTULO | TOPOGRAFO O/A INGENIERO CIVIL  | 1 AÑO       | 100%          |

**PERSONAL MÍNIMO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA**

| FUNCIÓN                 | NOMBRE                              | AÑO DE TITULACIÓN ACADÉMICA | EXPERIENCIA   | COMPROMISO |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|------------|
| SUPERINTENDENTE DE OBRA | ING. MARCO VINCENZO TAMAYO MEJIA    | 2002                        | 1.- SUPERINTENDENTE DE OBRA CON EL CONSORCIO OMEGA, EN EL PROYECTO "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL-PLANTA DE TRATAMIENTO – ASFALTO- DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, SUB SISTEMA DE RÍO PUYO", S.5°152.543.30 USD | 100%       |
| RESIDENTE DE OBRA 1     | ING. JONATHAN RODOLFO TORRES TAMAYO | 2005                        | 1.- RESIDENTE DE OBRA DEL PROYECTO" ASFALTO CAMINO VECINAL KM. 14 VÍA PUYO-SAN RAMON KM. 31 VÍA AL TENA, CANTÓN SANTA CLARA Y PASTAZA S.3°767.743.285,35  | 100%       |
| RESIDENTE DE OBRA 2     | ING. LUIS OCTAVIO                   | 2010                        | 1.- RESIDENTE DE OBRA DEL PROYECTO" ASFALTO Y ADOQUINADO DE LA VÍA CHUCCHUPUNGO LA ESPERANZA ZULETA,  | 100%       |

|  |   |      |  |      |
|--|---|------|--|------|
|  | TIBANTA GUAMÁN                          |      | LIMITE PROVINCIAL CO PICHINCHA, CANTÓN IBARRA, LONGITUD 15,54KM<br>\$ 4'590,355,59 USD   |      |
| TECNICO AMBIENTAL                        | ING. EDGAR RAÚL GASPATA CALO            | 2006 | RESIDENTE AMBIENTAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TERMAS DE LA VIRGEN, UBICADO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA, OBRA CONTRATADA CON LA CONSTRUCTORA AMAZONAS BUILDING S. A. MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BAÑOS DE AGUA SANTA Y LA FISCALIZACIÓN A CARGO DEL INGL. DASSY DURÁN CABRERA<br>\$ 1'150,232,93 USD | 50%  |
| TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | ING. WASHINGTON EDUARDO LASCANO COFILLO | 2018 | ASFALTADO DEL CAMINO VECINAL TARQUI-SAN JACINTO – LOS ANGELES CON SUS RAMALES HUAGRAYACU Y CHINGUSHIMI<br>\$ 1'344,013,54 USD  | 50%  |
| TOPOGRAFO                                | ING. DANIELA ANALLA GÓMEZ ZAMBRANO      | 2007 | ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY – FRANCISCO DE ORFELANA – JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO EL TRIUNFO CATÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA<br>\$ 1'344,013,54 USD   | 100% |

**EQUIPO E INSTRUMENTOS DISPONIBLES REQUERIDO POR LA ENTIDAD**

| Nº | DESCRIPCIÓN                  | CANTIDAD | CARACTERÍSTICAS                   |
|----|------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 1  | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 1        | POTENCIA MÍNIMA 148 HP            |
| 2  | MOTO NIVELADORA              | 1        | CAPACIDAD MÍNIMA 140 HP           |
| 3  | CAMIÓN CISTERNA              | 1        | CAPACIDAD MÍNIMA 2000 GALONES     |
| 4  | VOLQUETTES                   | 5        | CAPACIDAD MÍNIMA 10M <sup>3</sup> |
| 5  | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1        | CAPACIDAD MÍNIMA 1000 GALONES     |
| 6  | PLANTA DE ASFALTO            | 1        | 110 T/H 150 HP MÍNIMA             |
| 7  | TERMINADORA DE ASFALTO       | 1        | 60 HP POTENCIA MÍNIMA             |
| 8  | RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1        | 80 HP POTENCIA MÍNIMA             |
| 9  | RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1        | 125 HP POTENCIA MÍNIMA            |
| 10 | RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1        | 28 HP POTENCIA MÍNIMA             |
| 11 | CONCRETERA 1 SACO            | 2        | CAPACIDAD MÍNIMA 1 SACO           |
| 12 | MINICARGADORA                | 1        | 54 HP POTENCIA MÍNIMA             |
| 13 | APARATOS DE TOPOGRAFIA       | 1        | SISTEMA GPS-GNSS, ESTACION TOTAL  |

**EQUIPO E INSTRUMENTOS DISPONIBLES PROPUESTO POR EL CONTRATISTA**

| Nº | DESCRIPCIÓN             | CANTIDAD | PROPIETARIO                        | CARACTERÍSTICAS | PLACA/ FACTURA/ MATRICULA |
|----|-------------------------|----------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1  | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS | 1        | AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. | POTENCIA 148 HP | 7.1-16-000150             |
|    | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS | 1        | AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. | POTENCIA 148 HP | 7.1-16-000149             |



|   |                                   |   |   |                                    |                |
|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------------|----------------|
|   | EXCAVADORA SOBRELORUGAS           | 1 | AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  | POTENCIA 148 HP                    | 7.1-16-000006  |
| 2 | MOTO NIVELADORA                   | 1 | AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  | POTENCIA 140 HP                    | 6.0-16-000004  |
| 3 | CAMIÓN CISTERNA                   | 1 | COMPROMISO DE VENTA Y DISPONIBILIDAD PARA AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. POR PARTE DE VEHICENTRO S.A. | CAPACIDAD 2000 GALONES             | SN             |
| 4 | VOLQUETE                          | 1 | AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  | CAPACIDAD 12 M3                    | SBD0253        |
|   | VOLQUETE                          | 1 | AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  | CAPACIDAD 12 M3                    | VBA1052        |
|   | VOLQUETE                          | 1 | COMPROMISO DE VENTA Y DISPONIBILIDAD PARA AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. POR PARTE DE VEHICENTRO S.A. | CAPACIDAD 20 M3                    | SN             |
|   | VOLQUETE                          | 1 | COMPROMISO DE VENTA Y DISPONIBILIDAD PARA AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. POR PARTE DE VEHICENTRO S.A. | CAPACIDAD 20 M3                    | SN             |
| 5 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO           | 1 | COMPROMISO DE VENTA Y DISPONIBILIDAD PARA AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. POR PARTE DE VEHICENTRO S.A. | CAPACIDAD 20 M3                    | SN             |
|   |                                   |   | COMPROMISO DE VENTA Y DISPONIBILIDAD PARA AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. POR PARTE DE VEHICENTRO S.A. | CAPACIDAD 2000 GALONES             | SN             |
| 6 | PLANTA ASFALTICA                  | 1 | AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  | MODELO Y POTENCIA 110 SPL Y 150 HP | 15.0-17230     |
| 7 | TERMINADORA DE ASFALTO (FINISHER) | 1 | AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  | 60 HP DE POTENCIA                  | 16.0-14-000411 |

|    |                                |   |   |                       |                   |
|----|--------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------|
| 8  | RODILLO TANDEM DOBLE TAMBOR    | 1 | AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A         | 99 HP POTENCIA        | 001-001-000122989 |
| 9  | RODILLO TANDEM VIBRATORIO LISO | 1 | AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A         | 125 HP POTENCIA       | 001-16000005      |
| 10 | VIBRATORIO NEUMÁTICO           | 1 | AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A         | 28 HP POTENCIA        | 001-1-000410      |
| 11 | CONCRETERA 1 SACO              | 1 | AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A         | CONCRETERA DE UN SACO | 0032728           |
|    | CONCRETERA 1 SACO              | 1 | AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A         | CONCRETERA DE UN SACO | 0000128           |
| 12 | MINICARGADORA                  | 1 | AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A         | 54 HP POTENCIA        | 4518-000625       |
| 13 | GPS                            | 1 | FACTURA AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A | MARCA SOUTH           | 001-002-000000095 |
|    | ESTACIÓN TOTAL                 | 1 | FACTURA AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A | MARCA SOUTH           | 001-002-000000095 |

De la documentación presentada por el contratista se puede verificar que **cumple** con lo determinado en la sección **4.1.2 Equipo mínimo** y **4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico** de los pliegos determinados para el presente proceso; así como también **lo dispuesto** en los numerales **4.1.6 Metodología y Cronograma de ejecución**; para constancia **se** firma tres ejemplares.



**ODILO VINICIO GUEVARA MARIN**

Sr. Odilo Guevara

**REPRESENTANTE LEGAL DE AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S. A.**



**JAIME ANDRES SILVA CORDOVA**

Ing. Jaime Silva

**FISCALIZADOR TEMPORAL GADPPz**



**ERYKA MIREYA SILVA MANZANO**

Ing. Eryka Silva M.

**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**




**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

# INFORME DE FISCALIZACIÓN

"ASFALTADO DE LA VIACURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO  
"12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY – FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO – CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA**

KEYSZEN S.A.S.

FISCALIZADOR EXTERNO

**INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA No. 03**

**PROYECTO:** ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY – FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO – CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA

**CONTRATISTA:** CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S,A.

**MONTO DEL CONTRATO:** 4'650,521.23 USD.

**PERIODO DEL INFORME:** 01 DE ABRIL DEL 2023 – 30 DE ABRIL DEL 2023

**FECHA DE ELABORACIÓN:** 05 DE MAYO DEL 2023

**CONTENIDO**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO .....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>2. ASPECTOS CONTRACTUALES DE LA OBRA .....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>3. PERIODO DEL INFORME.....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>4. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO .....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>5. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS Y PLUVIOMÉTRICAS EN LOS FRENTE DE OBRA ..</b>                    | <b>9</b>  |
| <b>6. DESCRIPCIÓN POR FRENTE DE OBRA .....</b>  | <b>12</b> |
| <b>7. OBRA EJECUTADA DURANTE EL PERÍODO Y ACUMULADA.....</b>                                      | <b>15</b> |
| <b>8. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN.....</b>                                 | <b>20</b> |
| <b>9. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS ADOPTADAS PARA CUMPLIR LOS PLAZOS ESTABLECIDOS .....</b> | <b>20</b> |
| <b>10. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.....</b>  | <b>21</b> |
| <b>11. GESTIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DURANTE EL PERÍODO .....</b>                                   | <b>21</b> |
| <b>12. RESUMEN DE MONTOS EJECUTADOS PLANILLAS CONTRACTUALES .....</b>                             | <b>21</b> |
| <b>13. RESUMEN A LA FECHA DEL PROYECTO .....</b>  | <b>21</b> |
| <b>14. ACCIONES EFECTUADAS POR LA FISCALIZACIÓN.....</b>  | <b>22</b> |
| <b>15. UTILIZACIÓN DE RECURSOS, DE EQUIPOS Y DE MANO DE OBRA .....</b>                            | <b>22</b> |
| - <b>INCIDENCIAS PRODUCIDAS EN LA OBRA .....</b>  | <b>24</b> |
| - <b>CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES .....</b>   | <b>24</b> |
| - <b>OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS.....</b>  | <b>24</b> |
| <b>16. CONTROL DE COSTOS.....</b>   | <b>24</b> |
| <b>17. INFORME DETALLADO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL</b>                        | <b>27</b> |
| <b>18. RESUMEN DE CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES.....</b>                                       | <b>37</b> |
| <b>19. REPORTE FOTOGRÁFICO .....</b>  | <b>50</b> |
| <b>20. INFORME DEL PERSONAL.....</b>  | <b>53</b> |
| <b>21. CONCLUSIONES .....</b>   | <b>54</b> |
| <b>22. RECOMENDACIONES.....</b>   | <b>55</b> |
| <b>23. BIBLIOGRAFÍA.....</b>  | <b>55</b> |
| <b>24. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME .....</b>                               | <b>55</b> |

**TABLA DE ILUSTRACIONES**

|  |    |
|--|----|
| <b>Ilustración 1</b> Control de plazo.....                                     | 6  |
| <b>Ilustración 2</b> Categorías de nubosidad en abril 2023 en Puyo .....       | 10 |
| <b>Ilustración 3</b> Probabilidad de precipitación en abril 2023 en Puyo ..... | 11 |
| <b>Ilustración 4</b> Promedio mensual de lluvia en abril 2023 en Puyo .....    | 11 |
| <b>Ilustración 5</b> Diagrama de inversión programado vs ejecutado .....       | 25 |
| <b>Ilustración 6</b> Diagrama de avance programado vs ejecutado .....          | 26 |

**1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO              | ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA. |
| CÓDIGO DEL PROCESO               | LICO-GADPPz-006-2022   |
| MONTO DEL CONTRATO               | 4'650,521.23 USD.  |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN             | 25 de enero del 2023   |
| PLAZO CONTRATUAL                 | 540 días   |
| FECHA INICIO DE TRABAJO          | 25 de enero del 2023   |
| FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL | 18 de julio del 2024   |
| SUSPENSIÓN DE TRABAJO            | Ninguno  |
| AMPLIACION DE PLAZO              | Ninguno  |
| CONTRATISTA                      | AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.   |
| GEOREFERENCIAL DEL PROYECTO      | BALNEARIO DEL RÍO ARAJUNO - COMUNIDAD JATUNPACCHA  |
| ADMINISTRADOR DEL CONTRATO       | ING. ERYKA MIREYA SILVA MANZANO  |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN**

|                     |  |
|---------------------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO | FISCALIZACIÓN EXTERNA DEL ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY – FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO – CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA. |
| CODIGO DEL PROCESO  | LCC-GADPPz-004-2022  |

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| MONTO DEL CONTRATO               | USD \$ 186,020.85               |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN             | 25 de enero del 2023            |
| PLAZO CONTRACTUAL                | 540 días                        |
| MONTO DEL ANTICIPO               | USD \$ 93,010.42                |
| FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO    | 24 de enero del 2023            |
| FECHA INICIO DE TRABAJO          | 25 de enero del 2023            |
| FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL | 18 de julio del 2024            |
| AMPLIACIÓN DE PLAZO              | Ninguno                         |
| FISCALIZADOR                     | KEYSZEN S.A.S.                  |
| ADMINISTRADOR DEL CONTRATO       | ING. ERYKA MIREYA SILVA MANZANO |

## 2. ASPECTOS CONTRACTUALES DE LA OBRA

### TIEMPO UTILIZADO DESDE LA FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO

El plazo contractual es de 540 días, de los cuales se ha utilizado 96 días desde la entrega del proyecto hasta el presente periodo que corresponde (1 al 30 de abril / 2023)

|                 | PLAZO | PORCENTAJE |
|-----------------|-------|------------|
| PLAZO TOTAL     | 540   | 100%       |
| DÍAS UTILIZADOS | 96    | 17.78%     |

## Control de avance de plazos

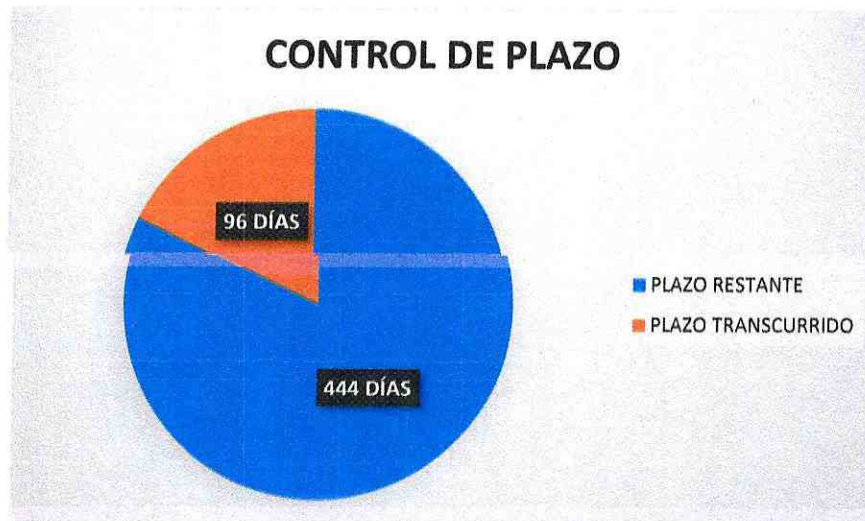


Ilustración 1 Control de plazo

### 3. PERIODO DEL INFORME

El presente informe de avance de trabajos relacionado con la obra, recoge las actividades, eventos y circunstancias operativas ocurridas dentro del periodo:  
ABRIL 1 – 30 / 2023.

### 4. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

El monto total del proyecto, alcanza la suma de **USD \$ 4'650,521.23** (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO DÓLARES CON 23/100 CENTAVOS) para la **CONSTRUCCIÓN DE ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY – FRANCISCO DE ORELLANA – JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO – CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA PASTAZA.**

|                                  |                     |      |
|----------------------------------|---------------------|------|
| <b>TOTAL MONTO DEL PROYECTO:</b> | USD \$ 4'650,521.23 | 100% |
|----------------------------------|---------------------|------|

## Costo total de los diferentes rubros ejecutados

| ITEMS | DESCRIPCIÓN  | IMPORANTE   |              |             |
|-------|--|-------------|--------------|-------------|
|       |  | T. ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL FECHA |
| 1     | Desbroce, desbosque y limpieza   | 2,666.52    | 697.74       | 3,364.26    |
| 2     | Replanteo y nivelación a nivel de asfalto                              | 2,214.35    | 7,182.80     | 9,397.15    |
| 3     | Remoción de alcantarillas  | 1,659.12    |              | 1,659.12    |
| 4     | Excavación sin clasificar(mov.de tierra)                               | 7,485.57    | 1,767.87     | 9,253.44    |
| 5     | Excavación de cunetas de coronación                                    | -           |              | -           |
| 6     | Excavación para cunetas y encauzamiento                                | -           |              | -           |
| 7     | Excavación y relleno de estructuras menores                            | 11,031.68   |              | 11,031.68   |
| 8     | Limpieza de derrumbes  | -           |              | -           |
| 9     | S.C. Tubería de acero corrugado D= 0,80 m, e=2.5 mm, PM-100            | -           |              | -           |
| 10    | S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m, e=2.5 mm, PM-100            | 13,337.80   |              | 13,337.80   |
| 11    | S.C. Tubería de acero corrugado D= 2.20 m, e=2.5 mm, PM-100            | -           |              | -           |
| 12    | Hormigon para cunetas (F'c=180 KG/CM)                                  | -           |              | -           |
| 13    | Muro de H.S. f'c=180kg./cm2 tipo B(Cabezales)                          | -           |              | -           |
| 14    | Hormigon simple en obras de arte F'c=240'KG/CM2                        | -           |              | -           |
| 15    | Hierro estructural fy=4200 kg/cm²                                      | -           |              | -           |
| 16    | Muro de gaviones - calibre N° 12                                       | -           |              | -           |
| 17    | Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)             | 43,471.20   | 12,072.36    | 55,543.56   |
| 18    | Material de subbase clase 3  | 13,995.00   | 19,667.39    | 33,662.39   |
| 19    | Material de base granular de agregados                                 | -           | 14,946.18    | 14,946.18   |
| 20    | Transporte material de desalojo  | 2,131.80    |              | 2,131.80    |
| 21    | Transporte de material pétreo de mejoramiento                          | 119,473.35  | 15,983.92    | 135,457.27  |
| 22    | Transporte de material pétreo de subbase clase 3                       | 9,275.63    | 13,035.14    | 22,310.77   |
| 23    | Transporte de material pétreo de base granular de agregados            | -           | 7,809.36     | 7,809.36    |
| 24    | Impregnación con emulsión asfáltica                                    | -           |              | -           |
| 25    | C. rodadura hormigon asf. Mezclado en planta, e=2"                     | -           |              | -           |
| 26    | Bordillo de H.S.(f'c=210 kg/cm² - 0,14x0,40)                           | -           |              | -           |
| 27    | Aceras de H.S. f'c=180kg/cm² E=7cm escobillado                         | -           |              | -           |
| 28    | Marcas en pavimento  | -           |              | -           |
| 29    | Marcas sobre salidas de pavimento (unidireccionales y bidireccionales) | -           |              | -           |
| 30    | Pancarta informativa (latero)-con estructura                           | 1,179.31    |              | 1,179.31    |
| 31    | Señales ecologicas (2.40x1.20)M  | -           |              | -           |
| 32    | Señales informativas (2.40x1.20)M                                      | -           |              | -           |
| 33    | Señales reglamentarias (0.75 x 0.75)M                                  | -           |              | -           |
| 34    | Señales preventivas (0,75 x 0,75 )M                                    | -           |              | -           |
| 35    | Señales informativas y reglamentarias (0.60m x 0.60m) móviles          | 312.72      |              | 312.72      |
| 36    | Señales preventivas tipo barrera (1.22m x 0.60m) móviles               | 653.36      |              | 653.36      |
| 37    | Contenedores metálicos de 55 galones                                   | 70.28       |              | 70.28       |
| 38    | Kit antiderrames   | 830.00      |              | 830.00      |
| 39    | Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)                      | 57.80       | 28.80        | 86.40       |
| 40    | SC Cono de seguridad con protección UV, 71cm Incl. cinta reflectiva    | 449.60      |              | 449.60      |
| 41    | Suministro de paleta de alto y siga                                    | 121.28      |              | 121.28      |
| 42    | Capacitación sobre preservación de recursos naturales (de 2 a 3 horas) | 100.00      |              | 100.00      |
| 43    | Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a 3 horas)      | 100.00      |              | 100.00      |
| 44    | Capacitación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3 horas)         | 100.00      |              | 100.00      |

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
 Oficina 072 785 269  
 keyszen.sas@gmail.com  
 www.keyszen.com  
 Machala – El oro - Ecuador

| IMPORTANTE             |        |                      |                     |                      |
|------------------------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                        |        | T. ANTERIOR          | ESTE PERIODO        | TOTAL FECHA          |
| DESCUENTOS:            | TOTAL  | \$ 230,516.37        | \$ 93,191.56        | \$ 323,707.93        |
| Anticipo               | 0%     | \$ 0.00              | \$ 0.00             | \$ 0.00              |
| Mora 0 días            | \$0.00 | \$ 0.00              | \$ 0.00             | \$ 0.00              |
| <b>VALOR A PAGARSE</b> |        | <b>\$ 230,516.37</b> | <b>\$ 93,191.56</b> | <b>\$ 323,707.93</b> |

SON: NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN DÓLARES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

### Reajuste de precios

PROYECTO: ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN: PARROQUIA 10 DE AGOSTO-CANTON PASTAZA-PROVINCIA DE PASTAZA

CONTRATISTA: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

ANEXO: REAJUSTE (PROVISIONAL) PLANILLA 3

POR: \$ 2,326.30

FECHA: 5 de Mayo de 2023

NOTA:

FORMULA POLINOMICA DE REAJUSTE

$$Pr = Po(0.143 B1/Bo + 0.072 C1/Co + 0.034 COM1/COMo + 0.372 E1/Eo + 0.128 F1/Fo + 0.002 H1/Ho + 0.057 M1/Mo + 0.147 P1/Po + 0.023 T1/To + 1.022 X1/Xo)$$

#### CUADRILLA TIPO

| DESCRIPCION               | COEFICIENTE | Ago-22                    |       | PLANILLA # 3 (Provisional) Abr-23 |       |
|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
|                           |             | JORNAL T.D                | TOTAL | JORNAL T.D                        | TOTAL |
|                           |             | OPERADOR EQUIPO PESADO C1 | 0.059 | 4.29                              | 0.25  |
| OPERADOR EQUIPO PESADO C2 | 0.030       | 4.09                      | 0.12  | 4.33                              | 0.130 |
| SIN TITULO DZ             | 0.077       | 3.87                      | 0.30  | 4.16                              | 0.320 |
| ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3 | 0.000       | 4.30                      | 0.00  | 4.55                              | 0.000 |
| CHOFER C1                 | 0.302       | 5.62                      | 1.70  | 5.95                              | 1.797 |
| ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 | 0.040       | 4.29                      | 0.17  | 4.55                              | 0.182 |
| ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2 | 0.003       | 4.09                      | 0.01  | 4.33                              | 0.013 |
| ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 | 0.152       | 3.87                      | 0.59  | 4.1                               | 0.623 |
| ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 | 0.337       | 3.83                      | 1.29  | 4.05                              | 1.365 |
|                           | 1.000       |                           | 4.43  |                                   | 4.699 |

| DESCRIPCION                                       | SIMBOLO | COEFICIENTE E (a) | Ago-22              |                       | PLANILLA # 3 (Provisional) Abr-23 |               | OBSERVACIONES        |
|---|---------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
|   |         |                   | PRECIO O INDICE (b) | PRECIO (j) INDICE (c) | RELACION d=(c/b)                  | TERMINO e=d*a |                      |
|   |         |                   | MANO DE OBRA        | B                     | 0.143                             | 4.434         |                      |
| CEMENTO PORTLAND-SACOS                            | C       | 0.072             | 185.910             | 184.300               | 0.991                             | 0.071         | Nivel Nacional       |
| COMBUSTIBLES (PRECIOS NACIONALES SUBSIDIADOS)(O)  | COM     | 0.034             | 252.130             | 252.130               | 1.000                             | 0.034         | Nivel Nacional       |
| EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION VIAL          | E       | 0.372             | 184.350             | 193.130               | 1.048                             | 0.390         | Nivel Nacional       |
| BETUN PETROLEO (ASFALTO) (O)                      | F       | 0.128             | 746.200             | 746.200               | 1.000                             | 0.128         | Nivel Nacional       |
| ACERO EN BARRAS                                   | H       | 0.002             | 301.350             | 301.350               | 1.000                             | 0.002         | Nivel Nacional       |
| MADERA ASERRADA, CEPILLADA Y/O ESCUADRADA (PREPAR | M       | 0.057             | 512.780             | 516.360               | 1.007                             | 0.057         | Nivel Nacional       |
| MATERIALES PÉTREOS-TUNGURAHUA                     | P       | 0.147             | 221.600             | 219.720               | 0.992                             | 0.146         | Tungurahua           |
| ALCANTARILLAS DE LÁMINAS DE METAL Y ACC.          | T       | 0.023             | 202.060             | 202.060               | 1.000                             | 0.023         | Nivel Nacional       |
| VARIOS IPC AMBATO                                 | X       | 0.022             | 109.540             | 110.380               | 1.008                             | 0.022         | Nivel Nacional       |
|   | OK      | 1.000             |                     |                       |                                   | 1.025         | <=FACTOR DE REAJUSTE |

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03

Oficina 072 785 269

keyszen.sas@gmail.com

www.keyszen.com

Machala – El oro - Ecuador

|                                   |    |           |
|-----------------------------------|----|-----------|
| VALOR A REAJUSTE (Po)             | \$ | 93,191.56 |
| VALOR REAJUSTADO (Pr=Po*1)        | \$ | 95,516.86 |
| VALOR DE REAJUSTE PRECIOS (Pr-Po) | \$ | 2,325.30  |

SON: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO DÓLARES CON TREINTA CENTAVOS

### VALOR LÍQUIDO A PAGAR

|   |                          |
|---|--------------------------|
| PLANILLA DE AVANCE Nro. 03                            | \$ 93,191.56 USD.        |
| REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE Nro. 03 | \$ 2,325.30 USD.         |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                  | <b>\$ 95,516.86 USD.</b> |

### Fuentes de financiación del proyecto

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, GADPPz.

### Subcontratistas

Ninguno

### 5. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS Y PLUVIOMÉTRICAS EN LOS FRENTE DE OBRA

| ESTADO DEL TIEMPO | MAÑANA        | TARDE         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 01/04/2023        | NUBLADO       | LLUVIOSO      |
| 02/04/2023        | LLUVIOSO      | LLUVIOSO      |
| 03/04/2023        | LLUVIOSO      | LLUVIOSO      |
| 04/04/2023        | NUBLADO       | SOLEADO       |
| 05/04/2023        | SOLEADO       | LLUVIA FUERTE |
| 06/04/2023        | LLUVIA FUERTE | LLUVIA FUERTE |
| 07/04/2023        | LLUVIOSO      | LLUVIOSO      |
| 08/04/2023        | SOLEADO       | LLUVIOSO      |
| 09/04/2023        | LLUVIA FUERTE | LLUVIA FUERTE |
| 10/04/2023        | NUBLADO       | LLUVIOSO      |
| 11/04/2023        | LLUVIOSO      | LLUVIA FUERTE |
| 12/04/2023        | NUBLADO       | SOLEADO       |
| 13/04/2023        | NUBLADO       | SOLEADO       |
| 14/04/2023        | LLUVIA FUERTE | LLUVIA FUERTE |
| 15/04/2023        | NUBLADO       | NUBLADO       |
| 16/04/2023        | SOLEADO       | SOLEADO       |
| 17/04/2023        | NUBLADO       | LLUVIA FUERTE |
| 18/04/2023        | NUBLADO       | SOLEADO       |
| 19/04/2023        | LLUVIOSO      | SOLEADO       |

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
 Oficina 072 785 269  
 keyszen.sas@gmail.com  
 www.keyszen.com  
 Machala – El oro - Ecuador

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 20/04/2023 | LLUVIA FUERTE | LLUVIA FUERTE |
| 21/04/2023 | LLUVIOSO      | LLUVIOSO      |
| 22/04/2023 | LLUVIOSO      | LLUVIOSO      |
| 23/04/2023 | NUBLADO       | LLUVIOSO      |
| 24/04/2023 | SOLEADO       | LLUVIA FUERTE |
| 25/04/2023 | NUBLADO       | LLUVIOSO      |
| 26/04/2023 | LLUVIOSO      | LLUVIOSO      |
| 27/04/2023 | LLUVIOSO      | SOLEADO       |
| 28/04/2023 | LLUVIOSO      | SOLEADO       |
| 29/04/2023 | SOLEADO       | SOLEADO       |
| 30/04/2023 | SOLEADO       | LLUVIOSO      |

## Nubosidad

El mes de abril, Puyo tiene nubosidad que disminuye rápidamente y el porcentaje de tiempo que el cielo está nublado o mayormente nublado disminuye del 82 % al 70 %. El día más despejado del mes es el 30 de abril, con condiciones despejadas, mayormente despejadas o parcialmente nubladas el 30 % del tiempo (Weatherspark, 2023)

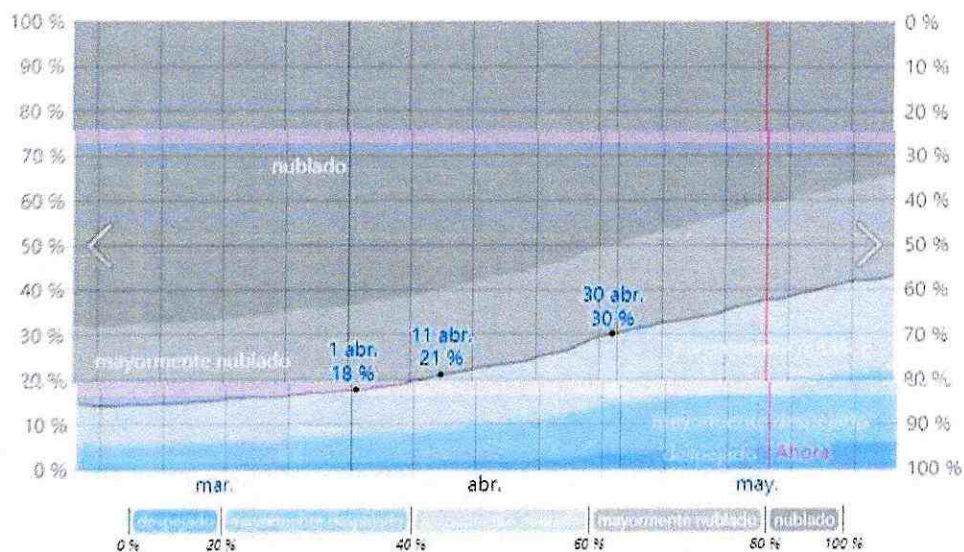


Ilustración 2 Categorías de nubosidad en abril 2023 en Puyo

## Precipitación

Un día mojado es un día con por lo menos 1 milímetro de líquido o precipitación equivalente a líquido. En Puyo, la probabilidad de un día mojado durante abril disminuye gradualmente, y comienza el mes en 72 % y termina en 68 %.

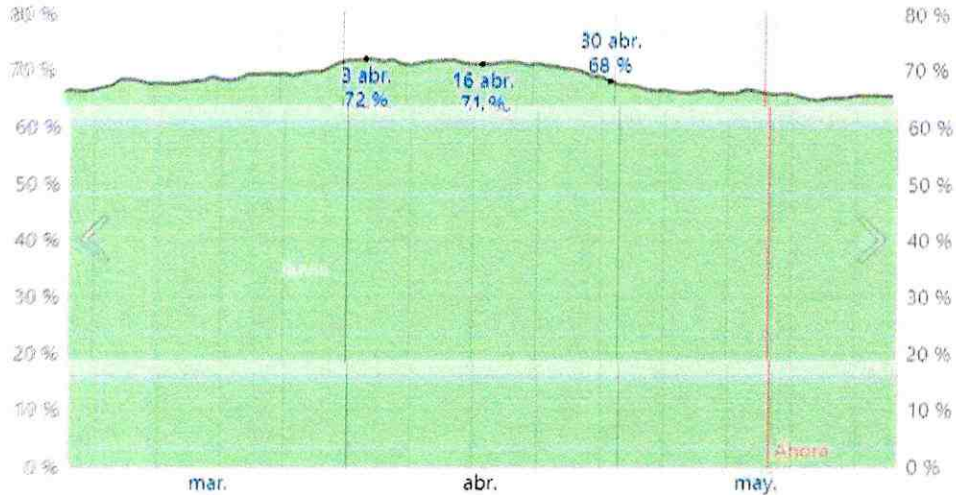


Ilustración 3 Probabilidad de precipitación en abril 2023 en Puyo

## Lluvia

El promedio de lluvia durante un periodo de 31 días en una escala móvil en abril en Puyo es esencialmente constante, permaneciendo en aproximadamente 178 milímetros y rara vez excede 304 milímetros o es menos de 48 milímetros.

El promedio de la acumulación máxima de 31 días es 184 milímetros el 19 de abril.

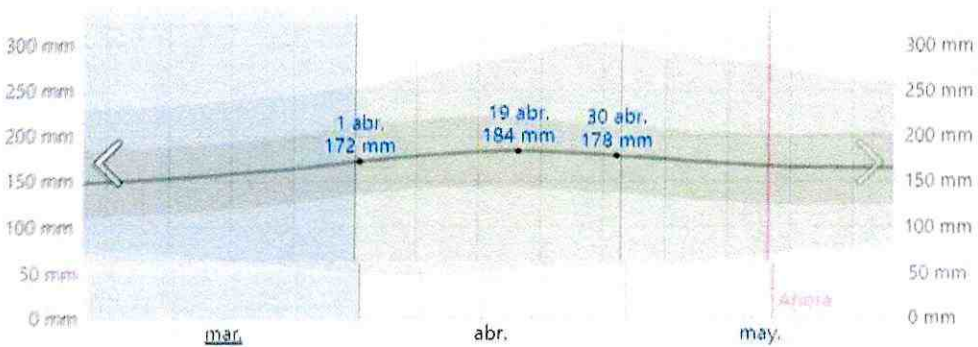


Ilustración 4 Promedio mensual de lluvia en abril 2023 en Puyo

**6. DESCRIPCIÓN POR FRENTE DE OBRA**

**DESCRIPCIÓN DE RUBROS EN EJECUCIÓN**

Desbroce, desbosque y limpieza

Replanteo y nivelación a nivel de asfalto

Excavación sin clasificar (mov.de tierra),

Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)

Material de subbase clase 3

Material de base granular de agregados

Transporte de material pétreo de mejoramiento

Transporte de material pétreo de subbase clase 3

Transporte de material pétreo de base granular de agregados

Cinta **peligro** colores intensos (mat. polietileno)

## Cantidades de los diferentes rubros ejecutados

| ITEMS | DESCRIPCIÓN  | CANTIDADES  |              |             |         |
|-------|--|-------------|--------------|-------------|---------|
|       |  | T. ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL FECHA | % TOTAL |
| 1     | Desbroce, desbosque y limpieza   | 6.00        | 1.57         | 7.57        | 25.94%  |
| 2     | Replanteo y nivelación a nivel de asfalto                              | 1.60        | 5.19         | 6.79        | 46.54%  |
| 3     | Remoción de alcantarillas  | 62.00       |              | 62.00       | 25.51%  |
| 4     | Excavación sin clasificar (mov.de tierra)                              | 7,338.80    | 1,733.21     | 9,072.01    | 13.17%  |
| 5     | Excavación de cunetas de coronación                                    | -           |              | -           | 0.00%   |
| 6     | Excavación para cunetas y encauzamiento                                | -           |              | -           | 0.00%   |
| 7     | Excavación y relleno de estructuras menores                            | 2,171.59    |              | 2,171.59    | 28.13%  |
| 8     | Limpieza de derrumbes  | -           |              | -           | 0.00%   |
| 9     | S.C. Tubería de acero corrugado D= 0,80 m, e=2,5 mm, PM-100            | -           |              | -           | 0.00%   |
| 10    | S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m, e=2,5 mm, PM-100            | 49.00       |              | 49.00       | 18.63%  |
| 11    | S.C. Tubería de acero corrugado D= 2,20 m, e=2,5 mm, PM-100            | -           |              | -           | 0.00%   |
| 12    | Hormigon para cunetas (F'c=180 KG/CM)                                  | -           |              | -           | 0.00%   |
| 13    | Muro de H.S. f'c=180kg./cm2 tipo B(Cabezas)                            | -           |              | -           | 0.00%   |
| 14    | Hormigon simple en obras de arte F'c=240 KG/CM2                        | -           |              | -           | 0.00%   |
| 15    | Hieno estructural fy=4200 kg/cm <sup>2</sup>                           | -           |              | -           | 0.00%   |
| 16    | Muro de gaviones - calibre N° 12                                       | -           |              | -           | 0.00%   |
| 17    | Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)             | 14,490.40   | 4,024.12     | 18,514.52   | 22.24%  |
| 18    | Material de subbase clase 3  | 1,125.00    | 1,580.98     | 2,705.98    | 12.88%  |
| 19    | Material de base granular de agregados                                 | -           | 947.16       | 947.16      | 7.27%   |
| 20    | Transporte material de desalajo  | 2,090.00    |              | 2,090.00    | 23.90%  |
| 21    | Transporte de material pétreo de mejoramiento                          | 477,893.40  | 63,935.69    | 541,829.09  | 16.37%  |
| 22    | Transporte de material pétreo de subbase clase 3                       | 37,102.50   | 32,140.36    | 69,242.86   | 11.43%  |
| 23    | Transporte de material pétreo de base granular de agregados            | -           | 31,237.45    | 31,237.45   | 6.45%   |
| 24    | Imprimación con emulsión asfáltica                                     | -           |              | -           | 0.00%   |
| 25    | C. rodadura hormigon asf. Mezclado en planta, e=2"                     | -           |              | -           | 0.00%   |
| 26    | Bordillo de H.S. (f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> - 0,14x0,40)              | -           |              | -           | 0.00%   |
| 27    | Aceras de H.S. f'c=180kg/cm <sup>2</sup> E=7cm escobillado             | -           |              | -           | 0.00%   |
| 28    | Marcas en pavimento  | -           |              | -           | 0.00%   |
| 29    | Marcas sobre salidas de pavimento (unidireccionales y bidireccionales) | -           |              | -           | 0.00%   |
| 30    | Pancarta informativa (letrero)-con estructura                          | 1.00        |              | 1.00        | 100.00% |
| 31    | Señales ecologicas (2,40x1,20)M  | -           |              | -           | 0.00%   |
| 32    | Señales informativas (2,40x1,20)M                                      | -           |              | -           | 0.00%   |
| 33    | Señales reglamentarias (0,75 x 0,75)M                                  | -           |              | -           | 0.00%   |
| 34    | Señales preventivas (0,75 x 0,75 )M                                    | -           |              | -           | 0.00%   |
| 35    | Señales informativas y reglamentarias (0,60mx0,60m) móviles            | 4.00        |              | 4.00        | 100.00% |
| 36    | Señales preventivas tipo barrera (1,22mx0,60m) móviles                 | 4.00        |              | 4.00        | 100.00% |
| 37    | Contenedores metálicos de 55 galones                                   | 4.00        |              | 4.00        | 100.00% |
| 38    | Kit anti-derrames  | 4.00        |              | 4.00        | 100.00% |
| 39    | Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)                      | 180.00      | 90.00        | 270.00      | 27.00%  |
| 40    | S/C Cono de seguridad con protección UV, 71cm Incl. cinta reflectiva   | 20.00       |              | 20.00       | 100.00% |
| 41    | Suministro de paleta de alto y siga                                    | 4.00        |              | 4.00        | 100.00% |
| 42    | Capacitación sobre preservación de recursos naturales (de 2 a 3 horas) | 1.00        |              | 1.00        | 100.00% |
| 43    | Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a 3 horas)      | 1.00        |              | 1.00        | 100.00% |
| 44    | Capacitación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3 horas)         | 1.00        |              | 1.00        | 100.00% |

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03

Oficina 072 785 269

keyszen.sas@gmail.com

www.keyszen.com

Machala – El oro - Ecuador

### Avance físico

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| AVANCE PROGRAMADO           | 1.68 %        |
| AVANCE EJECUTADO            | 2.00 %        |
| AVANCE CONTRATO CONTRACTUAL | 93,191.56 USD |

### Avance económico parcial y acumulado

| PLANILLAS                | VALORES          |            |                  |           |            | % PORCENTAJES     |      |                  |      |
|--------------------------|------------------|------------|------------------|-----------|------------|-------------------|------|------------------|------|
|                          | MONTO PROGRAMADO |            | MONTO PLANILLADO |           |            | AVANCE PROGRAMADO |      | AVANCE EJECUTADO |      |
|                          | MES              | ACUM       | ANTERIOR         | ACTUAL    | ACUM       | MES               | ACUM | MES              | ACUM |
| PLANILLA                 | 78,090.19        | 224,625.84 | 230,516.37       | 93,191.56 | 323,707.93 | 1.68              | 4.82 | 2.00             | 6.96 |
| OBRA CIVIL EXCEDENTE     |                  |            |                  |           |            |                   |      |                  |      |
| OBRA CIVIL RUBROS NUEVOS |                  |            |                  |           |            |                   |      |                  |      |
| TOTAL                    | 78,090.19        | 224,625.84 | 230,516.37       | 93,191.56 | 323,707.93 | 1.68              | 4.82 | 2.00             | 6.96 |

| DESCRIPCION  | No | PLANILLA           | VALOR               | PORCENTAJE    |
|--------------|----|--------------------|---------------------|---------------|
| CONTRATUAL   | 3  | 1 abril – 30 abril | \$ 93,196.56        | 2.00 %        |
| <b>TOTAL</b> |    |                    | <b>\$ 93,196.56</b> | <b>2.00 %</b> |

**Observación:** El contratista cumple con el cronograma valorado de trabajo según se anexa tabla comparativa del mes de abril.

## 7. OBRA EJECUTADA DURANTE EL PERÍODO Y ACUMULADA

| <b>PROYECTO:</b>                                  |           | ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA |              |           |                        |                         |               |
|---|-----------|--|--------------|-----------|------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>CONTRATISTA:</b>                               |           | CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  |              |           |                        |                         |               |
| <b>PLANILLA N°:</b>                               |           | 3  |              |           | <b>N° RUBRO:</b>       | 1                       |               |
| <b>PERIODO:</b>                                   |           | 01-Abr-23 - 30-Abr-23  |              |           | <b>UNIDAD:</b>         | Ha                      |               |
| <b>Desbroce, desbosque y limpieza</b>             |           |  |              |           |                        |                         |               |
| TRAMO   | ABSCISADO |  | LONGITUD (m) | ANCHO (m) | ÁREA (m <sup>2</sup> ) | CANTIDAD EJECUTADA (Ha) | OBSERVACIONES |
|   | DESDE     | HASTA  |              |           |                        |                         |               |
| 1   | 3+000.00  | 3+445.00   | 445.00       | 20.00     | 8,900.00               | 0.89                    | Jatunpaccha   |
| 2   | 0+000.00  | 0+340.00   | 340.00       | 20.00     | 6,800.00               | 0.68                    | Curaray       |
| <b>TOTAL</b>                                      |           |  |              |           |                        | <b>1.57</b>             |               |
| <b>PLANILLADO ANTERIORMENTE =</b>                 |           |  |              |           |                        | <b>6.00 Ha</b>          |               |
| <b>TOTAL CONTRATADO =</b>                         |           |  |              |           |                        | <b>29.18 Ha</b>         |               |
| <b>CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =</b> |           |  |              |           |                        | <b>1.57 Ha</b>          |               |
| <b>CANTIDAD PLANILLADA =</b>                      |           |  |              |           |                        | <b>7.57 Ha</b>          |               |
| <b>EXCEDENTES =</b>                               |           |  |              |           |                        | <b>- Ha</b>             |               |

| <b>PROYECTO:</b>                                 |           | ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA |              |               |                    |                 |
|--|-----------|--|--------------|---------------|--------------------|-----------------|
| <b>CONTRATISTA:</b>                              |           | CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  |              |               |                    |                 |
| <b>PLANILLA N°:</b>                              |           | 3  |              |               | <b>N° RUBRO:</b>   | 2               |
| <b>PERIODO:</b>                                  |           | 01-Abr-23 - 30-Abr-23  |              |               | <b>UNIDAD:</b>     | km              |
| <b>Replanteo y nivelación a nivel de asfalto</b> |           |  |              |               |                    |                 |
| TRAMO  | ABSCISADO |  | LONGITUD (m) | LONGITUD (Km) | CANTIDAD EJECUTADA | OBSERVACIONES   |
|  | DESDE     | HASTA  |              |               |                    |                 |
| 1  | 1+600.00  | 3+445.00   | 1,845.00     | 1.85          | 1.85               | Jatunpaccha     |
| 2  | 0+000.00  | 3+340.00   | 3,340.00     | 3.34          | 3.34               | Curaray         |
| <b>TOTAL</b>                                     |           |  |              |               |                    | <b>5.19</b>     |
| <b>PLANILLADO ANTERIORMENTE =</b>                |           |  |              |               |                    | <b>1.60 km</b>  |
| <b>TOTAL CONTRATADO =</b>                        |           |  |              |               |                    | <b>14.59 km</b> |
| <b>CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANIL</b>    |           |  |              |               |                    | <b>5.19 km</b>  |
| <b>CANTIDAD PLANILLADA =</b>                     |           |  |              |               |                    | <b>6.79 km</b>  |
| <b>EXCEDENTES =</b>                              |           |  |              |               |                    | <b>- km</b>     |

| <b>PROYECTO:</b>  |           | ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA |                                      |                                    |                                 |                |
|---|-----------|--|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| <b>CONTRATISTA:</b>   |           | CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  |                                      |                                    |                                 |                |
| <b>PLANILLA N°:</b>   |           | 3  |                                      |                                    | <b>N° RUBRO:</b>                | 4              |
| <b>PERIODO:</b>   |           | 01-Abr-23 - 30-Abr-23  |                                      |                                    | <b>UNIDAD:</b>                  | m <sup>3</sup> |
| <b>Excavación sin clasificar (mov. de tierra)</b>                   |           |  |                                      |                                    |                                 |                |
| <b>SECCIÓN TRANSVERSAL TIPO<br/>EXCAVACIÓN DE CAJERAS Y TALUDES</b> |           |  |                                      |                                    |                                 |                |
| TRAMO   | ABSCISADO |  | CANTIDAD EJECUTADA (m <sup>3</sup> ) | VOLUMEN EXCAVADO (m <sup>3</sup> ) | OBSERVACIONES                   |                |
|   | DESDE     | HASTA  |                                      |                                    |                                 |                |
| 1   | 3+000.00  | 3+445.00   | 1,660.31                             | 1,660.31                           | Ver anexo justificativo Rubro 4 |                |
| 2   | 0+000.00  | 0+340.00   | 72.90                                | 72.90                              | Ver anexo justificativo Rubro 4 |                |
| <b>TOTAL</b>  |           |  |                                      | <b>1733.21</b>                     |                                 |                |
| <b>PLANILLADO ANTERIORMENTE =</b>                                   |           |  |                                      | <b>7,336.80 m<sup>3</sup></b>      |                                 |                |
| <b>TOTAL CONTRATADO =</b>   |           |  |                                      | <b>68,863.54 m<sup>3</sup></b>     |                                 |                |
| <b>CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =</b>                   |           |  |                                      | <b>1,733.21 m<sup>3</sup></b>      |                                 |                |
| <b>CANTIDAD PLANILLADA =</b>  |           |  |                                      | <b>9,072.01 m<sup>3</sup></b>      |                                 |                |
| <b>EXCEDENTES =</b>   |           |  |                                      | <b>- m<sup>3</sup></b>             |                                 |                |

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03

Oficina 072 785 269

keyszen.sas@gmail.com

www.keyszen.com

Machala - El oro - Ecuador

| <b>PROYECTO:</b>                         | ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA |              |                |                     |                    |                   |                        |
|--|--|--------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| <b>CONTRATISTA:</b>                      | CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  |              |                |                     |                    |                   |                        |
| <b>PLANILLA N°:</b>                      | 3  |              |                | <b>N° RUBRO:</b>    | 4                  |                   |                        |
| <b>PERIODO:</b>                          | 01-Abr-23  | -            | 30-Abr-23      | <b>UNIDAD:</b>      | m³                 |                   |                        |
| Excavación sin clasificar(mov.de tierra) |  |              |                |                     |                    |                   |                        |
| Abs. 3+000 a la 3+445                    |  |              |                |                     |                    |                   |                        |
| VIA JATUNPACCHA                          |  |              |                |                     |                    |                   |                        |
| ABSCISAS                                 | LONGITUD (M)   | CAJERAS (M2) | ÁREA CORTE(M2) | AREA T. CORTE. (M2) | ÁREA PROMEDIO (M2) | VOLUMEN (M3)      | VOLUMEN ACUMULADO (M3) |
| 3+000.00                                 |  | 2.42         | 0.60           | 3.02                |                    |                   |                        |
|  | 20.00  |              |                |                     | 3.72               | 74.40             | 74.40                  |
| 3+020.00                                 |  | 2.75         | 1.66           | 4.414               |                    |                   |                        |
|  | 20.00  |              |                |                     | 3.51               | 70.20             | 144.60                 |
| 3+040.00                                 |  | 2.32         | 0.29           | 2.61                |                    |                   |                        |
|  | 20.00  |              |                |                     | 2.61               | 52.20             | 196.80                 |
| 3+440.00                                 |  | 1.39         | 0.61           | 2                   |                    |                   |                        |
|  | 5.00   |              |                |                     | 1.49               | 7.45              | 1,587.41               |
| 3+445.00                                 |  | 0.97         | 0.01           | 0.88                |                    |                   |                        |
| Abs. 0+000 a la 0+340                    |  |              |                |                     |                    |                   |                        |
| VIA ANTIGUA CURARAY                      |  |              |                |                     |                    |                   |                        |
| ABSCISAS                                 | LONGITUD (M)   | CAJERA       |                | AREA T. CORTE. (M2) | VOLUMEN (M3)       | VOLUMEN ACUMULADO |                        |
|  |  | ALTO(M)      | ANCHO (M)      |                     |                    |                   |                        |
| 0+120.00                                 | 9  | 3.40         | 1.50           | 5.10                | 45.90              | 45.90             |                        |
| 0+180.00                                 | 9  | 1.50         | 1.50           | 3.00                | 27.00              | 72.90             |                        |
| <b>SUB TOTAL EJECUTADO (M3)</b>          |  |              |                |                     |                    | <b>1,660.31</b>   |                        |

| <b>PROYECTO:</b>   | ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA |          |                         |   |    |  |  |
|--|--|----------|-------------------------|---|----|--|--|
| <b>CONTRATISTA:</b>  | CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  |          |                         |   |    |  |  |
| <b>PLANILLA N°:</b>  | 3  |          |                         | <b>N° RUBRO:</b>  | 17 |  |  |
| <b>PERIODO:</b>  | 01-Abr-23  | -        | 30-Abr-23               | <b>UNIDAD:</b>  | m³ |  |  |
| Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada) |  |          |                         |   |    |  |  |
| <b>SECCIÓN TRANSVERSAL TIPO</b>                            |  |          |                         |   |    |  |  |
| <b>MEJORAMIENTO DE CAJERAS Y TERRAPLEN</b>                 |  |          |                         |   |    |  |  |
| TRAMO  | ABSCISADO  |          | CANTIDAD EJECUTADA (m3) | OBSERVACIONES   |    |  |  |
|  | DESDE  | HASTA    |                         |   |    |  |  |
| 1  | 3+000.00   | 3+445.00 | 1,938.62                | Ver anexo justificativo Rubro 17 (Estructura de vía)                |    |  |  |
| 2  | 0+000.00   | 0+340.00 | 2,012.60                | Ver anexo justificativo Rubro 17 (Estructura de vía)                |    |  |  |
| 3  | 0+000.00   | 0+340.00 | 72.90                   | Ver anexo justificativo Rubro 17 mejoramiento localizado para Dren. |    |  |  |
| <b>TOTAL</b>   |  |          | <b>4,024.12</b>         |   |    |  |  |
| PLANILLADO ANTERIORMENTE =                                 |  |          |                         | 14,490.40 m³  |    |  |  |
| TOTAL CONTRATADO =   |  |          |                         | 68,863.54 m³  |    |  |  |
| CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =                 |  |          |                         | 4,024.12 m³   |    |  |  |
| CANTIDAD PLANILLADA =                                      |  |          |                         | 18,614.52 m³  |    |  |  |
| EXCEDENTES =   |  |          |                         | - m³  |    |  |  |

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
 Oficina 072 785 269  
 keyszen.sas@gmail.com  
 www.keyszen.com  
 Machala – El oro - Ecuador

|   |  |                     |                          |                            |                      |                          |                               |
|---|--|---------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b>  | ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA |                     |                          |                            |                      |                          |                               |
| <b>CONTRATISTA:</b>   | CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  |                     |                          |                            |                      |                          |                               |
| <b>PLANILLA No.</b>   | 3  |                     |                          |                            |                      | <b>N° RUBRO:</b>         | 17                            |
| <b>PERIODO:</b>   | 01-Abr-23  |                     | -                        |                            | 30-Abr-23            |                          | <b>UNIDAD:</b> m³             |
| <b>Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)</b> |  |                     |                          |                            |                      |                          |                               |
| <b>VIA JATUNPACCHA</b>  |  |                     |                          |                            |                      |                          |                               |
| <b>Abs. 3+000 a la 3+445</b>                                      |  |                     |                          |                            |                      |                          |                               |
| <b>ABSCISAS</b>   | <b>LONGITUD (M)</b>  | <b>CAJERAS (M2)</b> | <b>ÁREA RELLENO (M2)</b> | <b>AREA T. (M2)</b>        | <b>ÁREA PROMEDIO</b> | <b>VOLUMEN (M3)</b>      | <b>VOLUMEN ACUMULADO (M3)</b> |
| 3+000.00  |  | 2.42                | 0                        | 2.42                       |                      |                          |                               |
|   | 20.00  |                     |                          |                            | 2.59                 | 51.80                    | 51.80                         |
| 3+020.00  |  | 2.75                | 0                        | 2.754                      |                      |                          |                               |
|   | 20.00  |                     |                          |                            | 3.02                 | 60.40                    | 112.20                        |
| 3+040.00  |  | 2.32                | 0.97                     | 3.29                       |                      |                          |                               |
|   | 20.00  |                     |                          |                            | 21.00                | 420.00                   | 532.20                        |
| 3+440.00  |  | 1.39                | 0.53                     | 1.92                       |                      |                          |                               |
|   | 5.00   |                     |                          |                            | 2.14                 | 10.70                    | 1,938.62                      |
| 3+445.00  |  | 0.97                | 1.39                     | 2.36                       |                      |                          |                               |
| <b>SUB TOTAL1 EJECUTADO (M3)</b>                                  |  |                     |                          |                            |                      |                          | <b>1,938.62</b>               |
| <b>Abs. 0+000 a la 0+340</b>                                      |  |                     |                          |                            |                      |                          |                               |
| <b>VIA ANTIGUA CURARAY</b>  |  |                     |                          |                            |                      |                          |                               |
| 0+000.00  |  |                     | 4.86                     | 4.86                       |                      |                          |                               |
|   | 20.00  |                     |                          |                            | 5.33                 | 106.60                   | 106.60                        |
| 0+020.00  |  |                     | 5.79                     | 5.79                       |                      |                          |                               |
|   | 20.00  |                     |                          |                            | 5.63                 | 112.60                   | 219.20                        |
| 0+300.00  |  |                     | 6.62                     | 6.62                       |                      |                          |                               |
|   | 20.00  |                     |                          |                            | 7.17                 | 143.40                   | 1,865.20                      |
| 0+320.00  |  |                     | 7.71                     | 7.71                       |                      |                          |                               |
|   | 20.00  |                     |                          |                            | 7.37                 | 147.40                   | 2,012.60                      |
| 0+340.00  |  |                     | 7.03                     | 7.03                       |                      |                          |                               |
| <b>SUB TOTAL2 EJECUTADO (M3)</b>                                  |  |                     |                          |                            |                      |                          | <b>2,012.60</b>               |
| <b>VIA ANTIGUA CURARAY (MEJORAMIENTO LOCALIZADO PARA DRENAJE)</b> |  |                     |                          |                            |                      |                          |                               |
| <b>ABSCISAS</b>   | <b>LONGITUD (M)</b>  | <b>CAJERA</b>       |                          | <b>AREA T. CORTE. (M2)</b> | <b>VOLUMEN (M3)</b>  | <b>VOLUMEN ACUMULADO</b> |                               |
|   |  | <b>ALTO (M)</b>     | <b>ANCHO (M)</b>         |                            |                      |                          |                               |
| 0+120.00  | 9  | 3.40                | 1.50                     | 5.10                       | 45.90                | 45.90                    |                               |
| 0+180.00  | 9  | 1.50                | 1.50                     | 3.00                       | 27.00                | 72.90                    |                               |
| <b>SUB TOTAL 3 EJECUTADO (M3)</b>                                 |  |                     |                          |                            |                      |                          | <b>72.90</b>                  |

|   |  |                          |                    |                    |                      |                  |                           |                      |                  |                      |           |             |
|---|--|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------|-------------|
| <b>PROYECTO:</b>                                  | ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA |                          |                    |                    |                      |                  |                           |                      |                  |                      |           |             |
| <b>CONTRATISTA:</b>                               | CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  |                          |                    |                    |                      |                  |                           |                      |                  |                      |           |             |
| <b>PLANILLA N°:</b>                               | 3  |                          |                    |                    |                      | <b>N° RUBRO:</b> | 18                        |                      |                  |                      |           |             |
| <b>PERIODO:</b>                                   | 01-Abr-23  |                          | -                  |                    | 30-Abr-23            |                  | <b>UNIDAD:</b> m³         |                      |                  |                      |           |             |
| <b>Material de subbase clase 3</b>                |  |                          |                    |                    |                      |                  |                           |                      |                  |                      |           |             |
| <b>ABSCISADO</b>                                  |  | <b>ANCHO DE SUB-BASE</b> | <b>ANCHO TOTAL</b> | <b>ESPESOR (m)</b> | <b>CANTIDAD (m³)</b> | <b>PERALTE</b>   | <b>ALTURA PERALTE (m)</b> | <b>CANTIDAD (m³)</b> | <b>EJECUTADA</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |           |             |
| <b>DESDE</b>                                      | <b>HASTA</b>   | <b>LONGITUD (m)</b>      | <b>IZQUIERDA</b>   | <b>DERECHA</b>     | <b>SUB-BASE</b>      |                  |                           |                      |                  |                      |           |             |
| 2+080.00  | 2+080.00   | 20.00                    | 3.60               | 3.90               | 7.50                 | 0.15             | 22.5                      | x                    | 0.25             | 0.4875               | 22.99     | SOBRE ANCHO |
| 2+080.00  | 2+100.00   | 20.00                    | 3.60               | 3.90               | 7.50                 | 0.15             | 22.5                      | x                    | 0.25             | 0.4875               | 22.99     | SOBRE ANCHO |
| 2+100.00  | 2+120.00   | 20.00                    | 3.60               | 3.90               | 7.50                 | 0.15             | 22.5                      | x                    | 0.25             | 0.4875               | 22.99     | SOBRE ANCHO |
| 2+120.00  | 2+140.00   | 20.00                    | 3.60               | 3.90               | 7.50                 | 0.15             | 22.5                      | x                    | 0.25             | 0.4875               | 22.99     | SOBRE ANCHO |
| 2+140.00  | 2+160.00   | 20.00                    | 3.60               | 3.90               | 7.50                 | 0.15             | 22.5                      | x                    | 0.25             | 0.4875               | 22.99     | SOBRE ANCHO |
| 3+440.00  | 3+445.00   | 5.00                     | 3.60               | 3.6                | 7.20                 | 0.15             | 5.4                       | x                    | 0.16             | 0.288                | 5.69      |             |
| <b>TOTAL</b>                                      |  |                          |                    |                    |                      |                  |                           |                      |                  | <b>1,580.98</b>      |           |             |
| <b>PLANILLADO ANTERIORMENTE =</b>                 |  |                          |                    |                    |                      |                  |                           |                      |                  |                      | m³        |             |
| <b>TOTAL CONTRATADO =</b>                         |  |                          |                    |                    |                      |                  |                           |                      |                  |                      | 13,033.28 | m³          |
| <b>CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =</b> |  |                          |                    |                    |                      |                  |                           |                      |                  |                      | 1,580.98  | m³          |
| <b>CANTIDAD PLANILLADA =</b>                      |  |                          |                    |                    |                      |                  |                           |                      |                  |                      | 1,580.98  | m³          |
| <b>EXCEDENTES =</b>                               |  |                          |                    |                    |                      |                  |                           |                      |                  |                      | -         | m³          |

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
 Oficina 072 785 269  
 keyszen.sas@gmail.com  
 www.keyszen.com  
 Machala – El oro - Ecuador

| PROYECTO:                                  | ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA |              |           |               |      |             |             |                 |         |                    |      |               |                    |               |
|--|--|--------------|-----------|---------------|------|-------------|-------------|-----------------|---------|--------------------|------|---------------|--------------------|---------------|
| CONTRATISTA:                               | CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  |              |           |               |      |             |             |                 |         |                    |      |               |                    |               |
| PLANILLA N°:                               | 3  |              |           |               |      |             | N° RUBRO:   |                 |         |                    |      |               | 18                 |               |
| PERIODO:                                   | 01-Abr-23 - 30-Abr-23  |              |           |               |      |             | UNIDAD:     |                 |         |                    |      |               | m³                 |               |
| Material de base granular de agregados     |  |              |           |               |      |             |             |                 |         |                    |      |               |                    |               |
| DESDE                                      | HASTA  | ABSCISADO    |           | ANCHO DE BASE |      | ANCHO TOTAL | ESPESOR (m) | CANTIDAD (a) m³ | PERALTE | ALTURA PERALTE (m) |      | CANTIDAD (b)  | EJECUTADA m³ (a+b) | OBSERVACIONES |
|  |  | LONGITUD (m) | IZQUIERDA | DERECHA       | BASE |             |             |                 |         |                    |      |               |                    |               |
| 2+080.00                                   | 2+090.00   | 20.00        | 3.2       | 3.5           | 6.70 | 0.1         | 13.4        | x               | 0.25    | 0.40               | 0.40 | 13.80         |                    |               |
| 2+090.00                                   | 2+100.00   | 20.00        | 3.2       | 3.5           | 6.70 | 0.1         | 13.4        | x               | 0.25    | 0.40               | 0.40 | 13.80         |                    |               |
| 2+100.00                                   | 2+120.00   | 20.00        | 3.2       | 3.5           | 6.70 | 0.1         | 13.4        | x               | 0.25    | 0.40               | 0.40 | 13.80         |                    |               |
| 2+120.00                                   | 2+140.00   | 20.00        | 3.2       | 3.5           | 6.70 | 0.1         | 13.4        | x               | 0.25    | 0.40               | 0.40 | 13.80         |                    |               |
| 3+420.00                                   | 3+440.00   | 20.00        | 3.2       | 3.2           | 6.40 | 0.1         | 12.8        |                 |         |                    | 0.00 | 12.80         |                    |               |
| 3+440.00                                   | 3+445.00   | 5.00         | 3.2       | 3.2           | 6.40 | 0.1         | 3.2         | x               | 0.16    | 0.28               | 0.28 | 3.48          |                    |               |
| <b>TOTAL</b>                               |  |              |           |               |      |             |             |                 |         |                    |      | <b>947.18</b> |                    |               |
| PLANILLADO ANTERIORMENTE =                 |  |              |           |               |      |             |             |                 |         |                    |      | 1.125.00 m³   |                    |               |
| TOTAL CONTRATADO =                         |  |              |           |               |      |             |             |                 |         |                    |      | 21.016.98 m³  |                    |               |
| CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA = |  |              |           |               |      |             |             |                 |         |                    |      | 947.18 m³     |                    |               |
| CANTIDAD PLANILLADA =                      |  |              |           |               |      |             |             |                 |         |                    |      | 2.072.18 m³   |                    |               |
| EXCEDENTES =                               |  |              |           |               |      |             |             |                 |         |                    |      | - m³          |                    |               |

| PROYECTO:                                     | ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA |          |                           |                                     |                                      |                      |                  |   |  |  |  |                      |         |
|---|--|----------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|---|--|--|--|----------------------|---------|
| CONTRATISTA:                                  | CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  |          |                           |                                     |                                      |                      |                  |   |  |  |  |                      |         |
| PLANILLA N°:                                  | 3  |          |                           |                                     |                                      |                      | N° RUBRO:        |   |  |  |  |                      | 21      |
| PERIODO:                                      | 01-Abr-23 - 30-Abr-23  |          |                           |                                     |                                      |                      | UNIDAD:          |   |  |  |  |                      | m³ - km |
| Transporte de material pétreo de mejoramiento |  |          |                           |                                     |                                      |                      |                  |   |  |  |  |                      |         |
| TRAMO   | ABSCISADO  |          | CANTIDAD EJECUTADA A (m³) | DISTANCIA MINA INICIO PROYECTO (Km) | CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO (Km) | DISTANCIA TOTAL (Km) | TOTAL (m³ - Km)  | OBSERVACIONES                                       |  |  |  |                      |         |
|   | DESDE  | HASTA    |                           |                                     |                                      |                      |                  |   |  |  |  |                      |         |
| 1   | 3+000.00   | 3+445.00 | 1,938.82                  | 31.33                               | 1.65                                 | 32.98                | 63,935.69        | Cantidades detalladas en Anexo 17 - Vía Jatunpaccha |  |  |  |                      |         |
| 2   | 0+000.00   | 0+340.00 | 2,012.60                  | 26.98                               | 6.00                                 | 32.98                | 66,375.55        | Cantidades detalladas en Anexo 17 - Vía Curaray     |  |  |  |                      |         |
| <b>SUB TOTAL</b>                              |  |          |                           |                                     |                                      |                      | <b>63,935.69</b> |   |  |  |  |                      |         |
| PLANILLADO ANTERIORMENTE =                    |  |          |                           |                                     |                                      |                      |                  |   |  |  |  | 477,893.40 m³ - km   |         |
| TOTAL CONTRATADO =                            |  |          |                           |                                     |                                      |                      |                  |   |  |  |  | 3,309,493.83 m³ - km |         |
| CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =    |  |          |                           |                                     |                                      |                      |                  |   |  |  |  | 63,935.69 m³ - km    |         |
| CANTIDAD PLANILLADA =                         |  |          |                           |                                     |                                      |                      |                  |   |  |  |  | 541,829.09 m³ - km   |         |
| EXCEDENTES =                                  |  |          |                           |                                     |                                      |                      |                  |   |  |  |  | - m³ - km            |         |

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
 Oficina 072 785 269  
 keyszen.sas@gmail.com  
 www.keyszen.com  
 Machala – El oro - Ecuador

| <b>PROYECTO:</b>                                  | ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA |          |                         |                                     |                                      |                      |                 |   |
|---|--|----------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|---|
| <b>CONTRATISTA:</b>                               | CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  |          |                         |                                     |                                      |                      |                 |   |
| <b>PLANILLA N°:</b>                               | 3  |          |                         | <b>N° RUBRO:</b>                    |                                      | 22                   |                 |   |
| <b>PERIODO:</b>                                   | 01-Abr-23  |          | 30-Abr-23               |                                     | <b>UNIDAD:</b>                       |                      | m³ - km         |   |
| Transporte de material pétreo de subbase clase 3  |  |          |                         |                                     |                                      |                      |                 |   |
| TRAMO   | ABSCISADO  |          | CANTIDAD EJECUTADA (m³) | DISTANCIA MINA INICIO PROYECTO (Km) | CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO (Km) | DISTANCIA TOTAL (Km) | TOTAL (m³ - Km) | OBSERVACIONES                                     |
|   | DESDE  | HASTA    |                         |                                     |                                      |                      |                 |   |
| 1   | 2+060.00   | 3+445.00 | 1,580.98                | 31.33                               | 1.65                                 | 32.98                | 52,140.56       | Cantidades detalladas en Anexo 18-via Jatunpaccha |
| <b>SUB TOTAL</b>                                  |  |          |                         |                                     |                                      |                      | 52,140.56       |   |
| <b>PLANILLADO ANTERIORMENTE =</b>                 |  |          |                         |                                     |                                      |                      | 37,102.60       | m³ - km   |
| <b>TOTAL CONTRATADO =</b>                         |  |          |                         |                                     |                                      |                      | 781,104.32      | m³ - km   |
| <b>CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =</b> |  |          |                         |                                     |                                      |                      | 82,140.56       | m³ - km   |
| <b>CANTIDAD PLANILLADA</b>                        |  |          |                         |                                     |                                      |                      | 89,243.08       | m³ - km   |
| <b>EXCEDENTES =</b>                               |  |          |                         |                                     |                                      |                      | -               | m³ - km   |

| <b>PROYECTO:</b>  | ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA |          |                         |                                     |                                      |                      |                 |  |
|---|--|----------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|--|
| <b>CONTRATISTA:</b>   | CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  |          |                         |                                     |                                      |                      |                 |  |
| <b>PLANILLA N°:</b>   | 3  |          |                         | <b>N° RUBRO:</b>                    |                                      | 23                   |                 |  |
| <b>PERIODO:</b>   | 01-Abr-23  |          | 30-Abr-23               |                                     | <b>UNIDAD:</b>                       |                      | m³ - km         |  |
| Transporte de material pétreo de base granular de agregados |  |          |                         |                                     |                                      |                      |                 |  |
| TRAMO   | ABSCISADO  |          | CANTIDAD EJECUTADA (m³) | DISTANCIA MINA INICIO PROYECTO (Km) | CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO (Km) | DISTANCIA TOTAL (Km) | TOTAL (m³ - Km) | OBSERVACIONES                                      |
|   | DESDE  | HASTA    |                         |                                     |                                      |                      |                 |  |
| 1   | 2+060.00   | 3+445.00 | 947.16                  | 31.33                               | 1.65                                 | 32.98                | 31,237.45       | Cantidades detalladas en Anexo 18-Via Jatun Paccha |
| <b>SUB TOTAL</b>  |  |          |                         |                                     |                                      |                      | 31,237.45       |  |
| <b>PLANILLADO ANTERIORMENTE =</b>                           |  |          |                         |                                     |                                      |                      |                 | m³ - km  |
| <b>TOTAL CONTRATADO =</b>                                   |  |          |                         |                                     |                                      |                      | 484,490.39      | m³ - km  |
| <b>CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =</b>           |  |          |                         |                                     |                                      |                      | 31,237.46       | m³ - km  |
| <b>CANTIDAD PLANILLADA</b>                                  |  |          |                         |                                     |                                      |                      | 31,237.46       | m³ - km  |
| <b>EXCEDENTES =</b>   |  |          |                         |                                     |                                      |                      | -               | m³ - km  |

|   |  |  |           |                  |                |               |          |   |
|---|--|--|-----------|------------------|----------------|---------------|----------|---|
| <b>PROYECTO:</b>                                  | ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO - CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA |  |           |                  |                |               |          |   |
| <b>CONTRATISTA:</b>                               | CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  |  |           |                  |                |               |          |   |
| <b>PLANILLA N°:</b>                               | 3  |  |           | <b>N° RUBRO:</b> |                | 39            |          |   |
| <b>PERIODO:</b>                                   | 01-Abr-23  |  | 30-Abr-23 |                  | <b>UNIDAD:</b> |               | m        |   |
| Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno) |  |  |           |                  |                |               |          |   |
| DESCRIPCIÓN                                       |  |  |           |                  | UNIDAD         | OBSERVACIONES |          |   |
| Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno) |  |  |           |                  | 90.00          |               |          |   |
| <b>TOTAL</b>                                      |  |  |           |                  | <b>90.00</b>   |               |          |   |
| <b>PLANILLADO ANTERIORMENTE =</b>                 |  |  |           |                  |                |               | 180.00   | m |
| <b>TOTAL CONTRATADO =</b>                         |  |  |           |                  |                |               | 1,000.00 | m |
| <b>CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA =</b> |  |  |           |                  |                |               | 90.00    | m |
| <b>CANTIDAD PLANILLADA</b>                        |  |  |           |                  |                |               | 270.00   | m |
| <b>EXCEDENTES =</b>                               |  |  |           |                  |                |               | -        | m |

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
 Oficina 072 785 269  
 keyszen.sas@gmail.com  
 www.keyszen.com  
 Machala – El oro - Ecuador

## **8. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN**

- Se ha revisado la ejecución de los trabajos de acuerdo a las especificaciones técnicas, y a las actividades presupuestadas y al cronograma de trabajos para la construcción del proyecto.
- Se ha ejercido la supervisión continua de los equipos y materiales en el proyecto.
- Se atendió oportunamente las consultas y requerimientos del Contratista.
- Se ha controlado el avance de todos los trabajos realizados.
- Se ha vigilado el cumplimiento de todas las Normas y Reglamentos de Seguridad Industrial y Ambiental de acuerdo a las especificaciones contractuales.
- Se han aprobado los procedimientos de trabajo empleados por el Contratista.
- Se ha exigido al Contratista el cumplimiento de la Leyes Laborales y reglamentos de Seguridad Industrial, Ambiental, etc.
- Se ha verificado que el Personal Técnico y el equipo del Constructor sea idóneo y suficiente para la obra.
- Oportunamente se han dado soluciones técnicas a los problemas surgidos durante la ejecución de la obra.
- Se ha vigilado periódicamente el cumplimiento del contrato de construcción, para que el proyecto se ejecute de acuerdo a especificaciones técnicas y programas de trabajos.

## **9. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS ADOPTADAS PARA CUMPLIR LOS PLAZOS ESTABLECIDOS**

La fiscalización a organizado los controles de supervisión de campo, control de calidad de materiales y topografía, en acción permanente en los frentes de trabajo de la obra.

En oficina se dispone del personal técnico para el procesamiento de información y documentos en atención a todas las áreas de control técnico, financieros, actas de trabajo, programación de actividades, administrativo y contractual.

El grupo de profesionales mantiene como objetivo principal y base del cumplimiento de sus funciones, el aseguramiento permanente de calidad y los productos para la satisfacción del GAD Provincial de Pastaza y los usuarios beneficiarios del proyecto.

## 10. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se reporta la evidencia de charlas de seguridad, higiene y salud en el trabajo, previo al inicio de la jornada laboral, documentadas estas charlas con evidencia fotográfica. La misma que brinda información clara y precisa al personal sobre la seguridad en un ambiente laboral, para lo cual se realiza el análisis de la situación actual de la empresa y se identifica cuáles son los riesgos existentes en cada uno de los puestos de trabajo, que sirva de fundamento para el trabajo diario, y de esta manera establecer procedimientos de prevención y protección de riesgos de trabajo.

Para minimizar los riesgos de trabajo, la fiscalización vigila que se tomen todas las medidas de seguridad, verificando que se ejecuten las obras de protección estipuladas, ya que no se permite ubicar fuera del sitio de trabajo, equipos, herramientas o materiales que interfieran con el tráfico, a fin de minimizar las molestias al público.

## 11. GESTIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DURANTE EL PERÍODO

Control del trabajo realizado por la maquinaria, verificando el buen estado de las misma y su óptimo rendimiento.

Verificación de Abscisas con sus respectivas áreas y volúmenes de movimientos de tierra.

Revisión y aprobación de la Planilla de Avance de Obra No. 3

El contratista deberá realizar los trabajos necesarios para la protección ambiental de la obra, así como cumplir con todos los parámetros de seguridad industrial para sus trabajadores y cumplir con las obligaciones laborales.

## 12. RESUMEN DE MONTOS EJECUTADOS PLANILLAS CONTRACTUALES

| PLANILLA.                 | MES.                     | MONTO DE OBRA. PROGRAMADO | PORCENTAJE DE OBRA. PROGRAMADO | MONTO DE OBRA. EJECUTADO | PORCENTAJE DE OBRA. EJECUTADO |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Planilla de Avance No. 03 | 1 abril – 30 abril/ 2023 | 78,090.19                 | 1.68 %                         | 93,191.56                | 2.00 %                        |
|                           | TOTAL                    | 78,090.19                 | 1.68 %                         | 93,191.56                | 2.00 %                        |

## 13. RESUMEN A LA FECHA DEL PROYECTO

| DESCRIPCIÓN        | MONTO        | PORCENTAJE | OBSERVACIONES                    |
|--------------------|--------------|------------|----------------------------------|
| MONTO DEL CONTRATO | 4'650,521.23 | 100 %      | Los trabajos se están realizando |

|                         |            |        |                         |
|-------------------------|------------|--------|-------------------------|
| PLANILLAS CONTRACTUALES | 323,707.93 | 6.96 % | conforme al cronograma. |
| MONTO DE INCREMENTOS    |            |        |                         |
| MONTO DE DECREMENTOS    |            |        |                         |
| CONTRATO COMPLEMENTARIO |            |        |                         |
| COSTO + PORCENTAJE      |            |        |                         |

#### 14. ACCIONES EFECTUADAS POR LA FISCALIZACIÓN

Las actividades y acciones efectuadas por el equipo de Fiscalización del Proyecto están determinadas por el contrato de Consultoría y por los términos de referencia. Son actividades que se realizan en forma permanente y rutinaria y están enfocadas básicamente a: control de calidad de los materiales y de la ejecución de los rubros que se incorporan al proyecto; estado y número de maquinaria disponible en la ejecución de los trabajos; número y desempeño del personal del contratista; solución de los problemas que afecten a la obra y tramite de los aspectos administrativos vinculados al proyecto.

#### 15. UTILIZACIÓN DE RECURSOS, DE EQUIPOS Y DE MANO DE OBRA

##### VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL DEL CONTRATISTA

| PERSONAL OFERTADO    | PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA | CHECK LIST |
|----------------------|------------------------------|------------|
| SUPERINTENDENTE      | SUPERINTENDENTE              | OK         |
| RESIDENTE            | RESIDENTE                    | OK         |
| INGENIERO AMBIENTAL  | INGENIERO AMBIENTAL          | OK         |
| TÉCNICO EN SEGURIDAD | TÉCNICO EN SEGURIDAD         | OK         |
| ING. AYUDANTE        | ING. AYUDANTE                | OK         |
| TOPOGRAFO            | TOPOGRAFO                    | OK         |
| CADENERO             | CADENERO                     | OK         |
| OPERADORES           | OPERADORES                   | OK         |
| CHOFERES             | CHOFERES                     | OK         |
| MECANICO             | MECANICO                     | OK         |
| AYUDANTE DE MECÁNICO | AYUDANTE DE MECÁNICO         | OK         |
| INSPECTORES          | INSPECTORES                  | OK         |
| ALBAÑILES            | ALBAÑILES                    | OK         |
| SOLDADORES           | SOLDADORES                   | OK         |
| JORNALEROS           | JORNALEROS                   | OK         |

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03

Oficina 072 785 269

keyszen.sas@gmail.com

www.keyszen.com

Machala – El oro - Ecuador

## VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA DEL CONTRATISTA

| EQUIPO Y MAQUINARIA OFERTADO | EQUIPO Y MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA | CHECK LIST |
|------------------------------|--------------------------------------|------------|
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS              | OK         |
| MOTONIVELADORA               | MOTONIVELADORA                       | OK         |
| CAMIÓN CISTERNA              | CAMIÓN CISTERNA                      | OK         |
| VOLQUETES                    | VOLQUETES                            | OK         |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO              | OK         |
| PLANTA DE ASFALTO            | PLANTA DE ASFALTO                    | OK         |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | TERMINADORA DE ASFALTO               | OK         |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR          | OK         |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | RODILLO VIBRATORIO LISO              | OK         |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO         | OK         |
| CONCRETERA 1 SACO            | CONCRETERA 1 SACO                    | OK         |
| MINICARGADORA                | MINICARGADORA                        | OK         |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | APARATOS DE TOPOGRAFÍA               | OK         |

## PERSONAL PROPUESTO POR EL FISCALIZADOR

| No | FUNCIÓN                   | CANTIDAD | NOMBRE                              | COMPROMISO |
|----|---------------------------|----------|-------------------------------------|------------|
| 1  | DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN | 1        | DANNY DANIEL DURAN CABRERA          | 100 %      |
| 2  | RESIDENTE                 | 1        | RICARDO WELLINGTON CARPIO JARAMILLO | 100 %      |
| 3  | INGENIERO AMBIENTAL       | 1        | JESSICA GISSELLA GOROZABEL ROSILLO  | 50 %       |
| 4  | CONTADOR GENERAL          | 1        | AVEIGA FAUBLA MARITZA MARIA         | 100 %      |
| 5  | CHOFER: OTROS CAMIONES    | 1        | MAXI VALLE ERWIN JOSUE              | 100 %      |
| 6  | GERENTE / AFINES          | 1        | JARAMILLO ARMIJOS JESSICA MARIELA   | 100 %      |

## EQUIPO E INSTRUMENTOS PROPUESTO POR EL FISCALIZADOR

| No | FUNCIÓN          | CANTIDAD | CARACTERÍSTICAS  | PLACA / FACTURA / MATRÍCULA |
|----|------------------|----------|--|-----------------------------|
| 1  | CAMIONETA JAC T8 | 1        | MODELO:<br>FC1037D3KST LUXURY<br>T8 AC 2.0 CD 4X4 TM<br>DIESEL | OBC2109                     |
| 2  | LAPTO HP         | 1        | CORE I7 MODELO<br>CS3073                                       | 001-100-000003578           |

### - INCIDENCIAS PRODUCIDAS EN LA OBRA

No se ha producido en este periodo ningún incidente grave.

### - CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES

Uno de los principales objetivos de la Fiscalización es el control de la calidad de los materiales que intervienen en los diferentes rubros, así como el cumplimiento de las especificaciones para la ejecución de los rubros.

### - OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS

| OFICIO NRO.                 | FECHA               | ASUNTO  |
|-----------------------------|---------------------|---|
| OFICIO: 121<br>CABA/GADPPz  | 05 de mayo del 2023 | Oficio de presentación de Planilla de avance de obra No. 03 |
| OFICIO: KEYSOFICIO-029-2023 | 10 de mayo del 2023 | Oficio de devolución de Planilla de avance de obra No. 03   |
| OFICIO: 123<br>CABA/GADPPz  | 15 de mayo del 2023 | Oficio de presentación de Planilla de avance de obra No. 03 |
| OFICIO: KEYSOFICIO-031-2023 | 18 de mayo del 2023 | Oficio de entrega de Planilla de avance de obra No. 03      |

## 16. CONTROL DE COSTOS

Con base en el programa de inversiones propuesto, se presenta la inversión ejecutada en el mes y la total acumulada.

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| INVERSIÓN PROGRAMADA  | 78,090.18676 |
| AVANCE PROGRAMADO (%) | 1.68         |
| INVERSIÓN EJECUTADA   | 93,191.56    |
| AVANCE EJECUTADO (%)  | 2.00         |

### Control de avance económico

| DESCRIPCIÓN | CRONOGRAMA VALORADO | PROGRAMADO EN EL PERÍODO | EJECUTADO EN EL PERÍODO | ACUMULADO EJECUTADO | ÍNDICES DE DESEMPEÑO |
|-------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
|             |                     |                          |                         |                     | SPI= EV/PV           |
| VALOR       | 224,625.84          | 78,090.19                | 93,191.56               | 323,707.93          | 1.44                 |
| PORCENTAJE  | 4.82                | 1.68                     | 2.00                    | 6.96                |                      |

Nota: SPI es un índice de desempeño del cronograma que tiene la siguiente interpretación:

SPI > 1 se tiene un adelanto respecto a la línea base del proyecto.

SPI < 1 se tiene retrasos respecto a la línea base del proyecto.

SPI = 1 se tiene un avance igual al programado en la línea base del proyecto.

DIAGRAMA DE INVERSIÓN PROGRAMADO VS EJECUTADO



Ilustración 5 Diagrama de inversión programado vs ejecutado

DIAGRAMA DE AVANCE PROGRAMADO VS  
EJECUTADO

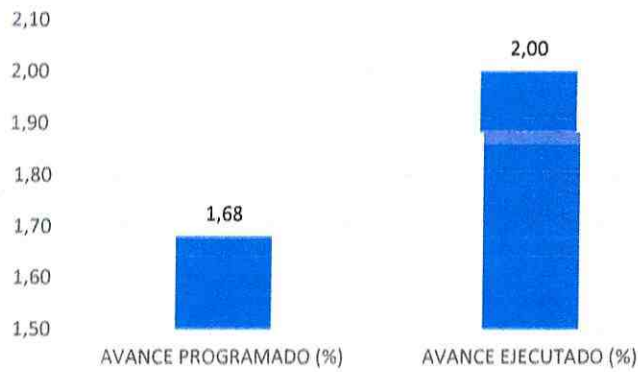


Ilustración 6 Diagrama de avance programado vs ejecutado

**17. INFORME DETALLADO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS**

| ITEM | MEDIDA   | Medio de verificación  | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES  |
|------|--|--|--------|-----------|-----------|--|
| 1    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementar señalética</li> <li>Señalética de prohibición</li> <li>Señalética de condición obligatoria</li> <li>Señalética condición Segura</li> <li>Señalética preventiva</li> <li>Señalética Ambiental</li> <li>Señalética informativa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Registro Fotográfico</li> </ul> |        |           | X         | En el frente de trabajo existe señalética. La colocación e implementación de la señalética informativa, preventiva y reglamentaria se establece para la etapa final del proyecto tal como lo señala el cronograma de ejecución de obra. <b>ANEXO 7</b> |
| 2    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Humedecer la vía en los días soleados para evitar material particulado, optimizando el recurso agua.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Registro Fotográfico</li> </ul> |        |           | X         | Dentro del periodo 01 al 30 de abril no fue necesario, por condiciones climáticas  |
| 3    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zonificar las áreas de trabajo con cinta de peligro.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Registro Fotográfico</li> </ul> | X      |           |           | Los diferentes frentes de trabajo han sido zonificados por cinta de peligro, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los peatones y tránsito vehicular. <b>REGISTRO FOTOGRAFICO IAC AMAZONAS BUILDING</b>                                      |
| 4    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cubrir con una lona las volquetas que trasladen material pétreo hacia el lugar de la obra.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Registro Fotográfico</li> </ul> | X      |           |           | Las volquetas que operan en el proyecto son cubiertas de lonas para evitar la dispersión del material transportado. <b>ANEXO 6</b>   |

|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Las vías por donde circula el equipo caminero deben estar despejadas y sin obstáculo.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Registro Fotográfico</li> </ul>  | X |  | Las vías se encuentran libres de obstáculos.  |
| 6 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar mantenimiento regular de la maquinaria y equipo utilizado</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Registro del mantenimiento vehicular (Periodo del 15 de marzo de abril)</li> </ul> | X |  | La revisión y mantenimiento de la maquinaria para el mes de marzo se realizó en los talleres de la compañía Amazonas Building, ubicados en la parroquia Madre Tierra el cual consta con todos los permisos y regularizaciones ambientales. REGISTRO FOTOGRAFICO IAC AMAZONAS BUILDING |
| 7 | <ul style="list-style-type: none"> <li>El transporte del equipo se realizará utilizando las vías de accesos existentes, considerado no causar molestias a los habitantes del costado de la vía y el posible deterioro de la misma.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inspección In situ</li> </ul>  | X |  | Los vehículos livianos y pesados que operan en el proyecto utilizan las vías de acceso, precautelado el correcto uso de las mismas con el objetivo de evitar daños.   |
| 8 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementar un kit antiderrame y equipo de respuesta rápida, para combatir posibles contaminados.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kits antiderrames- Inspección In situ</li> </ul>                                   | X |  | Dentro del proyecto existe un kit antiderrame, con el objetivo de mitigar cualquier derrame. ANEXO 8  |
| 9 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se Deberá instalar de forma permanente un extintor y botiquín de primeros auxilios en los vehículos y maquinaria.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Botiquín</li> <li>Extintor</li> </ul>  | X |  | La maquinaria y vehículos cuentan con botiquín y extintor ANEXO 5   |

|    |  |  |   |  |   |
|----|--|--|---|--|---|
| 10 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dotar al personal que labora en el Proyecto de EPP</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Usode EPPs</li> <li>Inspección In situ</li> </ul>                                 | X |  | <p>El contratista ha dotado a sus trabajadores del EPP adecuado, según la actividad laboral asignada. Entrega de impermeables, gafas y chalecos a operadores de maquinaria pesada se realizó en el periodo anterior y tiene la vigencia de tres meses</p> <p><b>ANEXO 4</b></p> |
| 11 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementar un área para el almacenamiento temporal de combustibles el cual deberá cumplir las siguientes características. Deberá estar ubicado alejado de cuerpos hídricos y aislados.</li> <li>Los sitios de almacenamiento de combustible serán ubicados en áreas no inundables.</li> <li>La estructura será realizada con vigas de madera y cubierta de durao techo o también pueden ser hojas de si las dimensiones del área se realizarán en base a la cantidad de tanques de almacenamiento a utilizar.</li> <li>El tanque de almacenamiento deberá estar protegido contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones que contaminen el ambiente y contarán con mangueras y llaves de distribución.</li> <li>El tanque de almacenamiento debe estar rodeado de un cubetto o estructura de contención impermeables recircionalmente Usado para el almacenamiento de combustible a 110% del tanque.</li> <li>En el área deberá implementar un extintor para evitar</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inspección In situ</li> <li>Área para el almacenamiento de combustible</li> </ul> | X |  | <p>En el campamento se encuentra un área destinada para el almacenamiento de combustible, la misma que cuenta con piso pavimentado, bajo cubierta kit antiderrame, señalética y extintor.</p> <p><b>ANEXO 9</b></p>   |

|    |  |  |  |  |   |  |
|----|--|--|--|--|---|--|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• cualquier riesgo de incendio</li> <li>• Tener un acceso adecuado para la carga de combustible y en caso de ser necesario para la entrada del carro de los bomberos</li> <li>• El área deberá estar señalizado en base a la normativa N.T.F. INEN. 2266.</li> </ul>  |  |  |  |   |  |
| 12 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ubicar el material de desalojo en los sitios descritos en el ítem 7 del presente documento.</li> <li>• Los cuáles han sido ubicados de acuerdo con los siguientes criterios técnicos</li> <li>• Deberán encontrarse dentro del área de influencia del Proyecto.</li> <li>• El terreno deberá estar desprovisto de vegetación</li> <li>• Alejado de cueros hídricos</li> <li>• Las áreas destinadas a las escombreras deberán ser estables y seguras a corto y largo plazo.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro fotografía de las escombreras del Proyecto</li> <li>• Actas de acuerdo de desalojo de escombreras (en caso de ser predios privados)</li> <li>• Deberán contar con una capacidad mínima de 1500m<sup>3</sup></li> <li>• El transporte del material debe realizarse en una volqueta con cubierta (lona), con el fin de evitar derrames en la carretera.</li> </ul> |  |  | X | Se lo realizara cuando las actividades lo ameriten |

**PLAN DE MANEJO DE DESECHOS**

| ITEM | MEDIDA  | Medio de verificación                                   | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES   |
|------|---|---|--------|-----------|-----------|---|
| 1    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementar las bases de almacenamiento temporal de desechos peligrosos en el cual deberá tener las siguientes características:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estar bajo cubierta</li> <li>• Iluminación natural</li> <li>• En un espacio abierto cerrado</li> <li>• El acceso a estos locales deberá ser registrado y el personal que ingiere estará provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad industrial</li> <li>• Contar con señalización apropiada en lugares y formas visibles en base a la Norma nte inen 2266.</li> <li>• Contar con el material y equipamiento para atender contingencias.</li> <li>• Contar con sistemas de extinción contra incendios</li> <li>• Contar con bases o pisos impermeabilizados osimilares según el caso.</li> </ul> </li> </ul> | Inspección In situ<br>Campamento Amazonas Building S.A. | X      |           |           | En el campamento se encuentra un área destinada para el almacenamiento temporal de los desechos peligrosos, la misma que cuenta con piso pavimentado, bajo cubierta, kit antiderrame, señalética y extintor. Cabe mencionar que durante este periodo no se han realizado actividades productivas que generen desechos peligrosos.<br><b>ANEXO 9</b> |
| 2    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotar de fundas plásticas a los conductores de volquetes y máquinas pesadas para los desechos.</li> </ul>  | Inspección In situ                                      | X      |           |           | La dotación de fundas plásticas anterior aún tiene unidades existentes para el correcto almacenamiento de los desechos comunes.<br><b>ANEXO 7</b>   |

|   |  |  |   |  |  |  |
|---|--|--|---|--|--|--|
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación de contenedores de colores debidamente etiquetados para la clasificación en lavía, se deberá cumplir con las siguientes características:</li> <li>Encontrarse bajo techo</li> <li>Contenedores de 55 galones (4)</li> <li>El rotulado estará en un lugar visible con caracteres legibles según lo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Contenedores (IAC AMAZONAS BUILDING)</li> </ul> | X |  |  | Los puntos ecológicos instalados en el periodo anterior fueron sustraídos por lo que se tuvo que improvisar con basureros que no reúnen las condiciones necesarias para el buen uso de desechos sólidos. |
|---|--|--|---|--|--|--|

**PLAN DE CAPACITACIÓN:**

| ITEM | MEDIDA   | Medio de verificación  | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES   |
|------|--|--|--------|-----------|-----------|---|
| 1    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitaciones al personal de trabajo sobre:</li> <li>Medidas propuestas en el MA</li> <li>Manejo de los procedimientos de seguridad</li> <li>Trabajos en alturas</li> <li>Protecciones del ambiente</li> <li>Primeros auxilios y procedimiento en caso de emergencia</li> <li>Manejo de desechos peligrosos y no peligrosos</li> <li>Técnicas para prevenir conflictos con la comunidad</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inspección In situ - IAC AMAZONAS BUILDING</li> </ul> | X      |           |           | Todo el personal que opera en el proyecto ha sido capacitado en los temas de seguridad, salud y ambiente, de igual forma ha sido socializado el PMA. No se realizaron charlas ni conferencias en el área de influencia del proyecto |

**PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS:**

| ITEM | MEDIDA   | Medio de verificación | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                       |
|------|--|-----------------------|--------|-----------|-----------|---|
| 1.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar una reunión previa con los involucrados directos del Proyecto para darles a conocer las ventajas de implementación del Proyecto obra o actividad.</li> </ul> |                       |        |           | X         | El proyecto fue socializado en periodos anteriores. |

|   |  |  |   |  |   |  |
|---|--|--|---|--|---|--|
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación un buzón donde se recepte las quejas y sugerencias de la población.</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inspeccion In situ Campamento Amazonas Building S.A.</li> </ul> | X |  |   | El personal que se encuentra diariamente en el proyecto cuenta con hojas de registro, en las cuales las personas |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Participar activamente en reuniones y procesos comunales que se realiza que se realicen en el área de influencia</li> </ul> |  |   |  | X | Las reuniones de informe de actividades y avance de obra se ejecutará en el siguiente mes de mayo.               |

**PLAN DE CONTINGENCIAS:**

| ITEM | MEDIDA  | Medio de verificación   | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES  |
|------|---|---|--------|-----------|-----------|--|
| 1    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar un plan de contingencia accesible a todo el personal en el cual se aborde la gestión de contingencia en caso de incendios, derrame, fuga o explotación</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de contingencia Amazonas Building S.A.</li> </ul> | X      |           |           | El proyecto cuenta con un plan de contingencia, el mismo que ha sido socializado a los trabajadores. <b>ANEXO 11</b> |
| 2    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Crear un comité de seguridad que actúe en caso de emergencia.</li> </ul>   |   |        |           | X         | Se prevé esta actividad para el próximo periodo del proyecto.  |
| 3    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizará simulacros, de evaluación, incendio, derrames o fugas para agilizar los tiempos de reacción del personal y su actuación.</li> </ul>                           |   |        |           | X         |  |

|   |  |                   |  |  |   |   |
|---|--|-------------------|--|--|---|---|
| 4 | <p>Actuar de la siguiente manera en caso de</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>En caso de incendio</b></li> </ul> <p>Si alguien detecta un fuego incipiente y sabe usar un extintor actúa inmediatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se recomienda el uso de extintores de industriales ubicados estrictamente Tipos de extintores</li> </ul> <p>El tipo A se usará durante la combustión de sólidos comunes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El tipo B se usará para líquidos y gases inflamables El tipo C sé para equipos eléctrico energizado y tipo de para metales combustibles</li> <li>- Salve su vida y la de los demás abandonando el lugar de incendio</li> <li>- Una vez a salvo avisar a la brigada hágalo sin pensar que otro ya lo han hecho</li> <li>- Solicité Auxilio</li> </ul> <p>Si se encuentra Atrapado por el humo trate de salir arrastrándose o permanézcalo más cerca del suelo el humo tiende a subir y existe aire no contaminado a nivel del suelo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si el humo es muy denso curarse con un pañuelo ropa mojada la boca y nariz manténgase cerca del suelo</li> <li>- Cuando se inflaman la ropa de una persona, impida que corra, el viento avive el fuego. Cobíjelo con una manta húmeda haga que se proteja la cara y cuello.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>En caso de explosión</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evacuen la zona de riesgo y proceda de acuerdo a lo establecido en el programa de contingencia</li> <li>-Acordeón del área y restringe el acceso a personal ajeno</li> <li>-Utilice el extintor adecuado</li> <li>- No intente extinguir el fuego hasta que la fuga haya sido detenida de otra manera existe grave riesgo de rescisión y explosión</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>En caso de sismo o fenómeno natural</b></li> </ul> <p>Antes un sismo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Conozca las zonas de seguridad</li> <li>-Contar con un mapa de peligro potencial y zonas seguras</li> <li>-Reciba entrenamiento en primeros auxilios y evacuación</li> </ul> | • Informe técnico |  |  | X | Durante este periodo no ha existido ningún incidente y/o accidente de manera natural o antrópica, en caso de suceder se tomará en cuenta lo establecido en esta medida. |
|---|--|-------------------|--|--|---|---|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>-Manténgase plenamente informado de cómo interrumpir de forma segura sus labores habituales o el proceso de construcción</p> <p>-Observe la ubicación de su área de trabajo Buscar sitios de protección contra materiales que pudieran desprenderse.</p> <p>-Haga una evaluación de vulnerabilidad de su entorno de trabajo para determinar los peligros potenciales</p> <p>-En caso de derrame o fuga</p> <p>-Localice el derrame o fuga</p> <p>-Antes de comenzar con el control o contención de un derrame, debe conocerse los elementos de protección personal necesario: ropa adecuada impermeable y resistente a los productos químicos guantes protectores lentes de seguridad protección respiratoria.</p> <p>-Contenga con barreras, di que si o materiales absorbentes</p> <p>-Colocar fluidos y desechables en recipientes de fundas para recolección de materiales contaminados</p> <p>-Entregar el material contaminado a un gestor calificado</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

**PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO:**

| ITEM | MEDIDA  | Medio de verificación   | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES  |
|------|---|---|--------|-----------|-----------|--|
| 1    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar el nivel de cumplimiento al presente PMA a través de un informe interno de cumplimiento de las medidas del plan de aprobación por la Autoridad Ambiental.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe de monitoreo</li> <li>• Registro Fotográfico IAC Amazonas Building S.A.</li> </ul> | X      |           |           | <p>Se presenta el informe correspondiente a este periodo.</p> <p>Se contó con la visita del Técnico Ambiental GAD Provincial de Pastaza 27-04-2023</p> |
| 2    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitorear el manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos dentro del área de influencia del proyecto.</li> </ul>   | Informe de monitoreo al manejo de desechos peligrosos y no peligrosos.  |        |           | X         | <p>La acción No Aplica, debido a que durante este periodo no se han realizado actividades que generen desechos peligrosos.</p>                         |

|   |   |            |   |  |  |   |
|---|---|------------|---|--|--|---|
| 3 | Realizar el mantenimiento de los extintores | Extintores | X |  |  | Los extintores se encuentran recargados, en buen estado y ubicados en lugares visibles y de fácil acceso. |
|---|---|------------|---|--|--|---|

**PLAN DE REHABILITACION:**

| ITEM | MEDIDA  | Medio de verificación                           | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES  |
|------|---|---|--------|-----------|-----------|--|
| 1    | Revegetación reforestación de áreas degradadas en el proyecto con plantas nativas de la zona. | Registro fotográfico<br>Informe de revegetación |        |           | X         | La acción no aplica, debido a que el proyecto se encuentra en etapa de construcción. |

**PLAN DE ENTREGA Y ABANDONO:**

| ITEM | MEDIDA   | Medio de verificación                        | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES  |
|------|--|--|--------|-----------|-----------|--|
| 1    | Desmantelamiento de la infraestructura temporal existente en el área del proyecto (campamento, área de almacenamiento de <i>combustibles y desechos peligrosos</i> ) | Registro fotográfico<br>Informe de monitoreo |        |           | X         | La acción no aplica, debido a que el proyecto se encuentra en etapa de construcción. |
| 2    | Limpeza general del área del proyecto.   | Registro fotográfico                         |        |           | X         | La acción no aplica, debido a que el proyecto se encuentra en etapa de construcción. |

## CUMPLIMIENTO GUIA DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES: TRAMO 2

|                          | # Medidas  | Cumpl e | No Cumpl e | N/A | Observaciones   |
|--------------------------|--|---------|------------|-----|---|
|                          | EQUIPOS DE OFIMÁTICA   |         |            |     |   |
| <b>USO DE LA ENERGÍA</b> | Una vez finalizada la jornada de trabajo apaga las luces, impresoras, computadoras y demás aparatos eléctricos.  |         |            | X   | En el área para lo cual se estableció el Certificado Ambiental no cuenta con oficinas en la misma |
|                          | Cuando te ausentes por más de una hora, mejor apaga el monitor de la computadora o ponlo en hibernar, ya que gasta un 70% total del consumo energético del equipo. Un monitor encendido tiene una potencia de 60 W, unos 6,5 W en espera, y 1W apagado |         |            | X   |   |
|                          | El único protector de pantalla que ahorra energía es negro. Es deseable configurarlo para que se active tras 10 minutos de inactividad.  |         |            | X   |   |
|                          | Los ordenadores portátiles son más eficientemente energéticos que los de mesa.   |         |            | X   |   |
|                          | Reduce el uso del papel o del secador de manos, utiliza tu propia toalla.  |         |            | X   |   |
|                          | Da preferencia al uso de las escaleras en lugar de los ascensores; es mucho más saludable, económico y ecológico.  |         |            | X   |   |
|                          | Llama al ascensor pulsando solo un botón para evitar hacer viajes innecesarios. O si vas a bajar o subir solo un piso mejor haz ejercicio, es bueno para tu salud.   |         |            | X   |   |
|                          | No conectes varios aparatos al mismo tiempo porque puede producirse una sobrecarga, posibles apagones y deterioro de las instalaciones a largo plazo.  |         |            | X   |   |
|                          | Configura los equipos de tu dependencia administrativa como computadoras, copadoras, impresoras, etc. en modo de "ahorro de energía" para reducir el consumo de electricidad hasta en un 50%.  |         |            | X   |   |
|                          | Para sacar tres o menos copias, es mejor imprimir. A partir de cuatro hojas, la copadora es la mejor opción  |         |            | X   |   |
|                          | Comparte eficientemente los equipos de dependencia administrativa entre compañeros   |         |            | X   |   |

|                      |   |  |  |   |   |
|----------------------|---|--|--|---|---|
|                      | Reporta a la unidad de tecnología de la Institución daños o dificultades en el uso de equipos informáticos, ya que requieren de un adecuado mantenimiento para su óptimo rendimiento.   |  |  | X |   |
|                      | Evitar el uso del fax térmico, ya que consume más energía y el papel no puede reciclarse.   |  |  | X | En el área para lo cual se estableció el Certificado Ambiental no cuenta con oficinas en la misma               |
| <b>CLIMATIZACIÓN</b> |   |  |  |   |   |
|                      | Usar estos dispositivos sólo cuando sea necesario. Siempre que sea posible, aprovechar la regulación natural de la temperatura, por ejemplo, en verano las ventanas entornadas o las corrientes de aire pueden refrescar algunas salas sin necesidad de encender el aire acondicionado. |  |  | X | El personal contratado se transporta aprovechando movilización de vehículo de Contratista Amazonas Buildign S.A |
|                      | Apagar o minimizar los sistemas de calefacción o aire acondicionado en las salas no ocupadas: sala de reuniones vacías, fuera de las horas de trabajo   |  |  | X |   |
|                      | Conocer adecuadamente cómo funcionan los sistemas de calefacción y refrigeración, para maximizar la eficiencia de los equipos de climatización.   |  |  | X |   |
|                      | Mantener la temperatura aproximadamente en 20°C en invierno, y aproximadamente en 24°C en verano, para disminuir el consumo energético.   |  |  | X | En el área para lo cual se estableció el Certificado Ambiental no cuenta con oficinas en la misma               |
|                      | Asegurarse de que los equipos de climatización se programan para funcionar exclusivamente en el período de trabajo, a excepción de situaciones en las que haga falta calefacción o refrigeración previas.   |  |  | X |   |
|                      | Asegurarse de que las puertas y ventanas están cerradas mientras funcionan los equipos de climatización, para impedir pérdidas y derroche   |  |  | X |   |
| <b>ILUMINACIÓN</b>   |   |  |  |   |   |
|                      | Sustituir progresivamente las antiguas bombillas incandescentes y tubos fluorescentes, que usan tecnología ineficiente que desprende más calor que luz  |  |  | X | En el área para lo cual se estableció el Certificado Ambiental no cuenta con oficinas en la misma               |
|                      | Usar interruptores independientes para iluminar sólo las zonas necesitadas de una misma área  |  |  | X |   |

|                         |  |  |  |   |  |
|-------------------------|--|--|--|---|--|
|                         | Aprovechar la iluminación natural, organizando los puestos de trabajo de manera que se mantenga una adecuada iluminación, manteniendo limpias las ventanas y abriendo las persianas, cortinas u otros elementos similares, etc.  |  |  | X | La iluminación durante la ejecución de los trabajos es natural   |
|                         | Antes de encender las luces para encubrir los reflejos del sol en los ordenadores, probar cambiando los puestos de trabajo de lugar o la orientación de las partallas, así como instalando láminas antirreflectantes en las ventanas o cortinas orientables.   |  |  | X | En el área para lo cual se estableció el Certificado Ambiental no cuenta con oficinas en la misma                      |
|                         | Asegurar una gestión apropiada de los tubos fluorescentes y bombillas, pues son residuos especiales  |  |  | X | En el área para lo cual se estableció el Certificado Ambiental no cuenta con oficinas en la misma, Iluminación natural |
| USO DEL AGUA            | Colocar temporizadores o detectores de presencia para grifos. Esto puede suponer ahorros entre el 20 y el 40% del recurso  |  |  | X | En el área para lo cual se estableció el Certificado Ambiental no cuenta con oficinas en la misma                      |
|                         | Las cisternas deberán ser de doble descarga o de interrupción de descarga, en todo caso con limitador del volumen de descarga como máximo de seis litros. Esto puede suponer ahorros de hasta un 40%. Utilizar sistemas de detección de fugas en las cañerías enterradas u ocultas   |  |  | X |  |
|                         | Las fuentes de consumo humano deben estar dotadas de sistemas temporizadores o limitadores de caudal.  |  |  | X |  |
|                         | Soltar el agua del inodoro cuando así lo requiera y no usarlo como cesto de residuos (papel higiénico)   |  |  | X |  |
| GESTIÓN DE LOS DESECHOS | Eliminar los tachos de cada puesto de los funcionarios y colocar los tachos en un solo lugar con los colores y etiquetas correspondientes, esto ayudará a mejorar la clasificación de los desechos (tacho verde-residuos orgánicos, tacho gris-papel y cartón, tacho azul-plástico, tacho blanco-vidrio y latas, tacho negro -desechos ordinarios) |  |  | X | Se colocaron basureros en cada punto ecológico<br><b>REGISTRO FOTOGRAFICO IAC AMAZONAS BUILDING</b>                    |
|                         | Reducir: Normalmente adquirimos productos que tienen muchos envoltorios como el plástico, espuma Flex, etc. que tardan mucho tiempo en descomponerse   |  |  | X | En el área para lo cual se estableció el Certificado Ambiental no cuenta con oficinas                                  |

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03

Oficina 072 785 269

keyszen.sas@gmail.com

www.keyszen.com

Machala - El oro - Ecuador

|                      |   |   |  |   |   |
|----------------------|---|---|--|---|---|
|                      | y que son fabricados con materiales escasos como el petróleo, agua y madera. Antes de comprar debemos pensar en lo que realmente necesitamos, y evitar envoltorios innecesarios.  |   |  |   | en la misma. Por lo que no se realizan compras con dichos envoltorios, la alimentación del personal se realiza en Campamento Amazonas Building S.A. |
|                      | Reutilizar: En este mundo modernizado se ha hecho normal el adquirir un bien y después de usarlo, fácilmente desecharlo sin pensar a dónde va eso que consideramos basura. Hay productos que podemos volver a usar muchas veces o darles otro uso haciendo algún artículo necesario para el hogar u dependencia administrativa evitando generar tanto desecho |   |  | X | En el área para lo cual se estableció el Certificado Ambiental no cuenta con oficinas en la misma   |
|                      | Reciclar: A este término se le suele confundir con el de "separar" o "reutilizar", sin embargo, el reciclar tiene que ver con la adquisición de materiales viejos o usados para ser procesados química o físicamente y obtener una materia prima y a partir de ésta fabricar productos nuevos   |   |  | X |   |
|                      | Elimina el uso de botellas individuales de plástico, consume el agua del dispensador usando tomato o tu vaso personal   | X |  |   | Se capacitó al personal sobre el uso de envases plásticos   |
|                      | Elimina el uso excesivo de fundas plásticas, en su lugar utilizar fundas reutilizables.   | X |  |   | La dotación de fundas de basura para el personal es controlada y se sugiere reutilización<br><b>ANEXO 07</b>  |
| <b>USO DEL PAPEL</b> | Evitar su uso siempre que sea posible, por ejemplo, guardando los documentos en formato digital, optimizando el número de copias necesarias, compartiendo Información en lugar de generar copias para cada persona, aprovechando las posibilidades de Internet, correos electrónicos, teléfono, etc.  |   |  | X | En el área para lo cual se estableció el Certificado Ambiental no cuenta con oficinas en la misma   |
|                      | Utilizar de forma preferente y en la medida de lo posible papel reciclado. No se debe olvidar que el papel reciclado puede llegar a tener una calidad similar a la del papel convencional   |   |  | X |   |

|  |   |  |  |   |   |
|--|---|--|--|---|---|
|  | Evitar imprimir documentos innecesarios o de aquellos que tienen muchos espacios libres (Ej: presentaciones de power point)   |  |  | X |   |
|  | Antes e imprimir, comprobar los posibles fallos y mejoras del documento, utilizando, por ejemplo, la "vista previa": ajuste de márgenes, división de párrafos eficiente, paginación correcta, reducción del tamaño de las fuentes, etc.                     |  |  | X |   |
|  | Utilizar el papel por las dos caras en el fotocopiado e impresión de documentos, siempre que sea posible. Igualmente, ajustar en la medida de lo posible, los textos para que quepan dos páginas de un documento, libro o publicación en una hoja estándar. |  |  | X |   |
|  | Todos los documentos internos se imprimirán reutilizando papel o bien, usando papel reciclado y a doble cara  |  |  | X |   |
|  | Utilizar medios de comunicación electrónicos en la medida de lo posible para reducir el uso de impresoras y faxes   |  |  | X |   |
|  | Reutilizar todo el papel que haya sido impreso sólo por una cara para imprimir borradores, fabricar bloc de notas, etc  |  |  | X |   |
|  | Reutilizar todo el papel que haya sido impreso sólo por una cara  |  |  | X |   |
|  | Utilizar papel reciclado para hacer fotocopias.   |  |  | X |   |
|  | Imprimir en calidad de borrador para evitar el derroche de tinta y facilitar la reutilización, especialmente en el caso de los documentos internos, y el reciclaje.   |  |  | X | En el área para lo cual se estableció el Certificado Ambiental no cuenta con oficinas en la misma |
|  | Separar el papel inservible, haciendo uso de los contenedores puestos a disposición a tal fin. Resulta interesante, siempre que sea posible, romper el papel antes de depositarlo en los contenedores para reducir el volumen que ocupa                     |  |  | X |   |
|  | Para los residuos, tener una pequeña papélera junto a cada mesa de trabajo optimizará la reutilización y reciclaje  |  |  | X |   |
|  | <b>CONSUMO RESPONSABLE</b>  |  |  |   |   |
|  | Ajústate a las necesidades reales en cuanto a los insumos que existen en tu lugar de trabajo, así evitarás comprar inútilmente  |  |  | X | En el área para lo cual se estableció el Certificado Ambiental no                                 |

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03

Oficina 072 785 269

keyszen.sas@gmail.com

www.keyszen.com

Machala – El oro - Ecuador

|   |  |               |                  |            |  |
|---|--|---------------|------------------|------------|--|
|   | Utiliza adecuadamente y comparte el material de la dependencia administrativa para alargar su vida útil, al mismo tiempo que se genera ahorro para la institución  |               |                  | X          | cuenta con oficinas en la misma  |
|   | Si vas a almorzar en la dependencia administrativa evita comprar alimentos que sabes te darán en envases de polietileno (espuma flex) para transportarlos, es un material que no se puede reciclar y contamina por mucho tiempo el ambiente, lleva tus propios recipientes y pide que te pongan los alimentos en ellos. Seamos coherentes con nosotros mismos y con la institución donde trabajamos. |               |                  | X          | En el área para lo cual se estableció el Certificado Ambiental no cuenta con oficinas en la misma la alimentación del personal se realiza en Campamento Amazonas Building S.A. |
|   | Prefiere las pilas recargables, ya que las pilas comunes contaminan de 3 mil a 175 mil litros de agua dependiendo de sus componentes como el mercurio. Las pilas recargables pueden usarse hasta unas dos mil veces según el tipo y uso adecuado.  |               |                  | X          | En el área para lo cual se estableció el Certificado Ambiental no cuenta con oficinas en la misma.   |
|   | Compra lápices y marcadores recargables, de esta manera evitarás generar más desechos. Prefiera productos cuyos envases tengan el logotipo de reciclable o reutilizable.   |               |                  | X          |  |
|   | Adquiere productos naturales para tu aseo personal, recuerda que el uso de aerosoles perjudica al ambiente   |               |                  | X          |  |
| <b>TRANSPORTE Y MOVILIDAD</b>   | Desplazamiento a pie   |               |                  | X          | El personal contratado se transporta aprovechando movillización de vehículo de Contratista Amazonas Building S.A.  |
|   | Utilizar el transporte público.  |               |                  | X          |  |
|   | Utilizar bicicleta.  |               |                  | X          |  |
|   | Cuando es inevitable el uso del vehículo privado, el sistema de carro compartido puede ser una opción bastante eficiente.  | X             |                  |            |  |
| <b>1. OTROS (Incorporación de medidas conforme a la actividad del proyecto)</b> |  |               |                  |            |  |
| <b>PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS</b>                              | <b># Medidas</b>   | <b>Cumple</b> | <b>No Cumple</b> | <b>N/A</b> | <b>Observaciones</b>   |
|   | Implementar señalética<br>Señalética de Prohibición<br>Señalética de condición obligatoria<br>Señalética de condición segura<br>Señalética preventiva<br>Señalética ambiental  | X             |                  |            | La colocación e implementación de la señalética informativa, preventiva y reglamentaria se establece para la   |

|  |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
|  | <p><b>Señalética informativa.</b><br/>         -Usar las figuras geométricas, colores de seguridad, y colores de contraste para señales de seguridad de la Tabla N°1 de la Norma INEN ISO 3864<br/>         -Usar los diseños para señales de prohibición, acción obligatoria, precaución, condición segura.</p> |   |  | <p>etapa final del proyecto tal como lo señala el cronograma de ejecución de obra<br/> <b>REGISTRO FOTOGRAFICO IAC AMAZONAS BUILDING</b></p>  |
|  | <p>Humedecer la vía en días soleados para evitar material particulado, optimizando el recurso agua.</p>  | X |  | <p>En el presente período el clima permitió controlar la emisión de material particulado</p>  |
|  | <p>Zonificar las áreas de trabajo con cinta de peligro.</p>  | X |  | <p>Las áreas intervenidas han sido debidamente zonificadas, Instalación de barreras horizontales que delimitan el área de trabajo <b>REGISTRO FOTOGRAFICO IAC AMAZONAS BUILDING</b></p>   |
|  | <p>Cubrir con una lona las volquetas que trasladen material pétreo hacia el lugar de la obra.</p>  | X |  | <p>Las volquetas cuentan con lona para cubrir el material pétreo y evitar el levantamiento de polvo. <b>ANEXO 06</b></p>  |
|  | <p>Las vías por donde circula el equipo caminero deben estar despejadas y sin obstáculos.</p>  | X |  | <p>Las vías se encuentran despejadas y en orden</p>   |
|  | <p>Realizar mantenimiento regular de la maquinaria y equipos utilizados.</p>   | X |  | <p>La revisión y mantenimiento de la maquinaria para el mes de abril se realizó en los talleres de la compañía Amazonas Building, ubicados en la parroquia Madre Tierra el cual consta con todos los permisos y regularizaciones ambientales. <b>REGISTRO FOTOGRAFICO IAC AMAZONAS BUILDING</b></p> |

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
 Oficina 072 785 269  
 keyszen.sas@gmail.com  
 www.keyszen.com  
 Machala – El oro - Ecuador

|  |  |   |  |   |   |
|--|--|---|--|---|---|
|  | El transporte del equipo se realizará utilizando las vías accesos existentes, considerando no causar molestias a los habitantes del costado de la vía y el posible deterioro de la misma.  |   |  | X | El equipo se traslada por el único acceso Vía Tena  |
|  | Implementar un kit antiderrame y equipos de respuesta rápida, para combatir posibles emergencias.<br><b>Contenido del Kit Anti Derrame:</b><br>-Pala, paños absorbentes, (sacónicha observante), guantes, botas, gafas protectoras, escoba, fundas o recipientes para recolectar los desechos contaminados.  | X |  |   | La empresa cuenta con el kit antiderrames, pero será utilizado en la etapa de asfaltado de la vía. <b>ANEXO 08</b>  |
|  | Se deberá instalar de forma permanente un extintor y botiquín de primeros auxilios en los vehículos y/o maquinaria pesada.<br><b>Contenido del botiquín de primeros auxilios:</b><br>- Antisépticos, alcohol gel, gasas, tijeras, algodón, termómetro, esparadrapo.  | X |  |   | Los vehículos y maquinarias están dotados de botiquín de primeros auxilios y un extintor <b>ANEXO 04</b>  |
|  | - Dotar al personal que labora en el proyecto de EPP.  | X |  |   | El personal ha sido dotado de EPP. Entrega de impermeables, gafas y chalecos a operadores de maquinaria pesada se realizó en el periodo anterior y tiene la vigencia de tres meses. <b>ANEXO 05</b> |
|  | Implementar un área para el almacenamiento temporal de combustibles, el cual deberá cumplir con las siguientes características:<br>-Deberá estar ubicado alejado de cuerpos hídricos, y aislado<br>-Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no inundables.<br>-La estructura será realizada con vigas de madera y cubierta de dura techo o también pueden ser hojas de zinc (Las dimensiones del área se las realizara en base a la cantidad de tanques de almacenamiento a utilizar).<br>-El tanque de almacenamiento deberá estar protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones que | X |  |   | El campamento de Amazonas Building cuenta con espacios de almacenamiento de combustibles <b>ANEXO 09</b>  |

|  |  |   |  |  |   |
|--|--|---|--|--|---|
|  | <p>contaminen el ambiente, y contará manguera y llaves de distribución.</p> <p>-El tanque de almacenamiento deberá estar rodeado de un cubeto o estructura de contención impermeable técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque.</p> <p>-En el área se deberá implementar un extintor para prevenir cualquier riesgo de incendio.</p> <p>-Tener un acceso adecuado para la carga de combustible y en caso de ser necesario para la entrada del carro de los bomberos.</p> <p>-El área deberá estar señalizado en base a la normativa NTE INEN-ISO 2266.</p>   |   |  |  |   |
|  | <p>Ubicar el material de desalojo en los sitios descritos en el ítem 7. del presente documento.</p> <p>Los cuales han sido ubicado de acuerdo con los siguientes criterios técnicos:</p> <p>-Deberán encontrarse dentro del área de influencia del proyecto.</p> <p>-El terreno debe estar desprovisto de vegetación.</p> <p>-Alejados de cursos hídricos.</p> <p>-Las áreas destinadas para escombreras deberán ser estables y seguras a corto y largo plazo.</p> <p>-Deberán contar con una capacidad mínima de 1500 m3</p> <p>-El transporte del material deberá realizarse en una volqueta con cubierta (lona), con el fin de evitar derrames en la carretera.</p> | X |  |  | <p>Se realizo un corte de talud en la abscisa 1+800 con un volumen aproximado de 800 m3 los cuales fueron depositados en frente por pedido verbal del propietario.</p> <p><b>REGISTRO FOTOGRAFICO IAC AMAZONAS BUILDING</b></p>         |
| <p><b>PLAN DE MANEJO DE DESECHOS</b></p> | <p>Implementar un área de almacenamiento temporal de desechos peligrosos el cual deberá tener las siguientes características:</p> <p>-Estar bajo cubierta</p> <p>-Iluminación natural</p> <p>-En un espacio abierto, cercado.</p> <p>-El acceso a estos locales debe ser restringido, y el personal que ingrese estará provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad industrial;</p> <p>-Contar con señalización apropiada en lugares y formas visibles; en base a la norma NTE INEN 2266.</p> <p>-Contar con el material y equipamiento para atender contingencias</p>  |   |  |  | <p>El campamento de Amazonas Building cuenta con espacios de almacenamiento de desechos peligrosos (Aceite quemado), al presente periodo no se ha generado dichos residuos</p> <p><b>REGISTRO FOTOGRAFICO IAC AMAZONAS BUILDING</b></p> |

|  |   |   |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
|  | <p>-Contar con sistemas de extinción contra incendios</p> <p>-Contar con bases o pisos impermeabilizados o similares, según el caso.</p> <p><b>Colores de los contenedores a Implementar</b></p> <p><b>Rojo:</b> Desechos Peligrosos</p> <p>Los desechos no peligrosos no se podrán almacenar por más de un año; deberán ser entregados a un gestor calificado para su tratamiento final.</p>   |   |  |  |  |
|  | <p>Dotar de fundas plásticas a los conductores de volquetes y maquinaria pesada para los desechos comunes.</p>  | X |  |  | <p>El personal ha sido dotado de fundas plásticas.</p> <p><b>ANEXO 07</b></p>  |
|  | <p>Implementar de contenedores de colores debidamente etiquetados para la clasificación de los residuos en la vía, se deberá cumplir con las siguientes características:</p> <p>-Encontrarse bajo techo.</p> <p>-Contenedores de 55 galones (4)</p> <p>El rotulado estará en un lugar visible con caracteres legibles según lo establecido en la NTE INEN 878. El nombre o denominación de los residuos con su logo respectivo y la distancia de observación según lo establecido en la NTE INEN ISO 3864-1</p> <p>- Se realizará una clasificación general de residuos:</p> <p><b>Colores de los contenedores a Implementar.</b></p> <p><b>Azul:</b> Reciclables</p> <p><b>Negro:</b> No Reciclables</p> <p><b>Verde:</b> Orgánicos</p> <p><b>Rojo:</b> Peligrosos</p> | X |  |  | <p>En el primer periodo se construyó e instaló 1 punto ecológico compuesto por 3 basureros cada uno con su respectivo identificador para la clasificación de desechos orgánicos, papel y plásticos respectivamente, para fines de sustracción y remplazados por tres recipientes improvisados</p> <p><b>REGISTRO FOTOGRAFICO IAC AMAZONAS BUILDING</b></p> |
| <b>PLAN DE CAPACITACIÓN</b>            | <p>Capacitar al personal de trabajo sobre temas:</p> <p>-Medidas propuestas en el PMA</p> <p>-Manejo de los procedimientos de seguridad</p> <p>-Trabajos en altura</p> <p>-Protección del ambiente</p> <p>-Primeros Auxilios y procedimiento en caso de emergencias</p> <p>-Manejo de desechos peligrosos y no peligrosos.</p> <p>-Técnicas para prevenir conflictos con la comunidad.</p>  | X |  |  | <p>En el presente periodo no se realizaron capacitaciones al personal, temas propuestos han sido socializados en periodos anteriores</p>   |
| <b>PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS</b> | <p>Realizar una reunión previa con los involucrados directos del proyecto</p>   | X |  |  | <p>El cambio del frente de trabajo afectó la organización de una reunión de</p>  |

|                      |   |   |  |   |  |
|----------------------|---|---|--|---|--|
|                      | para darles a conocer las ventajas de la implementación del proyecto obra o actividad.  |   |  |   | trabajo por lo que se prevé la realización en el mes de mayo del presente año.   |
|                      | Implementar un buzón donde se recepte las quejas y sugerencias de la población.   |   |  | X |  |
|                      | Participar activamente en reuniones y procesos comunales que se realicen en el área de influencia.  | X |  |   | En el presente periodo no se realizó reunión con el área de influencia   |
| PLAN DE CONTINGENCIA | Elaborar un Plan de Contingencia accesible a todo el personal en el cual se aborde la gestión de contingencia en caso de incendio, derrame, fuga o explosión.   | X |  |   | El proyecto cuenta con un plan de contingencia, el mismo que ha sido socializado a los trabajadores <b>ANEXO 11</b>  |
|                      | Crear un comité de seguridad que actué en caso de emergencias.  | X |  |   | en este periodo se empezó con el segundo tramo y por su extensión se dificulta la constitución del comité de vigilancia por lo que se prevé esta actividad para el próximo periodo del proyecto. |
|                      | Se deberá realizar simulacros, de evacuación. Incendios, derrames o fugas para agilizar los tiempos de reacción del personal y su actuación frente a un evento.   | X |  |   | El personal que se encuentra laborando fue capacitado con PLAN DE CONTINGENCIA AMAZONAS BUILDING S.A..   |
|                      | Actuar de la siguiente manera en caso de:<br><b>En Caso de Incendio:</b><br>- Si alguien detecta un fuego incipiente y sabe usar un extintor, actué inmediatamente.<br>- Se recomienda el uso de extintores Industriales ubicados estratégicamente<br>Tipos de extintores:<br><b>El tipo A:</b> Se usará durante la combustión de sólidos comunes,<br><b>El tipo B:</b> Se usará para líquidos y gases inflamables<br><b>El tipo C:</b> para equipo eléctrico energizado y el tipo D para | X |  |   | En el presente periodo 01 al 30 de abril del 2023, no  |

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03

Oficina 072 785 269

keyszen.sas@gmail.com

www.keyszen.com

Machala – El oro - Ecuador

|  |  |  |  |  |                              |
|--|--|--|--|--|------------------------------|
|  | <p>metales combustibles.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salve su vida y la de los demás abandonando el lugar de incendio.</li> <li>- Una vez a salvo, avisar a la brigada (hágalo sin pensar que otros ya lo han hecho).</li> <li>- Solicite auxilio.</li> <li>- Mantenga la calma y espere al rescate.</li> <li>- Si se encuentra atrapado por el humo, trate de salir arrastrándose o permanezca lo más cerca del suelo, el humo tiende a subir y existe aire no contaminado a nivel del suelo.</li> <li>- Si el humo es muy denso, cúbrase con un pañuelo o ropa (mojados) la boca y nariz, manténgase cerca del suelo.</li> <li>- Cuando se inflaman las ropas de una persona, impida que corra, el viento aviva el fuego. Cobjelo con una manta húmeda y haga que se proteja la cara y cuello con las manos.</li> </ul> <p><b><u>En Caso de Explosión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evacue la zona de riesgo y proceda de acuerdo a lo establecido en el programa de contingencias.</li> <li>- Acordone el área y restrinja el acceso a personal ajeno.</li> <li>- Utilice el extintor adecuado.</li> </ul> <p>No intente extinguir el fuego hasta que las fugas hayan sido detenidas, de otra manera, existe grave riesgo de reignición y explosión.</p> <p><b><u>En caso de sismos o fenómenos naturales</u></b></p> <p>Antes de un Sismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conozca las zonas de seguridad.</li> <li>- Contar con un mapa de peligros potenciales y zonas seguras.</li> <li>- Reciba entrenamiento en primeros auxilios y evacuación.</li> <li>- Manténgase plenamente informado de cómo interrumpir de forma segura</li> </ul> |  |  |  | <p>se registró incidente</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------|

|  |   |   |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
|  | <p>sus labores habituales o el proceso de construcción.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Observe la ubicación de su área de trabajo, buscar sitios de protección contra materiales que pudieran desprenderse.</li> <li>- Haga una evaluación de vulnerabilidad de su entorno de trabajo para determinar los peligros potenciales.</li> </ul> <p><b>En caso de derrame o fuga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Localice el derrame o fuga</li> <li>- Antes de comenzar con el control o contención del derrame, debe colocarse los elementos de protección personal necesarios: Ropa adecuada impermeable y resistente a los productos químicos; guantes protectores; lentes de seguridad; protección respiratoria.</li> <li>- Contenga con barreras, diques y/o materiales absorbentes.</li> <li>- Colocar fluidos y desechos en recipientes o fundas para recolección de materiales contaminados.</li> <li>- Entregar el material contaminado a un Gestor Calificado.</li> </ul> |   |  |  |  |
| <b>PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO</b> | <p>Verificar el nivel de cumplimiento al presente PMA, a través de un informe internos de cumplimiento de las medidas del Plan Aprobado por la Autoridad Ambiental.</p>   | X |  |  | <p>A través del presente Informe de Cumplimiento Ambiental, y mediante la visita de seguimiento del Técnico Ambiental del GAD provincial de Pastaza con fecha 27 de abril del 2023 <b>REGISTRO FOTOGRAFICO IAC AMAZONAS BUILDING</b></p> |
|  | <p>Monitorear el Manejo de los desechos peligroso y no peligrosos dentro del área de influencia del proyecto.</p>   | X |  |  | <p>En el proyecto se encuentra en fase de excavación, al momento no ha generado desecho peligroso</p>  |
|  | <p>Realizar el mantenimiento de los extintores</p>  | X |  |  | <p>Se encuentran con mantenimiento vigente</p>   |
| <b>PLAN DE REHABILITACIÓN</b>          | <p>Revegetación o reforestación de áreas degradadas en el proyecto con plantas nativas de la zona.</p>  | X |  |  | <p>El proyecto aún se encuentra en la etapa de</p>   |

|  |  |   |  |   |  |
|--|--|---|--|---|--|
|  | Retirar el suelo contaminado, y entregarlo a un Gestor Calificado para su disposición final, revegetar el área con especies nativas                          | X |  |   | excavación y ampliación de la vía. Posteriormente se establecera las especies forestales para recuperación del bosque y estabilización de taludes. |
| <b>PLAN DE ENTREGA Y ABANDONO DEL ÁREA</b> | Desmantelamiento de la infraestructura temporal existente en el área del proyecto (campamento, área de almacenamiento de combustibles y desechos peligrosos) |   |  | X | El proyecto continua en ejecución.   |
|  | Limpieza general del área del proyecto.  |   |  | X |  |

## 18. RESUMEN DE CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES

Para determinar las sanciones establecidas en el Procedimiento de Sanciones por incumplimientos Ambientales.

Dentro del periodo evaluado 1 al 30 de abril del 2023 se encontró con un Nivel de Conformidad al 100%.

## 19. REPORTE FOTOGRÁFICO



Limpieza y desbroce



Replanteo y nivelacion



Excavación de movimiento de tierra



Mejoramiento con material petreo



Material de subbase clase 3



Material base granular agregados



Transporte de material petreo



Transporte de material subbase clase 3



Transporte de material base granular



Cinta de peligro colores intensos

## 20. INFORME DEL PERSONAL

### Personal técnico del contratista

| No | FUNCIÓN                                  | NOMBRE                                 | NÚMERO DE CÉDULA |
|----|--|--|------------------|
| 1  | SUPERINTENDENTE DE OBRA                  | ING. MARCO VINICIO TAMAYO MEJIA        | 1600086779       |
| 2  | RESIDENTE DE OBRA 1                      | ING. JONATHAN RODOLFO TORRES TAMAYO    | 1600294852       |
| 3  | RESIDENTE DE OBRA 2                      | ING. LUIS OCTAVIO TIBANTA GUAMÁN       | 1600153132       |
| 4  | TÉCNICO AMBIENTAL                        | ING. EDGAR RAÚL GASPATA CALO           | 1600282295       |
| 5  | TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | ING. WASHINGTON EDUARDO LASCANO COELLO | 1600232332       |
| 6  | TOPÓGRAFO                                | ING. DANIELA ANALIA GOMEZ ZAMBRANO     | 0704073212       |

### Personal en obra

| No | CARGO                  | NOMBRE                             | NÚMERO DE CÉDULA |
|----|------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1  | OPERADOR DE EXCAVADORA | JUAN ISAAC ACERO UMAQUINGA         | 1720483609       |
| 2  | CHOFER DE VOLQUETA     | CARLOS ALEXANDER AMAGUAY CEDEÑO    | 1600786873       |
| 3  | CHOFER DE VOLQUETA     | JOSE ALFREDO AMAGUAY CEDEÑO        | 1312506288       |
| 4  | SECRETARIA             | NUBIA TATHIANA BRAVO CHANGO        | 1600354383       |
| 5  | OPERADOR DE EXCAVADORA | JOSE AUGUSTO CHASIPANTA CHASIPANTA | 0503530610       |
| 6  | OPERADOR DE EXCAVADORA | JOSE PEDRO CHASIPANTA CHASIPANTA   | 0503774580       |
| 7  | MECÁNICO               | AURELIO GREFA CHIMBO               | 1600203267       |
| 8  | CHOFER DE VOLQUETA     | GEREMIAS JOSE GUAMAN CASTILLO      | 0603907080       |
| 9  | INGENIERA AMBIENTAL    | JHESLY SARAY IBARRA RIVERA         | 092286234        |

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03

Oficina 072 785 269

keyszen.sas@gmail.com

www.keyszen.com

Machala – El oro - Ecuador

|    |  |                                    |            |
|----|--|------------------------------------|------------|
| 10 | CHOFER CAMIÓN  | EDWIN HUGO JACOME RODRIGUEZ        | 1600342222 |
| 11 | JEFE DE TALENTO HUMANO                                   | JENNY BEATRIZ JACOME RODRIGUEZ     | 1600267494 |
| 12 | ADMINISTRATIVO   | JENNYFER BRITHNEY MARIN JACOME     | 1600671760 |
| 13 | ADMINISTRATIVO   | KENYA MERY JOSEPH MARIN JACOME     | 1600496770 |
| 14 | ADMINISTRADOR DE CIA<br>AMAZONAS BUILDING<br>AMAZON S.A. | KLEVER JINSOP MARIN MONTERO        | 1600296717 |
| 15 | CHOFER CAMIÓN  | JOSE ALEXANDER MARIN PEREZ         | 1600595876 |
| 16 | ADMINISTRATIVO   | KRISLEY ARIANNA MARIN PEREZ        | 1600695868 |
| 17 | AYUDANTE DE TOPOGRAFÍA                                   | EDGAR JUVENAL MIRANDA AMBI         | 0601716327 |
| 18 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                  | KATTY JESSENIA MONTERO ESPINOSA    | 1600439804 |
| 19 | CHOFER DE VOLQUETA                                       | CARLOS VICENTE MUÑOZ VELASTEGUI    | 1600573032 |
| 20 | ADMINISTRATIVO   | JENNY MARITZA PUNINA CAIZAGUANO    | 1600724809 |
| 21 | OPERADOR<br>MOTONIVELADORA                               | PATRICIO BOLIVAR SOTAMINGA BELTRAN | 1004325641 |
| 22 | OBRERO   | CESAR LUIS TAPUY TAPUY             | 1600177461 |
| 23 | AYUDANTE DE TOPOGRAFÍA                                   | JOSE GREGORIO UGSHA VEGA           | 0500865159 |

## 21. CONCLUSIONES

Esta fiscalización aprueba la presente planilla de avance de obra No. 03, que se encuentra verificada en campo, cumpliendo con los parámetros de acuerdo a la planificación mensual aprobada, por lo que es pertinente continuar con el trámite respectivo.

Hasta la presente fecha de elaboración del informe el desarrollo de la obra se lleva de manera adecuada con la respectiva utilización de los materiales según especificación técnica.

Se ha encontrado en diferentes tramos de la vía intervenida filtraciones de agua subterránea lo que ha dificultado la estabilización de la misma, por lo que ha conllevado a **mejorar la** estructura, mediante encauzamiento con la finalidad que no se produzcan asentamientos.

## 22. RECOMENDACIONES

Se **deberá** dar estricto cumplimiento de la normativa establecida por el Ministerio de ~~Medio Ambiente (MAE)~~ y el ~~Departamento de Gestión Ambiental del CADPPZ~~.

Mantener el número de trabajadores, equipo mínimo y personal técnico en los diferentes frentes de trabajo para mantener el avance conforme el cronograma.

## 23. BIBLIOGRAFÍA

Weatherspark. (abril de 2023). *Weatherspark*. Obtenido de <https://es.weatherspark.com/m/20022/4/Tiempo-promedio-en-abril-en-Puyo-Ecuador#:~:text=El%20tiempo%20en%20abril%20en,o%20exceden%2021%20C%2%B0C>.

## 24. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME

Aprobado por:

Elaborado por:



Ing. Danny Duran  
C.C. 0703997627  
Director de Fiscalización



Ing. Ricardo Carpio  
C.C. 0706553500  
Residente

Atentamente,



Ing. Jessica Jaramillo  
C.C. 0704239128  
Gerente General  
KEYSZEN S.A.S.  
RUC 0791840462001

**KEYSZEN**   
INGENIERIA & CONSTRUCCION  
Machala - El Oro - Ecuador

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
Oficina 072 785 269  
keyszen.sas@gmail.com  
www.keyszen.com  
Machala – El oro - Ecuador



**MAZONAS BUILDING S.A.**


Puyo - Pastaza - Ecuador

# LIBRO

# DE OBRA

"ASFALTADO DE LA VIACURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO  
12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"





PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 01 Mes 04 Año 2023

Trabajos realizados: - Desbroce, desbosque y limpieza Abi: 3+000 Abf: 3+050

- Excavación sin clasificar (cajeras) - Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada, regada) Abi: 3+000 Abf: 3+070

- Desbroce, desbosque y limpieza Sector Vía Curaray Abi: 0+000 Abf: 0+050 - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Nublado TARDE: Lluvioso NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| VOLQUETA                     | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativas a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

AMAZONAS BUILDING

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

KEYSEN S.A.S.



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 02 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Desbroce, desbosque y limpieza Jatunpaccha Abi: 3+050 Abf: 3+100 y  
Via Curaray Abi: 0+050 Abf: 0+125  
- Excavación sin clasificar (cajeras) - Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)  
Abi: 3+050 Abf: 3+100 - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvioso TARDE: Lluvioso NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MÁQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| VOLQUETA                     | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a trámites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 03 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Desbroce, desbosque y limpieza Jatunpaccha Abi: 3+100 Abf: 3+200 y Curaray  
 Abi: 0+125, Abf: 0+175 - Excavación sin clasificar (cajeras) en Jatunpaccha  
 - Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada) - Replanteo y nivelación  
 Abi: 3+100 Abf: 3+200

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvioso TARDE: Lluvioso NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LMO       | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| VOLQUETA                     | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 04 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Desbroce, desbosque y limpieza Jatunpaccha Abi: 3+200 AbF: 3+300  
 Curaray Abi: 0+175 Abf: 0+240 - Excavación sin darificar (cajitas) en Jatunpaccha  
 - Material pétreo de mejoramiento (minado, cargado y regado) Abi: 3+200 AbF: 3+260  
 - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Nublado TARDE: Soleado NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MARCA/QUINA                  | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| VOLQUETA                     | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

  
 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

  
 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 05 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Desbroce, desbosque y limpieza Curaray Abi: 0+240 Abf: 0+300  
 - Excavación sin clasificar (cajeras) - Material pétreo de mejoramiento (minado, cargado, regado)  
 Ai: 3+260 Abf: 3+300 - Replanta y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado TARDE: Lluvia fuerte NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MARCA                        | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGRIGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| VOLQUETA                     | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFIA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 06 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Desbaste, desbaste y limpieza Jatunpaccha Abi: 3+300 Abf: 3+340 Curaray  
 Abi: 0+300 Abf: 0+320  
 - Visita técnica de autoridades competentes y comunidad  
 - Colocación cinta peligro colores intensos

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

Se solicita a Fiscalización se autorice realizar los rubros correspondientes hasta llegar al puente de Jatunpaccha (rubros existentes en el contrato vigente) y por pedido de la Comunidad y el Presidente del GAD Parroquial de la 10 de Agosto Sr. Wellington Velásquez

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvia fuerte TARDE: Lluvia fuerte NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBORE | 1  | TOPOGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| VOLQUETA                     | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 07 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Desbroce, desdique y limpieza Jatunpaccha Abi: 3+340 Abf: 3+380 Curaray se renueva vegetación. - Excava con sin clasificar (conejeras) - Material péreo de mejoramiento (mindra, cargada y regada) Abi: 3+300 Abf: 3+340 - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvioso TARDE: Lluvioso NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINARIA                   | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| VOLQUETA                     | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

Fiscalización autoriza que se continúe con los trabajos de construcción del proyecto hasta el puente de Jatunpaccha, correspondiente a la abscisa 3+445.

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 08 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Desbroce, desbosque y limpieza Jatunpaccha Abi: 3+380 Abf: 3+445  
 - Excavación sin clasificación (cajeras) - Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada) Abi: 3+340 Abf: 3+365 - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado TARDE: Lluvioso NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| VOLQUETA                     | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

  
 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

  
 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 09 Mes 04 Año 2023

Trabajos para el contratista  
 TRABAJOS REALIZADOS: - Excavación sin clasificar (cajas) - Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada) Abi: 3+365 Abf: 3+390 - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvia fuerte TARDE: Lluvia fuerte NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MÁQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| VOLQUETA                     | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a trámites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

  
 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

  
 CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA,HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADODELAVIACURARAY-FRANCISCOORELLANA-JATUNPACCHA, HASTAELKM12VIA10DEAGOSTO-ELTRIUNFOCANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 10 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Excavación sin clasificar - Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regala) Abi: 3+390 Alf: 3+415 - Reglanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Nublado TARDE: Lluvioso NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | 1  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| VOLQUETA                     | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

  
CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

  
CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 11 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Excavación sin clasificar - Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada) Abi: 3+415 Abf: 3+445 - Replanteo y nivelación.

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvioso TARDE: Lluvia fuerte NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| VOLQUETA                     | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 12 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Material de Subbase clase 3 (descarga - compactada) Asi: 3+445  
 Abf: 3+325 en Jatunpaccha - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Nublado TARDE: Soleado NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCALA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| VOLQUETA                     | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 13 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Material de subbase clase 3 (descarga - compactada) Abi = 3+325  
 ADF: 3+215 en Jatunpaccha - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Nublado TARDE: Soleado NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCALA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| VOLQUETA                     | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFIA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativas a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 14 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Material de subbase clase 3 (descarga - compactada) en Jatunpacha

Abi: 3+215 Abf: 3+095 - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvia fuerte TARDE: Lluvia fuerte NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| VOLQUETA                     | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

  
CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

  
CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 15 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Material de subbase clase 3 (descarga - compactado) Jatunpaccha

Ab: 3+095 ABF: 2+975 - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Nublado TARDE: Nublado NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | 1  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| VOLQUETA                     | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFIA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

  
CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

  
CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 16 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRabajos REALIZADOS: - Material de subbase clase 3 (descarga compactado) Jatunpacha

At: 2+975 Abf: 2+855 - Reglanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado TARDE: Soleado NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | 1  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| VOLQUETA                     | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

  
CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

  
CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 17 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Material de subbase clase 3 (descarga - compactado) Jatunpaccha

Ab: 2+855 Abf: 2+745 - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Nublado TARDE: Lluvia fuerte NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCALA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| VOLQUETA                     | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 18 Mes 04 Año 2023

Trabajos realizados: - Material de subbase clase 3 (descarga - compactado) *Fuente piedra*  
 A1: 2+745 A1F: 2+635 - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: *Nublado* TARDE: *Soleado* NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MARCA                        | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | -  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| VOLQUETA                     | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 19 Mes 04 Año 2023

Trabajos realizados: - Material de subbase clase 3 (descarga - compactada) Jatunpaccha  
 Abi: 2+635 Abf: 2+530 - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvioso TARDE: Soleado NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MÁQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGRÉGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| VOLQUETA                     | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 20 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Material de subbase clase 3 (descarga - compactado) Jatunpaccha

Abi: 2+530 Abf: 2+410 - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: *lluvia fuerte* TARDE: *lluvia fuerte* NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| VOLQUETA                     | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 21 Mes 04 Año 2023

Trabajos realizados: - Material de subbase clase 3 (descarga - compactado) Jatunpaccha

Abi: 2+410 Abf: 2+300 - Reglanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvioso TARDE: Lluvioso NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO              |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|-------------------------------|----|----------------------|----|
| MÁQUINA                       | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                       | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS       | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA               | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                     | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA                | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR   | 1  | TOPOGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO       | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO PNEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                      | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA               | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO        | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO       | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS     | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO     | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA            | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO             | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO       | -  |                      |    |
| VOLQUETA                      | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                   | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                 | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA        | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO             | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 22 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Material de subbase clase 3 (descarga - compactado) Jatunpaccha  
Abi: 2+300 Abf: 2+180 - Reglanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvioso TARDE: Lluvioso NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| EQUIPO                       | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| VOLQUETA                     | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 23 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Material de subbase clase 3 (tesuaga-compactada) Jatunpaccha

Abi: 2+100 Abf: 2+060 - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Nublado TARDE: Lluvioso NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MARCA/QUANTIDAD              | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| VOLQUETA                     | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

  
CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

  
CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Manto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 24 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Material de base granular de agregados en Jatunpaccha Abi: 3+445 AbF: 3+215

- Excavación sin clasificar (cajeras) - Material pietro de mejoramiento (minado, cargado y regalado) en Curaray Abi: 0+000 AbF: 0+080 - Replanteo y nivelación

- Colocación cinta peligro colores intensos

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado TARDE: Lluvia fuerte NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINARIA                   | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | 1  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| VOLQUETA                     | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFIA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 25 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Material de base granular de agregados en Jatunpaccha Abi: 3+215 Abf: 2+965  
- Excavación sin clasificar (cajeras) - Material de mejoramiento (minada, cargada y regada) en Curaray Abi: 0+080 Abf: 0+140 - Replantes y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Nublado TARDE: Lluvioso NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MARCA                        | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTÓNIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| VOLQUETA                     | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 26 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Material de base granular de agregados en Jatunpaccha Abi: 2+965 Abf: 2+755  
 - Excavación sin clasificar - Material pétreo de mejoramiento (minado, cargado y regalado) en Curaray  
 Abi: 0+140 Abf: 0+180 - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvioso TARDE: Lluvioso NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| VOLQUETA                     | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

  
CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

  
CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23      FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 27      Mes 04      Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Material de base granular de agregados Jatunpaccha Abi: 2+755 Abf: 2+525  
 - Excavación sin clasificar - Material pétreo de mejoramiento (minado, cargado y regalé) en Curaray  
 Abi: 0+180 Abf: 0+200 - Reglanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvioso      TARDE: Soleado      NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MÁQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| VOLQUETA                     | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a trámites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 28 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Material de base granular de agregados en Jatunpaccha Abi: 2+525 Abf: 2+310  
 - Excavación sin clasificar (cajeral) - Material pétreo de mejoramiento (minado, cargado y regado) en Curaray Abf: 0+200 Abf: 0+240 - Replantes y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: lluvioso TARDE: Soleado NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MARCA/QUANTIDAD              | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCALA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| VOLQUETA                     | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a trámites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

  
CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

  
CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIACURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 29 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Material de base granular de agregados Jatunpaccha Abi: 2+310 Abf: 2+060

- Excavación sin clasificar - Material pedregoso de mejoramiento (minada, cargada y regada) en Curaray Abi: 0+240 Abf: 0+300 - Replanteo y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado TARDE: Soleado NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPÓGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| VOLQUETA                     | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFÍA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

  
CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

  
CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)



PROYECTO : ASFALTADO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBJETO DEL CONTRATO : ASFALTADO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN : PROVINCIA PASTAZA

CONTRATISTA : CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

CONTRATO : Monto USD 4 650 521.23

FISCALIZADOR : KEYSZEN S.A.S

FECHA DE REPORTE N : Día 30 Mes 04 Año 2023

Espacio para el contratista

TRABAJOS REALIZADOS: - Material de base granular de agregados (regado y compactado) en Ah = 2+060

- Excavación sin elasticar (cajeras) - Material porteo de mejoramiento (minada, cargada y regada)

Curaray Abi: 0+300 Abf: 0+340 - Regantes y nivelación

NOTA: (novedades, consultas, sugerencias, pedido)

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado TARDE: Lluvioso NOCHE:

| EQUIPO UTILIZADO             |    | PERSONAL UTILIZADO   |    |
|------------------------------|----|----------------------|----|
| MAQUINA                      | No | CARGO                | No |
| TRACTOR                      | -  | SUPERINTENDENTE      | 1  |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS      | 3  | RESIDENTE            | 2  |
| CAMIÓN CISTERNA              | 1  | Ingeniero ambiental  | 1  |
| CARGADORA                    | -  | Técnico en seguridad | 1  |
| MOTONIVELADORA               | 1  | ING. AYUDANTE        | 1  |
| RODILLO TANDEN DOBLE TAMBOR  | 1  | TOPOGRAFO            | 1  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO      | 1  | CADENERO             | 2  |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMÁTICO | 1  | OPERADORES           | 6  |
| TANQUERO                     | 1  | CHOFERES             | 5  |
| ESCABA MECÁNICA              | -  | MECÁNICO             | 1  |
| TERMINADORA DE ASFALTO       | 1  | AYUDANTE DE MECÁNICO | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO      | 1  | INSPECTORES          | 1  |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS    | -  | ALBAÑILES            | -  |
| RECUPERADORA DE PAVIMENTO    | -  | SOLDADORES           | 1  |
| PLANTA TRITURADORA           | 1  | JORNALEROS           | 4  |
| PLANTA DE ASFALTO            | 1  |                      |    |
| TERMINADORA DE CONCRETO      | -  |                      |    |
| VOLQUETA                     | 5  |                      |    |
| CARRO MIXER                  | 1  |                      |    |
| MINICARGADORA                | 1  |                      |    |
| APARATOS DE TOPOGRAFIA       | 1  |                      |    |
| CONCRETERA 1 SACO            | 2  |                      |    |

Espacio para la fiscalización

INSTRUCCIONES: (relativos a tramites, procedimientos de trabajo o aclaraciones de especificaciones, etc.)

AUTORIZACIONES: (trabajos específicos puntuales o fuera de contrato. - se ratifica mediante comunicación)

OBSERVACIONES: (problemas presentados sobre trabajos ejecutados, control de calidad, diseño, equipos, etc.)

VISITA AL PROYECTO Y DISPOSICIONES: (autoridad, gobiernos provinciales, gobierno parroquial, organismos de control, etc.)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)

CONTRATISTA (NOMBRE Y FIRMA)




**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

# ANEXOS

# FOTOGRAFICOS

"ASFALTADO DE LA VIACURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO  
12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"



**Desbroce, desbosque y limpieza**



**Replanteo y nivelación a nivel de asfalto**






**Excavación sin clasificar (mov. de tierra)**



**Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)**

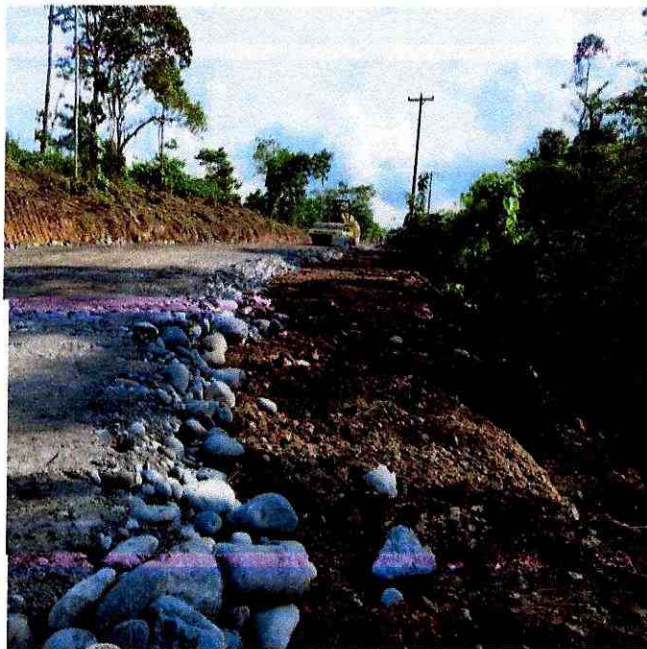


**Material de subbase clase 3**




**Material de base granular de agregados**



**Transporte de material pétreo de mejoramiento**

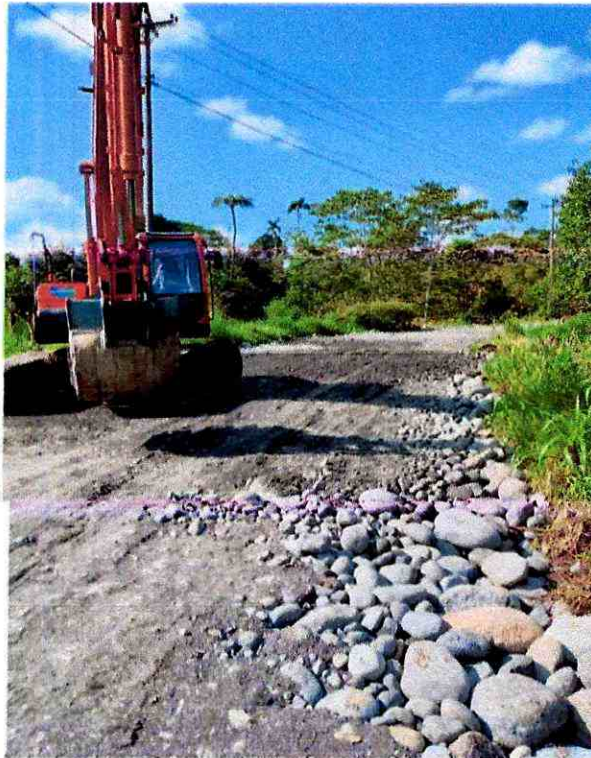

Transporte de material pétreo de subbase clase 3

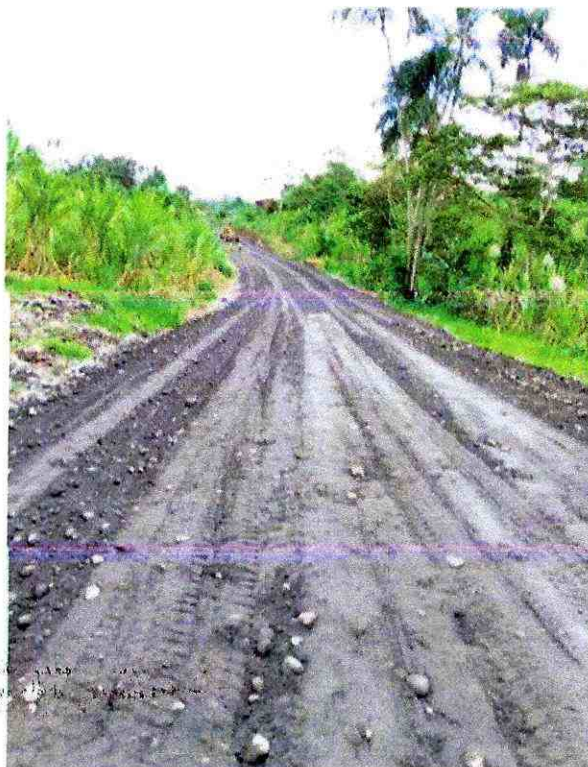

**Transporte de material pétreo de base granular de agregados**



**Cinta peligro colores intensos (mat. Polietileno)**






**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

**PLANILLA**

**PAGO IESS**

"ASFALTADO DE LA VIACURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO  
12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"





# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

mayo 08 del 2023 10:18

GUEVARA MARIN ODILO VINICIO

## DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

No. Comprobante: 0000000170126933

|                                       |   |                            |             |            |
|---------------------------------------|---|----------------------------|-------------|------------|
| Concepto:                             | PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,   |                            | Emitido en: | 2023-05-08 |
| No. RUC / REGISTRO:                   | 1691710080001 - 0001  | Fecha de Vigencia de Pago: | 2023-05-15  |            |
| Nombre / Razón Social / Organización: | AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. - AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. |                            |             |            |
| Periodo de Pago:                      | 2023 - 04   |                            |             |            |
| Forma de pago:                        | Fondos propios  |                            |             |            |
| Observación:                          |   |                            |             |            |

### PERIODOS

| PERIODO  | TIPO | RT | TP | REG. | SUELDO   | VALOR   | TIEMPO PARCIAL |
|----------|------|----|----|------|----------|---------|----------------|
| 2023 - 4 | M    | 06 | A  | 22   | 11138.92 | 2294.63 | 0.00           |
|          |      |    |    |      | 11138.92 | 2294.63 | 0.00           |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Valor                           | 2406.03 |
| Intereses por mora (+)          | 0.00    |
| Seguro Salud Tiempo Parcial (+) | 0.00    |
| Honorarios Abogado (+)          | 0.00    |
| Gastos Administrativos (+)      | 0.00    |
| Subtotal (=)                    | 2406.03 |
| Notas de Crédito (-)            | 0.00    |
| Total (=)                       | 2406.03 |

### Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

\*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

\*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

\*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Los comprobantes de pago con remisión de intereses por conceptos de: Planillas, Glosas, Títulos de Crédito, Acuerdos Pagos Parciales o Convenios de Purga de Mora que no fueron cancelados hasta la fecha de su vencimiento, seguirán las acciones de cobro previstas en la normativa vigente. LOS APORTES CANCELADOS CON REMISIÓN DE INTERESES SI OCASIONARÁN RESPONSABILIDAD PATRONAL.

Imprimir

Conf Impresora

### Servipagos - Pago Ágil

OFICINA: IESS RECAUDACION EN LINEA  
CAJA: CANAL WEB COOP CREA  
DIRECCION: AGENCIA PUYO  
CAJERO: AV SIMON BOLIVAR Y VIA A NAYON  
FECHA: ZAMBRANO BASTIDAS KEVLA ESTEFANNY  
CUIDADO: 2023-05-09 15:17:21  
3290292044

Identificación: 1991710090001  
Razón Social: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
No. Comprobante: 0000000170126933  
Tipo de Comprobante: PLANI  
Periodo: 202304  
Monto Comprobante: \$2406.03

Fecha: 2023-05-09 15:17:21  
Efectivo: \$ 2406.03  
Comisión: \$ 0.57  
Total: \$ 2406.60

\*\*\* ORIGINAL - CLIENTE \*\*\*  
\*\*\* GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\*

Factura N°: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA  
Matriz: 001-041-000260409  
Clave de acceso: AV SIMON BOLIVAR Y VIA A NAYON  
Ambiente: 0905202301179139824600120 0104100026040909151  
Emisión: PRODUCCION  
Ruc: NORMAL  
Código cliente: 1791398246001  
Contrib Esp Resol.No: 00155

#### COMISIÓN POR SERVICIOS

Forma de Pago: EFECTIVO  
Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
Ruc Cliente: 9999999999999999  
Oficina: CANAL WEB COOP CREA  
Cajero: ZAMBRANO BASTIDAS KEVLA ESTEFANNY  
Fecha Transacción: 2023-05-09 15:17:21  
Comisión: \$ 0.51  
Iva 12 %: \$ 0.06  
Comisión Total: \$ 0.57

LA FACTURA SERÁ EL ÚNICO COMPROBANTE VÁLIDO PARA EFECTUAR CUA  
RECLAMO

\*\*\* GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\*



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

mayo 08 del 2023 10:18

GUEVARA MARIN ODILO VINICIO

## DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

No. Comprobante: 0000000170126936

|                                       |   |                            |            |
|---------------------------------------|---|----------------------------|------------|
| Concepto:                             | PAGO DE PLANILLAS - AJUSTES,  | Emitido en:                | 2023-05-08 |
| No. RUC / REGISTRO:                   | 1691710080001 - 0001  | Fecha de Vigencia de Pago: | 2023-05-15 |
| Nombre / Razón Social / Organización: | AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. - AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. |                            |            |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Periodo de Pago: | 2023 - 04      |
| Forma de pago:   | Fondos propios |
| Observación:     |                |

| PERIODOS |      |    |    |      |         |        |                |  |
|----------|------|----|----|------|---------|--------|----------------|--|
| PERIODO  | TIPO | RT | TP | REG. | SUELDO  | VALOR  | TIEMPO PARCIAL |  |
| 2023 - 4 | M    | 06 | AA | 13   | 2452.61 | 505.25 | 0.00           |  |
|          |      |    |    |      | 2452.61 | 505.25 | 0.00           |  |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Valor                           | 529.76 |
| Intereses por mora (+)          | 0.00   |
| Seguro Salud Tiempo Parcial (+) | 0.00   |
| Honorarios Abogado (+)          | 0.00   |
| Gastos Administrativos (+)      | 0.00   |
| Subtotal (=)                    | 529.76 |
| Notas de Crédito (-)            | 0.00   |
| Total (=)                       | 529.76 |

### Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

\*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

\*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

\*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Quando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADQ y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Los comprobantes de pago con remisión de intereses por conceptos de: Planillas, Glosas, Títulos de Crédito, Acuerdos Pagos Parciales o Convenios de Purga de Mora que no fueron cancelados hasta la fecha de su vencimiento, seguirán las acciones de cobro previstas en la normativa vigente. LOS APORTES CANCELADOS CON REMISIÓN DE INTERESES SI OCASIONARÁN RESPONSABILIDAD PATRONAL.



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

junio 06 del 2023 10:14

GUEVARA MARIN ODILO VINICIO

## DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2023-05-09))

(BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO)

No. Comprobante: 0000000170126936

|                                       |   |                            |            |
|---------------------------------------|---|----------------------------|------------|
| Concepto:                             | PAGO DE PLANILLAS - AJUSTES,  | Emitido en:                | 2023-05-08 |
| No. RUC / REGISTRO:                   | 1691710080001 - 0001  | Fecha de Vigencia de Pago: | 2023-05-15 |
| Nombre / Razón Social / Organización: | AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. - AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. |                            |            |
| Periodo de Pago:                      | 2023 - 04   |                            |            |
| Forma de pago:                        | Fondos propios  |                            |            |
| Observación:                          |   |                            |            |

### AFILIADOS

| PERIODO  | RT | CEDULA     | NOMBRE                             | SUELDO  | DIAS | OBS. | VALOR  | TIEMPO PARCIAL |
|----------|----|------------|------------------------------------|---------|------|------|--------|----------------|
| 2023 - 4 | 06 | 1720483609 | ACERO UMAQUINGA JUAN ISAAC         | 143.84  | 0    | INS  | 29.63  | 0.00           |
| 2023 - 4 | 06 | 1600786873 | AMAGUAY CEDEÑO CARLOS ALEXANDER    | 250.27  | 0    | INS  | 51.56  | 0.00           |
| 2023 - 4 | 06 | 0503530610 | CHASIPANTA CHASIPANTA JOSE AUGUSTO | 174.00  | 0    | INS  | 35.84  | 0.00           |
| 2023 - 4 | 06 | 1600203267 | GREFA CHIMBO AURELIO               | 133.29  | 0    | INS  | 27.46  | 0.00           |
| 2023 - 4 | 06 | 0603907080 | GUAMAN CASTILLO GEREMIAS JOSE      | 126.94  | 0    | INS  | 26.15  | 0.00           |
| 2023 - 4 | 06 | 1600267494 | JACOME RODRIGUEZ JENNY BEATRIZ     | 420.94  | 0    | INS  | 86.71  | 0.00           |
| 2023 - 4 | 06 | 1600296717 | MARIN MONTERO KLEVER JINSOP        | 302.19  | 0    | INS  | 62.25  | 0.00           |
| 2023 - 4 | 06 | 2100210505 | MESTANZA LEON JORGE DAVID          | 9.56    | 0    | INS  | 1.97   | 0.00           |
| 2023 - 4 | 06 | 0601716327 | MIRANDA AMBI EDGAR JUVENAL         | 60.42   | 0    | INS  | 12.45  | 0.00           |
| 2023 - 4 | 06 | 1600573032 | MUÑOZ VELASTEGUI CARLOS VICENTE    | 256.40  | 0    | INS  | 52.82  | 0.00           |
| 2023 - 4 | 06 | 1600724809 | PUNINA CAIZAGUANO JENNY MARITZA    | 77.46   | 0    | INS  | 15.96  | 0.00           |
| 2023 - 4 | 06 | 1004325641 | SOTAMINGA BELTRAN PATRICIO BOLIVAR | 436.88  | 0    | INS  | 90.00  | 0.00           |
| 2023 - 4 | 06 | 0500865159 | UGSHA VEGA JOSE GREGORIO           | 60.42   | 0    | INS  | 12.45  | 0.00           |
|          |    |            |                                    | 2452.61 |      |      | 505.25 | 0.00           |



|  |               |
|--|---------------|
|  |               |
|  |               |
| <b>Seguro Salud Tiempo Parcial (+)</b> | 0.00          |
| <b>Honorarios Abogado (+)</b>          | 0.00          |
| <b>Gastos Administrativos (+)</b>      | 0.00          |
|  |               |
| <b>= de Crédito (-)</b>                |               |
|  | <b>529.76</b> |

### Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

\*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

\*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmege

\*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



Imprimir

Conf Impresora

### Servipagos - Pago Ágil

OFICINA: IESS RECAUDACION EN LINEA  
CAJA: CANAL WEB COOP CREA  
DIRECCION: AGENCIA PUNO  
CAJERO: AV. SIMON BOLIVAR Y VIA A NAYON  
FECHA: ZAMBRANO BASTIDAS KEVLA ESTEFANNY  
2023-05-09 15:17:49  
CODIGO: 2290292063

Identificación: 1691710080001  
Razón Social: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
No. Comprobante: 0000000170126936  
Tipo de Comprobante: PLANI  
Periodo: 202304  
Monto Comprobante: \$ 529.76

Fecha: 2023-05-09 15:17:49  
Efectivo: \$ 529.76  
Comisión: \$ 0.57  
Total: \$ 530.33

\*\*\* ORIGINAL - CLIENTE \*\*\*  
\*\*\* GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\*

Factura N°: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA  
Matriz: 001-041-000280410  
Clave de acceso: AV. SIMON BOLIVAR Y VIA A NAYON  
0905202301179139824600180 0104100026041009151  
Ambiente: PRODUCCION  
Emision: NORMAL  
Ruc: 1791398246001  
Contribuyente: Contrib Esp Resol No 00155

Forma de Pago: COMISIÓN POR SERVICIOS  
EFFECTIVO  
Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
Ruc Cliente: 99999999999999

Oficina: CANAL WEB COOP CREA  
Cajero: ZAMBRANO BASTIDAS KEVLA ESTEFANNY  
Fecha Transacción: 2023-05-09 15:17:49

Comisión: \$ 0.51  
Iva 12 %: \$ 0.06  
Comisión Total: \$ 0.57

LA FACTURA SERA EL ÚNICO COMPROBANTE VALIDO PARA EFECTUAR CUA  
RECLAMO

\*\*\* GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\*

## POLIZA DE SEGURO DE FIANZAS PUBLICO

ASEGURADORA DEL SUR C.A. en adelante "La Aseguradora" en virtud de la solicitud de seguro presentada por el interesado, que en adelante se denomina "El Afianzado o Contratista", y que forma parte integrante de ese contrato, se obliga a indemnizar al Asegurado, por las razones previstas en este contrato, de acuerdo a las condiciones generales, aprobadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con Resolución N°. SCVS-16-27-PR-1-123004418-22052020 del 22 de mayo de 2020 y sus reformas, teniendo preferencia las últimas sobre las primeras.

Emitido en: AMBATO

Emisión: 02/06/2023

Agente: 16917279

| RAMO                          |                    | PÓLIZA NÚMERO     | SUMA ASEGURADA |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO |                    | 1142619           | 232.536,06     |
| VIGENCIA DEL DOCUMENTO        |                    | TIPO DE DOCUMENTO |                |
| DESDE LAS 00:00 DE            | HASTA LAS 24:00 DE | PLAZO             | RENOVACION     |
| 05/06/2023                    | 02/12/2023         | 180               | 2              |

|  |                                |               |
|--|--------------------------------|---------------|
| <b>EL AFIANZADO O CONTRATISTA:</b> AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S A |                                | 1691710080001 |
| <b>DIRECCIÓN:</b>  | LUIS MOLINA SN ,Dpto. , Piso0, |               |
| <b>TELÉFONOS:</b>  | 0 032861348                    | 0999813185    |

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| <b>EL ASEGURADO:</b> GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA |  | 1660000170001 |
| <b>DIRECCIÓN:</b>  | PASTAZA / PUYO / FRANCISCO DE ORELLANA 739 Y 27 DE FEBRERO |               |
| <b>TELÉFONOS:</b>  | 0 032885381  | 0999123457    |

**OBJETO DEL CONTRATO:**

ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, SEGÚN PROCESO No. LICO-GADPPz-006-2022

| PRIMA    | IMPUESTOS Y OTROS | TOTAL CONTADO |
|----------|-------------------|---------------|
| 4.357,66 | 728,22            | 5.085,88      |

**ESTE FOMULARIO ES UN AVISO DE COBRO**

Mediante esta póliza de seguro incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, según la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, Aseguradora del Sur C.A. se obliga a favor del Beneficiario de esta póliza por los perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación afianzada hasta el monto estipulado como suma asegurada que le ocasiona el afianzado, en caso de terminación del contrato. Esta póliza podrá ser renovada mediante petición escrita del Afianzado o Asegurado. Transcurrido el plazo/vigencia, la presente póliza quedará automáticamente caduca, cesando de hecho toda responsabilidad de la compañía aún en el caso de que no fuera devuelto el original de la misma.

En testimonio de lo acordado se firma este contrato en: AMBATO a 2 DE JUNIO DE 2023

**EL ASEGURADO**

**EL CONTRATISTA**

**LA ASEGURADORA**



RODILLO VINICIO  
GUEVARA MARIN



Digitally signed by  
RODRIGO CEVALLOS  
GUEVARA  
Date: 2023.06.02  
11:24:55 -05:00  
Reason: Firma  
Electrónica  
Location: Aseguradora  
del Sur

**ORIGINAL**

|  |  |  |  |   |  |   |
|--|--|--|--|---|--|---|
| <b>MATRIZ QUITO</b><br>TELS:(02)2997500<br>FAX:(02)2997553 -<br>2997588<br><b>CUENCA</b><br>TELS:(07)2819721 - | <b>IBARRA</b><br>TELS:(06)640920<br><b>LOJA</b><br>TELS:(07)507677<br>FAX:(07)560995 | <b>PORTOVIEJO</b><br>TELS:(05)632647<br>FAX:(05)632669 | <b>MANTA</b><br>TELS:(05)625751/626503<br>FAX:(05)623483 | <b>AMBATO</b><br>TELS:(03)829299/828211<br>FAX:(03)828534 | <b>RIOBAMBA</b><br>TELS:(03)941063<br>FAX:(03)965040 | <b>MACHALA</b><br>TELS:<br>(07)2985563<br>FAX:<br>(07)2985561 |
|--|--|--|--|---|--|---|

## CONDICIONES DE LA PÓLIZA N° 1142619

RAMO: CUMPLIMIENTO DE CO  
 MONEDA: DÓLARES  
 LUGAR Y FECHA: AMBATO, Noviembre 1 de 2022

VIGENCIA DE LA POLIZA DESDE: 05/06/2023 HASTA: 02/12/2023

VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE: HASTA:

LAS 00:01 H

LAS 24:00 H (Local)

ASEGURADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL TLF: 0 032885381

Cel: 0999123457

DIRECCIÓN: PASTAZA / PUYO / FRANCISCO DE ORELLANA 739 Y 27 DE FEBRERO

## FIANZAS

| COBERTURAS CONTRATADAS        | Sumas Aseguradas hasta: USD | Deducible:<br>Aplica el mayor de los tres |                      |            |
|-------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|
|                               |                             | % Suma Asegurada                          | % Valor de Siniestro | Mínimo USD |
| Fiel Cumplimiento de Contrato | 232.536,06                  |   |                      |            |

## DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

El(La) asegurado(a) y/o el(la) solicitante declara libre y voluntariamente, que el seguro solicitado a Aseguradora del Sur C.A., ampara bienes, garantías y contratos de procedencia lícita, los mismos que no están ligados con actividades de Narcotráfico, Lavado de Activos o Financiamiento del Terrorismo. Igualmente, declara que los fondos con los cuales se pagará la prima correspondiente a este contrato de seguros tienen origen lícito y no guardan ninguna relación con las actividades mencionadas anteriormente.

## AUTORIZACIÓN

Siendo conocedor de las disposiciones legales para la Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, autorizo expresamente en forma libre, voluntaria e irrevocable a Aseguradora del Sur C.A. a realizar el análisis y las verificaciones que considere necesarias para corroborar la licitud de fondos y bienes comprendidos en el contrato de seguro; así como autorizo expresa, voluntaria e irrevocablemente a todas las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado a facilitar a Aseguradora del Sur C.A. toda la información que ésta les requiera, inclusive autorizo anticipadamente el levantamiento del sigilo o velo bancario en caso de ser necesario, incluido la revisión de los buró de crédito sobre mi información de riesgos crediticios.

<https://fms.aseguradoradelsur.com/asegsur/v1/fms/uploads/bedc194c-76f0-4390-b851-44b0fbc0f318.pdf>

## Direcciones:

Matriz Quito: Av. De Los Naranjos y De Las Azucenas (02) 2997-500 / Fax: (02)2467-983. Sucursal Ambato: Av. Rodrigo Pachano 13-109 y Juan Montalvo. Sector Ficoa (03)2828-211 / (03)2828-213 / (03) 2629-299. Sucursal Francisco Orellana (Coca): Calle Quito entre Guayaquil y Jorge Rodríguez (06)2883-276 / (06)2881-511. Sucursal Cuenca: Feder Proaño 365 y Honorato de Loyola, a dos cuadras de Pizza Hut. (07)2819-721 / (07)2819-964. Sucursal Ibarra: Victoria Cast Chiriboga 657 y Galo Plaza Lasso, atrás del C.C. La Plaza (06) 2630-920 / (06)2630-868. Sucursal Loja: Av. Av. Orillas Zamora y Segundo Puertas Moreno (07)2560-991 / (07)2587-677. Sucursal Machala: Av. 25 de Junio Km 2 1/2, vía a Pas: Urbanización Ciudad del Sol Mz. L1 (07)279-7087 / (07)279-7089 / 099 844 5197. Sucursal Manta: Calle M1 entre las calles y 24, diagonal al Hotel Oro Verde Manta, edificio 'Manta Business Center', planta baja. (05)2625 -751 / (05)2626-50: (05)2626-052. Sucursal Portoviejo: Av. Manabí y Granda Centeno, frente a la pista del aeropuerto (05)2563-494 / (05)2563-33 / (05)2563-508. Sucursal Riobamba: Uruguay 21-50 y Av. Daniel León Borja (03)2942-830 / (03)2941-063. Sucursal Sa Domingo: Av. Los Naranjos S/N y Av. Quito, 3er piso (frente al SRI). (02)2751-377 / (02)2762-006. Sucursal Guayaquil: Urde Circunvalación Sur #304 y Todos los Santos. (04)501-3050.

Línea de atención al cliente: teléfono: (02) 2997500 / (09)9555-3333.

Página web de la compañía: [www.aseguradoradelsur.com](http://www.aseguradoradelsur.com) <<http://www.aseguradoradelsur.com>>

Dirección de correo electrónico de contacto: [contacto@asur.ec](mailto:contacto@asur.ec) <[mailto:contacto@asur.ec](mailto:mailto:contacto@asur.ec)>

ORIGINAL



# AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING  
RUC. 1691710080001

## CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

En la ciudad de Puyo, el 01 día del mes de diciembre del 2022, comparecen a la suscripción del presente Contrato, por una parte, en calidad de INGENIERO CIVIL el Ing. JONATHAN RODOLFO TORRES TAMAYO C.I. 160029485-2 y, por otra, parte el señor Odilo Vinicio Guevara Marín en calidad de representante legal de la Compañía AMAZONAS BUILDING S.A con Ruc 1691710080001, quienes en forma libre y voluntaria convienen en celebrar el presente contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, contenido en las siguientes cláusulas

### Cláusula Primera. - ANTECEDENTES

El día 7 de noviembre del 2022, La Compañía Amazonas Building suscribe un contrato con el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA para la ejecución de la Obra denominada ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

### Cláusula Segunda. - OBJETO DEL CONTRATO

La compañía contrata al Ing. Jonathan Rodolfo Torres Tamayo, el mismo que prestará sus servicios de manera autónoma e independiente a la compañía, encargándose del área civil en el proyecto de ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA". tareas que se encuentran dentro de su campo de conocimiento y experiencia" teniendo la capacidad de celebrar el contrato, en virtud de que está familiarizado con la materia indicada en el mismo, en los términos y condiciones.

### Cláusula Tercera. — PLAZO

El plazo del presente contrato es por el tiempo que dure la ejecución de la obra, (aproximadamente 18 meses) a partir de la suscripción del presente contrato, pudiendo prorrogarse, si las partes así lo convienen, solo podrá extinguirse una vez que las labores materia del mismo hayan concluido para la COMPAÑIA Es obligación del Ing. Jonathan Rodolfo Torres Tamayo realizar el trabajo contratado, los alcances y aclaraciones que la Compañía solicite, previo al pago.

### Cláusula Cuarta. - OBLIGACIONES DEL CONTRATADO

EL CONTRATADO está obligado y sin perjuicio de lo previsto por las leyes y reglamentos vigentes en el Ecuador a: Encargándose de supervisar que se aplique todas las normas técnicas del proyecto de ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

- Desarrollar con total transparencia, prolijidad y honestidad las tareas allá encomendadas.
- Mantener la confidencialidad de la información y los datos proporcionados por la Compañía.



# AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING

RUC. 1691710080001

- Será responsable del manejo, uso y mantenimiento de los equipos y mobiliario a él entregados,

La compañía se reserva el derecho a intervenir, evaluar y analizar el trabajo realizado por el Ing. Jonathan Rodolfo Torres Tamayo.

Además, un informe mensual de los trabajos civiles realizados en el proyecto **ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**".

## **Cláusula Quinta: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO**

Las partes acuerdan determinar que la COMPAÑÍA cancelara sus honorarios profesionales al TECNICO por la gestión que él asume en el presente Contrato, al finalizar la obra. previa presentación de la factura correspondiente,

## **Cláusula Sexta – DEDUCCIONES**

La compañía deducirá de los honorarios" PROFESIONALES ", las cantidades que correspondan por concepto de impuesto a la Renta (10 %) e Impuesto al Valor Agregado (100%).

## **Cláusula Séptima. – RESPONSABILIDAD**

EL RESIDENTE DE OBRA 1 se obliga a ejecutar el trabajo con profesionalismo, diligencia, prolijidad y cuidados necesarios. Para evitar algún daño, pérdida o deterioro en los bienes de la COMPAÑÍA, por cualquier causa que fuere, "El Técnico se obliga a informar de manera inmediata, para determinar responsabilidades y sanciones a los causantes.

## **Clausula Octava: RELACIÓN CIVIL ENTRE LAS PARTES**

El presente Contrato es de naturaleza civil, sujeto al derecho común y singularmente a las reglas del Mandato. Por tanto, entre la COMPAÑÍA y "EL RESIDENTE DE OBRA" no existe relación laboral o de dependencia alguna, ni, consecuentemente sometimiento al Código del Trabajo y Leyes del Seguro Social Obligatorio. No hay subordinación jurídica ni de ninguna otra especie que pudiera significar relación laboral entre las partes o sus dependientes, puesto que " EL RESIDENTE DE OBRA" prestará sus servicios a la Compañía de manera libre, independiente y autónoma.

## **Clausula Novena: MODIFICACIONES**

Este contrato podrá ser modificado de común acuerdo y por escrito entre las partes contratantes.

## **Clausula Décima: DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO**

El presente contrato podrá darse por terminado en los siguientes casos:

- a) De común acuerdo entre las partes,
- b) Por terminación de su plazo de duración.
- c) Por cualquier causa legalmente establecida.

## **Clausula Décima Primera: DEL PACTO DE CONFIDENCIALIDAD**



# AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING  
RUC. 1691710080001

Toda la información que sea conocida por EL RESIDENTE DE OBRA consecuencia de este Contrato, sin importar su naturaleza y que fuere entregada, comunicada, divulgada o conocida como consecuencia de la ejecución de sus obligaciones bajo este instrumento, es propiedad de la COMPAÑÍA AMAZONAS BUILDING y se encuentra limitada su divulgación a terceros salvo las excepciones previstas en la ley.

## Clausula Décima Segunda: DEL DOMICILIO DE LAS PARTES

Para los efectos legales respectivos, las partes señalan domicilios para citaciones y notificaciones en esta ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, los siguientes.

- a) COMPAÑÍA AMAZONAS BUILDING S.A Avenida Tarqui calle los Laureles
- b) Ing. Jonathan Rodolfo Torres Tamayo, Ciudad Puyo.

## Clausula Décima Tercera: DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Los Contratantes quedan sometidos a los jueces competentes de esta ciudad de Puyo y al trámite previsto por la LEY

## Clausula Décima Cuarta: DE LA ACEPTACIÓN

Los contratantes aceptan el presente contrato en su integridad, para constancia de lo cual lo firman por triplicado, todo en el día y fecha antes anotados.



Firmado electrónicamente por:  
ODILO VINICIO  
GUEVARA MARIN

Sr. Odilo Guevara Marín  
**GERENTE CIA AMAZONAS BUILDING**



Firmado electrónicamente por:  
JONATHAN RODOLFO  
TORRES TAMAYO

Ing. Jonathan Torres  
**RESIDENTE CIVIL**



# AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING  
RUC. 1691710080001

## CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

En la ciudad de Puyo, el 01 día del mes de diciembre del 2022, comparecen a la suscripción del presente Contrato, por una parte, en calidad de INGENIERO CIVIL el Ing. LUIS OCTAVIO TIBANTA GUAMAN C.I. 160015313-2 y, por otra, parte el señor Odilo Vinicio Guevara Marín en calidad de representante legal de la Compañía AMAZONAS BUILDING S.A con Ruc 1691710080001, quienes en forma libre y voluntaria convienen en celebrar el presente contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, contenido en las siguientes cláusulas

### Cláusula Primera. – ANTECEDENTES

El día 7 de noviembre del 2022, La Compañía Amazonas Building suscribe un contrato con el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA para la ejecución de la Obra denominada ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

### Cláusula Segunda. - OBJETO DEL CONTRATO

La compañía contrata al Ing. Luis Octavio Tibanta Guamán, el mismo que prestará sus servicios de manera autónoma e independiente a la compañía, encargándose del área civil en el proyecto de ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA". tareas que se encuentran dentro de su campo de conocimiento y experiencia" teniendo la capacidad de celebrar el contrato, en virtud de que está familiarizado con la materia indicada en el mismo, en los términos y condiciones.

### Cláusula Tercera. — PLAZO

El plazo del presente contrato es por el tiempo que dure la ejecución de la obra, (aproximadamente 18 meses) a partir de la suscripción del presente contrato, pudiendo prorrogarse, si las partes así lo convienen, solo podrá extinguirse una vez que las labores materia del mismo hayan concluido para la COMPAÑIA Es obligación del Ing. Luis Octavio Tibanta Guamán realizar el trabajo contratado, los alcances y aclaraciones que la Compañía solicite, previo al pago.

### Cláusula Cuarta. - OBLIGACIONES DEL CONTRATADO

EL CONTRATADO está obligado y sin perjuicio de lo previsto por las leyes y reglamentos vigentes en el Ecuador a: Encargándose de supervisar que se aplique todas las normas técnicas del proyecto de ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

- Desarrollar con total transparencia, prolijidad y honestidad las tareas allá encomendadas.
- Mantener la confidencialidad de la información y los datos proporcionados por la Compañía.



# AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING  
RUC. 1691710080001

- Será responsable del manejo, uso y mantenimiento de los equipos y mobiliario a él entregados,

La compañía se reserva el derecho a intervenir, evaluar y analizar el trabajo realizado por el Ing. Luis Octavio Tibanta Guamán.

Además, un informe mensual de los trabajos civiles realizados en el proyecto ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

## **Cláusula Quinta: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO**

Las partes acuerdan determinar que la COMPAÑÍA cancelara sus honorarios profesionales al TECNICO por la gestión que él asume en el presente Contrato, al finalizar la obra. previa presentación de la factura correspondiente,

## **Cláusula Sexta - DEDUCCIONES**

La compañía deducirá de los honorarios " PROFESIONALES ", las cantidades que correspondan por concepto de impuesto a la Renta (10 %) e Impuesto al Valor Agregado (100%).

## **Cláusula Séptima. - RESPONSABILIDAD**

EL RESIDENTE DE OBRA 2 se obliga a ejecutar el trabajo con profesionalismo, diligencia, prolijidad y cuidados necesarios. Para evitar algún daño, pérdida o deterioro en los bienes de la COMPAÑÍA, por cualquier causa que fuere, "El Técnico se obliga a informar de manera inmediata, para determinar responsabilidades y sanciones a los causantes.

## **Clausula Octava: RELACIÓN CIVIL ENTRE LAS PARTES**

El presente Contrato es de naturaleza civil, sujeto al derecho común y singularmente a las reglas del Mandato. Por tanto, entre la COMPAÑÍA y "EL RESIDENTE DE OBRA" no existe relación laboral o de dependencia alguna, ni, consecuentemente sometimiento al Código del Trabajo y Leyes del Seguro Social Obligatorio. No hay subordinación jurídica ni de ninguna otra especie que pudiera significar relación laboral entre las partes o sus dependientes, puesto que " EL RESIDENTE DE OBRA 2" prestará sus servicios a la Compañía de manera libre, independiente y autónoma.

## **Clausula Novena: MODIFICACIONES**

Este contrato podrá ser modificado de común acuerdo y por escrito entre las partes contratantes.

## **Clausula Décima: DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO**

El presente contrato podrá darse por terminado en los siguientes casos:

- a) De común acuerdo entre las partes,
- b) Por terminación de su plazo de duración.
- c) Por cualquier causa legalmente establecida.



# AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING  
RUC. 1691710080001

## Clausula Décima Primera: DEL PACTO DE CONFIDENCIALIDAD

Toda la información que sea conocida por EL RESIDENTE DE OBRA consecuencia de este Contrato, sin importar su naturaleza y que fuere entregada, comunicada, divulgada o conocida como consecuencia de la ejecución de sus obligaciones bajo este instrumento, es propiedad de la COMPAÑÍA AMAZONAS BUILDING y se encuentra limitada su divulgación a terceros salvo las excepciones previstas en la ley.

## Clausula Décima Segunda: DEL DOMICILIO DE LAS PARTES

Para los efectos legales respectivos, las partes señalan domicilios para citaciones y notificaciones en esta ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, los siguientes.

- a) COMPAÑÍA AMAZONAS BUILDING S.A Avenida Tarqui calle los Laureles
- b) Ing. Luis Octavio Tibanta Guaman, Ciudad Puyo.

## Clausula Décima Tercera: DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Los Contratantes quedan sometidos a los jueces competentes de esta ciudad de Puyo y al trámite previsto por la LEY

## Clausula Décima Cuarta: DE LA ACEPTACIÓN

Los contratantes aceptan el presente contrato en su integridad, para constancia de lo cual lo firman por triplicado, todo en el día y fecha antes anotados.




ODILO VINICIO  
GUEVARA MARIN

Sr. Odilo Guevara Marín  
**GERENTE CIA AMAZONAS BUILDING**



LUIS OCTAVIO  
TIBANTA  
GUAMAN

Ing. Luis Tibanta  
**RESIDENTE CIVIL**



# AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING  
RUC. 1691710080001

## CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

En la ciudad de Puyo, el 01 día del mes de diciembre del 2022, comparecen a la suscripción del presente Contrato, por una parte, en calidad de TOPOGRAFO la Ing. Daniela Analía Gómez Zambrano Cl. 070407321-2 y, por otra, parte el señor Odilo Vinicio Guevara Marín en calidad de representante legal de la Compañía AMAZONAS BUILDING S.A con Ruc 1691710080001, quienes en forma libre y voluntaria convienen en celebrar el presente contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, contenido en las siguientes cláusulas

### Cláusula Primera. - ANTECEDENTES

El día 7 de noviembre del 2022, La Compañía Amazonas Building suscribe un contrato con el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA para la ejecución de la Obra denominada ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

### Cláusula Segunda. - OBJETO DEL CONTRATO

La compañía contrata al Ing. Daniela Analía Gómez Zambrano, el mismo que prestará sus servicios de manera autónoma e independiente a la compañía, encargándose de la TOPOGRAFIA en el proyecto de ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA". tareas que se encuentran dentro de su campo de conocimiento y experiencia" teniendo la capacidad de celebrar el contrato, en virtud de que está familiarizado con la materia indicada en el mismo, en los términos y condiciones.


### Cláusula Tercera. — PLAZO

El plazo del presente contrato es por el tiempo que dure la ejecución de la obra, (aproximadamente 18 meses) a partir de la suscripción del presente contrato, pudiendo prorrogarse, si las partes así lo convienen, solo podrá extinguirse una vez que las labores materia del mismo hayan concluido para la COMPAÑIA Es obligación de la Ing. Daniela Analía Gómez Zambrano realizar el trabajo contratado, los alcances y aclaraciones que la Compañía solicite, previo al pago.

### Cláusula Cuarta. - OBLIGACIONES DEL CONTRATADO

EL CONTRATADO está obligado y sin perjuicio de lo previsto por las leyes y reglamentos vigentes en el Ecuador a: Encargándose de supervisar que se aplique todas las normas técnicas del proyecto de ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

- Desarrollar con total transparencia, prolijidad y honestidad las tareas allá encomendadas.
- Mantener la confidencialidad de la información y los datos proporcionados por la Compañía.



# AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING  
RUC. 1691710080001

- Será responsable del manejo, uso y mantenimiento de los equipos y mobiliario a él entregados,

La compañía se reserva el derecho a intervenir, evaluar y analizar el trabajo realizado por la Ing. Daniela Analía Gómez Zambrano.

Además, un informe mensual de los trabajos topográficos realizadas en el proyecto **ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**".

## **Cláusula Quinta: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO**

Las partes acuerdan determinar que la COMPAÑÍA cancelara sus honorarios profesionales al TECNICO por la gestión que él asume en el presente Contrato, al finalizar la obra. previa presentación de la factura correspondiente,

## **Cláusula Sexta – DEDUCCIONES**

La compañía deducirá de los honorarios " TOPOGRAFO ", las cantidades que correspondan por concepto de impuesto a la Renta (10 %) e Impuesto al Valor Agregado (100%).

## **Cláusula Séptima. – RESPONSABILIDAD**

LA TOPOGRAFA se obliga a ejecutar el trabajo con profesionalismo, diligencia, prolijidad y cuidados necesarios. Para evitar algún daño, pérdida o deterioro en los bienes de la COMPAÑÍA, por cualquier causa que fuere," EL TECNICO "se obliga a Informar de manera inmediata, para determinar responsabilidades y sanciones a los causantes.

## **Clausula Octava: RELACIÓN CIVIL ENTRE LAS PARTES**

El presente Contrato es de naturaleza civil, sujeto al derecho común y singularmente a las reglas del Mandato. Por tanto, entre la COMPAÑÍA Y' LA TOPÓGRAFA "no existe relación laboral o de dependencia alguna, ni, consecuentemente sometimiento al Código del Trabajo y Leyes del Seguro Social Obligatorio. No hay subordinación jurídica ni de ninguna otra especie que pudiera significar relación laboral entre las partes o sus dependientes, puesto que" LA TOPÓGRAFA "prestará sus servicios a la Compañía de manera libre, independiente y autónoma.

## **Clausula Novena: MODIFICACIONES**

Este contrato podrá ser modificado de común acuerdo y por escrito entre las partes contratantes.

## **Clausula Décima: DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO**

El presente contrato podrá darse por terminado en los siguientes casos:

- a) De común acuerdo entre las partes,
- b) Por terminación de su plazo de duración.
- c) Por cualquier causa legalmente establecida.

## **Clausula Décima Primera: DEL PACTO DE CONFIDENCIALIDAD**



# AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING  
RUC. 1691710080001

Toda la información que sea conocida por LA TOPÓGRAFA "consecuencia de este Contrato, sin importar su naturaleza y que fuere entregada, comunicada, divulgada o conocida como consecuencia de la ejecución de sus obligaciones bajo este instrumento, es propiedad de la COMPAÑÍA AMAZONAS BUILDING y se encuentra limitada su divulgación a terceros salvo las excepciones previstas en la ley.

## Clausula Décima Segunda: DEL DOMICILIO DE LAS PARTES

Para los efectos legales respectivos, las partes señalan domicilios para citaciones y notificaciones en esta ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, los siguientes.

- a) COMPAÑÍA AMAZONAS BUILDING S.A Avenida Tarquí calle los laureles
- b) Ing. Daniela Analía Gómez Zambrano Barrio la Merced.

## Clausula Décima Tercera: DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Los Contratantes quedan sometidos a los jueces competentes de esta ciudad de Puyo y al trámite previsto por la LEY

## Clausula Décima Cuarta: DE LA ACEPTACIÓN

Los contratantes aceptan el presente contrato en su integridad, para constancia de lo cual lo firman por triplicado, todo en el día y fecha antes anotados.



Sr. Odilo Guevara Marín  
**GERENTE CIA AMAZONAS BUILDING**



Ing. Daniela Gómez  
**TOPÓGRAFO**



# AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING  
RUC. 1691710080001

## CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

En la ciudad de Puyo, el 01 día del mes de diciembre del 2022, comparecen a la suscripción del presente Contrato, por una parte, en calidad de INGENIERO CIVIL el Ing. MARCO VINICIO TAMAYO MEJIA C.I. 16000877-9 y, por otra, parte el señor Odilo Vinicio Guevara Marín en calidad de representante legal de la Compañía AMAZONAS BUILDING S.A con Ruc 1691710080001, quienes en forma libre y voluntaria convienen en celebrar el presente contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, contenido en las siguientes cláusulas

### Cláusula Primera. - ANTECEDENTES

El día 7 de noviembre del 2022, La Compañía Amazonas Building suscribe un contrato con el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA para la ejecución de la Obra denominada ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

### Cláusula Segunda. - OBJETO DEL CONTRATO

La compañía contrata al Ing. Marco Vinicio Tamayo Mejía, el mismo que prestará sus servicios de manera autónoma e independiente a la compañía, encargándose del área civil en el proyecto de ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA". tareas que se encuentran dentro de su campo de conocimiento y experiencia" teniendo la capacidad de celebrar el contrato, en virtud de que está familiarizado con la materia indicada en el mismo, en los términos y condiciones.

### Cláusula Tercera. — PLAZO

El plazo del presente contrato es por el tiempo que dure la ejecución de la obra, (aproximadamente 18 meses) a partir de la suscripción del presente contrato, pudiendo prorrogarse, si las partes así lo convienen, solo podrá extinguirse una vez que las labores materia del mismo hayan concluido para la COMPAÑIA Es obligación del Ing. Marco Vinicio Tamayo Mejía, realizar el trabajo contratado, los alcances y aclaraciones que la Compañía solicite, previo al pago.

### Cláusula Cuarta. - OBLIGACIONES DEL CONTRATADO

EL CONTRATADO está obligado y sin perjuicio de lo previsto por las leyes y reglamentos vigentes en el Ecuador a: Encargándose de supervisar que se aplique todas las normas técnicas del proyecto de ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

- Desarrollar con total transparencia, prolijidad y honestidad las tareas allá encomendadas.
- Mantener la confidencialidad de la información y los datos proporcionados por la Compañía.



# AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING  
RUC. 1691710080001

- Será responsable del manejo, uso y mantenimiento de los equipos y mobiliario a él entregados,

La compañía se reserva el derecho a intervenir, evaluar y analizar el trabajo realizado por el Ing. Marco Vinicio Tamayo Mejía.

Además, un informe mensual de los trabajos civiles realizados en el proyecto **ASFALTADO DE LA VIA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**".

## **Cláusula Quinta: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO**

Las partes acuerdan determinar que la COMPAÑÍA cancelara sus honorarios profesionales al TECNICO por la gestión que él asume en el presente Contrato, al finalizar la obra. previa presentación de la factura correspondiente,

## **Cláusula Sexta – DEDUCCIONES**

La compañía deducirá de los honorarios " PROFESIONALES ", las cantidades que correspondan por concepto de impuesto a la Renta (10 %) e Impuesto al Valor Agregado (100%).

## **Cláusula Séptima. – RESPONSABILIDAD**

EL SUPERINTENDENTE DE OBRA se obliga a ejecutar el trabajo con profesionalismo, diligencia, prolijidad y cuidados necesarios. Para evitar algún daño, pérdida o deterioro en los bienes de la COMPAÑÍA, por cualquier causa que fuere, El Superintendente se obliga a informar de manera inmediata, para determinar responsabilidades y sanciones a los causantes.

## **Clausula Octava: RELACIÓN CIVIL ENTRE LAS PARTES**

El presente Contrato es de naturaleza civil, sujeto al derecho común y singularmente a las reglas del Mandato. Por tanto, entre la COMPAÑÍA y 'EL SUPERINTENDENTE DE OBRA' no existe relación laboral o de dependencia alguna, ni, consecuentemente sometimiento al Código del Trabajo y Leyes del Seguro Social Obligatorio. No hay subordinación jurídica ni de ninguna otra especie que pudiera significar relación laboral entre las partes o sus dependientes, puesto que " EL SUPERINTENDENTE DE OBRA" prestará sus servicios a la Compañía de manera libre, independiente y autónoma.

## **Clausula Novena: MODIFICACIONES**

Este contrato podrá ser modificado de común acuerdo y por escrito entre las partes contratantes.

## **Clausula Décima: DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO**

El presente contrato podrá darse por terminado en los siguientes casos:

- a) De común acuerdo entre las partes,
- b) Por terminación de su plazo de duración.
- c) Por cualquier causa legalmente establecida.



# AMAZONBUILD S.A.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMAZONAS BUILDING  
RUC. 1691710080001

## Clausula Décima Primera: DEL PACTO DE CONFIDENCIALIDAD

Toda la información que sea conocida por EL SUPERINTENDENTE DE OBRA consecuencia de este Contrato, sin importar su naturaleza y que fuere entregada, comunicada, divulgada o conocida como consecuencia de la ejecución de sus obligaciones bajo este instrumento, es propiedad de la COMPAÑÍA AMAZONAS BUILDING y se encuentra limitada su divulgación a terceros salvo las excepciones previstas en la ley.

## Clausula Décima Segunda: DEL DOMICILIO DE LAS PARTES

Para los efectos legales respectivos, las partes señalan domicilios para citaciones y notificaciones en esta ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, los siguientes.

- a) COMPAÑÍA AMAZONAS BUILDING S.A Avenida Tarqui calle los Laureles
- b) Ing. Marco Vinicio Tamayo Mejía, Ciudad Puyo.

## Clausula Décima Tercera: DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Los Contratantes quedan sometidos a los jueces competentes de esta ciudad de Puyo y al trámite previsto por la LEY

## Clausula Décima Cuarta: DE LA ACEPTACIÓN

Los contratantes aceptan el presente contrato en su integridad, para constancia de lo cual lo firman por triplicado, todo en el día y fecha antes anotados.



Firmado electrónicamente por:  
ODILO VINICIO  
GUEVARA MARIN

Sr. Odilo Guevara Marín  
**GERENTE CIA AMAZONAS BUILDING**



Firmado electrónicamente por:  
MARCO VINICIO  
TAMAYO MEJIA

Ing. Marco Tamayo  
**SUPERINTENDENTE**

**POLIZA DE SEGURO DE FIANZAS  
PUBLICO**

ASEGURADORA DEL SUR C.A. en adelante "La Aseguradora" en virtud de la solicitud de seguro presentada por el interesado, que en adelante se denomina "El Afianzado o Contratista", y que forma parte integrante de ese contrato, se obliga a indemnizar al Asegurado, por las razones previstas en este contrato, de acuerdo a las condiciones generales, aprobadas por la Superintendencia de Bancos y seguros con Resolución N°. SBS-INS-2002-293 de Septiembre 3 del 2002 y especiales, eniendno prelación las últimas sobre las primeras.

Emisión en: AMBATO  
Emisión: 01/11/2022

Agente: 16917279

|                               |                    |                          |                       |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>RAMO</b>                   |                    | <b>PÓLIZA NÚMERO</b>     | <b>SUMA ASEGURADA</b> |
| FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO |                    | 1142619                  | 232.536,06            |
| <b>VIGENCIA DEL DOCUMENTO</b> |                    | <b>TIPO DE DOCUMENTO</b> |                       |
| DESDE LAS 00:01 DE            | HASTA LAS 24:00 DE | PLAZO                    | POLIZA                |
| 07/11/2022                    | 06/05/2023         | 180                      | 0                     |

**EL AFIANZADO O CONTRATISTA:** AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S A 169171008000  
**DIRECCIÓN:** LUIS MOLINA SN ,Dpto. , Piso0,  
**TELÉFONOS:** 0 032861348 0999813185



**EL ASEGURADO:** GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA 1660000170001  
**DIRECCIÓN:** FRANCISCO DE ORELLANA SN GENERAL VILLAMIL  
**TELÉFONOS:** 0 032883830 0999123457

**OBJETO DEL CONTRATO:**

ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, SEGÚN PROCESO No. LICO-GADPPz-006-2022

| PRIMA    | IMPUESTOS Y OTROS | TOTAL CONTADO |
|----------|-------------------|---------------|
| 4.357,66 | 728,22            | 5.085,88      |

**ESTE FOMULARIO ES UN AVISO DE COBRO**

Mediante esta póliza de seguro incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, según la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, Aseguradora del Sur C.A. se obliga a favor del Beneficiario de esta póliza por los perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación fianzada hasta el monto estipulado como suma asegurada que le ocasione el afianzado, en caso de terminación del contrato. Esta póliza podrá ser renovada mediante petición escrita del Afianzado o Asegurado. Transcurrido el plazo/vigencia, la presente póliza quedará automáticamente caduca, cesando de hecho toda responsabilidad de la compañía aún en el caso de que no fuera devuelto el original de la misma.

En testimonio de lo acordado se firma este contrato en: AMBATO a 1 DE NOVIEMBRE DE 2022

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>EL ASEGURADO</b>   | <b>EL CONTRATISTA</b>   | <b>LA ASEGURADORA</b>  |
| <br>Firmado electrónicamente por:<br><b>JORGE RODRIGO LOPEZ PARDEAS</b> | <br>Firmado electrónicamente por:<br><b>ODILO VINICIO GUEVARA MARIN</b> | <br>Digitally signed by:<br><b>RODRIGO CEVALLOS GUEVARA</b><br>Date: 2022.11.01<br>17:17:54 -08:00<br>Reason: Firma Electrónica<br>Location: Aseguradora |

**ORIGINAL**

|   |   |  |  |   |  |   |
|---|---|--|--|---|--|---|
| <b>MATRIZ QUITO</b><br>TELS:(02)2997500<br>FAX:(02)2997553<br>2997588<br>CUENCA<br>TELS:(07)2819721 - | <b>IBARRA</b><br>TELS:(06)640920<br>LOJA<br>TELS:(07)587677<br>FAX:(07)560995 | <b>PORTOVIEJO</b><br>TELS:(05)632647<br>FAX:(05)632669 | <b>MANTA</b><br>TELS:(03)829299/828211<br>FAX:(05)623485 | <b>AMBATO</b><br>TELS:(03)829299/828211<br>FAX:(03)828534 | <b>RIOBAMBA</b><br>TELS:(03)941063<br>FAX:(03)965040 | <b>MACHALA</b><br>TELS:<br>(07)2985563<br>FAX:<br>(07)2985561 |
|---|---|--|--|---|--|---|



Abg. Pedro Eduardo Merino Castillo  
C.C. 1803299491  
SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

09 NOV 2022

CONDICIONES DE LA PÓLIZA Nº 1142319

RAMO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
MONEDA: DÓLARES
LUGAR Y FECHA: AMBATO, Noviembre 1 de 2022



VIGENCIA DE LA POLIZA DESDE: 07/11/2022 HASTA: 06/05/2023
VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE: LAS 00:01 H HASTA: LAS 24:00 H (Local)

ASEGURADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL TLF: 0 032883830 Cel: 0999123457
DIRECCIÓN: FRANCISCO DE ORELLANA SN GENERAL WILLAMIL

ANEXOS

Table with columns: COBERTURAS CONTRATADAS, Sumas Aseguradas hasta: USD, Deducible: Aplica el mayor de los tres (sub-columns: % Suma Asegurada, % Valor de Siniestro, Mínimo USD). Row 1: Cumplimiento de Contrato, 232.536,06.

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

El(La) asegurado(a) y/o el(la) solicitante declara libre y voluntariamente, que el seguro solicitado a Aseguradora del Sur C.A., ampara bienes, garantías y contratos de procedencia lícita, los mismos que no están ligados con actividades de Narcotráfico, Lavado de Activos o Financiamiento del Terrorismo. Igualmente, declara que los fondos con los cuales se pagará la prima correspondiente a este contrato de seguros tienen origen lícito y no guardan ninguna relación con las actividades mencionadas anteriormente.

AUTORIZACIÓN

Siendo conocedor de las disposiciones legales para la Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, autorizo expresamente en forma libre, voluntaria e irrevocable a Aseguradora del Sur C.A. a realizar el análisis y las verificaciones que considere necesarias para corroborar la licitud de fondos y bienes comprendidos en el contrato de seguro; así como autorizo expresa, voluntaria e irrevocablemente a todas las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado a facilitar a Aseguradora del Sur C.A. toda la información que ésta les requiera, inclusive autorizo anticipadamente el levantamiento del sigilo o velo bancario en caso de ser necesario, incluido la revisión de los buró de crédito sobre mi información de riesgos crediticios.

https://fms.aseguradoradelsur.com/asegsur/v1/fms/uploads/bcdc194c-76f0-4390-b851-44b0fbc0f318.pdf

Direcciones:

Matriz Quito: Av. De Los Naranjos y De Las Azucenas (02) 2997-500 / Fax: (02)2467-983. Sucursal Ambato: Av. Rodrigo Pachano 13-109 y Juan Montalvo. Sector Ficoa (03)2828-211 / (03)2828-213 / (03) 2829-299. Sucursal Francisco Orellana (Coca): Calle Quito entre Guayaquill y Jorge Rodríguez (06)2883-276 / (06)2881-511. Sucursal Cuenca: Federico Proaño 365 y Honorato de Loyola, a dos cuadras de Pizza Hut. (07)2819-721 / (07)2819-964. Sucursal Ibarra: Victoria Cast Chiriboga 657 y Galo Plaza Lasso, atrás del C.C. La Plaza (06) 2630-920 / (06)2630-868. Sucursal Loja: Av. Av. Orillas Zamora y Segundo Puertas Moreno (07)2560-991 / (07)2587-677. Sucursal Machala: Av. 25 de Junio Km 2 1/2, vía a Pas: Urbanización Ciudad del Sol Mz. L1 (07)279-7087 / (07)279-7089 / 099 844 5197. Sucursal Manta: Calle M1 entre las calles y 24, diagonal al Hotel Oro Verde Manta, edificio 'Manta Business Center', planta baja. (05)2625 -751 / (05)2626-50: (05)2626-052. Sucursal Portoviejo: Av. Manabí y Granda Centeno, frente a la pista del aeropuerto (05)2563-494 / (05)2563-33 / (05)2563-508. Sucursal Riobamba: Uruguay 21-50 y Av. Daniel León Borja (03)2942-830 / (03)2941-063. Sucursal Sa Domingo: Av. Los Naranjos S/N y Av. Quito, 3er piso (frente al SRI). (02)2758-337 / (02)2762-006. Sucursal Guayaquil: Urde Circunvalación Sur #304 y Todos los Santos. (04)501-3050.

Línea de atención al cliente: teléfono: (02) 2997500 / (09)9555-3333.

Página web de la compañía: https://www.aseguradoradelsur.com

Dirección de correo electrónico de contacto: info@aseguradoradelsur.com

Handwritten signature and stamp of Abg. Pedro Eduardo Serrano Castillo, C.C. 1808299591, SECRETARIO GENERAL DEL C.A.D.P.A.

ORIGINAL



09 NOV 2022




**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

# DOCUMENTACIÓN

## CRUZADA

"ASFALTADO DE LA VIACURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO  
12.ª DEL AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"





**AMAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

Oficio, 123 CABA/GADPPz

Puyo, 15 de mayo de 2023

**Ingeniera**

Jessica Mariela Jaramillo Armijos

**FISCALIZADOR EXTERNO KEYSZEN S.A.S.**

Presente. -

De mi consideración:

Con respecto al contrato "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", del particular debo manifestar lo siguiente:

- **Adjunto** se servirá encontrar la planilla de avance número 03, con los respectivos anexos y sustentos de justificación para que proceda con su revisión y autorización correspondiente, conforme lo señalado en CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO. - La forma de pago se realizará por planilla de avance mensual, una vez realizadas las correcciones solicitadas en comunicación KEYSOFICIO-029-2023 de fecha 10 de mayo/2023.

Particular que comunico a ustedes para los fines legales correspondientes.

Atentamente,



ODILO VINICIO  
GUEVARA MARIN

**Sr. Odilo Guevara**

CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
GERENTE

Recibido

15-05-2023

Ricardo Carpio



Puyo, 10 de mayo del 2023

Señor  
Odilo Vinicio Guevara Marín  
**Gerente General**  
**AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.**  
Presente. –

De mi consideración:

Mediante Contrato LICO-GADPPz-006-2022 suscrito el 07 de noviembre del 2022, dentro del Proceso de LCC-GADPPz-004-2022, para la ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, entre la Compañía AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, con un Anticipo del 0%, por un monto de USD \$ 4'650.521,23 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 23/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) SIN INCLUIR IVA, y un Plazo de 540 Días contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Obra.

En referencia al Oficio 121 CABA/GADPPz, suscrito por el Señor Odilo Vinicio Guevara Marín, de fecha 05 de mayo del 2023.

Adjunto la corrección de la Planilla de Avance No. 03:

- 1.- Adjuntar el Reajuste de precios provisional de la Planilla de Avance No. 03.
- 2.- Adjuntar el memo de pago de la Planilla de Avance No. 03.
- 3.- Adjuntar los planos de la sección horizontal.
- 4.- Favor hacer entrega de correos con la Planilla y los anexos al mail [keyszen.sas@gmail.com](mailto:keyszen.sas@gmail.com).

Por la atención al presente le anticipo mis sinceros agradecimientos.

Sin otro particular por el momento, me despido.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
JESSICA MARIELA  
JARAMILLO ARMIÑOS

Ing. Jessica Jaramillo  
C.C. 0704239128  
Gerente General  
**KEYSZEN S.A.S.**  
RUC 0791840462001

**KEYSZEN** **S**  
INGENIERIA & CONSTRUCCION **A**  
Machala - El Oro - Ecuador

Jenny Ponina  
19/05/2023 14:15:3

CC. Administrador del Contrato

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
Oficina 072 785 269  
[keyszen.sas@gmail.com](mailto:keyszen.sas@gmail.com)  
[www.keyszen.com](http://www.keyszen.com)  
Machala – El oro - Ecuador

Puyo, 10 de mayo del 2023

Señor  
Odilo Vinicio Guevara Marín  
Gerente General  
AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.  
Presente. —

De mi consideración:

Mediante Contrato LICO-GADPPz-006-2022 suscrito el 07 de noviembre del 2022, dentro del Proceso de LCC-GADPPz-004-2022, para la ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KM 12 VÍA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, entre la Compañía AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. y el ~~Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de~~ Pastaza, con un Anticipo del 0%, por un monto de USD \$ 4'650.521,23 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 23/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) SIN INCLUIR IVA, y un Plazo de 540 Días contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Obra.

En referencia al Oficio 121 CABA/GADPPz, suscrito por el Señor Odilo Vinicio Guevara Marín, de fecha 05 de mayo del 2023.

Adjunto la corrección de la Planilla de Avance No. 03:

- 1.- Adjuntar el Reajuste de precios provisional de la Planilla de Avance No. 03.
- 2.- Adjuntar el memo de pago de la Planilla de Avance No. 03.
- 3.- Adjuntar los planos de la sección horizontal.
- 4.- Favor hacer entrega de correos con la Planilla y los anexos al mail 'keyszen.sas@gmail.com

Por la atención al presente le anticipo mis sinceros agradecimientos.

Sin otro particular por el momento, me despido.

Atentamente,



JESSICA JARAMILLO  
JARAMILLO ARMIJOS

Ing. Jessica Jaramillo  
C.C. 0704239128  
Gerente General  
KEYSZEN S.A.S.  
RUC 0791840462001



CC. Administrador del Contrato

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
Oficina 072 785 269  
keyszen.sas@gmail.com  
www.keyszen.com  
Machala – El oro - Ecuador

Recibido  
12/05/2023



# AMAZONAS BUILDING S.A.

Puyo - Pastaza - Ecuador

Oficio, 121 CABA/GADPPz

Puyo, 05 de mayo de 2023

**Ingeniera**

Jessica Mariela Jaramillo Armijos

**FISCALIZADOR EXTERNO KEYSZEN S.A.S.**

Presente. -

**De mi consideración:**

**Con respecto al contrato "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", del particular debo manifestar lo siguiente:**

- Adjunto se servirá encontrar la planilla de avance número 03, con los respectivos anexos y sustentos de justificación para que proceda con su revisión y autorización correspondiente, conforme lo señalado en CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO. - La forma de pago se realizará por planilla de avance mensual.

Particular que comunico a ustedes para los fines legales correspondientes.

Atentamente,




**Sr. Odilo Guevara**

CIA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

**GERENTE**

CC. Ing. Eryka Silva Administradora del contrato

  
Recibido  
05-05-2023  
Ricardo Cerpio





**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

# CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO

"ASFALTADO DE LA VIACURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO  
12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"



| RUBRO                                     | DESCRIPCION   | UNIDAD | CANTIDAD   | P. UNITARIO | P. TOTAL       | CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
|---|---|--------|------------|-------------|----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|----|----|--------|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|
|   |   |        |            |             |                | 11 MES                          |                 | 15 MES          |                 |                 | 16 MES |    |    | 17 MES |    |    | 18 MES |    |    |    |    |    |    |
|   |   |        |            |             |                | 56                              | 57              | 58              | 59              | 60              | 61     | 62 | 63 | 64     | 65 | 66 | 67     | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 1   | Desbroce, desbosque y limpieza                                      | Ha     | 29.18      | 444.42      | 12968.17560    |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 2   | Replanteo y nivelación a nivel de asfalto                           | km     | 14.59      | 1383.97     | 20192.12230    |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 3   | Remoción de alcantarillas   | m      | 243.00     | 26.76       | 6502.68000     |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 4   | Excavación sin clasificar (mov. de tierra)                          | m³     | 68863.54   | 1.02        | 70240.81080    |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 5   | Excavación de cunetas de coronación                                 | m²     | 613.80     | 1.29        | 791.80200      |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 6   | Excavación para cunetas y encauzamiento                             | m²     | 8576.91    | 5.02        | 43056.08820    |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 7   | Excavación y relleno de estructuras menores                         | m³     | 7720.00    | 5.08        | 39217.60000    |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 8   | Limpieza de derrumbes   | m²     | 8746.43    | 0.82        | 7172.07260     |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 9   | S.C. Tubería de acero corrugado D= 0.80 m, e=2.5 mm, MP             | m      | 126.00     | 166.33      | 20957.58000    |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 10  | S.C. Tubería de acero corrugado D= 1.20 m, e=2.5 mm, MP             | m      | 263.00     | 272.20      | 71586.60000    |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 11  | S.C. Tubería de acero corrugado D= 2.20 m, e=3.0 mm, MP             | m      | 46.00      | 562.20      | 25861.20000    |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 12  | Hormigón para cunetas (F'c=180 KG/CM2)                              | m³     | 4746.82    | 167.21      | 793715.77220   |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 13  | Muro de H.S. Fc=180kg/cm2 tipo B(Cabezales)                         | m²     | 763.00     | 167.20      | 127573.60000   |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 14  | Hormigón simple en obras de arte F'c=240 KG/CM2                     | m³     | 78.47      | 162.46      | 12748.23620    |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 15  | Hierro estructural fy=4200 kg/cm²                                   | kg     | 8288.90    | 1.94        | 16080.46600    |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 16  | Muro de pavones - calibre N° 12                                     | m³     | 400.00     | 70.12       | 28048.00000    |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 17  | Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)          | m³     | 83263.76   | 3.00        | 249791.28000   |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 18  | Material de subbase clase 3   | m³     | 21010.98   | 12.44       | 261376.59120   |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 19  | Material de base granular de agregados                              | m³     | 13031.28   | 15.78       | 205633.58840   |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 20  | Transporte material de desalojo                                     | m³     | 8746.43    | 1.02        | 8921.35860     |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 21  | Transporte material pétreo de mejoramiento                          | m³-km  | 3309493.83 | 0.25        | 827373.45750   |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 22  | Transporte de material sub base clase 3                             | m³-km  | 781104.32  | 0.25        | 195276.08000   |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 23  | Transporte de material base granular de agregados                   | m³-km  | 484450.99  | 0.25        | 121112.74750   |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 24  | Impresión con emulsión asfáltica                                    | Lt     | 171247.08  | 0.76        | 130147.78080   |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 25  | C. rodadura hormigón asf. Mezclado en planta, e=2"                  | m²     | 122319.34  | 9.74        | 1191390.37160  |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 26  | Bordillo de H.S. (fc=210 kg/cm² - 0.14x0.40)                        | m      | 2000.00    | 14.64       | 29280.00000    |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 27  | Acaras de H.S. fc=180kg/cm² E=7cm escobillado                       | m²     | 3000.00    | 19.32       | 57960.00000    |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 28  | Marcas en pavimento   | m      | 43626.97   | 0.40        | 17450.78800    |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 29  | Marcas sobre salidas de pavimento (unidireccionales y bidirec)      | u      | 3895.00    | 7.32        | 28511.40000    |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 30  | Pancarta informativa de la obra (letrero)-con estructura            | u      | 1.00       | 1179.51     | 1179.51000     |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 31  | Señales ecologicas (2.44x1.22)M2                                    | u      | 2.00       | 354.87      | 709.74000      |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 32  | Señales informativas (2.44x1.22)M2                                  | u      | 4.00       | 354.87      | 1419.48000     |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 33  | Señales reglamentarias (0.75 x 0.75)M2                              | u      | 10.00      | 111.50      | 1115.00000     |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 34  | Señales preventivas (0.75 x 0.75) M2                                | u      | 200.00     | 111.50      | 22300.00000    |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 35  | Señales informativas y reglamentarias (0.60m x 0.80m) móviles       | u      | 4.00       | 78.18       | 312.72000      |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 36  | Señales preventivas tipo barrera (1.22mx0.60m) móviles              | u      | 4.00       | 163.34      | 653.36000      |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 37  | Contenedores metálicos de 55 galones                                | u      | 4.00       | 17.57       | 70.28000       |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 38  | Kil antiderrames  | u      | 4.00       | 157.50      | 630.00000      |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 39  | Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)                   | m      | 1000.00    | 0.32        | 320.00000      |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 40  | S/C Cono de seguridad con protección UV, 71cm Incl. cinta           | u      | 20.00      | 22.48       | 449.60000      |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 41  | Suministro de paleta de alto y siga                                 | u      | 4.00       | 30.32       | 121.28000      |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 42  | Capacitación sobre preservación de recursos naturales (de 2 a 3 hor | u      | 1.00       | 100.00      | 100.00000      |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 43  | Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a 3 hor      | u      | 1.00       | 100.00      | 100.00000      |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| 44  | Capacitación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3 hor         | u      | 1.00       | 100.00      | 100.00000      |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| INVERSION MENSUAL                         |   |        |            |             | 4 650 521.2295 | 300                             |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| AVANCE MENSUAL (%)                        |   |        |            |             |                | 42544                           | 365 482.97688   | 361 206.15716   | 433 654.85936   | 412 674.03254   |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| INVERSION ACUMULADA AL 100% (línea e=1p)  |   |        |            |             |                | 300                             | 7.86            | 7.77            | 8.33            | 8.87            |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| AVANCE ACUMULADO (%)                      |   |        |            |             |                | 3 20358                         | 3 443 086.18046 | 3 804 292.33762 | 4 237 847.19698 | 4 650 521.2295  |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| INVERSION ACUMULADA AL 80% (línea e=0.5p) |   |        |            |             |                | 240                             | 74.03           | 81.80           | 91.12           | 100.0           |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| AVANCE ACUMULADO (%)                      |   |        |            |             |                | 4 56286                         | 2 754 468.94437 | 3 043 433.87010 | 3 390 357.75758 | 3 720 416.98362 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| PLAZO TOTAL: 540 DIAS                     |   |        |            |             |                | 94                              | 59.22           | 65.44           | 72.90           | 80.0            |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |
| PUYO, 25 DE ENERO DE 2023                 |   |        |            |             |                |                                 |                 |                 |                 |                 |        |    |    |        |    |    |        |    |    |    |    |    |    |

Firmado electrónicamente por:  
**ODILO VINICIO GUEVARA MARIN**





**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

# CONFORMIDAD AMBIENTAL


"ASFALTADO DE LA VIACURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO  
12 VIA 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"



Puyo, 03 de mayo del 2023

KEYSOFICIO-028-2023

Ing. Adam Mariño  
DIRECTOR DE FISCALIZACION SUBROGANTE DEL GADPPz  
Presente. -



De mis consideraciones. -

Reciba un cordial y atento saludo, a la vez desearle éxitos en las funciones a usted encomendadas, de la misma manera pongo en conocimiento que se adjunta el informe Ambiental de Cumplimiento del Proyecto **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA** perteneciente a la Planilla de Avance No. 03 para que se proceda con el trámite pertinente.

Verificando en territorio lo presentado en el informe Ambiental de cumplimiento remitido por el contratista, fiscalización externa emite la **CONFORMIDAD AMBIENTAL**, correspondiente al periodo **ABRIL 01 DEL 2023 AL ABRIL 30 DEL 2023**

Por la atención prestada anticipo mis más sinceros agradecimientos

Atentamente,



JESSICA MARIELA  
JARAMILLO ARMIJOS

Ing. Jessica Jaramillo  
C.C. 0704239128  
GERENTE GENERAL  
KEYSZEN S.A.S.  
RUC 0791840462001

KEYSZEN S.A.S  
INGENIERIA & CONSTRUCCION  
Machala - El Oro - Ecuador



Archivos Adjuntos :

- 01 Informe Ambiental de Cumplimiento Planilla de Fiscalizacion N° 03 (58 hojas)
- 02 Informe Ambiental de Cumplimiento Planilla de Obra N° 03 (64 hojas)

CC. Ing. David Yadra - Director de Gestión Ambiental del GADPPz



Puyo, 29 de abril del 2023

ERGC-AMAZON-003-2023

**Asunto:** Entrega informe ambiental. Periodo 01 de abril al 30 de abril del 2023

Sres.

KEYSZEN.S.A.S.

**FISCALIZACION EXTERNA DEL CONTRATO "PROYECTO DE ASFALTO DE LA VÍA CURARAY – FCO. DE ORELLANA – 10 DE AGOSTO, JATUMPACCHA HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO "CODIGO: LICO-GADPPz-006-2022**

**Presente. –**

**De mi consideración:**

Reciba un cordial y atento saludo.

La presente es para realizar la entrega del informe de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental del "PROYECTO DE ASFALTO DE LA VÍA CURARAY – FCO. DE ORELLANA – 10 DE AGOSTO, JATUMPACCHA HASTA EL KM 12 VIA 10 DE AGOSTO – EL TRIUNFO " CODIGO: LICO-GADPPz-006-2022, del periodo 01 de abril al 30 de abril del 2023 para su respectiva CONFORMIDAD AMBIENTAL y sus fines pertinentes.

Dando fe y cumplimiento a lo actuado, me suscribo con altos sentimientos de consideración y estima.

Atentamente;



Edgar Raúl Gaspata Calo

Ing. Edgar Raúl Gaspata Calo

**TECNICO AMBIENTAL AMAZONAS BUILDING S.A.**

Cc/: Administradora del contrato. Ing. Eryka Silva

  
Recibido  
30-04-2023  
Recoido Carpio

**INFORME AMBIENTAL DE FISCALIZACION DEL PROYECTO: "ASFALTADO DE  
LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL  
KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA,  
PROVINCIA DE PASTAZA"**

**PERIODO: ABRIL 01 DEL 2023 AL ABRIL 30 DEL 2023**

**PROYECTO:** ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:** El proyecto consta de 2 tramos definidos:

**Tramo 1:** el tramo desde el km 2 ½ vía al Tena continuando la vía Curaray por 12.280 kilómetros.

**Tramo 2:** entre el Km 12 vía 10 de agosto y la comunidad de Jatun Paccha de 3.445 km

## FICHA DEL PROYECTO

|  |  |                        |                                |
|--|--|------------------------|--------------------------------|
| <b>ETAPA DEL PROYECTO</b>              | Construcción de asfaltos en caminos vecinales, Colocacion de Material Petreo |                        |                                |
| <b>UBICACIÓN GEOGRÁFICA</b>            | <b>Provincia:</b> Pastaza  | <b>Cantón:</b> Pastaza | <b>Parroquia:</b> 10 de agosto |
|  | CURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA                                |                        |                                |
| <b>TIPO DE ZONA</b>                    | Rural  |                        |                                |
| <b>CÓDIGO DEL PROYECTO</b>             | LICO-GADPPz-006-2022   |                        |                                |
| <b>PERIODO DEL INFORME</b>             | 01 de abril de 2023 al 30 de abril de 2023                                   |                        |                                |
| <b>COORDENADAS UTM (TRAMO 1)</b>       |  |                        |                                |
| <b>Este (X)</b>                        |  |                        | <b>Norte (Y)</b>               |
| 169467                                 |  |                        | 9837116                        |
| 169975                                 |  |                        | 9837403                        |
| 170901                                 |  |                        | 9838807                        |
| 173028                                 |  |                        | 9840607                        |
| 173979                                 |  |                        | 9841143                        |
| 175562                                 |  |                        | 9841028                        |
| 176810                                 |  |                        | 9841069                        |
| 178330                                 |  |                        | 9841233                        |
| 178384                                 |  |                        | 9841892                        |
| 178743                                 |  |                        | 9842171                        |
| <b>COORDENADAS UTM (TRAMO 2)</b>       |  |                        |                                |
| <b>ZONA 1</b>                          |  |                        |                                |
| 178304                                 |  |                        | 9839271                        |
| 178324                                 |  |                        | 9839765                        |
| 178390                                 |  |                        | 9840273                        |
| 178520                                 |  |                        | 9840720                        |
| 178343                                 |  |                        | 9841210                        |
| <b>ZONA 2</b>                          |  |                        |                                |
| 178178                                 |  |                        | 9841664                        |
| 178126                                 |  |                        | 9842125                        |
| 177960                                 |  |                        | 9842483                        |
| <b>DATOS DEL OPERADOR DEL PROYECTO</b> |  |                        |                                |
| <b>Representante legal</b>             | Ing. Jaime Guevara   |                        |                                |
| <b>Domicilio</b>                       | Francisco de Orellana y 27 de febrero, Puyo, Pastaza                         |                        |                                |
| <b>Página web</b>                      | gadppz@pastaza.gob.ec  | <b>Cel:</b>            | (593) 032 994-220              |

| DATOS DEL RESPONSABLE TÉCNICO<br>FISCALIZACIÓN EXTERNA |  |      |             |
|--|--|------|-------------|
| Elaborado por:   | Ing. Jessica Gorozabel                           |      |             |
| Dirección  | Machala  |      |             |
| Correo electrónico                                     | jessica.gorozabel@gmail.com                      | Cel: | 0995057489  |
| Aprobado por:  | Ing. Jessica Jaramillo                           |      |             |
| Dirección:   | Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03 |      |             |
| Correo Electrónico                                     | keyszen.sas@gmail.com                            | Cel: | 072 785 269 |
| Representante legal:                                   | Gerente de KEYSZEN S.A.S.                        |      |             |
| PERIODO  | 01 de abril de 2023 al 30 de abril de 2023       |      |             |

**FISCALIZADOR:**  
KEYSZEN S.A.S.

**CONTRATISTA:**  
CÍA. AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

**PERIODO:**  
ABRIL 01 DEL 2023 AL ABRIL 30 DEL 2023

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
Oficina 072 785 269  
keyszen.sas@gmail.com  
www.keyszen.com  
Machala – El oro – Ecuador

## 1. ANTECEDENTES.

El presente **informe** pretende cumplir con lo establecido en el contrato celebrado entre el Gobierno **Autónomo** Descentralizado Provincial de Pastaza y la Compañía Amazonas Building S.A. por un monto de USD \$4,650,521.23 (Cuatro millones seis cientos cincuenta mil quinientos **veinte** y uno dólares con 23/100) para el Asfalto de la vía Curaray – Fco. de Orellana – **10 de agosto**, Jatun Paccha hasta el km 12 vía 10 de agosto – El Triunfo en la provincia de **Pastaza**, cantón Pastaza, Parroquia 10 de agosto.

En este sentido, en el presente informe se indicarán las actividades encaminadas a prevenir, controlar o mitigar los impactos ambientales de la fase de construcción, operación y mantenimiento del proyecto de acuerdo con el plan de manejo ambiental aprobado por ministerio del Ambiente para su ejecución.

El informe ambiental toma como base para su elaboración los siguientes documentos:

1. Proyecto **constructivo**.
2. Ficha **Ambiental** aprobada por el Ministerio del ambiente del proyecto.
3. Guía de **Buenas Prácticas Ambientales**

## 2. BASE LEGAL

El análisis **legal** efectuado describe los principales contenidos relacionados con la **obligatoriedad de cumplir las leyes y reglamentos vigentes para el cumplimiento de los parámetros ambientales exigibles en la legislación ecuatoriana.**

El Ministerio del **Ambiente** es el ente que dirige la gestión ambiental, a través de políticas normas e **instrumentos de control**, para lograr el uso sustentable y la conservación del capital natural **del Ecuador**, asegurar el derecho de sus habitantes a vivir en un ambiente sano y apoyar la **competitividad del país.**

El Estudio de **Impacto Ambiental**, considera el marco regulatorio ambiental ecuatoriano que se encuentra estipulado en varias leyes y reglamentos así:

Según la Constitución Nacional actual, Título VII del Régimen del Buen Vivir; Capítulo Segundo: **Biodiversidad y Recursos Naturales**; Sección Primera: Naturaleza y Ambiente; Párrafos 1 y 3 del Artículo 395, se manifiesta que:

*“El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de*

regeneración natural de los ecosistemas y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras”.

“El Estado garantizará la participación y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales”.

En el Párrafo 2 del artículo 396 se expone que se deben “Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales”.

En la Sección Cuarta (Recursos Naturales) del capítulo en mención, en el Artículo 408 se manifiesta que “son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo....”.

- La Ley de Gestión Ambiental, publicada en el R.O. N° 245 del 30 de julio de 1999, que establece la necesidad de que las actividades que supongan riesgo ambiental cuenten con la licencia respectiva, previa la aprobación de estudios ambientales por parte de las instituciones respectivas del Estado.

**Artículo 6. - Señala:** El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en función de los intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico y de evaluación de impactos ambientales.

En el Capítulo IV, DE LA PARTICIPACION DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO,

**Art. 13. -** Los Consejos Provinciales y los Municipios, dictarán políticas ambientales, seccionales con Sujeción a la Constitución Política de la República y a la presente Ley. Respetarán las regulaciones Nacionales sobre el Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas, para determinar los usos del suelo y consultarán a los representantes de los Pueblos Indígenas y Afroecuatorianos y Poblaciones locales para la delimitación, manejo y administración de áreas de conservación y reserva ecológica.

- La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, establece la obligación de conservar las áreas naturales. Publicada en el Registro Oficial No 64, del 24 de agosto de 1981, y codificada por el H. Congreso Nacional (Comisión de Legislación y Codificación) en el R.O. No 418 del 10 de septiembre del 2004.

En el marco de la ley en mención, Título V: Disposiciones Generales, Artículo 101,

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
Oficina 072 785 269  
keyszen.sas@gmail.com  
www.keyszen.com  
Machala – El oro - Ecuador

menciona: "En los proyectos de desarrollo rural o industriales, construcción de carreteras, obras de riego, hidroeléctricas u otras, que pudieren originar deterioro de los recursos naturales renovables, el Ministerio del Ambiente y demás instituciones del sector público afectadas, **determinarán** las medidas y valores que los ejecutores de tales proyectos u obras deban **efectuar** o asignar para evitar dicho deterioro o para la reposición de tales recursos".

**Asimismo, en el Artículo 105, Título V:** Disposiciones Generales, se instaure que "Los propietarios de predios rurales colindantes, con carreteras, caminos vecinales, o cursos naturales de agua o que se hallen cruzados por éstos, están obligados a plantar árboles en los costados de estas vías y de tales cursos, según las normas legales y las que establezca el Ministerio del Ambiente en coordinación con el de Obras Públicas".

- El Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3399 del 28 de noviembre de 2002, publicado en el Registro Oficial No. 725 del 16 de diciembre de 2002 y ratificado mediante Decreto Ejecutivo No. 3516, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 2 del 31 de marzo de 2003, contiene como mecanismos de aplicación las siguientes disposiciones legales:

- Políticas Básicas Ambientales (Título Preliminar).
- Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (Capítulo III, Título IV, Libro VI De la Calidad Ambiental).

*Prevención y Control de la Contaminación, así:*

- Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua, (Anexo 1, Libro VI, de la Calidad Ambiental).
- Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados, (Anexo 2, Libro VI, de la Calidad Ambiental).
- Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión, (Anexo 3, Libro VI, de la Calidad Ambiental).
- Norma de Calidad del Aire Ambiente, (Anexo 4, Libro VI, de la Calidad Ambiental).
- Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles, y para Vibraciones, (Anexo 5, Libro VI, de la Calidad Ambiental).
- Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos No Peligrosos, (Anexo 6, Libro VI, de la Calidad Ambiental).
- Listados Nacionales de Productos Químicos Prohibidos, Peligrosos y de Uso Severamente Restringido que se utilicen en el Ecuador, (Anexo 7, Libro VI, de la Calidad Ambiental).

- **Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo** (R.O. No. 565 del 17 de noviembre de 1986). Las disposiciones de este Reglamento son aplicables a las actividades de construcción en sus diferentes fases. Deberán observarse fundamentalmente procedimientos de seguridad y capacitación; y, se aprovecharán experiencias prácticas y técnicas actualizadas que coadyuven al mejoramiento en la producción; a la protección de los trabajos y a la conservación de la maquinaria empleada en los mismos y sus instalaciones, evitando, además, riesgos de accidentes y enfermedades profesionales.

- **Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas** en el Ecuador. Este Reglamento fue expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 1215 y publicado en el Registro Oficial No. 265 del 13 de febrero de 2001. El Artículo 1, señala el objeto de "regular las actividades hidrocarburíferas de exploración, desarrollo y producción, almacenamiento, transporte, industrialización y comercialización de petróleo crudo, derivados del petróleo, gas natural y afines, susceptibles de producir impactos ambientales en el área de influencia directa, definida en cada caso por el Estudio Ambiental respectivo".

- El constructor del proyecto deberá regirse a las especificaciones técnicas estipuladas por el **Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador (MTOPE)**, referentes a la construcción de caminos y puentes, en especial a lo indicado en las siguientes secciones:

- Secciones 104, Marco de Actuación Ambiental.
- Capítulo 200, Medidas Generales de Control Ambiental.

### 3. OBJETIVO GENERAL

- El Objetivo principal, es el cumplimiento de Plan de manejo Ambiental establecido en materia ambiental, por parte de la contratista AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A., que permitan evitar, mitigar y corregir las potenciales afectaciones que se pudieran presentar durante la ejecución del proyecto.

#### 3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Procurar la menor afectación e impactos ambientales negativos hacia el recurso humano y recursos naturales como suelo, agua, calidad de aire, flora y fauna.
- Maximizar el bienestar de la población, en función de los beneficios sociales y de seguridad que conllevan la ejecución del proyecto.
- Detectar oportunamente errores y/u omisiones en el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y dar soluciones a las diferentes situaciones que se presenten dentro

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
Oficina 072 785 269  
keyszen.sas@gmail.com  
www.keyszen.com  
Machala – El oro - Ecuador

de la ejecución del proyecto **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**

#### 4. ACTIVIDADES Y MAQUINARIA

Las actividades de quien suscribe este informe se han desarrollado durante el periodo abril 01 del 2023 a abril 30 del 2023.

En cumplimiento a la ejecución del proyecto **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY- FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA** sea compatible con las normas ambientales; se ha establecido el siguiente alcance:

- Identificación y sistematización de los potenciales riesgos ambientales que se producirán durante la ejecución de las actividades de constructivas del proyecto en mención.

#### DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE PROYECTO

- Desbroce, desbosque y limpieza
- Replanteo y nivelación a nivel de asfalto
- Remoción de alcantarillas
- Excavación sin clasificar (mov. de tierra)
- Excavación de cunetas de coronación
- Excavación para cunetas y encauzamiento
- Excavación y relleno de estructuras menores
- Limpieza de derrumbes
- S.C. Tubería de acero corrugado D= 0,80 m, e=2.5 mm, MP-100
- S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m, e=2.5 mm, MP-100
- S.C. Tubería de acero corrugado D= 2.20 m. e=3.0 mm, MP-100
- Hormigón para cunetas (F'C=180 KG/CM2)
- Muro de H.S. f'c=180kg./cm2 tipo B(Cabezales)
- Hormigón simple en obras de arte F'C=240 KG/CM2
- Hierro estructural fy=4200 kg/cm<sup>2</sup>
- Muro de gaviones - calibre N.º 12
- Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)
- Material de subbase clase 3
- Material de base granular de agregados
- Transporte material de desalojo

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
Oficina 072 785 269  
keyszen.sas@gmail.com  
www.keyszen.com  
Machala – El oro – Ecuador

- Transporte **material** pétreo de mejoramiento
- **Transporte de material** sub base clase 3
- **Transporte de material** base granular de agregados
- **Imprimación con** emulsión asfáltica
- C. rodadura **hormigón** asf. Mezclado en planta, e=2"
- Bordillo **de H.S.** (f'c=210 kg/cm<sup>2</sup> - 0,14x0,40)
- Aceras **de H.S.** f'c=180kg/cm<sup>2</sup> E=7cm escobillado
- Marcas **en pavimento**
- Marcas **sobre salidas** de pavimento (unidireccionales y bidireccionales),
- Pancarta informativa de la obra (letrero)-con estructura
- Señales ecológicas (2.44x1.22) M2
- Señales informativas (2.44x1.22) M2
- Señales reglamentarias (0.75 x 0.75) M2
- Señales preventivas (0.75 x 0.75) M2
- Señales informativas y reglamentarias (0.60m x 0.80m) móviles
- Señales preventivas tipo barrera (1.22mx0.60m) móviles
- Contenedores **metálicos** de 55 galones
- Cinta peligro **colores** intensos (mat. polietileno)
- S/C Cono de **seguridad** con protección UV, 71cm Incl. cinta reflectiva
- Suministro **de paleta** de alto y siga
- Capacitación **sobre** preservación de recursos naturales (de 2 a 3 horas)
- Capacitación **en** el manejo de desechos peligrosos (de 2 a 3 horas)
- Capacitación **en** seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3 horas)

## MAQUINARIA/EQUIPO EMPLEADO

- Motoniveladora
- Excavadora **sobre** oruga
- Camión cisterna
- Volquetes
- Distribuidor **de** asfalto
- Planta **de** asfalto
- Terminador **de** asfalto
- Rodillo **tandem** doble tambor
- Rodillo **vibratorio** liso
- Rodillo **vibratorio** neumáticos
- Concretera
- Mini **cargadora**
- ~~Apuratos de topografía.~~

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
Oficina 072 785 269  
keyszen.sas@gmail.com  
www.keyszen.com  
Machala – El oro - Ecuador

## 5. IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

1. Reconformación de la subrasante y excavación para cunetas de drenaje en la vía existente (camino vecinal).
2. Colocación de una capa de material pétreo para estabilización de la subrasante, de un espesor de 60cm., perfectamente compactada y con sus alineaciones correspondientes.
3. Colocación de una capa de subbase clase 3 de espesor igual a 15 cm perfectamente compactada.
4. Colocación de una capa de base clase 4 de espesor igual a 10cm perfectamente compactada.
5. Colocación de una capa de rodadura de hormigón asfáltico de 2" de espesor.
6. Construcción de cunetas laterales de hormigón para drenaje.
7. Construcción de alcantarilladas de hormigón y metálicas para drenaje de aguas pluviales.

6. CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

| ITEM | MEDIDA   | Medio de verificación  | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES   |
|------|--|------------------------|--------|-----------|-----------|---|
| 1    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementar señalética</li> <li>Señalética de prohibición</li> <li>Señalética de condición obligatoria</li> <li>Señalética condición Segura</li> <li>Señalética preventiva</li> <li>Señalética Ambiental</li> <li>Señalética informativa</li> </ul> | • Registro Fotográfico |        |           | X         | En el frente de trabajo existe señalética. La colocación e implementación de la señalética Informativa, preventiva y reglamentaria se establece para la etapa final del proyecto tal como lo señala el cronograma de ejecución de obra. ANEXO 7 |
| 2    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Humedecer la vía en los días soleados para evitar material particulado, optimizando el recurso agua.</li> </ul>   | • Registro Fotográfico |        |           | X         | Dentro del periodo 01 al 30 de abril no fue necesario, por condiciones climáticas   |
| 3    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zonificar las áreas de trabajo con cinta de peligro.</li> </ul>   | • Registro Fotográfico | X      |           |           | Los diferentes frentes de trabajo han sido zonificados por cinta de peligro, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los peatones y tránsito vehicular. REGISTRO FOTOGRAFICO IAC AMAZONAS BUILDING                                      |
| 4    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cubrir con una lona las volquetas que traían material pétreo hacia el lugar de la obra.</li> </ul>  | • Registro Fotográfico | X      |           |           | Las volquetas que operan en el proyecto son cubiertas de lona para evitar la dispersión del material transportado. ANEXO 6  |

|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Las vías por donde circula el equipo caminero deben estar despejadas y sin obstáculo.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Registro Fotográfico</li> </ul>  | X |  | Las vías se encuentran libres de obstáculos.  |
| 6 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar mantenimiento regular de la maquinaria y equipo utilizado.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Registro del mantenimiento vehicular. (Periodo del 01 al 30 de abril)</li> </ul> | X |  | La revisión y mantenimiento de la maquinaria para el mes de marzo se realizó en los talleres de la compañía Amazonas Building, ubicados en la parroquia Madre Tierra el cual consta con todos los permisos y regularizaciones ambientales. REGISTRO FOTOGRAFICO IAC AMAZONAS BUILDING |
| 7 | <ul style="list-style-type: none"> <li>El transporte del equipo se realizará utilizando las vías de accesos existentes, considerado no causar molestias a los habitantes del costado de la vía y el posible deterioro de la misma.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inspeccion In situ</li> </ul>  | X |  | Los vehículos livianos y pesados que operan en el proyecto utilizan las vías de acceso, precautelado el correcto uso de las mismas con el objetivo de evitar daños.   |
| 8 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementar un kit antiderrame y equipo de respuesta rápida, para combatir posibles contaminados.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kits antiderrames- Inspeccion In situ</li> </ul>                                 | X |  | Dentro del proyecto existe un kit antiderrame, con el objetivo de mitigar cualquier derrame. ANEXO 8  |
| 9 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se Deberá instalar de forma permanente un extintor y botiquín de primeros auxilios en los vehículos y maquinaria.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Botiquín</li> <li>Extintor</li> </ul>  | X |  | La maquinaria y vehículos cuentan con botiquín y extintor ANEXO 5   |

|    |  |  |   |  |   |
|----|--|--|---|--|---|
| 10 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dotar al personal que labora en el Proyecto de EPP</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Usode EPPs</li> </ul> <p>Inspeccion In situ</p> | X |  | <p>El contratista ha dotado a sus trabajadores del EPP adecuado, según la actividad laboral asignada. Entrega de impermeables, gafas y chalecos a operadores de maquinaria pesada se realizó en el periodo anterior y tiene la vigencia de tres meses ANEXO 4</p> |
| 11 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementar un área para el almacenamiento temporal de combustibles el cual deberá cumplir las siguientes características. Deberá estar ubicado alejado de cuerpos hídricos y aislados.</li> <li>Los sitios de almacenamiento de combustible serán ubicados en áreas no inundables.</li> <li>La estructura será realizada con vigas de madera y cubierta de dura techo o también pueden ser hojas de si las dimensiones del área se realizarán en base a la cantidad de tanques de almacenamiento a utilizar.</li> <li>El tanque de almacenamiento deberá estar protegido contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones que contaminen el ambiente y contarán con mangueras y llaves de distribución.</li> <li>El tanque de almacenamiento debe estar rodeado de un cubeto o estructura de contención impermeables</li> <li>En el área deberá implementar un extintor para evitar</li> </ul> | <p>Inspeccion In situ</p> <p>Área para el almacenamiento de combustible</p>            | X |  | <p>En el campamento se encuentra un área destinada para el almacenamiento de combustible, la misma que cuenta con piso pavimentado, bajo cubierta, kit antiderrame, señalética y extintor. ANEXO 9</p>  |

|    |  |   |  |   |  |
|----|--|---|--|---|--|
|    | <p>cualquier riesgo de incendio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tener un acceso adecuado para la carga de combustible y en caso de ser necesario para la entrada del carro de los bomberos</li> <li>El área deberá estar señalizado en base a la normativa NITFJUNFIN 2266.</li> </ul>  |   |  |   |  |
| 12 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ubicar el material de desalojo en los sitios descritos en el ítem 7 del presente documento.</li> <li>Los cuáles han sido ubicados de acuerdo con los siguientes criterios técnicos</li> <li>Deberán encontrarse dentro del área de influencia del Proyecto.</li> <li>El terreno deberá estar desprovisto de vegetación</li> <li>Alejado de cueros hídricos</li> <li>Las áreas destinadas a las escombreras deberán ser estables y seguras a corto y largo plazo.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Registro fotografía de las escombreras del Proyecto</li> <li>Actas de acuerdo de desalojo de escombreras (en caso de ser predios privados)</li> <li>Deberán contar con una capacidad mínima de 1500m3</li> <li>El transporte del material debe realizarse en una volqueta con cubierta (lona), con el fin de evitar derrames en la carretera.</li> </ul> |  | X | Se lo realizara cuando las actividades lo ameriten |

## PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

| ITEM | MEDIDA  | Medio de verificación  | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES  |
|------|---|--|--------|-----------|-----------|--|
| 1    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementar un área de almacenamiento temporal de desechos peligrosos en el cual deberá tener las siguientes características:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Estar bajo cubierta</li> <li>Iluminación natural</li> <li>En un espacio abierto cerrado</li> <li>El acceso a estos locales deberá ser registrado y el personal que ingiere estará provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad industrial</li> <li>Contar con señalización apropiada en lugares y formas visibles en base a la Norma nte inen 2266.</li> <li>Contar con el material y equipamiento para atender contingencias.</li> <li>Contar con sistemas de extinción contra incendios</li> <li>Contar con bases o pisos impermeabilizados osimilares según el caso.</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inspeccion In situ Campamento Amazonas Building S.A.</li> </ul> | X      |           |           | <p>En el campamento se encuentra un área destinada para el almacenamiento temporal de los desechos peligrosos, la misma que cuenta con piso pavimentado, bajo cubierta, kit antiderrame, señalética y extintor. Cabe mencionar que durante este periodo no se han realizado actividades productivas que generen desechos peligrosos.</p> <p><b>ANEXO 9</b></p> |
| 2    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dotar de fundas plásticas a los conductores de volquetes y máquinas pesadas para los desechos.</li> </ul>  | Inspección In situ   | X      |           |           | <p>La dotación de fundas plásticas anterior aún tiene unidades existentes para el correcto almacenamiento de los desechos comunes.</p> <p><b>ANEXO 7</b></p>   |
| 3    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación de contenedores de colores debidamente etiquetados para la clasificación en lavía, se deberá cumplir con las siguientes características:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Encontrarse bajo techo</li> <li>Contenedores de 55 galones (4)</li> <li>El rotulado estará en un lugar visible con caracteres legibles según lo</li> </ul> </li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Contenedores (CAC AMAZONAS BUILDING)</li> </ul>                 | X      |           |           | <p>Los puntos ecológicos instalados en el periodo anterior fueron sustraídos por lo que se tuvo que improvisar con basureros que no reúnen las condiciones necesarias para el buen uso de desechos sólidos.</p>  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | establecido en la NTE INEN 878. El nombre o denominación de los residuos con su logo respectivo y la distancia de observaciones <ul style="list-style-type: none"> <li>según lo establecido en la NTE INEN ISO 3864-1</li> </ul> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

### PLAN DE CAPACITACIÓN:

| ITEM | MEDIDA   | Medio de verificación  | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES  |
|------|--|--|--------|-----------|-----------|--|
| 1    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitaciones al personal de trabajo sobre:</li> <li>Medidas propuestas en el MA</li> <li>Manejo de los procedimientos de seguridad</li> <li>Trabajos en alturas</li> <li>Protecciones del ambiente</li> <li>Primeros auxilios y procedimiento en caso de emergencia</li> <li>Manejo de desechos peligrosos y no peligrosos</li> <li>Técnicas para prevenir conflictos con la comunidad</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inspección In situ - IAC AMAZONAS BUILDING</li> </ul> | X      |           |           | Todo el personal que opera en el proyecto ha sido capacitado en los temas de seguridad, salud y ambiente, de igual forma ha sido socializado el PMA. No se realizaron charlas ni conferencias en el área de influencia del proyecto. |

**PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS:**

| ITEM | MEDIDA   | Medio de verificación                                  | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES  |
|------|--|--|--------|-----------|-----------|--|
| 1    | • Realizar una reunión <del>previa</del> con los involucrados directos del Proyecto para darles a conocer las <del>ventajas</del> de implementación del Proyecto obra o actividad. |  |        |           | X         | El proyecto fue socializado en periodos anteriores.  |
| 2    | • Implementación un buzón <del>donde</del> se recepte las quejas y sugerencias de lapoblación.   | • Inspeccion in situ Campamento Amazonas Building S.A. | X      |           |           | El personal que se encuentra diariamente en el proyecto cuenta con hojas de registro, en las cuales las personas |
| 3    | • Participar activamente en reuniones y procesos comunales que se realiza que se realicen en el área de influencia   |  |        |           | X         | Las reuniones de informe de actividades y avance de obra se ejecutará en el siguiente mes de mayo.               |

**PLAN DE CONTINGENCIAS:**

| ITEM | MEDIDA  | Medio de verificación                         | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES  |
|------|---|---|--------|-----------|-----------|--|
| 1    | • Elaborar un plan de contingencia accesible a todo el personal en el cual se aborde la gestión de contingencia en caso de incendios, derrame, fuga o explotación | • Plan de contingencia Amazonas Building S.A. | X      |           |           | El proyecto cuenta con un plan de contingencia, el mismo queha sido socializado a los trabajadores. ANEXO 11 |
| 2    | • Crear un comité de seguridad que actúe en caso de emergencia.   |   |        |           | X         | Se prevé esta actividad para el próximo periodo del proyecto.  |

|   |   |   |  |   |  |
|---|---|---|--|---|--|
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizará simulacros, de evaluación, incendio, derrames o fugas para agilizar los tiempos de reacción del personal y su actuación.</li> </ul>   |   |  | X |  |
| 4 | <p>Actuar de la siguiente manera en caso de</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>En caso de incendio</b></li> </ul> <p>Si alguien detecta un fuego incipiente y sabe usar un extintor actúa inmediatamente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se recomienda el uso de extintores de industriales ubicados estrictamente</li> <li>Tipos de extintores</li> <li>El tipo A se usará durante la combustión de sólidos comunes</li> <li>El tipo B se usará para líquidos y gases inflamables El tipo C se para equipos eléctrico energizado y tipo de para metales combustibles</li> <li>Salve su vida y la de los demás abandonando el lugar de incendio</li> <li>Una vez a salvo avisar a la brigada hágalo sin pensar que otro ya lo han hecho</li> <li>Solicite Auxilio</li> <li>Si se encuentra Atrapado por el humo trate de salir arrastrándose o permanézcalo más cerca del suelo el humo tiende a subir y existe aire no contaminado a nivel del suelo</li> <li>Si el humo es muy denso cubrirse con un pañuelo ropa mojada la boca y nariz manténgase cerca del suelo</li> <li>Cuando se inflaman la ropa de una persona, impida que corra, el viento aviva el fuego. Cobríjelo con una manta húmeda haga que se proteja la cara y cuello.</li> <li><b>En caso de explosión</b></li> <li>Evacuen la zona de riesgo y proceda de acuerdo a lo establecido en el programa de contingencia</li> <li>Acordeón del área y restringe el acceso a personal ajeno</li> <li>Utilice el extintor adecuado</li> <li>No Intente extinguir el fuego hasta que la fuga haya sido detenida de otra manera existe grave riesgo de rescisión y explosión.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe técnico</li> </ul> |  | X | <p>Durante este periodo no ha existido ningún incidente y/o accidente de manera natural o antrópica, en caso de suceder se tomará en cuenta lo establecido en esta medida.</p> |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>• <b>En caso de sismo o fenómeno natural</b></p> <p>Antes un sismo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Conozca las zonas de seguridad</li> <li>-Contar con un mapa de peligro potencial y zonas seguras</li> <li>-Reciba entrenamiento en primeros auxilios y evacuación</li> <li>-Manténgase plenamente informado de cómo Interrumpir de forma segura sus labores habituales en el proceso de construcción</li> <li>-Observe la ubicación de su área de trabajo. Buscar sitios de protección contra materiales que pudieran desprenderse.</li> <li>-Haga una evacuación de vulnerabilidad de su entorno de trabajo para determinar los peligros potenciales</li> <li>-En caso de derrame o fuga</li> <li>-Localice el derrame o fuga</li> <li>-Antes de comenzar con el control o contención del derrame, debe colocarse los elementos de protección personal necesario: ropa adecuada impermeable y resistente a los productos químicos guantes protectores lentes de seguridad protección respiratoria.</li> <li>-Contenga con barreras, di que sí o materiales absorbentes</li> <li>-Colocar fluidos y desechables en recipientes de fundas para recolección de materiales contaminados</li> <li>-Entregar el material contaminado a un gestor calificado</li> </ul> |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

## PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO:

| ITEM | MEDIDA  | Medio de verificación   | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES   |
|------|---|---|--------|-----------|-----------|---|
| 1    | • Verificar el nivel de cumplimiento al presente PMA a través de un informe interno de cumplimiento de las medidas del plan de aprobación por la Autoridad Ambiental. | • Informe de monitoreo<br>• Registro Fotográfico IAC Amazonas Building S.A. | X      |           |           | Se presenta el informe correspondiente a este periodo.<br>Se contó con la visita del Técnico Ambiental GAD Provincial de Pastaza 27-04-2023 |
| 2    | • Monitorear el manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos dentro del área de influencia del proyecto.   | • Informe de monitoreo al manejo de desechos peligrosos y no peligrosos     |        |           | X         | La acción No Aplica, debido a que durante este periodo no se han realizado actividades que generen desechos peligrosos.                     |
| 3    | • Realizar el mantenimiento de los extintores   | • Extintores  | X      |           |           | Los extintores se encuentran recargados, en buen estado y ubicados en lugares visibles de fácil acceso.                                     |

## PLAN DE REHABILITACION:

| ITEM | MEDIDA  | Medio de verificación                               | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES  |
|------|---|---|--------|-----------|-----------|--|
| 1    | • Revegetación reforestación de áreas degradadas en el proyecto con plantas nativas de la zona. | • Registro fotográfico<br>• Informe de revegetación |        |           | X         | La acción no aplica, debido a que el proyecto se encuentra en etapa de construcción. |

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
 Oficina 072 785 269  
 keyszen.sas@gmail.com  
 www.keyszen.com  
 Machala – El oro - Ecuador

**PLAN DE ENTREGA Y ABANDONO:**

| ITEM | MEDIDA   | Medio de verificación  | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES  |
|------|--|--|--------|-----------|-----------|--|
| 1    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Desmantelamiento de la infraestructura temporal existente en el área del proyecto (campamento, área de almacenamiento de combustibles y desechos peligrosos)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Registro fotográfico</li> <li>Informe de monitoreo</li> </ul> |        |           | X         | La acción no aplica, debido a que el proyecto se encuentra en etapa de construcción. |
| 2    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Limpieza general del área del proyecto.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Registro fotográfico</li> </ul>                               |        |           | X         | La acción no aplica, debido a que el proyecto se encuentra en etapa de construcción. |

## 7. CUMPLIMIENTO GUIA DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES: TRAMO 2

|                   | # Medidas   | Cumple | No Cumple | N/A | Observaciones  |
|-------------------|---|--------|-----------|-----|--|
|                   | EQUIPOS DE OFIMÁTICA  |        |           |     |  |
| USO DE LA ENERGÍA | Una vez finalizada la jornada de trabajo apaga las luces, impresoras, computadoras y demás aparatos eléctricos.   |        |           | X   | En el área para lo cual se estableció el Certificado Ambiental no cuenta con oficinas en la misma                |
|                   | Cuando te ausentes por más de una hora, mejor apaga el monitor de la computadora o ponlo en hibernar, ya que gasta un 70% total del consumo energético del equipo. Un monitor encendido tiene una potencia de 60 W, unos 6,5 W en espera, y 1W apagado                                  |        |           | X   |  |
|                   | El único protector de pantalla que ahorra energía es negro. Es deseable configurarlo para que se active tras 10 minutos de inactividad.   |        |           | X   |  |
|                   | Los ordenadores portátiles son más eficientemente energéticos que los de mesa.  |        |           | X   |  |
|                   | Reduce el uso del papel o del secador de manos, utiliza tu propia toalla.   |        |           | X   |  |
|                   | Da preferencia al uso de las escaleras en lugar de los ascensores; es mucho más saludable, económico y ecológico.   |        |           | X   |  |
|                   | Llama al ascensor pulsando solo un botón para evitar hacer viajes innecesarios. O si vas a bajar o subir solo un piso mejor haz ejercicio, es bueno para tu salud.  |        |           | X   |  |
|                   | No conectes varios aparatos al mismo tiempo porque puede producirse una sobrecarga, posibles apagones y deterioro de las instalaciones a largo plazo.   |        |           | X   |  |
|                   | Configura los equipos de tu dependencia administrativa como computadoras, copiadoras, impresoras, etc. en modo de "ahorro de energía" para reducir el consumo de electricidad hasta en un 50%.  |        |           | X   |  |
|                   | Para sacar tres o menos copias, es mejor imprimir. A partir de cuatro hojas, la copiadora es la mejor opción  |        |           | X   |  |
|                   | Comparte eficientemente los equipos de dependencia administrativa entre compañeros  |        |           | X   |  |
|                   | Reporta a la unidad de tecnología de la institución daños o dificultades en el uso de equipos informáticos, ya que requieren de un adecuado mantenimiento para su óptimo rendimiento.   |        |           | X   |  |
|                   | Evitar el uso del fax térmico, ya que consume más energía y el papel no puede reciclarse.   |        |           | X   | En el área para lo cual se estableció el Certificado Ambiental no cuenta con oficinas en la misma                |
|                   | <b>CLIMATIZACIÓN</b>  |        |           |     |  |
|                   | Usar estos dispositivos sólo cuando sea necesario. Siempre que sea posible, aprovechar la regulación natural de la temperatura, por ejemplo, en verano las ventanas ertornabas o las corrientes de aire pueden refrescar algunas salas sin necesidad de encender el aire acondicionado. |        |           | X   | El personal contratado se transporta aprovechando movillización de vehículo de Contratista Amazonas Buildign S.A |
|                   | Apagar o minimizar los sistemas de calefacción o aire acondicionado en las salas no ocupadas: sala de reuniones vacías, fuera de las horas de trabajo   |        |           | X   |  |
|                   | Conocer adecuadamente cómo funcionan los sistemas de calefacción y refrigeración, para maximizar la eficiencia de los equipos de climatización.   |        |           | X   |  |

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03

Oficina 072 785 269

keyszen.sas@gmail.com

www.keyszen.com

Machala – El oro - Ecuador

|                         |  |  |  |   |  |
|-------------------------|--|--|--|---|--|
|                         | Mantener la temperatura aproximadamente en 20°C en invierno, y aproximadamente en 24°C en verano, para disminuir el consumo energético.  |  |  | X | En el área para lo cual se estableció el Certificado Ambiental no cuenta con oficinas en la misma                            |
|                         | Asegurarse de que los equipos de climatización se programan para funcionar exclusivamente en el período de trabajo, a excepción de situaciones en las que haga falta calefacción o refrigeración previas.  |  |  | X |  |
|                         | Asegurarse de que las puertas y ventanas están cerradas mientras funcionan los equipos de climatización, para impedir pérdidas y derroche  |  |  | X |  |
|                         | <b>ILUMINACIÓN</b>   |  |  |   |  |
|                         | Sustitución progresivamente las antiguas bombillas incandescentes y tubos fluorescentes, que usan tecnología ineficiente que desprende más calor que luz   |  |  | X | En el área para lo cual se estableció el Certificado Ambiental no cuenta con oficinas en la misma                            |
|                         | Usar interruptores independientes para iluminar sólo las zonas necesitadas de una misma área   |  |  | X |  |
|                         | Aprovechar la iluminación natural, organizando los puestos de trabajo de manera que se mantenga una adecuada iluminación, manteniendo limpias las ventanas y abriendo las persianas, cortinas u otros elementos similares, etc.  |  |  | X | La iluminación durante la ejecución de los trabajos es natural   |
|                         | Antes de encender las luces para encubrir los reflejos del sol en los ordenadores, probar cambiando los puestos de trabajo de lugar o la orientación de la pantallas, así como instalando láminas antirreflextantes en las ventanas o cortinas orientables.  |  |  | X | En el área para lo cual se estableció el Certificado Ambiental no cuenta con oficinas en la misma                            |
|                         | Asegurar una gestión apropiada de los tubos fluorescentes y bombillas, pues son residuos especiales  |  |  | X | En el área para lo cual se estableció el Certificado Ambiental no cuenta con oficinas en la misma, Iluminación natural       |
| USO DEL AGUA            | Colocar temporizadores o detectores de presencia para grifos. Esto puede suponer ahorros entre el 20 y el 40% del recurso  |  |  | X | En el área para lo cual se estableció el Certificado Ambiental no cuenta con oficinas en la misma                            |
|                         | Las cisternas deberán ser de doble descarga o de interrupción de descarga, en todo caso con limitador del volumen de descarga como máximo de seis litros. Esto puede suponer ahorros de hasta un 40%. Utilizar sistemas de detección de fugas en las cañerías enterradas u ocultas   |  |  | X |  |
|                         | Las fuentes de consumo humano deben estar dotadas de sistemas temporizadores o limitadores de caudal.  |  |  | X |  |
|                         | Soltar el agua del inodoro cuando así lo requiera y no usarlo como cesto de residuos (papel higiénico)   |  |  | X |  |
| GESTIÓN DE LOS DESECHOS | Eliminar los tachos de cada puesto de los funcionarios y colocar los tachos en un solo lugar con los colores y etiquetas correspondientes, esto ayudará a mejorar la clasificación de los desechos (tacho verde-residuos orgánicos, tacho gris-papel y cartón, tacho azul-plástico, tacho blanco-vidrio y latas, tacho negro -desechos ordinarios) |  |  | X | Se colocaron basureros en cada punto ecológico<br><b>REGISTRO FOTOGRAFICO IAC AMAZONAS BUILDING</b>                          |
|                         | Reducir: Normalmente adquirimos productos que tienen muchos envoltorios como el plástico, espuma Flex, etc. que tardan mucho tiempo en descomponerse y que son fabricados con materiales escasos como el petróleo, agua y madera. Antes de   |  |  | X | En el área para lo cual se estableció el Certificado Ambiental no cuenta con oficinas en la misma. Por lo que no se realizan |

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03

Oficina 072 785 269

keyszen.sas@gmail.com

www.keyszen.com

Machala—El oro - Ecuador

|               |  |   |  |   |  |
|---------------|--|---|--|---|--|
|               | comprar debemos pensar en lo que realmente necesitamos, y evitar envoltorios innecesarios.   |   |  |   | compras con dichos envoltorios, la alimentación del personal se realiza en Campamento Amazonas Building S.A. |
|               | <b>Reutilizar:</b> En este mundo modernizado se ha hecho normal el adquirir un bien y después de usarlo, fácilmente desecharlo sin pensar a dónde va eso que consideramos basura. Hay productos que podemos volver a usar muchas veces o darles otro uso haciendo algún artículo necesario para el hogar u dependencia administrativa. Evitando generar tanto desecho. |   |  | X | En el área para lo cual se estableció el Certificado Ambiental no cuenta con oficinas en la misma            |
|               | <b>Reciclar:</b> A este término se le suele confundir con el de "separar" o "reutilizar", sin embargo, el reciclar tiene que ver con la adquisición de materiales viejos o usados para ser procesados química o físicamente y obtener una materia prima y a partir de ésta fabricar productos nuevos   |   |  | X |  |
|               | Elimina el uso de botellas individuales de plástico, consume el agua del dispensador usando tomatodo o tu vaso personal  | X |  |   | Se capacito al personal sobre el uso de envases plasticos  |
|               | Elimina el uso excesivo de fundas plásticas, en su lugar utilizar fundas reutilizables.  | X |  |   | La dotación de fundas de basura para el personal es controlada y se sugiere reutilización ANEXO 07           |
| USO DEL PAPEL | Evitar su uso siempre que sea posible, por ejemplo, guardando los documentos en formato digital, optimizando el número de copias necesarias, compartiendo información en lugar de generar copias para cada persona, aprovechando las posibilidades de Internet, correos electrónicos, teléfono, etc.   |   |  | X | En el área para lo cual se estableció el Certificado Ambiental no cuenta con oficinas en la misma            |
|               | Utilizar de forma preferente y en la medida de lo posible papel reciclado. No se debe olvidar que el papel reciclado puede llegar a tener una calidad similar a la del papel convencional  |   |  | X |  |
|               | Evitar imprimir documentos innecesarios o de aquellos que tienen mucho espacios libres (Ej: presentaciones de power point)   |   |  | X |  |
|               | Antes e imprimir, comprobar los posibles fallos y mejoras del documento, utilizando, por ejemplo, la "vista previa": ajuste de márgenes, división de párrafos eficiente, paginación correcta, reducción del tamaño de las fuentes, etc.  |   |  | X |  |
|               | Utilizar el papel por las dos caras en el fotocopiado e impresión de documentos, siempre que sea posible. Igualmente, ajustar en la medida de lo posible, los textos para que quepan dos páginas de un documento, libro o publicación en una hoja estándar.  |   |  | X |  |
|               | Todos los documentos internos se imprimirán reutilizando papel o bien, usando papel reciclado y a doble cara   |   |  | X |  |
|               | Utilizar medios de comunicación electrónicos en la medida de lo posible para reducir el uso de impresoras y faxes  |   |  | X |  |
|               | Reutilizar todo el papel que haya sido impreso sólo por una cara para imprimir borradores, fabricar bloc de notas, etc   |   |  | X |  |

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03

Oficina 072 785 269

keyszen.sas@gmail.com

www.keyszen.com

Machala – El oro - Ecuador

|  |  |        |           |     |   |
|--|--|--------|-----------|-----|---|
|  | Reutilizar todo el papel que haya sido impreso sólo por una cara   |        |           | X   | En el área para lo cual se estableció el Certificado Ambiental no cuenta con oficinas en la misma   |
|  | Utilizar papel reciclado para hacer fotocopias.  |        |           | X   |   |
|  | Imprimir en calidad de borrador para evitar el desperdicio de tinta y facilitar la reutilización, especialmente en el caso de los documentos internos, y el reciclaje.   |        |           | X   |   |
|  | Separar el papel inservible, haciendo uso de los contenedores puestos a disposición a tal fin. Resulta interesante, siempre que sea posible, romper el papel antes de depositarlo en los contenedores para reducir el volumen que ocupa  |        |           | X   |   |
|  | Para los residuos, tener una pequeña papelera junto a cada mesa de trabajo optimizará la reutilización y reciclaje   |        |           | X   |   |
|  | <b>CONSUMO RESPONSABLE</b>   |        |           |     |   |
|  | Ajústate a las necesidades reales en cuanto a los insumos que existen en tu lugar de trabajo, así evitarás comprar inútilmente   |        |           | X   | En el área para lo cual se estableció el Certificado Ambiental no cuenta con oficinas en la misma   |
|  | Utiliza adecuadamente y comparte el material de la dependencia administrativa para alargar su vida útil, al mismo tiempo que se genera ahorro para la institución  |        |           | X   |   |
|  | Si vas a almorzar en la dependencia administrativa evita comprar alimentos que sabes te darán en envases de polietileno (espuma flex) para transportarlos, es un material que no se puede reciclar y contamina por mucho tiempo el ambiente, lleva tus propios recipientes y pide que te pongan los alimentos en ellos. Seamos coherentes con nosotros mismos y con la institución donde trabajamos. |        |           | X   | En el área para lo cual se estableció el Certificado Ambiental no cuenta con oficinas en la misma la alimentación del personal se realiza en Campamento Amazonas Building S.A.. |
|  | Prefiere las pilas recargables, ya que las pilas comunes contaminan de 3 mil a 175 mil litros de agua dependiendo de sus componentes como el mercurio. Las pilas recargables pueden usarse hasta unas dos mil veces según el tipo y uso adecuado.  |        |           | X   |   |
|  | Compra lápices y marcadores recargables, de esta manera evitarás generar más desechos. Prefiera productos cuyos envases tengan el logotipo de reciclable o reutilizable.   |        |           | X   | En el área para lo cual se estableció el Certificado Ambiental no cuenta con oficinas en la misma.  |
|  | Adquiere productos naturales para tu aseo personal, recuerda que el uso de aerosoles perjudica al ambiente   |        |           | X   |   |
| TRANSPORTE Y MOVILIDAD   | Desplazamiento a pie   |        |           | X   | El personal contratado se transporta aprovechando movilización de vehículo de Contratista Amazonas Building S.A.  |
|  | Utilizar el transporte público.  |        |           | X   |   |
|  | Utilizar bicicleta.  |        |           | X   |   |
|  | Cuando es inevitable el uso del vehículo privado, el sistema de carro compartido puede ser una opción bastante eficiente.  | X      |           |     |   |
| 1. OTROS (Incorporación de medidas conforme a la actividad del proyecto) |  |        |           |     |   |
| PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  | # Medidas  | Cumple | No Cumple | N/A | Observaciones   |
|  | Implementar señalética<br>Señalética de Prohibición<br>Señalética de condición obligatoria Señalética de   | X      |           |     | La colocación e implementación de la señalética informativa,  |

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
 Oficina 072 785 269  
 keyszen.sas@gmail.com  
 www.keyszen.com  
 Machala – El oro - Ecuador

|             |  |   |  |   |   |
|-------------|--|---|--|---|---|
| DE IMPACTOS | <p><b>condición segura Señalética preventiva</b><br/> <b>Señalética ambiental</b><br/> <b>Señalética Informativa.</b><br/>                     -Usar las figuras geométricas, colores de seguridad, y colores de contraste para señales de seguridad de la Tabla N°1 de la Norma INEN ISO 3864<br/>                     -Usar los diseños para señales de prohibición, acción obligatoria, precaución, condición segura.</p> |   |  |   | <p>preventiva y reglamentaria se establece para la etapa final del proyecto tal como lo señala el cronograma de ejecución de obra<br/> <b>REGISTRO FOTOGRAFICO IAC AMAZONAS BUILDING</b></p>  |
|             | <p>Humedecer la vía en días soleados para evitar material particulado, optimizando el recurso agua.</p>  | X |  |   | <p>En el presente periodo el clima permitió controlar la emisión de material particulado</p>  |
|             | <p>Zonificar las áreas de trabajo con cinta de peligro.</p>  | X |  |   | <p>Las áreas intervenidas han sido debidamente zonificadas, Instalación de barreras horizontales que delimitan el área de trabajo <b>REGISTRO FOTOGRAFICO IAC AMAZONAS BUILDING</b></p>   |
|             | <p>Cubrir con una lona las volquetas que trasladen material pétreo hacia el lugar de la obra</p>   | X |  |   | <p>Las volquetas cuentan con lona para cubrir el material pétreo y evitar el levantamiento de polvo.<br/> <b>ANEXO 06</b></p>   |
|             | <p>Las vías por donde circula el equipo caminero deben estar despejadas y sin obstáculos.</p>  | X |  |   | <p>Las vías se encuentran despejadas y en orden</p>   |
|             | <p>Realizar mantenimiento regular de la maquinaria y equipos utilizados.</p>   | X |  |   | <p>La revisión y mantenimiento de la maquinaria para el mes de abril se realizó en los talleres de la compañía Amazonas Building, ubicados en la parroquia Madre Tierra el cual consta con todos los permisos y regularizaciones ambientales. <b>REGISTRO FOTOGRAFICO IAC AMAZONAS BUILDING</b></p> |
|             | <p>El transporte del equipo se realizará utilizando las vías accesos existentes, considerando no causar molestias a los habitantes del costado de la vía y el posible deterioro de la misma.</p>   |   |  | X | <p>El equipo se traslada por el único acceso Vía Tena</p>   |
|             | <p>Implementar un kit anti derrame y equipos de respuesta rápida, para combatir posibles emergencias.<br/> <b>Contenido del Kit Anti Derrame:</b><br/>                     -Pala, paños absorbentes, (salchicha observante), guantes, botas, gafas protectoras, escoba, fundas o recipientes para recolectar los desechos contaminados.</p>  | X |  |   | <p>La empresa cuenta con el kit antiderrames, pero será utilizado en la etapa de asfaltado de la vía.<br/> <b>ANEXO 08</b></p>  |
|             | <p>Se deberá instalar de forma permanente un extintor y botiquín de primeros auxilios en los vehículos y/o maquinaria pesada.<br/> <b>Contenido del botiquín de primeros auxilios:</b></p>   | X |  |   | <p>Los vehículos y maquinarias están dotados de botiquín de primeros auxilios y un</p>  |

|                                   |  |   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|---|--|--|--|
|                                   | - Antisépticos, alcohol gel, gasas, tijeras, algodón, termómetro, esparadrapo.   |   |  |  | extintor ANEXO 04  |
|                                   | - Dotar al personal que labora en el proyecto de EPP.  | X |  |  | El personal ha sido dotado de EPP. Entrega de impermeables, gafas y chalecos a operadores de maquinaria pesada se realizó en el periodo anterior y tiene la vigencia de tres meses. ANEXO 05                         |
|                                   | Implementar un área para el almacenamiento temporal de combustibles, el cual deberá cumplir con las siguientes características:<br>-Deberá estar ubicado alejado de cuerpos hídricos, y aislado<br>-Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no inundables.<br>-La estructura será realizada con vigas de madera y cubierta de dura techo o también pueden ser hojas de zinc (Las dimensiones del área se las realizara en base a la cantidad de tanques de almacenamiento a utilizar).<br>-El tanque de almacenamiento deberá estar protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones que contaminen el ambiente, y contará manguera y llaves de distribución.<br>-El tanque de almacenamiento deberá estar rodeado de un cubeto o estructura de contención impermeable técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque.<br>-En el área se deberá implementar un extintor para prevenir cualquier riesgo de incendio.<br>-Tener un acceso adecuado para la carga de combustible y en caso de ser necesario para la entrada del carro de los bomberos.<br>-El área deberá estar señalizado en base a la normativa NTE INEN-ISO 2266. | X |  |  | El campamento de Amazonas Building cuenta con espacios de almacenamiento de combustibles ANEXO 09  |
|                                   | Ubicar el material de desalojo en los sitios descritos en el ítem 7. del presente documento. Los cuales han sido ubicado de acuerdo con los siguientes criterios técnicos:<br>-Deberán encontrarse dentro del área de influencia del proyecto.<br>-El terreno debe estar desprovisto de vegetación.<br>-Alejados de cursos hídricos.<br>-Las áreas destinadas para escombreras deberán ser estables y seguras a corto y largo plazo.<br>-Deberán contar con una capacidad mínima de 1500 m3<br>-El transporte del material deberá realizarse en una volqueta con cubierta (lona), con el fin de evitar derrames en la carretera.   | X |  |  | Se realizo un corte de talud en la abscisa 1+800 con un volumen aproximado de 800 m3 los cuales fueron depositados en frente por pedido verbal del propietario.<br><b>REGISTRO FOTOGRAFICO IAC AMAZONAS BUILDING</b> |
| <b>PLAN DE MANEJO DE DESECHOS</b> | Implementar un área de almacenamiento temporal de desechos peligrosos el cual deberá tener las siguientes características:<br>-Estar bajo cubierta<br>-Iluminación natural<br>-En un espacio abierto, cercado.   |   |  |  | El campamento de Amazonas Building cuenta con espacios de almacenamiento de desechos peligrosos (Aceite quemado), al presente  |

Urb. Puertas del Sur III, Mz. P-Sur-C1, Villa 03

Oficina 072 785 269

keyszen.sas@gmail.com

www.keyszen.com

Machala – El oro - Ecuador

|                                 |  |   |  |   |  |
|---------------------------------|--|---|--|---|--|
|                                 | <p>-El acceso a estos locales debe ser restringido, y el personal que ingrese estará provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad industrial;</p> <p>-Contar con señalización apropiada en lugares y formas visibles; en base a la norma NTE INEN 2266.</p> <p>-Contar con el material y equipamiento para atender contingencias</p> <p>-Contar con sistemas de extinción contra incendios</p> <p>-Contar con bases o pisos impermeabilizados o similares, según el caso.</p> <p><b>Colores de los contenedores a implementar.</b><br/> <b>Rojo: Desechos Peligrosos</b><br/>         Los desechos no peligrosos no se podrán almacenar por más de un año; deberán ser entregados a un gestor calificado para su tratamiento final.</p> |   |  |   | <p>periodo no se ha generado dichos residuos</p> <p><b>REGISTRO FOTOGRAFICO IAC AMAZONAS BUILDING</b></p>  |
|                                 | <p>Dotar de fundas plásticas a los conductores de volquetes y maquinaria pesada para los desechos comunes.</p>   | X |  |   | <p>El personal ha sido dotado de fundas plásticas.</p> <p><b>ANEXO 07</b></p>  |
|                                 | <p>Implementar de contenedores de colores debidamente etiquetados para la clasificación de los residuos en la vía, se deberá cumplir con las siguientes características:</p> <p>-Encontrarse bajo techo.</p> <p>-Contenedores de 55 galones (4)</p> <p>El rotulado estará en un lugar visible con caracteres legibles según lo establecido en la NTE INEN 878. El nombre o denominación de los residuos con su logo respectivo y la distancia de observación según lo establecido en la NTE INEN ISO 3864-1</p> <p>- Se realizará una clasificación general de residuos:</p> <p><b>Colores de los contenedores a implementar.</b><br/> <b>Azul: Reciclables</b><br/> <b>Negro: No Reciclables</b><br/> <b>Verde: Orgánicos</b><br/> <b>Rojo: Peligrosos</b></p>      | X |  |   | <p>En el primer periodo se construyó e instalo 1 punto ecológico compuestos por 3 basureros cada uno con su respectivo identificador para la clasificación de desechos orgánicos, papel y plásticos respectivamente, pero fueron sustraídos y remplazados por tres recipientes improvisados</p> <p><b>REGISTRO FOTOGRAFICO IAC AMAZONAS BUILDING</b></p> |
| PLAN DE CAPACITACIÓN            | <p>Capacitar al personal de trabajo sobre temas:</p> <p>-Medidas propuestas en el PMA</p> <p>-Manejo de los procedimientos de seguridad</p> <p>-Trabajos en altura</p> <p>-Protección del ambiente</p> <p>-Primeros Auxilios y procedimiento en caso de emergencias</p> <p>-Manejo de desechos peligrosos y no peligrosos.</p> <p>-Técnicas para prevenir conflictos con la comunidad.</p>   | X |  |   | <p>En el presente periodo no se realizaron capacitaciones al personal, temas propuestos han sido socializados en periodos anteriores</p>   |
| PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS | <p>Realizar una reunión previa con los involucrados directos del proyecto para darles a conocer las ventajas de la implementación del proyecto obra o actividad.</p>   | X |  |   | <p>El cambio del frente de trabajo afecto la organización de una reunión de trabajo por lo que se prevé la realización en el mes de mayo del presente año.</p>   |
|                                 | <p>Implementar un buzón donde se recepte las quejas y sugerencias de la población.</p>   |   |  | X |  |
|                                 | <p>Participar activamente en reuniones y procesos comunales que se realicen en el área de influencia.</p>  | X |  |   | <p>En el presente periodo no se realizó reunión con el</p>   |

|                        |   |   |  | área de influencia   |
|------------------------|---|---|--|--|
| PLAN DE CONTINGENCIA A | Elaborar un Plan de Contingencia accesible a todo el personal en el cual se aborde la gestión de contingencia en caso de incendio, derrame, fuga o explosión.   | X |  | El proyecto cuenta con un plan de contingencia, el mismo que ha sido socializado a los trabajadores ANEXO 11   |
|                        | Crear un comité de seguridad que actúe en caso de emergencias.  | X |  | en este periodo se empezó con el segundo tramo y por su extensión se dificulta la constitución del comité de vigilancia por lo que se prevé esta actividad para el próximo periodo del proyecto. |
|                        | Se deberá realizar simulacros, de evacuación. Incendios, derrames o fugas para agilizar los tiempos de reacción del personal y su actuación frente a un evento.   | X |  | El personal que se encuentra laborando fue capacitado con PLAN DE CONTINGENCIA AMAZONAS BUILDING S.A.  |
|                        | <p>Actuar de la siguiente manera en caso de:</p> <p><b>En Caso de Incendio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si alguien detecta un fuego incipiente y sabe usar un extintor, actúe inmediatamente.</li> <li>- Se recomienda el uso de extintores industriales ubicados estratégicamente</li> </ul> <p>Tipos de extintores:</p> <p><b>El tipo A:</b> Se usará durante la combustión de sólidos comunes,</p> <p><b>El tipo B:</b> Se usará para líquidos y gases inflamables</p> <p><b>El tipo C:</b> para equipo eléctrico energizado y el tipo D para metales combustibles.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salve su vida y la de los demás abandonando el lugar de incendio.</li> <li>- Una vez a salvo, avisar a la brigada (hágalo sin pensar que otros ya lo han hecho).</li> <li>- Solicite auxilio.</li> <li>- Mantenga la calma y espere al rescate.</li> <li>- Si se encuentra atrapado por el humo, trate de salir arrastrándose o permanezca lo más cerca del suelo, el humo tiende a subir y existe aire no contaminado a nivel del suelo.</li> <li>- Si el humo es muy denso, cúbrase con un pañuelo o ropa (mojados) la boca y nariz, manténgase cerca del suelo.</li> <li>- Cuando se inflaman las ropas de una persona, impida que corra, el viento aviva el fuego. Cobijelo con una manta húmeda y haga que se proteja la cara y cuello con las manos.</li> </ul> <p><b>En Caso de Explosión:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evacue la zona de riesgo y proceda de acuerdo a lo establecido en el programa de contingencias.</li> <li>- Acondone el área y restrinja el acceso a personal ajeno.</li> <li>- Utilice el extintor adecuado.</li> </ul> | X |  | En el presente periodo 01 al 30 de abril del 2023, no se registró incidente  |

|                                 |  |   |  |  |  |
|---------------------------------|--|---|--|--|--|
|                                 | <p>No <b>intente</b> extinguir el fuego hasta que las fugas hayan sido detenidas, de otra manera, existe grave riesgo de reignición y explosión.</p> <p><b>En caso de sismos o fenómenos naturales</b></p> <p>Antes de un Sismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conozca las zonas de seguridad.</li> <li>- Contar con un mapa de peligros potenciales y zonas seguras.</li> <li>- Recibir, entrenamiento en primeros auxilios y evacuación.</li> <li>- Manténgase plenamente informado de cómo interrumpir de forma segura sus labores habituales o el proceso de construcción.</li> <li>- Observe la ubicación de su área de trabajo, buscar sitios de protección contra materiales que pudieran desprenderse.</li> <li>- Haga una evaluación de vulnerabilidad de su entorno de trabajo para determinar los peligros potenciales.</li> </ul> <p><b>En caso derrame o fuga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Localice el derrame o fuga</li> <li>- Antes de comenzar con el control o contención del derrame, debe colocarse los elementos de protección personal necesarios: Ropa adecuada impermeable y resistente a los productos químicos; guantes protectores; lentes de seguridad; protección respiratoria.</li> <li>- Contenga con barreras, diques y/o materiales absorbentes.</li> <li>- Colocar fluidos y desechos en recipientes o fundas para recolección de materiales contaminados.</li> <li>- Entregar el material contaminado a un Gestor Calificado.</li> </ul> |   |  |  |  |
| PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO | <p>Verificar el nivel de cumplimiento al presente PMA, a través de un informe Internos de cumplimiento de las medidas del Plan Aprobado por la Autoridad Ambiental.</p>  | X |  |  | A través del presente Informe de Cumplimiento Ambiental, y mediante la visita de seguimiento del Técnico Ambiental del GAD provincial de Pastaza con fecha 27 de abril del 2023 REGISTRO FOTOGRAFICO IAC AMAZONAS BUILDING |
|                                 | <p>Monitorear el Manejo de los desechos peligroso y no peligrosos dentro del área de influencia del proyecto.</p>  | X |  |  | En el proyecto se encuentra en fase de excavación, al momento no ha generado desecho peligroso   |
|                                 | <p>Realizar el mantenimiento de los extintores</p>   | X |  |  | Se encuentran con mantenimiento vigente  |
| PLAN DE REHABILITACIÓN          | <p>Revegetación o reforestación de áreas degradadas en el proyecto con plantas nativas de la zona.</p>   | X |  |  | El proyecto aún se encuentra en la etapa de excavación y ampliación de la vía. Posteriormente  |
|                                 | <p>Retirar el suelo contaminado, y entregarlo a un Gestor Calificado para su disposición final, revegetar el área</p>  | X |  |  |  |

|                                     |  |  |  |   |  |
|-------------------------------------|--|--|--|---|--|
|                                     | con especies nativas   |  |  |   | se establecera las especies forestales para recuperación del bosque y estabilización de taludes. |
| PLAN DE ENTREGA Y ABANDONO DEL ÁREA | Desmantelamiento de la infraestructura temporal existente en el área del proyecto (campamento, área de almacenamiento de combustibles y desechos peligrosos) |  |  | X | El proyecto continua en ejecución.   |
|                                     | Limpieza general del área del proyecto.  |  |  | X |  |

## 8. CONFORMIDAD

Durante el periodo abril 01 del 2023 a abril 30 del 2023, En la ejecución del proyecto **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.**

**LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LAS MEDIDAS AMBIENTALES SE HAN CUMPLIDO**

## 9. CONCLUSIONES

Se obtuvo el permiso ambiental en el tramo del Km 12 Vía 10 de agosto \_ El Triunfo hasta Jatun Paccha desde la abscisa 0+000 hasta la abscisa 2+040 y desde la abscisa 2+500 hasta la 3+445, siendo este emitido con fecha 10 de abril del 2023

Podemos concluir en el presente informe mensual la administración del Proyecto **ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**, tiene como objetivo continuar con el cumplimiento de las medidas ambientales y así mitigar el impacto que esta obra pueda ocasionar en los moradores del sector.

En ese contexto, se recomienda continuar con la implementación del Plan de Manejo Ambiental, Guía de Buenas Prácticas Ambientales, así como también el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad del personal.

**Elaborado por:**



Elaborado el 10/04/2023 por:  
JESSICA GROSSELLA  
GROZABEL ROSILLO

Jessica Gorozabel Rosillo  
**INGENIERO AMBIENTAL**

**Aprobado por:**



Elaborado el 10/04/2023 por:  
JESSICA MARIELA  
JARAMILLO ARMIJOS

Jessica Jaramillo Armijos  
**KEYSZEN S.A.S.**  
**FISCALIZADOR EXTERNO**

# ANEXOS

## ANEXO 1. Permiso Ambiental



Via Puyo-Napo Km2 1/4  
Diagonal Hacienda los Chorizos  
Puyo - Ecuador  
Teléfonos (593 3) 2643809 / 2643065  
www.ambiente.gob.ec

Oficio No. MAE-DPP-2010-0457

Puyo, 09 de diciembre de 2010

Señor Ingeniero  
Jaime Patricio Guevara Blaschke  
Prefecto  
**GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA**  
Presente.

En respuesta al oficio N° 266-GPPZ-2010, de lugar y fecha, Puyo 04 de Noviembre de 2010, suscrito por el Ing. Rodrigo Villagomez, Técnico Ambiental del Gobierno Provincial de Pastaza, en el cual remite a la Dirección Provincial de Pastaza del Ministerio del Ambiente, para análisis y pronunciamiento de la Ficha Ambiental del proyecto: "ASFALTADO DE LA VIA CURARAY -FRANCISCO DE ORELLANA-INTERSECCION CON LA VIA 10 DE AGOSTO -EL TRIUNFO", al respecto comunico que luego de revisada la documentación y sobre el Informe Técnico N° 171 UCA.DPP de 08 de diciembre de 2010 realizado por el Ing. Franklin Guamán, Responsable de la Unidad Calidad Ambiental, se aprueba la Ficha Ambiental en mención, el cumplimiento a cabalidad del Plan de Manejo Ambiental de la ficha lo realizará el Ministerio del Ambiente hacia el proyecto a través de inspecciones, sin previo aviso.

Al ejecutarse modificaciones en la operación normal del proyecto, se deberá notificar en forma oficial e inmediata de los detalles de modificación y/o cambios a esta Dirección Provincial.

Atentamente,

  
José María García Paican  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA (E)



C.C. Señor  
Franklin Patricio Guamán Bosmediano  
Servidor Público 1  
MINISTERIO DEL AMBIENTE  
Señor  
Angel Guaberto Vargas Cevallos  
Servidor público de apoyo 3  
MINISTERIO DEL AMBIENTE

Oficio de aprobación del permiso ambiental del  
proyecto.

Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
Oficina 072 785 269  
keyszen.sas@gmail.com  
www.keyszen.com  
Machala - El Oro - Ecuador

## ANEXO 2. Certificado de Intersección



Via Puyo-Napo Km2 1/2  
Diagonal Hostena los Chontos  
Puyo - Ecuador  
Teléfonos: (593 3) 2683809 / 2683065  
www.ambiente.gob.ec

Oficio No. MAE-DPP-2010-0457

Puyo, 09 de diciembre de 2010

Señor Ingeniero  
Jaime Patricio Guevara Blaschke  
Prefecto  
GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA  
Presente.

En respuesta al oficio N° 266-GPPZ-2010, de lugar y fecha, Puyo 04 de Noviembre de 2010, suscrito por el Ing. Rodrigo Villagomez, Técnico Ambiental del Gobierno Provincial de Pastaza, en el cual remite a la Dirección Provincial de Pastaza del Ministerio del Ambiente, para análisis y pronunciamiento de la Ficha Ambiental del proyecto: "ASFALTADO DE LA VIA CURARAY -FRANCISCO DE ORELLANA-INTERSECCION CON LA VIA 10 DE AGOSTO -EL TRIUNFO", al respecto comunico que luego de revisada la documentación y sobre el Informe Técnico N° 171 UCA.DPP de 08 de diciembre de 2010 realizado por el Ing. Franklin Guaman, Responsable de la Unidad Calidad Ambiental, se aprueba la Ficha Ambiental. En consecuencia, el cumplimiento a cabalidad del Plan de Manejo Ambiental de la ficha lo realizará el Ministerio del Ambiente hacia el proyecto a través de inspecciones, sin previo aviso.

Al ejecutarse modificaciones en la operación normal del proyecto, se deberá notificar en forma oficial e inmediata de los detalles de modificación y/o cambios a esta Dirección Provincial.

Atentamente,

  
José María García Paican

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA (E)



C.C. Señor  
Franklin Patricio Guaman Bosmediano  
Servidor Público I  
MINISTERIO DEL AMBIENTE  
Señor  
Ángel Guilberto Vargas Cevallos  
Servidor público de apoyo 3  
MINISTERIO DEL AMBIENTE

**ANEXO 3. Certificado Ambiental (Tramo 2)**



CERTIFICADO AMBIENTAL No. MAATE-SUIA-DZDCH-2023-CA-0196

DIRECCIÓN ZONAL

MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Dado en PASTAZA, 10 de abril de 2023

La DIRECCIÓN ZONAL, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico del Ambiente y su Reglamento, y demás normativa ambiental vigente aplicable.

**CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO AMBIENTAL a favor de:**

ASFALTADO DE LA INTERSECCIÓN 10 DE AGOSTO – VÍA JATUNPACCHA

Otorgar el Certificado Ambiental a: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, considerando que ha registrado la información de su proyecto, obra o actividad en el Sistema Único de Información Ambiental SUIA; debiendo emplear durante todas las fases del mismo, las directrices que le apliquen dentro de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, emitida por la Autoridad Ambiental Nacional

**DETALLES DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD:**

**DATOS TÉCNICOS:**

Proyecto/Obra/Actividad:

Actividad Principal CIU: Obras de superficie en calles, carreteras, autopistas, puentes o túneles, asfaltado de carretera, pintura y otros tipos de marcado de carretera, instalación de barreras de emergencia, señales de tráfico y elementos similares. Incluye la construcción de pistas para aeropuertos.

Sector: Otros Sectores

Ubicación Geográfica: PASTAZA, PASTAZA, DIEZ DE AGOSTO

Coordenadas geográficas (Datum WGS 84 Zona 17S): Ver Anexo

**DATOS ADMINISTRATIVOS:**

Nombre del representante legal: GUEVARA BLASCHKE JAIME PATRICIO

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucía  
Código postal: 170101  
Teléfono: 072 785 269





Dirección: Km 7 Vía Puyo - Tena - Parroquia Fátima Hangares del GADPPz  
Teléfono: 032885380 - 0987573972 -  
Email: davidalejandroyedra@gmail.com - christianvargas900@gmail.com -  
Código del Proyecto: No. MAATE-RA-2023-468843

Actividad principal CIU: F4210.12.01

## DETALLE DE RESIDUOS Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES

| CÓDIGO DEL RESIDUO O DESECHO PELIGROSO Y/O ESPECIAL | NOMBRE DEL RESIDUO O DESECHO PELIGROSO Y/O ESPECIAL   | CRTIB | ORIGEN DE LA GENERACIÓN |
|---|---|-------|-------------------------|
| NE-42   | Material adsorbente contaminado con hidrocarburos: paños, paños, trapos, aserrín, barreras adsorbentes y otros materiales sólidos adsorbentes | T     | Subproducto             |
| NE-14   | Desechos de asfalto con contenido de alquitrán resultante de la construcción y el mantenimiento de carreteras                                 | T     | Subproducto             |

De conformidad a lo establecido en el artículo 178 del Código Orgánico del Ambiente y el artículo 427 del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, el presente Certificado Ambiental, no es de carácter obligatorio, siendo importante observar la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, en el desarrollo de su proyecto, obra o actividad en lo que fuere aplicable.

Atentamente,

VARGAS SALAZAR GAVINO  
DIRECCIÓN ZONAL  
MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Yo, GUEVARA BLASCHKE JAIME PATRICIO con Cédula/RUC N° 1600191454 declaro que la información que consta en el presente certificado es de mi absoluta responsabilidad. En caso de forzar, falsificar, modificar, alterar o introducir cualquier corrección al presente documento, asumo las responsabilidades y sanciones determinadas en la ley.

Atentamente,

Sr. GUEVARA BLASCHKE JAIME PATRICIO



Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Dirección: Calle Madrid 1150 y Andalucía  
Código postal: 170100  
Teléfono: 032 222 1111  
www.mta.gob.ec



Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
Oficina 072 785 269  
keyszen.sas@gmail.com  
www.keyszen.com  
Machala – El oro - Ecuador



SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

**Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica**

Dirección: Calle Madrid 1150 y Andalucía

Código postal: 170105 - Machala, El Oro

Teléfono: (072) 785 269

Correo electrónico: [ca@ambiente.gob.ec](mailto:ca@ambiente.gob.ec)




Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
Oficina 072 785 269  
[keyszen.sas@gmail.com](mailto:keyszen.sas@gmail.com)  
[www.keyszen.com](http://www.keyszen.com)  
Machala – El Oro – Ecuador

## ANEXO 4. Botiquín y Extintor



ANEXO 5. Actas de entrega EPP

|  |  |   |            |
|--|--|---|------------|
|   |  | <b>REGISTRO DE ENTREGA DE UNIFORMES</b> | Nº         |
| NOMBRE DEL TRABAJADOR:   |  | Tadjar Macario                          |            |
| CATEGORÍA OCUACIONAL:  |  | CÉDULA:                                 | 1600518826 |
| <b>SE LE HACE LA ENTREGA DE LO SIGUIENTE:</b>  |  |   |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAMISA DE TRABAJO COLOR AZUL CON FRANJAS PLOMAS</li> <li>• PANTALON DE TRABAJO COLOR AZUL CON FRANJAS PLOMAS</li> <li>• CALZADO TIPO BOTAS COLOR CAFÉ CON PUNTA DE ACERO</li> </ul>   |  |   |            |
| <b>OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPLEADOR</b>  |  |   |            |
| <b>Art. 1.- Obligaciones generales del empleador. -</b>  |  |   |            |
| <p>4. Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las medidas de prevención colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección individual adecuados.</p> |  |   |            |
| <b>PROHIBICIONES DEL EMPLEADOR Y TRABAJADORES</b>  |  |   |            |
| <b>Art.4.- Prohibiciones del empleador. -</b> La empresa deberá considerar las siguientes prohibiciones:   |  |   |            |
| c) Faculter al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y equipo de protección personal.   |  |   |            |
| <b>INCUMPLIMIENTOS</b>   |  |   |            |
| <b>Art. 133.-Incumplimientos</b>   |  |   |            |
| b) Faltas graves.  |  |   |            |
| • No cuidar o dar mal uso a los elementos de protección personal.  |  |   |            |
| <b>SANCIONES</b>   |  |   |            |
| <b>Art. 134.- Sanciones</b>  |  |   |            |
| c) Sanción pecuniaria administrativa o multa.  |  |   |            |
| - No excederá el monto del diez por ciento de la remuneración, y se impondrá por reincidencia en faltas leves en el cumplimiento de sus deberes. En caso de reincidencia, trabajador/a será destituido con sujeción a la ley.  |  |   |            |

**COMPROMISO:** Me comprometo a cuidar, mantener en buen estado y usar adecuadamente el equipo de protección personal. Cualquier imprevisto será notificado, teniendo presente que el inadecuado uso del EEP conlleva a sanciones por parte de la empresa.

  
FIRMA DEL TRABAJADOR

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| <b>REGISTRO DE ENTREGA DE UNIFORMES</b>  |  | Nº                                 |
| <b>NOMBRE DEL TRABAJADOR:</b> <i>Hugo J. ...</i>   |  |                                    |
| <b>CATEGORÍA OCUPACIONAL:</b>  |  | <b>CÉDULA:</b> <i>1600000000 2</i> |
| <b>SE LE HACE LA ENTREGA DE LO SIGUIENTE:</b>  |  |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAMISA DE TRABAJO COLOR AZUL CON FRANJAS PLOMAS</li> <li>• PANTALON DE TRABAJO COLOR AZUL CON FRANJAS PLOMAS</li> <li>• CALZADO TIPO BOTAS COLOR CAFÉ CON PUNTA DE ACERO</li> </ul>   |  |                                    |
| <b>OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPLEADOR</b><br><b>Art. 1.- Obligaciones generales del empleador. –</b><br><i>4. Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las medidas de prevención colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección individual adecuados.</i> |  |                                    |
| <b>PROHIBICIONES DEL EMPLEADOR Y TRABAJADORES</b><br><b>Art.4.- Prohibiciones del empleador. –</b> La empresa deberá considerar las siguientes prohibiciones:<br><i>c) Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y equipo de protección personal.</i>   |  |                                    |
| <b>INCUMPLIMIENTOS</b><br><b>Art. 133.-Incumplimientos</b><br><b>b) Faltas graves.</b><br><i>a. No cuidar o dar mal uso a los elementos de protección personal.</i>  |  |                                    |
| <b>SANCIONES</b><br><b>Art. 134.- Sanciones</b><br><b>c) Sanción pecuniaria administrativa o multa.</b><br><i>• No excederá el monto del diez por ciento de la remuneración, y se impondrá por reincidencia en faltas leves en el cumplimiento de sus deberes. En caso de reincidencia, trabajador/a será destituido con sujeción a la ley.</i>  |  |                                    |


**COMPROMISO:** Me comprometo a cuidar, mantener en buen estado y usar adecuadamente el equipo de protección personal. Cualquier imprevisto será notificado, teniendo presente que el inadecuado uso del EEP conlleva a sanciones por parte de la empresa.

  
 FIRMA DEL TRABAJADOR

| REGISTRO DE ENTREGA DE UNIFORMES   |                  | Nº                  |
|--|------------------|---------------------|
| NOMBRE DEL TRABAJADOR:   | Pedro Chacipanta |                     |
| CATEGORÍA OCUPACIONAL:   |                  | CÉDULA: 090377458-0 |
| <b>SE LE HACE LA ENTREGA DE LO SIGUIENTE:</b>  |                  |                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAMISA DE TRABAJO COLOR AZUL CON FRANJAS PLOMAS</li> <li>• PANTALON DE TRABAJO COLOR AZUL CON FRANJAS PLOMAS</li> <li>• CALZADO TIPO BOTAS COLOR CAFÉ CON PUNTA DE ACERO</li> </ul>   |                  |                     |
| <b>OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPLEADOR</b>  |                  |                     |
| <p><b>Art. 1.- Obligaciones generales del empleador. -</b></p> <p>4. <i>Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las medidas de prevención colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección individual adecuados.</i></p> |                  |                     |
| <b>PROHIBICIONES DEL EMPLEADOR Y TRABAJADORES</b>  |                  |                     |
| <p><b>Art.4.- Prohibiciones del empleador. -</b> La empresa deberá considerar las siguientes prohibiciones:</p> <p>c) <i>Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y equipo de protección personal.</i></p>   |                  |                     |
| <b>INCUMPLIMIENTOS</b>   |                  |                     |
| <p><b>Art. 133.-Incumplimientos</b></p> <p>b) <b>Faltas graves.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>No cuidar o dar mal uso a los elementos de protección personal.</i></li> </ul>   |                  |                     |
| <b>SANCIONES</b>   |                  |                     |
| <p><b>Art. 134.-Sanciones</b></p> <p>c) <b>Sanción pecuniaria administrativa o multa.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>No excederá el monto del diez por ciento de la remuneración, y se impondrá por reincidencia en faltas leves en el cumplimiento de sus deberes. En caso de reincidencia, el trabajador será destituido con suspensión a la ley.</i></li> </ul>  |                  |                     |

**COMPROMISO:** Me comprometo a cuidar, mantener en buen estado y usar adecuadamente el equipo de protección personal. Cualquier imprevisto será notificado, teniendo presente que el inadecuado uso del EEP conlleva a sanciones por parte de la empresa.

  
 FIRMA DEL TRABAJADOR

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>REGISTRO DE ENTREGA DE UNIFORMES</b>  |  | Nº                              |
|   |  |                                 |
| <b>NOMBRE DEL TRABAJADOR:</b> <i>Lolyan Miranda</i>  |  |                                 |
| <b>CATEGORÍA OPERACIONAL:</b>  |  | <b>CÉDULA:</b> <i>060116327</i> |
| <b>SE LE HACE LA ENTREGA DE LO SIGUIENTE:</b>  |  |                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAMISA DE TRABAJO COLOR AZUL CON FRANJAS PLOMAS</li> <li>• PANTALON DE TRABAJO COLOR AZUL CON FRANJAS PLOMAS</li> <li>• CALZADO TIPO BOTAS COLOR CAFÉ CON PUNTA DE ACERO</li> </ul>   |  |                                 |
| <b>OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPLEADOR</b><br><b>Art. 1.- Obligaciones generales del empleador. -</b><br><i>4. Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las medidas de prevención colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección individual adecuados.</i> |  |                                 |
| <b>PROHIBICIONES DEL EMPLEADOR Y TRABAJADORES</b><br><b>Art.4.- Prohibiciones del empleador. -</b> La empresa deberá considerar las siguientes prohibiciones:<br><i>c) Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y equipo de protección personal.</i>   |  |                                 |
| <b>INCUMPLIMIENTOS</b><br><b>Art. 122.- Incumplimientos</b><br><i>b) Faltas graves.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>No cuidar o dar mal uso a los elementos de protección personal.</i></li> </ul>   |  |                                 |
| <b>SANCIONES</b><br><b>Art. 134.- Sanciones</b><br><i>c) Sanción pecuniaria administrativa o multa.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>No excederá el monto del diez por ciento de la remuneración, y se impondrá por reincidencia en faltas leves en el cumplimiento de sus deberes. En caso de reincidencia, trabajador/a será destituido con sujeción a la ley.</i></li> </ul>   |  |                                 |

**COMPROMISO:** Me comprometo a cuidar, mantener en buen estado y usar adecuadamente el equipo de protección personal. Cualquier imprevisto será notificado, teniendo presente que el inadecuado uso del EEP conlleva a sanciones por parte de la empresa.

  
 FIRMA DEL TRABAJADOR

**ANEXO 6. Volquetas con Lona**



**ANEXO 7. Zona despejada y Señaletica**



Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
Oficina 072 785 269  
keyszen.sas@gmail.com  
www.keyszen.com  
Machala - El Oro - Ecuador

**ANEXO 7. Entrega de Fundas Plasticas**



**ANEXO 08. Kit antiderrame**



Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
Oficina 072 785 269  
keyszen.sas@gmail.com  
www.keyszen.com  
Machala – El oro - Ecuador

**ANEXO 09. Área para almacenamiento de combustible**



**ANEXO 10. Área para almacenamiento temporal de los desechos peligrosos**



Urb. Puertas del Sol III, Mz. P-Sol-C1, Villa 03  
Oficina 072 785 269  
keyszen.sas@gmail.com  
www.keyszen.com  
Machala – El Oro - Ecuador

ANEXO 11. Plan de Contingencias AMAZONAS BUILDING S.A.



**AMAZONAS BUILDING S.A.**  
PUYO - PASTAZA - ECUADOR

**PLAN DE CONTINGENCIA**

**ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE  
ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO  
12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN  
PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**

PREPARADO PARA:

**GADP DE PASTAZA**



ELABORADO POR:

**ING. LESLIE CASTILLO POZO**

**2022**



### Contenido

|  |    |
|--|----|
| 1. GENERALIDADES .....                                     | 3  |
| 1.1 OBJETIVOS .....  | 3  |
| 2. ENTIDADES DE APOYO ANTE UNA CONTINGENCIA .....          | 4  |
| 2.1 Cuerpo de bomberos .....                               | 4  |
| Tabla 1. Cuerpo de bomberos .....                          | 4  |
| 2.2 Salud .....  | 4  |
| TABLA 2. CENTROS DE SALUD .....                            | 4  |
| 2.3 Policía .....  | 4  |
| Tabla 3. Unidad de policía comunitaria .....               | 4  |
| 2.4 CRUZ ROJA .....  | 4  |
| Tabla 4. Cruz roja ecuatoriana .....                       | 4  |
| 3. RECURSOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS .....          | 4  |
| 3.1 Recursos humanos .....                                 | 5  |
| 3.2 Recursos físicos y logísticos .....                    | 5  |
| 3.3 Recursos físicos y logísticos .....                    | 5  |
| 3.4 Recursos económicos, .....                             | 5  |
| 4. CAPACITACION .....                                      | 5  |
| 4.1 Divulgación .....                                      | 5  |
| 4.2 Capacitación .....                                     | 6  |
| 4.3 Entrenamiento .....                                    | 6  |
| FIGURA 1. Organigrama para la atención de emergencia ..... | 6  |
| 5. PLANES DE RESPUESTA A CONTINGENCIAS .....               | 7  |
| FIGURA 1. Organigrama para la atención de emergencia ..... | 7  |
| 6. Firma de responsabilidad .....                          | 10 |



**MAZONAS BUILDING S.A.**

Miño - Pastaza - Ecuador

## PLAN DE CONTINGENCIA

**ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**

### 1 GENERALIDADES

El Plan de Contingencias se presenta para hacer frente oportunamente a las contingencias ambientales, estas están referidas a la ocurrencia de efectos adversos sobre el ambiente debido a situaciones de origen natural o producto de actividades humanas, situaciones no previsibles que estén en directa correlación con el potencial de riesgo y vulnerabilidad del área y del proceso productivo.

Las actividades no ofrecen mayores riesgos de contingencia para el medio ambiente, sin embargo, puede considerarse como contingencias, los riesgos por derrame de hidrocarburos, incendios y sismos.

Es política del proyecto, "ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", que trabajadores, así como todo usuario deberá tener en cuenta la seguridad física y de salud, en caso de emergencia dentro de las actividades relacionadas con materiales áridos y pétreos y en apoyo a las poblaciones cercanas.

### 2 OBJETIVOS

- Establecer las medidas de prevención, atención y control requeridas para atender eventos o siniestros, con fin de manejar eventualidades naturales y accidentes laborales que pudieran ocurrir en el área de influencia del proyecto.
- Asignar funciones y responsabilidades dentro del personal vinculado al área, que permitan generar acciones operativas prácticas, eficaces, ágiles frente a la probable ocurrencia de un evento o siniestro.

Proporcionar la información necesaria al personal que labora en el ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", para que puedan responder de forma inmediata y correcta a las situaciones de emergencia.

### 3. ENTIDADES DE APOYO ANTE UNA CONTINGENCIA

Ante la posible ocurrencia de contingencia que por su magnitud e implicaciones no pueden ser atendidas totalmente por el ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", es necesario el apoyo y participación de entidades públicas, como: organismos de infraestructura, tránsito, entre los que están, las emergencias, continuación, se relacionan las entidades de apoyo para la atención de contingencias en el área de influencia del ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.



### 3. Grupo de Bomberos

En la parroquia Madre Tierra donde se encuentran ubicada y operando del ASFALTADO DE LA VÍA CASPERAY FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA DE ASBESTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, al estar ubicada entre dos cantones, se puede contar con dos estaciones de bomberos las cuales prestan apoyo en una situación de emergencia.

Tabla 1. Grupo de Bomberos

| ESTACION                  | DIRECCION                             | TELÉFONO  |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Estación de bomberos Atal | La Misericordia                       | 032756133 |
| Campo de bomberos Puyo    | Av. Alberto Zambrano, Km 1.5 de Nayas | 033301112 |

### 3. Salud

El sistema de salud de Ecuador está conformado por dos sectores, público y privado. El sector público comprende al Ministerio de Salud Pública (MSP), y el instituciones de seguridad social Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Tabla 2. Centros de salud

| ESTACION           | DIRECCION                     | TELÉFONO  |
|--------------------|-------------------------------|-----------|
| Subcentro de salud | Cabecera parroquial           | 032884037 |
| IESS               | Casa Oscar Nolasco y Orellana | 032888014 |

### 3. Policía

Las **Unidades de Policía Comunitaria** (UPC) juegan un papel fundamental en el nuevo modelo de gestión de la Policía Nacional, donde el acercamiento a la ciudadanía es la base para los programas de prevención de delitos, así como el centro de integración de los barrios y comunidades en torno a la seguridad.

Tabla 3. Unidad de policía comunitaria

| ESTACION | DIRECCION                           | TELÉFONO   |
|----------|-------------------------------------|------------|
| UPC      | Cabecera parroquial, Pto. Principal | 03 002 317 |

### 3. COOPERATIVA

La Cruz Roja, basada en el deseo de prestar auxilio sin discriminación, a todos los heridos en el campo de batalla, se fundamenta en su capacidad internacional y nacional de prevenir y aliviar el sufrimiento humano dondequiera que se encuentre. Su propósito es proteger la vida y la salud y hacer respetar a la vida humana. Promueve la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre los pueblos.

Tabla 4. Cruz roja ecuatoriana

| ESTACION  | DIRECCION   | TELÉFONO    |
|-----------|---|-------------|
| CRUZ ROJA | Calle 9 de octubre, esquina del Hospital 12 de mayo | 03 228 5185 |

## 4. RECURSOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS





Los recursos humanos, logísticos, físicos y económicos necesarios para atender las contingencias se enuncian a continuación:

#### ii. Recursos humanos

Los recursos humanos están representados por el personal capacitado y entrenado que conforma los comités y grupos mencionados anteriormente; adicionalmente se encuentra el personal perteneciente a las entidades de apoyo.

#### iii. Recursos físicos y logísticos

Dentro de estos recursos encontramos todos los elementos, equipos y maquinaria necesarios para afrontar una contingencia.

#### iv. Recursos físicos y logísticos

Dentro de estos recursos encontramos todos los elementos, equipos y maquinaria necesarios para afrontar una contingencia.

- Unidades móviles
- Celulares
- Equipos contra incendios
- Equipos de primeros auxilios
- Equipos para control de movimientos de remoción en masa

#### v. Recursos económicos

Se deberá disponer de un rubro económico que de viabilidad al Plan Contingencia y que cubra en gran medida los gastos correspondientes a la atención de emergencias.

## 5. CAPACITACIÓN

Con el fin de asegurar un óptimo desarrollo del Plan de Contingencias se implementarán planes de capacitación, divulgación y entrenamiento para todo el personal que labore en la obra. Las actividades de capacitación, divulgación y entrenamiento serán dirigidas al personal directivo, profesional, técnico y obrero del ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

#### a. Divulgación

El objetivo de la divulgación del Plan de Contingencias es de informar y dar herramientas al personal que labore en el ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA para realizar las acciones que deben seguir en el momento de afrontar una emergencia; adicionalmente se pretende comunicar las responsabilidades y la forma organizacional del Plan de Contingencias.

Para conseguir este objetivo se realizarán las siguientes actividades:

- **Charlas y conferencias:** se realizarán charlas y conferencias donde se traten los siguientes temas: definición, objetivos, estructura y alcance del plan de contingencias; causa, magnitud y consecuencia de los riesgos; identificación de áreas más vulnerables (zonas de riesgo); seguridad industrial y salud ocupacional; medidas preventivas; primeros auxilios; comportamiento de las personas durante la emergencia; técnicas de orientación y movilización; manejo de información y medios de comunicación y equipos utilizados para la emergencia e instrucciones de manejo.
- **Folleto y cartillas:** se elaborarán folletos y cartillas didácticas, de forma sencilla donde se explique el manejo de equipos, información y medios de comunicación durante una



emergencia, pasos a seguir durante una emergencia y rutas seguras. Este material se entregará a todo el personal.

b. Capacitación

Se realizará un periodo de capacitación, en el cual participarán entidades especializadas en atención de emergencia y desastres como la Cruz Roja, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, entre otras.


c. Entrenamiento

Con el propósito de que el personal que labora en el ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, tenga un mejor desenvolvimiento ante una situación de emergencia, se programarán cursos, talleres y simulacros, consiguiendo una mejor preparación de dicho personal.

Los talleres y cursos están enfatizados en temas como: manejo de contingencias, uso de equipos, sistema de evacuación, atención de heridas, sistema de comunicación de emergencias y prestación de primeros auxilios.

Los simulacros se planificarán con anterioridad a su ejecución, estos serán evaluados con el fin de corregir las fallencias presentadas al atender una emergencia.

FIGURA 1. Organigrama para la atención de emergencias

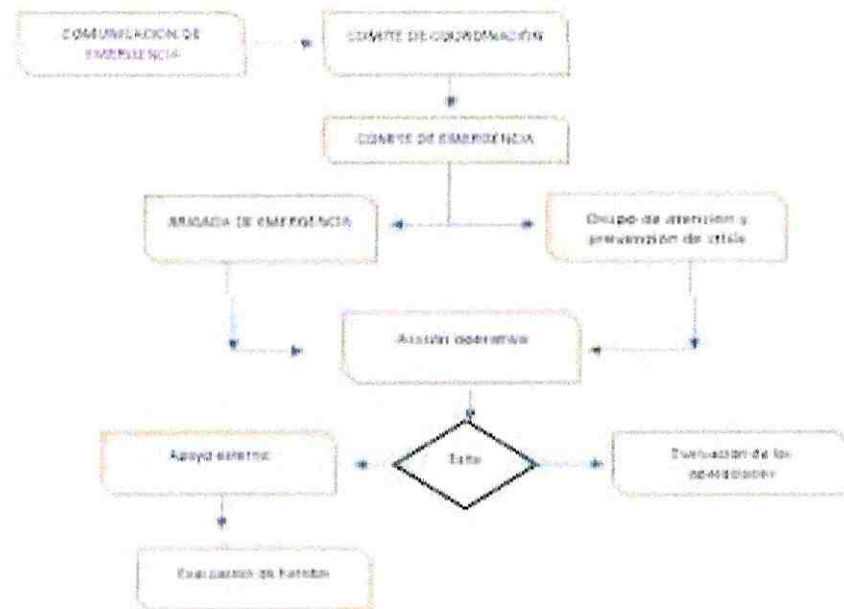



### PLANES DE RESPUESTA A CONTINGENCIAS

En el presente numeral se describen los planes de atención de emergencias, que contienen los procedimientos y acciones particulares para atender a cada uno de los riesgos en el momento de su desarrollo.

#### • Procedimiento

- Ubicar el lugar del accidente
- Movilizar los recursos necesarios para atender los heridos
- Identificar al personal herido
- Retirar al personal herido a un lugar seguro para brindarles los primeros auxilios
- Evaluar la condición del accidentado y su traslado a un centro de salud
- Trasladar el (los) herido(s) al centro de salud más cercano a la zona.
- Evaluar las causas del accidente y describir las lesiones.

#### CONTINGENCIA: ACCIDENTE DE TRABAJOS

##### AREA CRITICA

- Frentes de trabajo
- Campesinatos.


##### MEIDAS PREVENTIVAS

- Se debe cumplir cuidadosamente las normas de seguridad industrial.
- Usar elementos de protección personal
- Realizar adecuadamente el trabajo designado a cada personal
- Implementar medidas de seguridad en el ASFALTADO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRINIDAD, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DEL PASTAZA.
- Colocación de advertencia y barreras en los sitios de mayor probabilidad de ocurrencia de accidentes.
- Utilizar rutas de viaje y medios seguros de acceso.
- Señalización clara que comunique al personal y a la comunidad al tipo de riesgo al que se exponen.

##### PROCEDIMIENTO EN CASO DE LA CONTINGENCIA

- Comunicar inmediatamente la contingencia al Comité Coordinador del plan, quien a su vez informará al Comité de Emergencias.
- El comité de emergencia atenderá de inmediato el evento, desplazando recursos como personal capacitado, vehículos para transportar heridos al lugar del accidente
- Luego según sea la gravedad del evento, se pedirá apoyo a las entidades externas, como hospitales, bomberos y otras del municipio de Soacha.
- Simultáneamente se evacuará todo el personal del lugar del accidente.
- Una vez controlada la emergencia se hará una evaluación de los hechos que originaron el accidente y la magnitud de su gravedad.

FIGURA 1. Organigrama para la atención de emergencia.



RESPONSABLE

### CONTINGENCIA: ACCIDENTE DE TRABAJOS

#### AREA CRITICA

- Manipulación de hidrocarburos, aceites, combustibles, grasas, aceites usados.

#### MEASURAS PREVENTIVAS

- El espacio donde se almacena los hidrocarburos, aceites, combustibles, grasas, aceites usados, deberá ser de materiales apropiados y no presentar escapes.
- Se colocará una señal cerca del depósito donde se indique que es prohibido fumar.
- El depósito deberá contar con el siguiente equipo: extintores portátiles.
- Durante el recibo y suministro de hidrocarburos, aceites, combustibles, grasas, aceites usados, se pueden presentar accidentes que ocasionen derrames, por lo que los encargados de esta labor deben ser personas capacitadas en el manejo de hidrocarburos.
- El asesoramiento de combustible a la maquinaria u equipo pesado se realizará en el mismo frente de trabajo, tomando todas las medidas preventivas del caso.

#### PROCEDIMIENTO EN CASO DE LA CONTINGENCIA

- El comité de emergencias evaluará el evento determinando su magnitud.
- Se realizará un control inmediato de la fuente, en caso de presentarse el derrame durante el recibo o suministro, o por falla del tanque de almacenamiento.
- Se deberá aislar la zona del derrame y evitar que se acerque personal, pues se debe evitar la posibilidad de ocurrencia de un incendio.
- De manera inmediata se procederá a remover en su totalidad el hidrocarburo derramado.
- En caso de presentarse el derrame de hidrocarburos, aceites, combustibles, grasas, aceites usados, por el volcamiento de un vehículo, se dará aviso al comité coordinador, quien dependiendo de la magnitud del daño instruirá al comité de emergencias para activar el plan de acción que consiste en la intersección del derrame mediante zanjas construidas en el camino de migración del combustible.
- Controlará el evento mediante una evaluación de los efectos sobre el medio, para posteriormente restaurar el área afectada.

RESPONSABLE: Departamento ambiental, seguridad y salud ocupacional.

### AREA CRITICA

Area de influencia del ASFALTADO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

### PROCEDIMIENTO EN CASO DE LA CONTINGENCIA

- El personal debe mantener la calma y controlar el pánico.
- Detener todas las actividades que estén siendo realizadas en ese momento.
- El personal deberá evacuar las áreas de trabajo inmediatamente y desplazarse a espacios abiertos para evitar ser atrapados.
- Se verificará si falta personal.
- Verificará el estado de las comunicaciones, de la infraestructura y del personal.
- Se convocará la Brigada de Emergencias para que rescate y de primeros auxilios a los heridos; la brigada activará el procedimiento ante emergencia descrito en el numeral.
- Una vez evacuados los heridos se evaluarán los daños producidos por el sismo.
- Seguidamente se procederá a adecuar la zona afectada eliminando riesgo de derrumbes, escombros, etc.
- Recuperar la estabilidad del lugar.

**RESPONSABLE:** Departamento ambiental, seguridad y salud ocupacional

### CONTINGENCIA: INUNDACIONES

### AREA CRITICA

Area de influencia del ASFALTADO DE LA VIA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VIA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

### PROCEDIMIENTO EN CASO DE LA CONTINGENCIA

- Si mientras se conduce se produjera en el trayecto una inundación el conductor deberá disminuir la velocidad y ubicar, en las cercanías y a la brevedad posible, un lugar donde pueda estacionar la unidad de transporte en sitio apartado de zona de ocurrencia.
- Permanecer dentro de la cabina atento a la intensidad de la inundación y a la dirección de su desplazamiento las cuales podrían comprometer a la unidad de transporte.
  - Mantener la calma, evaluar la situación y de ser factible reubicar la posición de la unidad de transporte a otra más segura. Si la situación es crítica y se torna peligrosa para su integridad personal descender del vehículo y buscar ponerse a salvo en otra zona.
  - De ser el caso, comunicar el evento a las autoridades locales.

**RESPONSABLE:** Departamento ambiental, seguridad y salud ocupacional

## 7 Firma de responsabilidad

ELABORADO POR:

Ing. Leslie Castillo  
TÉCNICO AMBIENTAL DE LA COMPAÑIA  
AMAZONAS BUILDING.



LESLIE VERÓNICA  
CASTILLO PARDO

APROBADO POR:

Sr. Ordila Guevara  
GERENTE DE LA COMPAÑIA AMAZONAS  
BUILDING.



ORDILA VINCICIO  
GUEVARA MARIN




**MAZONAS BUILDING S.A.**

Puyo - Pastaza - Ecuador

# FACTURAS

"ASFALTADO DE LA VIACURARAY - FRANCISCO DE ORELLANA - JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO  
12.500 DEL ACERVO - EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600132607001

FACTURA

No. 001-002-000000371

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202301160013260700120010020000003712304011811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2023 08:09:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202301160013260700120010020000003712304011811

GUACHO CALDERON ROSA ELVIRA

REPUESTOS VILLAFUERTE

Dirección: AV. ALBERTO ZAMBRANO Y AV. LA TARQUI  
Matriz:

Dirección: AV ALBERTO ZAMBRANO Y AV. TARQUI  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AMAZONAS BUILDIND

Identificación: 1691710080001

Fecha: 01/04/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: PUYO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción  | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1022           | 1022          | 6.00     | TERMINAL DE COBRE  |                   | 2.68            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 16.07        |
| P5/16X1U NC    | P5/16X1U NC   | 10.00    | PERNO 5/16X1 UNC NG  |                   | 0.22            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.23         |
| CEN-003        | CEN-003       | 1.00     | SWITCH ARRANQUE UNIVERSAL 6T 24V                           |                   | 17.86           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 17.86        |
| RLY-050        | RLY-050       | 5.00     | RELAY 12V 5P ISUZU NPR NKR NHR JAC ENCENDIDO Y APAGADO UND |                   | 7.14            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 35.71        |
| CAB14          | CAB14         | 6.00     | CABLE 14 METRO   |                   | 0.45            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.68         |
| BM-1141        | BM-1141       | 8.00     | SOQUILLA METAL 1P CALIDAD                                  |                   | 1.34            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 10.71        |
| F1P24          | F1P24         | 8.00     | FOCO 24V 1P TW   |                   | 0.89            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 7.14         |
| UDS418         | UDS418        | 1.00     | CAMBIO LUZ PIE   |                   | 6.25            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 6.25         |
| SOQ016         | SOQ016        | 2.00     | SOQUET 3 CABLES H/M  |                   | 0.89            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.79         |
| IND260 R       | IND260 R      | 1.00     | INDUCIDO NUEVO HINO AK 24V 10 DIENTES UNI                  |                   | 58.04           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 58.04        |
| SOQ-001        | SOQ-001       | 1.00     | SOQUET   |                   | 2.68            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.68         |
| CAB14          | CAB14         | 10.00    | CABLE 14 METRO   |                   | 0.45            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 4.46         |
| 17197          | 17197         | 10.00    | FOCO UNA 24V 5W NARVA                                      |                   | 0.67            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 6.70         |

| Cod. Principal  | Cod. Auxiliar   | Cantidad | Descripción                         | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|-----------------|-----------------|----------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| SOQ002          | SOQ002          | 1.00     | SOQUET 2 CABLES H/M                 |                   | 1.34            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.34         |
| TERM1/4         | TERM1/4         | 6.00     | TERMINAL 1/4                        |                   | 0.22            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.34         |
| RT-036          | RT-036          | 1.00     | REGULADOR FORD                      |                   | 8.93            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 8.93         |
| 10X3/4CN        | 10X3/4CN        | 6.00     | TORNILLO 10X3/4 NIQ C/NORMAL        |                   | 0.30            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.79         |
| JHN 219-1602 RH | JHN 219-1602 RH | 2.00     | FARO ESQ.HINO RANGER FF-FD-GD/84-89 |                   | 17.86           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 35.71        |
| P8X20           | P8X20           | 10.00    | PERNO 8X20 MM NG                    |                   | 0.67            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 6.70         |
| P6X15           | P6X15           | 14.00    | PERNO 6X15 MM NG                    |                   | 0.45            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 6.25         |
| ESP19           | ESP19           | 4.00     | MANGUERA CORRUGADA 19MM KTC         |                   | 1.34            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 5.36         |
| SOQ006          | SOQ006          | 2.00     | SOQUET 6 CABLES H/M                 |                   | 1.34            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.68         |
| CAR150          | CAR150          | 3.00     | CARGA BATERIA                       |                   | 1.79            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 5.36         |

|   |        |
|---|--------|
| SubTOTAL 12%  | 247.78 |
| SubTOTAL 0%   | 0.00   |
| SubTOTAL NO OBJETO DE IVA                               | 0.00   |
| SubTOTAL EXENTO DE IVA                                  | 0.00   |
| SubTOTAL SIN IMPUESTOS                                  | 247.78 |
| TOTAL DESCUENTO   | 0.00   |
| ICE   | 0.00   |
| IVA 12%   | 29.73  |
| TOTAL DEVOLOUCIONIVA                                    | 0.00   |
| IRBPNR  | 0.00   |
| PROPINA   | 0.00   |
| VALOR TOTAL   | 277.51 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                | 0.00   |
| AHORRO POR SUBSIDIO<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00   |

| Información Adicional                       |                             |
|---|-----------------------------|
| RIMPE:                                      | Contribuyente Régimen RIMPE |
| Forma de pago                               | Valor                       |
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 277.51                      |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600294852001

FACTURA

No. 001-101-000000091

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202301160029485200120011010000000910000000118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2023 09:18:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202301160029485200120011010000000910000000118

TORRES TAMAYO JONATHAN RODOLFO

TORRES TAMAYO JONATHAN RODOLFO INGENIERO CIVIL

Dirección Matriz: MARCO AURELIO SUBIA.

Dirección Sucursal: MARCO AURELIO SUBIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1601710080001

Fecha: 04/04/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: BARRIO MIRAFLORES LUIS MOLINA Y FIDEL RODRIGUEZ

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción   | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 73             | 73            | 186.07   | ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO VIA AL PLODARAKY. |                   | 45.00           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 8373.15      |

Información Adicional

Mail: jntorres@hotmial  
Sistema: FERRERO  
Vendedor: ZULLY PERALVO  
Telefono: 032999977  
Correo: jntorres19@gmail.com  
Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD-9377.93  
Plazo: 15 DIAS

| Forma de pago                                     | Valor   |
|---|---------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 9377.93 |

|  |         |
|--|---------|
| SUBTOTAL 12%   | 8373.15 |
| SUBTOTAL 0%  | 0.00    |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                            | 0.00    |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                               | 0.00    |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                               | 8373.15 |
| TOTAL DESCUENTO                                      | 0.00    |
| ICE  | 0.00    |
| IVA 12%  | 1004.78 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                 | 0.00    |
| IRBPNR   | 0.00    |
| PROPINA  | 0.00    |
| VALOR TOTAL  | 9377.93 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                             | 0.00    |
| AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00    |

10%  
100%

TIENE LOGO

R.U.C.: 1891724612001

FACTURA

No. 001-801-000019642

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504202301189172461200120018010000196423074658718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2023 15:02:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202301189172461200120018010000196423074658718

VEHICENTRO VEHICULOS Y CAMIONES CENTRO SIERRA S.A

VEHICENTRO S.A.

Dirección: Av. Indoamerica Km 3 1/2  
Matriz:

Dirección: AV. INDOAMERICA KM 3 1/2  
Sucursal:

Contribuyente Especial 00183

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1891724612001

Fecha: 05/04/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción  | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| FUCH10W40      | SD            | 42.00    | ACEITE MOTOR FUCHS 10W40 LTS                                   |                   | 5.76            | 0.00     | 0.00                | 36.29     | 205.63       |
| J0V05504-0122  | SD            | 1.00     | ELEMENTO DE ACEITE C7H 540HP 200V05504-0108/200V05504-0107     |                   | 19.53           | 0.00     | 0.00                | 2.93      | 16.60        |
| 201V12503-0062 | SD            | 1.00     | ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIBLE T5G 340HP                       |                   | 21.00           | 0.00     | 0.00                | 3.15      | 17.85        |
| ARAL75W80      | SD            | 18.50    | ACEITE ARAL CAJA ZF  |                   | 19.80           | 0.00     | 0.00                | 54.95     | 311.36       |
| WG992555       | SD            | 1.00     | ELEMENTO FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE C7H 540HP TX 390 FS20190 |                   | 37.71           | 0.00     | 0.00                | 5.66      | 32.05        |
| 85W140EX P     | SD            | 46.00    | ACEITE DE TRANSMISION TM85W140                                 |                   | 5.71            | 0.00     | 0.00                | 39.40     | 223.26       |
| M1815          | SD            | 1.00     | FILTRO DE ACEITE DEL RETARDADOR CAJA ZF HFC4253                |                   | 53.00           | 0.00     | 0.00                | 7.95      | 45.05        |
| RM1085         | SD            | 1.00     | INSUMOS VARIOS   |                   | 10.00           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 10.00        |

| Información Adicional |  |
|-----------------------|--|
| Dirección:            | PUYO AV. TARQUI SN Y LOS LAURELES/PUYO/PASTAZA |
| Email:                | janacaramo@hotmail.com                         |
| MARCA:                | SD   |
| CLASE:                | LUBRICANTES                                    |
| TIPO:                 | SD   |
| MODELO:               | SD   |
| COLOK:                | SD   |
| ANIO:                 | SD   |
| CHASIS:               | FUCH10W40                                      |
| MOTOR:                | SD   |
| CILINDRAJE:           | SD   |
| PAISORIGEN:           | SD   |
| RAW:                  | SD   |
| TONELAJE:             | 0 N° Pasajeros; SD Combustible; SD             |
| Motivo:               | VENIA  |

| Forma de pago                                     | Valor  |
|---|--------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 965.22 |

|   |        |
|---|--------|
| SUBTOTAL 12%  |        |
| SUBTOTAL 0%   |        |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                               |        |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                  | 0      |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                  | 861.80 |
| TOTAL DESCUENTO   | 150.32 |
| ICE   | 0.00   |
| IVA 12%   | 103.42 |
| TOTAL DEVOLUCIÓN IVA                                    | 0.00   |
| IRBPNR  | 0.00   |
| PROPINA   | 0.00   |
| VALOR TOTAL   | 965.22 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                | 0.00   |
| AHORRO POR SUBSIDIO<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00   |

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1715603211001

FACTURA

No. 001-002-000000058

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0504202301171560321100120010020000000582022112117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2023 17:59:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202301171560321100120010020000000582022112117

COFRE HERRERA MIGUEL ANGEL

MCORP LUBRICANTES Y REPUESTOS

Dirección: AV. MALDONADO DPTO 704 Y JOAQUIN GUTIERREZ  
Matriz:

Dirección: AV. MALDONADO DPTO 704 Y JOAQUIN GUTIERREZ  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S. A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 05/04/2023

Placa / Matricula:

Guia

Dirección: PUYO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción        | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 000237         | 110911-00126  | 2.00     | CAP FUEL           |                   | 128.74          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 257.48       |
| 000065         |               | 1.00     | ENVIO DE REPUESTOS |                   | 5.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 5.00         |

Información Adicional

Dirección: PUYO  
Teléfonos: 032284445  
Email: jinnas@hotmai.com

| Forma de pago                                     | Valor  |
|---|--------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 293.98 |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12%              | 262.48 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00   |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00   |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00   |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 262.48 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00   |
| ICE                       | 0.00   |
| IVA 12%                   | 31.50  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00   |
| IRBPNR                    | 0.00   |
| PROPINA                   | 0.00   |
| VALOR TOTAL               | 293.98 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO.<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1701952069001

FACTURA

No. 001-014-000000717

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202301170195206900120010140000007170000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2023 08:00:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804202301170195206900120010140000007170000000017

FUENTES FLORES MARIA DEL CARMEN

E/S AZOR SHELL

Dirección: AV PADRE LUIS JACOME  
Matriz:

Dirección: AV. BARRIO LAS PALMAS, AV. ALBERTO ZAMBRANO  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710000001

Fecha: 08/04/2023

Placa / Matricula: ABC9999

Gula

Dirección: BARRIO MIRAFLORES

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción    | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0121           | 3             | 1002.48  | DIESEL PREMIUM |                   | 1.56            | 1.53     | 3.09                | 0.00      | 1566.37      |

Información Adicional

in\_Factura: 001-014-000000717  
E\_MAIL: shellazor@factura@gmail.com  
Direccion\_Cliente: BARRIO MIRAFLORES  
Telefono\_Cliente: 000  
Codigo\_Cliente: 45848

| Forma de pago                                     | Valor   |
|---|---------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1754.33 |

332 %

|  |         |
|--|---------|
| SUBTOTAL 12%   | 1566.37 |
| SUBTOTAL 0%  | 0.00    |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00    |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00    |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 1566.37 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00    |
| IVA  | 0.00    |
| IVA 12%  | 187.96  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00    |
| IRBPNR   | 0.00    |
| PROPINA  | 0.00    |
| VALOR TOTAL  | 1754.33 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 3470.44 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 1716.11 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1000100899001

FACTURA

No. 001-014-000001582

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1004202301100010089900120010140000015820000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/04/2023 10:09:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1004202301100010089900120010140000015820000000014

VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL

E/S AZOR

Dirección Matriz: LAS PALMAS AV ALBERTO ZAMBRANO SIN VIA PUYO

Dirección Sucursal: LAS PALMAS, AV ALBERTO ZAMBRANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación 1691710080001

Fecha 10/04/2023

Placa / Matrícula: ABE4997

Guía

Dirección: BARRIO MIRAFLORES

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción    | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0121           | 3             | 3290.71  | DIESEL PREMIUM |                   | 1.56            | 1.53     | 3.09                | 0.00      | 5141.73      |

Información Adicional

No. Factura: 001-014-000001582  
 E\_MAIL: jinmaria@hotmail.com  
 Dirección\_Cliente: BARRIO MIRAFLORES  
 Telefono\_Cliente: 0  
 Código\_Cliente: 66

| Forma de pago                                     | Valor   |
|---|---------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 5758.74 |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| SUBTOTAL 12%              | 5141.73 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00    |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00    |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00    |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 5141.73 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00    |
| ICE                       | 0.00    |
| IVA 12%                   | 617.01  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00    |
| IRBPNR                    | 0.00    |
| PROPINA                   | 0.00    |
| VALOR TOTAL               | 5758.74 |

|  |          |
|--|----------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 11391.99 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 5633.25  |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600253908001

FACTURA

No. 001-100-000000046

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


1004202301160025390800120011000000000467085096616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/04/2023 09:53:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1004202301160025390800120011000000000467085096616

NAVAS GUERRERO EDWIN MARCELO

MECANICA EN GENERAL NAVAS

Dirección: Barrio: LAS PALMAS Calle: AV. ALBERTO ZAMBRANO  
Matriz: Número: S/N Intersección: BENIGNO MALO

Dirección Sucursal: Barrio: LAS PALMAS Calle: AV. ALBERTO ZAMBRANO  
Número: S/N Intersección: BENIGNO MALO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación 1691710080001

Fecha 10/04/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: PUYO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción   | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 001            |               | 1.00     | ARREGLO DE VOLQUETA HINO<br>Fm CAMBIO DE ZAPATAS<br>RULIMANES Y ENGRASADAS<br>DE 6 RUEDAS |                   | 400.00          | 0.00     | 400.00              | 0.00      | 400.00       |
| 002            |               | 1.00     | SACADO DE LA TORRE PORTA<br>CHUMACERAS PARA LLEVAR<br>AL TORNO                            |                   | 550.00          | 0.00     | 550.00              | 0.00      | 550.00       |

Información Adicional

Email: jinmarim@hotmail.com

| Forma de pago                                     | Valor  |
|---|--------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 950.00 |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12%              | 0.00   |
| SUBTOTAL 0%               | 950.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00   |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00   |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 950.00 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00   |
| ICE                       | 0.00   |
| IVA 12%                   | 0.00   |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00   |
| IRBPNR                    | 0.00   |
| PROPINA                   | 0.00   |
| VALOR TOTAL               | 950.00 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



09 79 131 549

R.U.C.: 1301381438001

FACTURA

No. 002-100-000000803

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1104202301130138143800120021000000008033201050415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/04/2023 11:31:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1104202301130138143800120021000000008033201050415

ZAMBRANO BELLO LAURA ALEGRIA

RULIMANESA

Dirección Matriz: Calle: AV. 10 DE AGOSTO Número: N39-256 Intersección: ARIZACA

Dirección Sucursal: Calle: AV 10 DE AGOSTO Número: N39-256 Intersección: ARIZACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1801710000001

Fecha: 11/04/2023

Placa / Matricula:

Gula

Dirección: VIA A LA TAPAJI

| Cod. Principal   | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción               | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|------------------|---------------|----------|---------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| HM221449/10.NTN. |               | 2.00     | HM221449/10 NTN           | ROD CONICO        | 398.76          | 0.00     | 0.00                | 79.75     | 717.77       |
| RETEN CR         |               | 2.00     | RETEN CR 111.6126.9711.13 | RET PLG           | 39.54           | 0.00     | 0.00                | 7.91      | 71.17        |
| ENVIO            |               | 1.00     | SERVICIO DE ENVIO         |                   | 6.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 6.00         |

Información Adicional

Telefono: 0993313516

Email: jnreparacion@hotmail.com

| Forma de pago                                     | Valor  |
|---|--------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 889.61 |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12%              | 788.94 |
| SUBTOTAL 0%               | 6.00   |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00   |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00   |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 794.94 |
| TOTAL DESCUENTO           | 87.66  |
| ICE                       | 0.00   |
| IVA 12%                   | 94.67  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00   |
| IRBPNR                    | 0.00   |
| PROPINA                   | 0.00   |
| VALOR TOTAL               | 889.61 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                             | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

Handwritten calculations: 7195 + 140 = 7335, 28440 \* 30% = 8532, 7335 - 8532 = -1197, 7335 - 1197 = 6138

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1301381438001

FACTURA

No. 002-100-000000803

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1104202301130138143800120021000000008033201050415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/04/2023 11:31:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1104202301130138143800120021000000008033201050415

ZAMBRANO BELLO LAURA ALEGRIA

RULIMANESA

Dirección: Calle: AV 10 DE AGOSTO Número: N39-256  
Matriz: Intersección: ARIZAGA

Dirección: Calle: AV 10 DE AGOSTO Número: N39-256  
Sucursal: Intersección: ARIZAGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080999

Fecha: 11/04/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: VIA A LA TABOLA

| Cod. Principal  | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción               | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|-----------------|---------------|----------|---------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| HH221449/10 NTN |               | 2.00     | HH221449/10 NTN           | ROD CONICO        | 398.76          | 0.00     | 0.00                | 79.75     | 717.77       |
| RETEN CR        |               | 2.00     | RETEN CR 111.6126.9711.13 | RET PLG           | 39.54           | 0.00     | 0.00                | 7.91      | 71.17        |
| ENVIO           |               | 1.00     | SERVICIO DE ENVIO         |                   | 6.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 6.00         |

Información Adicional

Telefono: 0983975516

Email: jinmanes@hotmail.com

| Forma de pago                                     | Valor  |
|---|--------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 889.61 |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12%              | 788.94 |
| SUBTOTAL 0%               | 6.00   |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00   |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00   |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 794.94 |
| TOTAL DESCUENTO           | 87.66  |
| ICE                       | 0.00   |
| IVA 12%                   | 94.67  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00   |
| IRBPNR                    | 0.00   |
| PROPINA                   | 0.00   |
| VALOR TOTAL               | 889.61 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1802005429001

FACTURA

No. 001-003-000000705

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1104202301180200542900120010030000007051263190014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/04/2023 10:56:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1104202301180200542900120010030000007051263190014

BRAVO MOROCHO FREDI MANUEL

BRAVO MOROCHO FREDI MANUEL

Dirección: AV ALBERTO ZAMBRANO SM Y ALPAYACU  
Matriz:

Dirección: AV ALBERTO ZAMBRANO SN Y ALPAYACU  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AMAZONAS BUILDING SA

Identificación: 1691710080001

Fecha: 11/04/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: PUYO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                            | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| PCFM500        |               | 28.00    | Perno Milimetrico Flange<br>M8*1.25*30 |                   | 0.45            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 12.50        |
| A68M           |               | 3.00     | Banda Alternador Mitsuba               |                   | 5.36            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 16.07        |
| PV0057         |               | 4.00     | P. Rueda Gd/Gh/Fm Del Rh               |                   | 5.36            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 21.43        |
| UC210DI        |               | 8.00     | Pulman Chumacera Uc210di Ntn           |                   | 31.25           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 250.00       |
| PV0813         |               | 4.00     | Bacin Chumacera Hlno Fm<br>790/Nissan  |                   | 17.86           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 71.43        |
| G1/2X12        |               | 2.00     | Pernos Guia 1/2x12                     |                   | 3.57            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 7.14         |
| E-39           |               | 6.00     | Seguro Exterior                        |                   | 0.89            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 5.36         |
| 9899           |               | 2.00     | Spray Desoxidante Wd40 Mannol          |                   | 4.91            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 9.82         |
| RFA021         |               | 2.00     | Pulmon Doble Tipo 30/30 Rectrex        |                   | 48.21           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 96.43        |
| 821987V-03     |               | 1.00     | Hoja Toyota Hilux 1600 M/70-76<br>Pos  |                   | 19.64           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 19.64        |
| PIAM087        |               | 4.00     | Perno Milimetrico M8*1.25*50           |                   | 0.45            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.79         |
| PIAM235        |               | 5.00     | Perno Milimetrico M12*1.5*50           |                   | 1.07            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 5.36         |
| B53L           |               | 3.00     | Banda Lisa V-Belt                      |                   | 7.14            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 21.43        |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                           | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Pre    |
|----------------|---------------|----------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------|
| BPK1395        |               | 1.00     | Bandas Accesorios Freigliner          |                   | 21.43           | 0.00     | 0.00                | 0.00      |        |
| B68M           |               | 4.00     | Banda Mitsuba                         |                   | 7.14            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 28.56  |
| JD3522         |               | 1.00     | Trabador De Roscas Rojo Reflex        |                   | 2.68            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.68   |
| PV0937         |               | 5.00     | P. Rueda Daihatsu Delta Del Rh Reflex |                   | 6.25            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 31.25  |
| UCF213-40J     |               | 4.00     | Chumacera Hoyo 63 Mm                  |                   | 123.21          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 492.86 |
| 440211V-02     |               | 2.00     | Hoja Hino Fm M/2007 Pos               |                   | 97.32           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 194.64 |
| B62M           |               | 1.00     | Banda Alternador Mitsuba              |                   | 7.14            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 7.14   |
| PV0056         |               | 4.00     | P. Rueda Gd/Gh/Fm Del Lh              |                   | 5.36            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 21.43  |
| B70M           |               | 2.00     | Banda Alternador Mitsuba              |                   | 7.14            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 14.29  |
| GM12X10        |               | 1.00     | Pernos Guia M12x10                    |                   | 3.57            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 3.57   |
| PIAM233        |               | 5.00     | Perno Milimetrico M12*1.5*35          |                   | 0.89            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 4.45   |
| TIAM110        |               | 8.00     | Tuerca Milimetrica Flange M10*1.25    |                   | 0.33            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.68   |
| B75M           |               | 1.00     | Banda Alternador Mitsuba              |                   | 8.93            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 8.93   |
| JD3522         |               | 2.00     | Trabador De Roscas Rojo Reflex        |                   | 1.34            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.68   |
| PIAM236        |               | 10.00    | Perno Milimetrico M12*1.5*60          |                   | 1.03            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 10.27  |
| TIAM006        |               | 20.00    | Tuerca Milimetrica M10*1.25           |                   | 0.18            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 3.57   |
| PV0830         |               | 1.00     | Pista Retenedor Tandem Gruesa Reflex  |                   | 28.57           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 28.57  |
| TIAM004        |               | 4.00     | Tuerca Milimetrica M8*1.25            |                   | 0.13            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.54   |
| 821987V-04     |               | 2.00     | Hoja Toyota Hilux 1600 M/70-76 Pos    |                   | 15.92           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 31.25  |
| CMTA404        |               | 7.00     | Cono 5/8                              |                   | 4.02            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 28.14  |
| G5/8X14C G     |               | 2.00     | Pernos Guia 5/8x14 Cg                 |                   | 6.25            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 12.50  |
| PIAM174        |               | 8.00     | Perno Milimetrico M10*1.5*40          |                   | 0.67            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 5.36   |
| JD3522         |               | 1.00     | Trabador De Roscas Rojo Reflex        |                   | 1.79            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.79   |
| 9911           |               | 5.00     | Silicon Gris 85g Mannol               |                   | 3.57            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 17.86  |
| AERP005        |               | 4.00     | Arandela Presion 5/16                 |                   | 0.09            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.36   |
| PIAM007        |               | 8.00     | Perno Milimetrico M6*1.0*40           |                   | 0.28            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.23   |
| G3/8X4         |               | 2.00     | Pernos Guia 3/8x4                     |                   | 1.34            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.68   |
| TIAM009        |               | 15.00    | Tuerca Milimetrica M12*1.5            |                   | 0.27            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 4.02   |
| JD0001         |               | 5.00     | Bornes Bateria Juego Reflex           |                   | 2.68            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 13.39  |
| 440211V-08     |               | 1.00     | Hoja Hino Fm M/2007 Pos               |                   | 63.39           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 63.39  |

Descuento  
0.00  
Pre. Al  
0.00  
28.5  
2.68

| Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción              | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---------------|----------|--------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 14003         | 28.00    | Arandela Plana M10       |                   | 0.13            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 3.75         |
| 1516          | 10.00    | Crasero Pv0020 3/8 Curvo |                   | 0.67            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 6.70         |

Información del Cliente

Sucursal: AMAZONAS BUILDING SA  
 Dirección: PUYO  
 E-MAIL: jinmazam@hotmail.com  
 Teléfono: 0984500000  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN: RIMPE EMPRENDEDOR

| Forma de pago                                     | Valor   |
|---|---------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1804.70 |

1%  
30%

|   |         |
|---|---------|
| SUBTOTAL 12%  | 1611.37 |
| SUBTOTAL 0%   | 0.00    |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                               | 0.00    |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                  | 0.00    |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                  | 1611.34 |
| TOTAL DESCUENTO   | 0.00    |
| ICE   | 0.00    |
| IVA 12%   | 193.36  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                    | 0.00    |
| IRBPNR  | 0.00    |
| PROPINA   | 0.00    |
| VALOR TOTAL   | 1804.70 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                | 0.00    |
| AHORRO POR SUBSIDIO<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00    |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791282299001

FACTURA

No. 001-006-000837876

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

120420230117912822990012001006000837876000000116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/04/2023 17:36:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



120420230117912822990012001006000837876000000116

PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C A

PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C A

Dirección Matriz: AV 6 DE DICIEMBRE N 30 182 Y ALPALLANA

Dirección Sucursal: AV 6 DE DICIEMBRE N 30 182 Y ALPALLANA

Contribuyente Especial 02239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S A

Identificación 1691710080001

Fecha 12/04/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción        | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 309            | 309           | 35000.00 | ASFALTO AC 20 O.P. |                   | 0.28            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 9772.00      |

Información Adicional

Dirección: SEC RODRIGO DE TRIANA SN Y VIA PUYO MADR  
 Telefono: 2884649  
 Codigo Cliente/Petro: 07033478/07033478  
 Mail Cliente: jinmarin@hotmail.com  
 Nombre Estacion: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S A  
 Numero Factura/Banco: 28837876  
 Fecha Despacho: 12/04/2023  
 Fecha Vencimiento: 27/04/2023  
 Contribuyente Especial: RESOLUCION NO. 02239 - 07/05/1996  
 Punto De Partida: ESMERALDAS

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| SUBTOTAL 12%              | 9772.00  |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00     |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00     |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00     |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 9772.00  |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00     |
| ICE                       | 0.00     |
| IVA 12%                   | 1172.64  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00     |
| IRBPNR                    | 0.00     |
| PROPINA                   | 0.00     |
| VALOR TOTAL               | 10944.64 |

| Forma de pago                                     | Valor    |
|---|----------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 10944.64 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

332

TIENE LOGO

R.U.C.: 1701952069001

FACTURA

No. 001-014-000000720

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


1504202301170195206900120010140000007200000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/04/2023 06:50:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1504202301170195206900120010140000007200000000013

FUENTES FLORES MARIA DEL CARMEN

E/S AZOR SHELL

Dirección: AV. BARRIO LAS PALMAS, AV. ALBERTO ZAMBRANO  
Matriz:

Dirección: AV. BARRIO LAS PALMAS, AV. ALBERTO ZAMBRANO  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación 1691710080001

Fecha 15/04/2023

Placa / Matrícula: ABC9999

Guía

Dirección: BARRIO MIRAFLORES

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción    | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0121           | 3             | 450.05   | DIESEL PREMIUM |                   | 1.56            | 1.53     | 3.09                | 0.00      | 703.21       |

Información Adicional

No. Factura: 001-014-000000720  
E\_MAIL: shellazorfactura@gmail.com  
Direccion\_Cliente: BARRIO MIRAFLORES  
Telefono\_Cliente: 000  
Codigo\_Cliente: 45848

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12%              | 703.21 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00   |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00   |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00   |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 703.21 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00   |
| ICE                       | 0.00   |
| IVA 12%                   | 84.38  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00   |
| IRBPNR                    | 0.00   |
| PROPINA                   | 0.00   |
| VALOR TOTAL               | 787.59 |

| Forma de pago                                     | Valor  |
|---|--------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 787.59 |

|  |         |
|--|---------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 1558.03 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(incluye IVA cuando corresponda) | 770.43  |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791282299001

FACTURA

No. 001-006-000838853

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


1504202301179128229900120010060008388530000000112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/04/2023 17:37:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1504202301179128229900120010060008388530000000112

PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C A

PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C A

Dirección: AV 6 DE DICIEMBRE N 30 182 Y ALPALLANA  
Matriz:

Dirección: AV 6 DE DICIEMBRE N 30 182 Y ALPALLANA  
Sucursal:

Contribuyente Especial 02239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S A

Identificación: 1691710080001

Fecha: 15/04/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción        | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 309            | 309           | 35000.00 | ASFALTO AC 20 O.P. |                   | 0.28            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 9772.00      |

Información Adicional

Identificación: SEC RODRIGO DE TRIANA SN Y VIA PUYO MADR  
 Telefono: 2884659  
 Codigo Cliente/Petro: 07033478 / 07033478  
 Mail Cliente: jinmaria@hotmail.com  
 Nombre Estación: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S A  
 Numero Factura Banco: 28838853  
 Fecha Despacho: 15/04/2023  
 Fecha Vencimiento: 02/05/2023  
 Contribuyente Especial: RESOLUCION NO. 02239 - 07/05/1998  
 Punto De Partida: ESMEFALDAS

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| SUBTOTAL 12%              | 9772.00  |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00     |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00     |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00     |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 9772.00  |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00     |
| ICE                       | 0.00     |
| IVA 12%                   | 1172.64  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00     |
| IRBPNR                    | 0.00     |
| PROPINA                   | 0.00     |
| VALOR TOTAL               | 10944.64 |

| Forma de pago                                     | Valor    |
|---|----------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 10944.64 |

332

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

TIENE LOGO

R.U.C.: 1701952069001

FACTURA

No. 001-014-000000721

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


1604202301170195206900120010140000007210000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/04/2023 06:40:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1604202301170195206900120010140000007210000000013

FUENTES FLORES MARIA DEL CARMEN

E/S AZOR SHELL

Dirección Matriz: AV. BARRIO LAS PALMAS, AV. ALBERTO ZAMBRANO

Dirección Sucursal: AV. BARRIO LAS PALMAS, AV. ALBERTO ZAMBRANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación 1691710080001

Fecha 16/04/2023

Placa / Matricula: ZZZ9999

Guía

Dirección: BARRIO MIRAFLORES

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción    | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0121           | 3             | 858.96   | DIESEL PREMIUM |                   | 1.56            | 1.53     | 3.09                | 0.00      | 1342.12      |

Información Adicional

Factura: 001-014-000000721  
 E\_MAIL: shellazor.efactura@gmail.com  
 Dirección\_Cliente: BARRIO MIRAFLORES  
 Telefono\_Cliente: 000  
 Código\_Cliente: 45848

| Forma de pago                               | Valor   |
|---|---------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1503.17 |

|  |         |
|--|---------|
| SUBTOTAL 12%   | 1342.12 |
| SUBTOTAL 0%  | 0.00    |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00    |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00    |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 1342.12 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00    |
| ICE  | 0.00    |
| IVA 12%  | 161.05  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00    |
| IRBPNR   | 0.00    |
| PROPINA  | 0.00    |
| VALOR TOTAL  | 1503.17 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 2973.60 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 1470.42 |

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1490820317001

FACTURA

No. 001-002-000001087

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1704202301149082031700120010020000010870000108715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/04/2023 16:17:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1704202301149082031700120010020000010870000108715

TRANSCARRERA-ROBLES S.A.

TRANSCARRERA-ROBLES S.A.

Dirección: SOASTI Y RAFAEL RIVADENEIRA.  
Matriz:

Dirección: SOASTI Y RAFAEL RIVADENEIRA  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1681710000001

Fecha: 17/04/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: LUIS MOLINA S/N Y FIDEL RODRIGUEZ

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                      | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0100032        | 0100032       | 37490.00 | TRANSPORTE DE ASFALTO ESM - PUYO |                   | 0.04            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1499.60      |

Información Adicional

Dirección: LUIS MOLINA S/N Y FIDEL RODRIGUEZ  
Email: ynilin.molan@petroleosyservicios.com  
Nota: GUIA 005-041-000112630 PLACA EAA2287

| Forma de pago                                     | Valor   |
|---|---------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1499.60 |

|  |         |
|--|---------|
| SUBTOTAL 12%   | 0.00    |
| SUBTOTAL 0%  | 1499.60 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00    |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00    |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 1499.60 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00    |
| IVA  | 0.00    |
| IVA 12%  | 0.00    |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00    |
| IRBPNR   | 0.00    |
| PROPINA  | 0.00    |
| VALOR TOTAL  | 1499.60 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00    |
| AHORRO POR SUBSIDIO.<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00    |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1490820317001

FACTURA

No. 001-002-000001086

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


1704202301149082031700120010020000010860000108612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/04/2023 16:16:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1704202301149082031700120010020000010860000108612

TRANSCARRERA-ROBLES S.A.

TRANSCARRERA-ROBLES S.A.

Dirección: SOASTI Y RAFAEL RIVADENEIRA  
Matriz:

Dirección: SOASTI Y RAFAEL RIVADENEIRA  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 17/04/2023 Placa / Matricula: Guía

Dirección: LUIS MOLINA S/N Y FIDEL RODRIGUEZ

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                         | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0100032        | 0100032       | 32740.00 | TRANSPORTE DE ASFALTO<br>ESM - PUYO |                   | 0.04            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1309.60      |

Información Adicional

cción: LUIS MOLINA S/N Y FIDEL RODRIGUEZ  
email: yair.molina@petroleosyservicios.com  
Nota: GUIA 005-041-000112355 PLACA EAA1006

| Forma de pago                                     | Valor   |
|---|---------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1309.60 |

|  |         |
|--|---------|
| SUBTOTAL 12%   | 0.00    |
| SUBTOTAL 0%  | 1309.60 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00    |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00    |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 1309.60 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00    |
| IVA  | 1309.60 |
| IVA 12%  | 0.00    |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00    |
| IRBPNR   | 0.00    |
| PROPINA  | 0.00    |
| VALOR TOTAL  | 1309.60 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00    |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00    |

TIENE LOGO

R.U.C.: 1701952069001

FACTURA

No. 001-014-000000722

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1704202301170195206900120010140000007220000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/04/2023 06:40:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1704202301170195206900120010140000007220000000013

FUENTES FLORES MARIA DEL CARMEN

E/S AZOR SHELL

Dirección: AV. PADRE J.J.S. JAZONE

Matriz:

Dirección: AV. BARRIO LAS PALMAS, AV. ALBERTO ZAMBRANO

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1891710080001

Fecha: 17/04/2023

Placa / Matricula: ABC9999

Guía

Dirección: BARRIO MIRAFLORES

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción    | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0121           | 3             | 901.25   | DIESEL PREMIUM |                   | 1.56            | 1.53     | 3.09                | 0.00      | 1408.20      |

Información Adicional

n\_Factura: 001-014-000000722  
E\_MAIL: shellazor.efactura@gmail.com  
Direccion\_Cliente: BARRIO MIRAFLORES  
Telefono\_Cliente: 000  
Codigo\_Cliente: 45848

| Forma de pago                                     | Valor   |
|---|---------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1577.18 |

|  |         |
|--|---------|
| SUBTOTAL 12%   | 1408.20 |
| SUBTOTAL 0%  | 0.00    |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00    |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00    |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 1408.20 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00    |
| VALOR  | 1577.18 |
| IVA 12%  | 168.98  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00    |
| IRBPNR   | 0.00    |
| PROPINA  | 0.00    |
| VALOR TOTAL  | 1577.18 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 3120.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO.<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 1542.82 |



Guevara Marín Odilo Vinicio

Actividades de Servicios Diversos

Dirección: Vía a Tena

Puyo - Pastaza

RUC: 1600153132001

Autorización SRI N° 1130797499

NOTA DE VENTA

001-001-

00000011

Fecha de Emisión

12 | 04 | 2023

DÍA MES AÑO

\*Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE\*

Sr(es) Amazonas Building Amazonbuild SA

Dirección: Puyo, Vía Tena Telf.:

RUC/Ci: 16911-10080001 Guía de Remisión:

| Cant. | DETALLE                               | P. Unit. | V./ VENTA |
|-------|---------------------------------------|----------|-----------|
| 01    | Servicios Prestados<br>Mes Marzo 2023 | 1200,-   | 1200,-    |
|       |                                       |          |           |
|       |                                       |          |           |
|       |                                       |          |           |
|       |                                       |          |           |
|       |                                       |          |           |
|       |                                       |          |           |
|       |                                       |          |           |
|       |                                       |          |           |
|       |                                       |          |           |

FORMA DE PAGO

Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta De Crédito/ Débito  Otros

TOTAL USD 1200,-

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Original: Adquirente / Copia: Emisor

\*Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 \*Aut.: 14083 \*RUC:180359938801\* José Luis Cárdenas Fonseca  
Impreso desde N° 000001 al 000050 Fecha Impresión: 06-12-2022 Válido hasta: 06 de Diciembre -/2023

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

**QUISHPE ALARCON ALEXANDER VINICIO**  
**RUC: 0603456880001**

Dir.: Principal s/n y vía a las antenas  
Cel.: 0982 579 464  
Baños de Agua Santa - Tungurahua

NOTA DE VENTA 001-001

**0000515**

Aut. **SRI** 1130466095

| Fecha | DIA | MES | AÑO  |
|-------|-----|-----|------|
|       | 12  | 04  | 2023 |

Sr. (es): Amazonas Building Amazonbuild S.A.

Dirección: Paipa, Vía Tarapá

RUC/CI: 1691710080001 Telf: \_\_\_\_\_

| CANT | DESCRIPCIÓN                           | P.UNIT | V.TOTAL |
|------|---------------------------------------|--------|---------|
| 01   | Servicios Prestados<br>Mes Marzo/2023 | 380,00 | 380,00  |
|      |                                       |        |         |
|      |                                       |        |         |
|      |                                       |        |         |
|      |                                       |        |         |
|      |                                       |        |         |
|      |                                       |        |         |
|      |                                       |        |         |
|      |                                       |        |         |
|      |                                       |        |         |

**ACID** IMPRESA Y PUBLICIDAD Villarcel Montaguano Jorge Eduardo  
RUC 1803486480001 / Aut. 13562 / Telf: 2838 094 / Cel: 0987 886 937  
Dir.: Av. 22 de Julio y Zoposopanqui, junto al Colegio Mariano Benítez \* Pelileo

TOTAL \$ **380,00**

Efectivo  Dinero Electrónico  Tarj. Crédito / Débito  Otros

Nº: 601 al 660  
Fecha de Aut. 12 - Septiembre - 2022  
Caduca: 12 - Septiembre - 2023  
ORIGINAL: Adquirente  
COPIA: Emisor

  
ENTREGUE CONFORME

  
RECIBI CONFORME





"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"  
**JACOME RODRIGUEZ EDGAR GONZALO**  
 Actividades de servicios diversos  
 Dir.: Av. de la Unidad sn y Agustín Ruales  
 SHELL - PASTAZA

RUC: 1600318826001  
 NOTA DE VENTA 001-001-

**Nº 0000084**

AUTORIZACION SRI # 1130838836

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Fecha de Emisión: 

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 12  | 04  | 2023 |

Cliente: Amazonas Building Amazonbuild S.A

RUC/C.I.: 1691710080001

Dir.: Puyo, Via Tarqui

| CANT. | DESCRIPCION                             | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|---|-------------|----------|
| 01    | Servicios Prestados<br>Mes Marzo / 2023 | 750,93      | 750,93   |
|       |   |             |          |
|       |   |             |          |
|       |   |             |          |
|       |   |             |          |
|       |   |             |          |
|       |   |             |          |
|       |   |             |          |
|       |   |             |          |

|               |                    |                             |             |        |
|---------------|--------------------|-----------------------------|-------------|--------|
| FORMA DE PAGO | EFFECTIVO          | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | VALOR TOTAL | 750,93 |
|               | DINERO ELECTRONICO | OTROS                       |             |        |
|               |                    | X                           |             |        |

  
 Firma Autorizada

Recibi Conforme

LUIS ALFREDO MORGUCHO JANETA - Imp. Oficial "Jesus del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2885 032  
 RUC: 0901582935001 - del 000076 al 000100 - Fecha Autorización 19-DICIEMBRE-2022 - Fecha Caducidad 19-DICIEMBRE-2023

**FIALLOS CURIPALLO MILTON JEFFERSON**  
**ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS**  
 Dir. Matriz: Vía a Madre Tierra S/N y Francisco Montahuano  
 PUYO - PASTAZA

**RUC: 1600712457001**  
**Aut. SRI. N° 1130352006**  
**FACTURA-001-001**  
**00000007**

Cel.: 098 108 7268

| FECHA DE EMISIÓN |       |      |
|------------------|-------|------|
| AÑO              | MESES | DÍA  |
| 12               | 04    | 2023 |

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE  
 F. AUT.: 14/08/2022 - CADUC.A: 15/08/2023  
 del 00000001 al 00000050

Sr. (Ea): Amazonas Building Amazonbuild S.A  
 RUC: 1691710080001 Guía de Remisión: .....  
 Dir.: Puyo, Vía Tarapi

| Cant. | DESCRIPCIÓN                           | V. Unit | V. TOTAL |
|-------|---------------------------------------|---------|----------|
| 0.1   | Servicios Prestados<br>Mes Marzo 2023 | 490.-   | 490.-    |
|       |                                       |         |          |
|       |                                       |         |          |
|       |                                       |         |          |
|       |                                       |         |          |

|                       |   |               |       |
|-----------------------|---|---------------|-------|
| <b>Forma de pago:</b> |   | SUB TOTAL 12% |       |
| Efectivo              |   | SUB TOTAL 0%  | 490.- |
| Tarjeta Déb/Créd.     |   | DESCUENTO     |       |
| Otros:                | X | SUB TOTAL     |       |
|                       |   | IVA 12%       |       |
|                       |   | VALOR TOTAL   | 490.- |

**Noriega** 1304197823001 - LINO VASQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA  
 TELF. 03 2894 729 - PUYO - PASTAZA AUT. SRI. 4851  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791282299001

FACTURA

No. 001-016-000001589

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204202301179128229900120010160000015890000099916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/04/2023 15:07:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204202301179128229900120010160000015890000099916

PETROLEOS Y SERVICIOS C.A.

PETROLEOS Y SERVICIOS C.A.

Dirección: Av. 6 de Diciembre N30-182 y Alpallana,  
Matriz:

Dirección: AV. 6 DE DICIEMBRE N30-182 Y ALPALLANA  
Sucursal:

Contribuyente Especial 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A

Identificación: 1691710080001

Fecha: 12/04/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción   | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 49             | 49            | 32740.00 | ASFALTO AC OP |                   | 0.28            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 9141.01      |

Información Adicional

Numero\_num\_factura: 000001589  
E-MAIL: yalin.milan@petroleosyservicios.com  
Direccion\_Cliente: SEC RODRIGO DE TRIANA SN VIA A PUYO-MADRE TIERRA KM 1.  
Telefono\_Cliente: 032884640  
Codigo\_Cliente: 1524

| Forma de pago                                     | Valor    |
|---|----------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 10237.93 |

|  |          |
|--|----------|
| SUBTOTAL 12%   | 9141.01  |
| SUBTOTAL 0%  | 0.00     |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00     |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00     |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 9141.01  |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00     |
| ICE  | 0.00     |
| IVA 12%  | 1096.92  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00     |
| IRBPNR   | 0.00     |
| PROPINA  | 0.00     |
| VALOR TOTAL  | 10237.93 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00     |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00     |

TIENE LOGO

R.U.C.: 1791324366001

FACTURA

No. 001-001-000000397

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204202301179132436600120010010000003977846333318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/04/2023 17:21:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204202301179132436600120010010000003977846333318

SERVICIOS BACH SOCIEDAD ANONIMA CIVIL

SERVICIOS BACH SOCIEDAD ANONIMA CIVIL

Dirección: CATARAMA E5-94 Y ZUMBAGUA SAN BARTOLO  
Matriz:

Dirección: CATARAMA E5-94 Y ZUMBAGUA SAN BARTOLO  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 12/04/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Luis Molina S N y Fidel Rodriguez PASTAZA

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción           | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Desuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|----------|--------------|
| 10108608       | 1010          | 1.00     | Muela Faco 9026 Fija  |                   | 1398.74         | 0.00     | 0.00                | 139.87   | 1258.87      |
| 3609           | 1010          | 1.00     | Muela Faco 9026 Móvil |                   | 1427.50         | 0.00     | 0.00                | 142.75   | 1284.75      |

| Información Adicional |  |
|-----------------------|--|
| email:                | jinmaria@hotmail.com;serviciosbach@gmail.com |

| Forma de pago                                     | Valor   |
|---|---------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 2848.85 |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| SUBTOTAL 12%              | 2543.62 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00    |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00    |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00    |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 2543.62 |
| TOTAL DESCUENTO           | 282.62  |
| ICE                       | 0.00    |
| IVA 12%                   | 305.23  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00    |
| IRBPNR                    | 0.00    |
| VALOR TOTAL               | 2848.85 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

**"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"**  
**REA SANGOQUIZA JAZMIN PAOLA**

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE  
VESTIR Y CALZADO. -ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS.  
Dir.: Luis Molina sn y Vinicio Kubes

**PUYO - PASTAZA**

RUC: 1600498735001

NOTA DE VENTA 001-001-

000000070

AUTORIZACION SRI # 1130953892

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

Fecha de Emisión: 

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 13  | 04  | 2023 |

Cliente: Amazonas Building

RUC./C.I.: 1691710080001

Dir.: Puyo, via Tarqui

| CANT. | DESCRIPCION                           | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|---------------------------------------|-------------|----------|
| 01    | Servicios Prestados<br>Mes Marzo 2023 |             | 430.00   |
|       |                                       |             |          |
|       |                                       |             |          |
|       |                                       |             |          |
|       |                                       |             |          |
|       |                                       |             |          |
|       |                                       |             |          |
|       |                                       |             |          |
|       |                                       |             |          |
|       |                                       |             |          |

FORMA DE PAGO: 

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| EFECTIVO                 | TARJETA DE CREDITO / DEBITO         |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO       | OTROS                               |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

 VALOR TOTAL 430.00

*MU*  
Firma Autorizada

*[Signature]*  
Recibí Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf: 2885 032  
RUC: 0601692893901 del 0000051 al 0000150 - Fecha Autorización 30-ENERO-2023-Fecha Caducidad 30-ENERO-2024

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1701952069001

FACTURA

No. 001-014-000000719

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


1304202301170195206900120010140000007190000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/04/2023 06:40:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1304202301170195206900120010140000007190000000019

FUENTES FLORES MARIA DEL CARMEN

E/S AZOR SHELL

Dirección: AV. PABLO DE LA ROSA  
Matriz:

Dirección: AV. BARRIO LAS PALMAS, AV. ALBERTO ZAMBRANO  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 13/04/2023

Placa / Matrícula: ZZZ9999

Guía

Dirección: BARRIO MIRAFLORES

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción    | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0121           | 3             | 1000.00  | DIESEL PREMIUM |                   | 1.56            | 1.53     | 3.09                | 0.00      | 1562.50      |

Información Adicional

Núm. Factura: 001-014-000000719  
E\_MAIL: shellazor.efactura@gmail.com  
Dirección\_Cliente: BARRIO MIRAFLORES  
Telefono\_Cliente: 000  
Codigo\_Cliente: 45848

| Forma de pago                                     | Valor   |
|---|---------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1750.00 |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| SUBTOTAL 12%              | 1562.50 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00    |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00    |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00    |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 1562.50 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00    |
| ICE                       | 0.00    |
| IVA 12%                   | 187.50  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00    |
| IRBPNR                    | 0.00    |
| PROPINA                   | 0.00    |
| VALOR TOTAL               | 1750.00 |

|  |         |
|--|---------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 3461.87 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 1711.87 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600232332001

FACTURA

No. 001-100-000000004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1304202301160023233200120011000000000042591046111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/04/2023 11:30:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1304202301160023233200120011000000000042591046111

LASCANO COELLO WASHINGTON EDUARDO

Dirección Matriz: Barrio: LA MERCED Calle: SADO VALLADARES Intersección: MEDARDO ANGEL SILVA

Dirección Sucursal: Barrio: LA MERCED Calle: SADO VALLADARES Intersección: MEDARDO ANGEL SILVA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 13/04/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: AV. TARQUI Y LOS LAURELES

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                           | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 001            |               | 1.00     | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES |                   | 740.00          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 740.00       |

| Información Adicional |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Telefono:             | 0984508890                       |
| Email:                | amazonasbuilding2009@hotmail.com |

| Forma de pago                               | Valor  |
|---|--------|
| VI - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 740.00 |

|  |        |
|--|--------|
| SUBTOTAL 12%   | 740.00 |
| SUBTOTAL 0%  | 0.00   |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00   |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00   |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 740.00 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00   |
| ICE  | 0.00   |
| IVA 12%  | 88.80  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00   |
| IRBPNR   | 0.00   |
| PROPINA  | 0.00   |
| VALOR TOTAL  | 828.80 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00   |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00   |

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791282299001

FACTURA

No. 001-016-000001593

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


1504202301179128229900120010160000015930000099911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/04/2023 15:08:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1504202301179128229900120010160000015930000099911

PETROLEOS Y SERVICIOS C.A.

PETROLEOS Y SERVICIOS C.A.

Dirección: Av. 6 de Diciembre N30-182 y Alpullana  
Matriz:

Dirección: AV. 6 DE DICIEMBRE N30-182 Y ALPALLANA  
Sucursal:

Contribuyente Especial 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A

Identificación: 1691710080001

Fecha: 15/04/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción   | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 49             | 49            | 37490.00 | ASFALTO AC OP |                   | 0.28            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 10467.21     |

Información Adicional

Nombre\_num\_factura: 000001593  
E-MAIL: yamil.milan@petroleosyservicios.com  
Direccion\_Cliente: SEC RODRIGO DE TRIANA SN VIA A PUYO-MADRE TIERRA KM 1.  
Telefono\_Cliente: 032854540  
Codigo\_Cliente: 1524

| Forma de pago                                     | Valor    |
|---|----------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 11723.28 |

|  |          |
|--|----------|
| SUBTOTAL 12%   | 10467.21 |
| SUBTOTAL 0%  | 0.00     |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00     |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00     |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 10467.21 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00     |
| IVA  | 0.00     |
| IVA 12%  | 1256.07  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00     |
| IRBPNR   | 0.00     |
| PROPINA  | 0.00     |
| VALOR TOTAL  | 11723.28 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00     |
| AHORRO POR SUBSIDIO.<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00     |

AVILES NARVAEZ EDISON JAIME  
 ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS  
 Dir.  
 \* \* Pastaza \* \*

**RUC: 2250153760001**  
**FACTURA 001-001-**  
**00000037**  
**RUT. SRI: 1129838741**

FECHA EMISION: 17/04/2023

R.U.C / C.I. 1691710080001

GUÍA DE REMISIÓN:

Sr (es): Amazonas Building Amazonbuild S.A.

DIRECCION: Puyo, Via Tarqui

| CANT. | DESCRIPCIÓN                       | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|-----------------------------------|-------------|----------|
| 01    | Servicios Prestados<br>Marzo 2023 | 465,00      | 465,00   |
|       |                                   |             |          |
|       |                                   |             |          |
|       |                                   |             |          |
|       |                                   |             |          |
|       |                                   |             |          |
|       |                                   |             |          |
|       |                                   |             |          |

|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| <b>FORMA DE PAGO</b> Original: Adquirente / Copia: Emisor |  | <b>SUB TOTAL</b> 465,00   |
| <input type="checkbox"/> EFECTIVO                         | <br>RECIBI CONFORME | <b>DESCUENTO</b>          |
| <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO               |  | <b>IVA 12 %</b>           |
| <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/ DEBITO       |  | <b>IVA 0 %</b>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> OTROS                 |  | <b>VALOR TOTAL</b> 465,00 |
| "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"           |  |                           |

Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 14083 RUC: 1803599388001 José Luis Cárdenas Fonseca  
 Impreso desde N° 000028 al 000050 Fecha Impresión: 25-04-2022 Válido hasta: 25 de Abril.-/2023

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790774058001

FACTURA

No. 001-001-000124578

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1704202301179077405800120010010001245789501240913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/04/2023 16:56:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1704202301179077405800120010010001245789501240913

COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA SA. COMREIVIC

COMREIVIC SA.

Dirección: AV DE LOS GRANADOS E14-947 y AZUCENAS  
Matriz:

Dirección: AV DE LOS GRANADOS E14-947 y AZUCENAS  
Sucursal:

Contribuyente Especial 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 17/04/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal            | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción              | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---------------------------|---------------|----------|--------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| TFAAFT35<br>EF009416<br>2 |               | 1.00     | PAVIMENTADORA DE ASFALTO |                   | 115000.00       | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 115000.00    |

Información Adicional

Dirección: PUYO - LUIS MOLINA S/N Y FIDEL RODRIGUEZ. - -PASTAZA-PASTAZA-Ecuador

Teléfono: 0993328972

E-mail: jinmaranm@hotmail.com

Nombre Comercial/Tercero: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Descripción 1: TIPO FINISHER ( TERMINADORA DE ASFALTO), MARCA: AMMANN, MODELO: AFT 350E AÑO: 2019, SERIE CHASIS: TFAAFT35EF0094162, PIN DE PRODUCCIÓN: 94162, MARCA MOTOR: DEUTZ, POTENCIA: 79 HP, MOTOR: 1150774058001, COLOR: AMARILLO, VENDEDOR: CASTANEDA, MARCO: OBSERVACIONES: USADO, RESERVA DE DOM

Descripción 2: INFO A FAVOR DE COMREIVIC: El comprador declara bajo juramento que el origen de los fondos de la compra provienen de sus actividades lícitas, por lo que libera de toda responsabilidad a la vendedora por el origen de los recursos. En caso que en el futuro el poder público, cambie el tipo de moneda.

Descripción 3: el valor de esta factura será cancelado exclusivamente en dólares de los Estados Unidos. Estimado Cliente: De acuerdo a la ley de Régimen Tributario Interno Art. 49 "Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo Comprobante de Retención, dentro del término no mayor de cinco días.

Descripción 4: de recibido el comprobante de venta (Factura), a las personas (Naturales o Jurídicas) a quienes deben efectuar la retención"...La observación de esta disposición legal facilitará el cumplimiento de sus obligaciones tributarias comerciales. Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de Compañía Comercial Reina Victoria S.A. COMREIVIC. En el lugar y fecha que se me reconvenge, el valor total expresado en este documento, más el máximo interés vigente por mora desde esta fecha. Sin protesta, eximase de presentación para el pago así como de avisos por falta de estos hechos, Resguardo domicilio y

Descripción 6: me someto a los jueces competentes de la ciudad de Quito y al trámite ejecutivo a elección de Compañía Comercial Reina Victoria COMREIVIC S.A. o sus representantes. Acepto que Compañía Comercial Reina Victoria COMREIVIC S.A., cada y transfera en cualquier momento los derechos que emanan el presente

|  |           |
|--|-----------|
| SUBTOTAL 12%   | 115000.00 |
| SUBTOTAL 0%  | 0.00      |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00      |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00      |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 115000.00 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00      |
| ICE  | 0.00      |
| IVA 12%  | 13800.00  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00      |
| IRBPNR   | 0.00      |
| PROPINA  | 0.00      |
| VALOR TOTAL  | 128800.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00      |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00      |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1000100899001

FACTURA

No. 001-014-000001593

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1704202301100010089900120010140000015930000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/04/2023 11:59:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1704202301100010089900120010140000015930000000016

VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL

E/S AZOR

Dirección: LAS PALMAS AV ALBERTO ZAMBRANO S/N, VILLA PASO  
Matriz:

Dirección: LAS PALMAS AV ALBERTO ZAMBRANO  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 16917100899001

Fecha: 17/04/2023

Placa / Matricula: ZZZ9999

Guía

Dirección: BARRIO MIRAFLORES

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción    | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0121           | 3             | 565.71   | DIESEL PREMIUM |                   | 1.56            | 1.53     | 3.09                | 0.00      | 883.93       |

Información Adicional

\_Factura: 001-014-000001593  
E\_MAIL: jinrra@amazon.com  
Direccion\_Cliente: BARRIO MIRAFLORES  
Telefono\_Cliente: 0  
Codigo\_Cliente: 66

| Forma de pago                                     | Valor  |
|---|--------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 990.00 |

|  |         |
|--|---------|
| SUBTOTAL 12%   | 883.93  |
| SUBTOTAL 0%  | 0.00    |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00    |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00    |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 883.93  |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00    |
| IVA  | 0.00    |
| IVA 12%  | 106.07  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00    |
| IRBPNR   | 0.00    |
| PROPINA  | 0.00    |
| VALOR TOTAL  | 990.00  |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 1958.43 |
| AHORRO POR SUBSIDIO.<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 968.43  |

TIENE LOGO

R.U.C.: 1000100899001

FACTURA

No. 001-014-000001591

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1304202301100010089900120010140000015910000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/04/2023 07:59:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1304202301100010089900120010140000015910000000017

VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL

E/S AZOR

Dirección Matriz: LAS PALMAS, AV ALBERTO ZAMBRANO SIN VIALTO

Dirección Sucursal: LAS PALMAS, AV ALBERTO ZAMBRANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación 1691710080001

Fecha 13/04/2023

Placa / Matrícula: ZZZ9999

Guía

Dirección: BARRIO MIRAFLORES

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción    | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0121           | 3             | 1000.00  | DIESEL PREMIUM |                   | 1.56            | 1.53     | 3.09                | 0.00      | 1562.50      |

Información Adicional

Factura: 001-014-000001591  
 E\_MAIL: jinmarin@hotmail.com  
 Dirección\_Cliente: BARRIO MIRAFLORES  
 Telefono\_Cliente: 0  
 Código\_Cliente: 66

| Forma de pago                                     | Valor   |
|---|---------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1750.00 |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| SUBTOTAL 12%              | 1562.50 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00    |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00    |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00    |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 1562.50 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00    |
| ICE                       | 0.00    |
| IVA 12%                   | 187.50  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00    |
| IRBPNR                    | 0.00    |
| PROPINA                   | 0.00    |
| VALOR TOTAL               | 1750.00 |

|  |         |
|--|---------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 3461.87 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 1711.87 |

**GREFA ANDI MICHAEL BLADIMIR**  
 ACTIVIDADES DE: TOPOGRAFIA - ESTUDIOS  
 HIDROLÓGICOS - ESTUDIOS DE SUBSUELO

RUC 1600919086001

NOTA DE VENTA 001 - 001

Dir.: Leopoldo Benitez sn y Ruben Astudillo  
 Pastaza - Ecuador

Nº 000055  
 Aut. SRI: 1130736671

Sr. (es) Amazonas Building Amazonbuild SA



Dirección: Rio Via Tarqui

Fecha de Emisión: 17/04/2023 RUC/CI:

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|---|-------------|----------|
| 03    | Servicios prestados de levantamiento y colocación de puntos en 3km de la vía Curaray. | 350,00      | 1050,00  |
|       |   |             |          |
|       |   |             |          |
|       |   |             |          |
|       |   |             |          |
|       |   |             |          |

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE" TOTAL \$ 1050,00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:  TARJETA DE CREDITO/DEBITO:   

DINERO EFECTIVO:  OTROS:  FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFORME:

SOLIS ZUÑIGA LINER ASUNCIÓN \* GRAFICAS LIDER \* RUC 1600260374001 - Aut. 13417  
 Fecha de impresión 21-11-2022 Caduca 21-11-2023 - Del 000001 al 000100

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



R.U.C.: 1791290275001

**FACTURA**

No. 001-003-000001497

NUMERO DE AUTORIZACION

1804202301179129027500120010030000014970000456915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 18/04/2023 12:21:36

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1804202301179129027500120010030000014970000456915

**BREM CIA LTDA**

**AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001**

Dirección Matriz: Pasaje Alfonso ~~Jaimes~~ N26-114 y Av. Orellana

Teléfonos: 2902425

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: AMAZONBUILD SA

RUC / CI: 1691710080001

Fecha Emision: 18/04/2023

Dirección: Barrio Miraflores ~~Calle~~ Luis Molina y Fidel Rodriguez

Teléfonos: 03 2884 879

| Cod. Principal | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|----------|-------------|-----------------|-----------|--------------|
| 102            | 15,150   | EMULPRIMER  | 0.65            | 0.00      | 9,847.50     |

**PAGOS:**

FORMA DE PAGO

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

TOTAL 11,029.20 DOLARES AMERICANOS

PLAZO 0 dias

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| SUBTOTAL 12%              | 9,847.50  |
| SUBTOTAL IVA 0%           | 0.00      |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00      |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00      |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 9,847.50  |
| DESCUENTO                 | 0.00      |
| IVA 12%                   | 1,181.70  |
| VALOR TOTAL               | 11,029.20 |

**Información Adicional:**

Las retenciones se recibirán máximo hasta 5 días posteriores a la emisión de la factura, según ART.50 LRTI

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1701952069001

FACTURA

No. 001-014-000000723

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1804202301170195206900120010140000007230000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/04/2023 06:50:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1804202301170195206900120010140000007230000000013

FUENTES FLORES MARIA DEL CARMEN

E/S AZOR SHELL

Dirección Matriz: AV. PADRE LUIS SACOMBE

Dirección Sucursal: AV. BARRIO LAS PALMAS, AV. ALBERTO ZAMBRANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

|                                     |                                    |                    |         |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. |                    |         |
| Identificación:                     | 1691710080001                      | Placa / Matrícula: | ABC9999 |
| Fecha:                              | 18/04/2023                         | Guía:              |         |
| Dirección:                          | BARRIO MIRAFLORES                  |                    |         |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción    | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0121           | 3             | 898.49   | DIESEL PREMIUM |                   | 1.56            | 1.53     | 3.09                | 0.00      | 1403.89      |

| Información Adicional |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Nº Factura:           | 001-014-000000723            |
| E_MAIL:               | shellazor.efactura@gmail.com |
| Dirección Cliente:    | BARRIO MIRAFLORES            |
| Teléfono Cliente:     | 000                          |
| Código Cliente:       | 45848                        |

|  |         |
|--|---------|
| SUBTOTAL 12%   | 1403.89 |
| SUBTOTAL 0%  | 0.00    |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00    |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00    |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 1403.89 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00    |
| ICE  | 0.00    |
| IVA 12%  | 168.47  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00    |
| IRBPNR   | 0.00    |
| PROPINA  | 0.00    |
| VALOR TOTAL  | 1572.36 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 3110.45 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 1538.10 |

| Forma de pago                                     | Valor   |
|---|---------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1572.36 |

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

QUISHPE ALARCON ALEXANDER VINICIO

RUC: 0603456880001

Dir.: Principal s/n y vía a las antenas

Cel.: 0982 579 484

Baños de Agua Santa - Tungurahua

NOTA DE VENTA 001-001

0000516

Aut. SRI 1130466095

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 19  | 04  | 2023 |

Sr. (es): Amazonas Building Amazonbuild S.A.

Dirección: Puyo, Vía Tarqui

RUC/CI: 1091710080001

Tel: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION         | P.UNIT. | V.TOTAL |
|-------|---------------------|---------|---------|
| 01    | Servicios Prestados | 552,00  | 552,00  |
|       | Mes Marzo/2023      |         |         |
|       | C.C.                |         |         |
|       |                     |         |         |
|       |                     |         |         |
|       |                     |         |         |
|       |                     |         |         |
|       |                     |         |         |
|       |                     |         |         |
|       |                     |         |         |

ACID EMPRESA PUBLICA Villarreal Montaguano Jorge Eduardo  
RUC: 4982485646001 / Aut. 13562 / Tel: 2636 084 / Cel: 0987 906 037  
Dir: Av. 22 de Julio y Zoposopanqui, junto al Colegio Mariano Benitez \* Palileo

TOTAL \$ 552,00

Efectivo  Dinero Electrónico  Tarj. Crédito / Débito  Otros

  
ENTREGUE CONFORME

  
RECIBI CONFORME

Nº: 501 al 550  
Fecha de Aut. 12 - Septiembre - 2022  
Caduca: 12 - Septiembre - 2023  
ORIGINAL: Adquirente  
COPIA: Emisor

TIENE LOGO

R.U.C.: 1701952069001

FACTURA

No. 001-014-000000679

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202301170195206900120010140000006790000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/02/2023 11:10:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402202301170195206900120010140000006790000000018

FUENTES FLORES MARIA DEL CARMEN

E/S AZOR SHELL

Dirección: AV. BARRIO LAS PALMAS, AV. ALBERTO ZAMBRANO  
Matriz:

Dirección: AV. BARRIO LAS PALMAS, AV. ALBERTO ZAMBRANO  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

|                                     |                                    |                    |         |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. |                    |         |
| Identificación                      | 1691710080001                      | Placa / Matrícula: | ABC9999 |
| Fecha                               | 24/02/2023                         | Guía               |         |
| Dirección:                          | BARRIO MIRAFLORES                  |                    |         |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción    | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0121           | 3             | 500.04   | DIESEL PREMIUM |                   | 1.56            | 1.53     | 3.09                | 0.00      | 781.31       |

| Información Adicional |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Número de factura:    | 001-014-000000679            |
| E_MAIL:               | shellazor.efactura@gmail.com |
| Dirección_Cliente:    | BARRIO MIRAFLORES            |
| Teléfono_Cliente:     | 000                          |
| Código_Cliente:       | 45848                        |

| Forma de pago                               | Valor  |
|---|--------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 875.07 |

|  |         |
|--|---------|
| SUBTOTAL 12%   | 781.31  |
| SUBTOTAL 0%  | 0.00    |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00    |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00    |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 781.31  |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00    |
| ICE  | 0.00    |
| IVA 12%  | 93.76   |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00    |
| IRBPNR   | 0.00    |
| PROPINA  | 0.00    |
| VALOR TOTAL  | 875.07  |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 1731.08 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 856.00  |

**JACOME RODRIGUEZ JENNY BEATRIZ**  
 ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS  
 Dir.: E1 24 y Av. 10 de Agosto  
**QUITO - PICHINCHA**  
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

RUC: 1600267494001  
**NOTA DE VENTA**  
 001 - 001 -  
**0000013**  
 Aut. SRI N°1130794287

Fecha de Emisión: 19 04 2023  
DIA MES AÑO

Sr.(es): Amazonas Building Amazonbuild SA

Dirección: Puyo Via Tarqui

RUC/CI: 151170080001 Guía de Remisión: .....

| Cant. | DETALLE                                      | P. Unit. | V. / VENTA |
|-------|--|----------|------------|
| 01    | Servicios Prestados<br>Mes Marzo 2023<br>G.M | 510,00   | 510,00     |
|       |  |          |            |
|       |  |          |            |
|       |  |          |            |
|       |  |          |            |
|       |  |          |            |
|       |  |          |            |
|       |  |          |            |
|       |  |          |            |

**FORMA DE PAGO** TOTAL \$ 510,00

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO                   | <input type="checkbox"/>            |
| DINERO                      | <input type="checkbox"/>            |
| ELECTRÓNICO                 | <input type="checkbox"/>            |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | <input type="checkbox"/>            |
| OTROS                       | <input checked="" type="checkbox"/> |

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Agular Carrón Jenny del Carmen - Calle Cumanda e/n y Luis Arias Guerra - Puyo - Telef. 2660-257 - Aut. 3306 - RUC. 1600097552001 - F. Impresión 05/12/2022 del 0000001 al 0000050 - Válido 05/12/2023

  
 FIRMA AUTORIZADA

  
 RECIBI CONFORME

**ILBAY ILBAY WILBER EDUARDO**

-CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL.  
-ACTIVIDADES DE DISEÑO Y CONSULTORIA  
DE INGENIERIA.

Dirección: C. 50 y Calle A. \* PUYO - PASTAZA

RUC: 1600494882001  
FACTURA 001-001

Nº 0000253

AUTORIZACIÓN SRI # 1130579400

Fecha de Emisión: 19 | 04 | 2023  
DIA MES AÑO

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cliente: Amazonas Building Amazonbuild S.A.

Dirección: Puyo, Via Tarqui

RUC/C.I.: 1691710080001 Telf.: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION                                      | VUNITARIO | V/TOTAL |
|-------|--|-----------|---------|
| 01    | Servicios Prestados Mes<br>Febrero y Marzo /2023 | 1333.33   | 1333.33 |
|       |  |           |         |
|       |  |           |         |
|       |  |           |         |
|       |  |           |         |

Original: ADQUIRENTE    Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

|                    |                             |                                     |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO          | TARJETA DE CREDITO / DEBITO |                                     |
| DINERO ELECTRONICO | OTROS                       | <input checked="" type="checkbox"/> |

|                |         |
|----------------|---------|
| SUB TOTAL 12 % | 1333.33 |
| SUB TOTAL 0%   |         |
| DESCUENTO      |         |
| SUBTOTAL       |         |
| IVA 12 %       | 160.00  |
| VALOR TOTAL    | 1493.33 |

 FIRMA AUTORIZADA

 RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesus del Gran Poder" - Av. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2885 032  
RUC 0301582816001 del 0000251 al 00000350 - F. Autorización 10-OCTUBRE-2022 - F. Caducidad 10-OCTUBRE-2023

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1891724612001

FACTURA

No. 001-801-000019874

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2004202301189172461200120018010000198745892884013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/04/2023 17:04:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2004202301189172461200120018010000198745892884013

2004202301189172461200120018010000198745892884013

VEHICENTRO VEHICULOS Y CAMIONES CENTRO SIERRA S.A

VEHICENTRO S.A.

Dirección: Av. Indoeamerica Km 3 1/2  
Matriz:

Dirección: AV. INDOAMERICA KM 3 1/2  
Sucursal:

Contribuyente Especial 00183

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691710080001

Fecha: 20/04/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal  | Cod. Auxiliar | Cantidad  | Descripción  | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|-----------------|---------------|-----------|--|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| RM1085          | SD            | 1.000000  | ##SUMOS VARIOS   |                   | 10.000000       | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 10.00        |
| 200V05504-0122  | SD            | 1.000000  | ELEMENTO DE ACEITE C7H 540HP 200V05504-0108/200V05504-0107     |                   | 19.530000       | 0.00     | 0.00                | 2.93      | 16.60        |
| 201V12503-0062  | SD            | 1.000000  | ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIBLE T5G 340HP                       |                   | 21.000000       | 0.00     | 0.00                | 3.15      | 17.85        |
| WG9925550966/1  | SD            | 1.000000  | ELEMENTO FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE C7H 540HP TX 390 FS20190 |                   | 37.710000       | 0.00     | 0.00                | 5.66      | 32.05        |
| M1B15           | SD            | 1.000000  | FILTRO DE ACEITE DEL RETARDADOR CAJA ZF #FC4253                |                   | 53.000000       | 0.00     | 0.00                | 7.95      | 45.05        |
| FUCHSCARGO10W40 | SD            | 42.000000 | FUCHS CARGO MC 10W40 CANECA                                    |                   | 6.340000        | 0.00     | 0.00                | 39.94     | 226.34       |
| ARAL75W80       | SD            | 18.500000 | ACEITE ARAL CAJA ZF  |                   | 19.800000       | 0.00     | 0.00                | 54.95     | 311.36       |
| 85W140EX P      | SD            | 37.000000 | ACEITE DE TRANSMISION TM85W140                                 |                   | 5.710000        | 0.00     | 0.00                | 31.69     | 179.58       |

| Información Adicional |  |
|-----------------------|--|
| Dirección:            | PUYO AV. TARQUI SN Y LOS LAURELES/PUYO/PASTAZA |
| Email:                | jeanmarco@hotmail.com                          |
| MARCA:                | SD   |
| CLASE:                | MANO DE OBRA                                   |
| TIPO:                 | SD   |
| MODELO:               | SD   |
| COLOR:                | SD   |
| ANIO:                 | SD   |
| CHASIS:               | RM1085   |
| MOTOR:                | SD   |
| CILINDRAJE:           | SD   |
| PAISORIGEN:           | SD   |
| RAW:                  | SD   |
| TONELAJE:             | 0 N° Pasajeros: SD Combustible: SD             |
| Motivo:               | VENTA  |

| Forma de pago                                     | Valor  |
|---|--------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 939.49 |

|   |        |
|---|--------|
| SUBTOTAL 12%  | 838.83 |
| SUBTOTAL 0%   | 0.00   |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                               | 0.00   |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                  | 0.00   |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                  | 838.83 |
| TOTAL DESCUENTO   | 146.26 |
| ICE   | 0.00   |
| IVA 12%   | 100.66 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                    | 0.00   |
| IRBPNR  | 0.00   |
| PROPINA   | 0.00   |
| VALOR TOTAL   | 939.49 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                | 0.00   |
| AHORRO POR SUBSIDIO<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00   |

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1691715430001

FACTURA

No. 001-100-000000015

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2004202301169171543000120011000000000153854243811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/04/2023 12:07:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2004202301169171543000120011000000000153854243811

2004202301169171543000120011000000000153854243811

COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO TOAPANTA RIVERA CIA. LTDA.

Dirección: 27 DE FEBRERO Y TENTE HUGO ORTIZ  
Matriz:

Dirección: 27 DE FEBRERO Y TENTE HUGO ORTIZ  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación: 1691715430001

Fecha: 20/04/2023 Placa / Matricula: Guía

Dirección: PASTAZA PUYO AV TARQUI S/N Y LOS LAURELES

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                     | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0015           |               | 2.000000 | TRANSPORTE MADRE TIERRA<br>MINA |                   | 250.000000      | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 500.00       |

Información Adicional

Correo electrónico: jirresana@hotmail.com  
Teléfono: 0537532569

| Forma de pago                                     | Valor  |
|---|--------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 500.00 |

|  |        |
|--|--------|
| SUBTOTAL 12%   | 0.00   |
| SUBTOTAL 0%  | 500.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00   |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00   |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 500.00 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00   |
| ICE  | 0.00   |
| IVA 12%  | 0.00   |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00   |
| IRBPNR   | 0.00   |
| PROPINA  | 0.00   |
| VALOR TOTAL  | 500.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00   |
| AHORRO POR SUBSIDIO.<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00   |

TIENE LOGO

R.U.C.: 1791282299001

FACTURA

No. 001-006-000840496

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

210420230117912822990012001006000840496000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/04/2023 17:36:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



210420230117912822990012001006000840496000000111

210420230117912822990012001006000840496000000111

PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C A

PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C A

Dirección: AV 6 DE DICIEMBRE N 30 182 Y ALPALLANA  
Matriz:

Dirección: AV 6 DE DICIEMBRE N 30 182 Y ALPALLANA  
Sucursal:

Contribuyente Especial 02239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

|                                     |                                   |                    |      |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S A |                    |      |
| Identificación                      | 1691710080001                     | Placa / Matrícula: | Guía |
| Fecha                               | 21/04/2023                        |                    |      |
| Dirección:                          |                                   |                    |      |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad        | Descripción        | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 309            | 309           | 35000,000<br>33 | ASFALTO AC 20 O.P. |                   | 0.279200        | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 9772.00      |

| Información Adicional  |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Dirección:             | SECTOR RODRIGO DE TRIANA SN VIA PUYO |
| Telefono:              | 9813185                              |
| CodigoCliente/Petro:   | 0703358207033588                     |
| MailCliente:           | amazo_building2009@hotmail.com       |
| NombreEstacion:        | AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S A    |
| NumeroFacturaBanco:    | 26840496                             |
| FechaDespacho:         | 21/04/2023                           |
| FechaVencimiento:      | 08/05/2023                           |
| ContribuyenteEspecial: | RESOLUCION NO. 02239 - 07/05/1996    |
| PuntoDePartida:        | ESMERALDAS                           |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| SUBTOTAL 12%              | 9772.00  |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00     |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00     |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00     |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 9772.00  |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00     |
| ICE                       | 0.00     |
| IVA 12%                   | 1172.84  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00     |
| IRBPNR                    | 0.00     |
| PROPINA                   | 0.00     |
| VALOR TOTAL               | 10944.84 |

| Forma de pago                                     | Valor    |
|---|----------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 10944.84 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1490820317001

FACTURA

No. 001-002-000001096

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104202301149082031700120010020000010960000109611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/04/2023 17:17:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2104202301149082031700120010020000010960000109611

2104202301149082031700120010020000010960000109611

TRANSCARRERA-ROBLES S.A.

TRANSCARRERA-ROBLES S.A.

Dirección Matriz: SOASTI Y RAFAEL RIVADENEIRA

Dirección Sucursal: SOASTI Y RAFAEL RIVADENEIRA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Fuente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación 1691710080001

Fecha 21/04/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: LUIS MOLINA S/N Y FIDEL RODRIGUEZ

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad         | Descripción                             | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------------------|---|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0100032        | 0100032       | 37350.000<br>000 | TRANSPORTE DE ASFALTO<br>FSM - P.I.Y.Q. |                   | 0.040000        | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1494.00      |

Información Adicional

Dirección: LUIS MOLINA S/N Y FIDEL RODRIGUEZ

email: yailin.milan@petroleosyservicios.com

Nota: GUIA 006-041-000113056 PLACA EAA2287

| Forma de pago                                     | Valor   |
|---|---------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1494.00 |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| SUBTOTAL 12%              | 0.00    |
| SUBTOTAL 0%               | 1494.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00    |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00    |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 1494.00 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00    |
| ICE                       | 0.00    |
| IVA 12%                   | 0.00    |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00    |
| IRBPNR                    | 0.00    |
| PROPINA                   | 0.00    |
| VALOR TOTAL               | 1494.00 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1701952069001

FACTURA

No. 001-014-000000725

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202301170195206900120010140000007250000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2023 09:10:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202301170195206900120010140000007250000000015

2304202301170195206900120010140000007250000000015

FUENTES FLORES MARIA DEL CARMEN

E/S AZOR SHELL

Dirección Matriz: AV. MIRAFLORES

Dirección Sucursal: AV. BARRIO LAS PALMAS, AV. ALBERTO ZAMBRANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.

Identificación 1691710080001

Fecha 23/04/2023 Placa / Matrícula: ABC9999 Guía

Dirección: BARRIO MIRAFLORES

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad       | Descripción    | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0121           | 3             | 1001.0940<br>Ω | DIESEL PREMIUM |                   | 1.562500        | 1.53     | 3.09                | 0.00      | 1564.21      |

Información Adicional

Factura: 001-014-000000725  
 E\_MAIL: shellazor.efactura@gmail.com  
 Dirección\_Cliente: BARRIO MIRAFLORES  
 Telefono\_Cliente: 000  
 Codigo\_Cliente: 45848

| Forma de pago                                     | Valor   |
|---|---------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1751.92 |

|  |         |
|--|---------|
| SUBTOTAL 12%   | 1564.21 |
| SUBTOTAL 0%  | 0.00    |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00    |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00    |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 1564.21 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00    |
| ICE  | 0.00    |
| IVA 12%  | 187.71  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00    |
| IRBPNR   | 0.00    |
| PROPINA  | 0.00    |
| VALOR TOTAL  | 1751.92 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 3465.65 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 1713.74 |

R.U.C.: 1691710080001

**FACTURA**

No. 001-101-000000095

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**

2106202301169171008000120011010000000950000009513

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:**

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISION:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2106202301169171008000120011010000000950000009513

**AMAZONBUILD SA 2023**

**AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S A**

**Dirección Matriz:**

BARRIO EL DORADO, AV TARQUI SN Y LOS LAURELES

**Telf.:**

**E-mail:** jinmarinm@hotmail.com

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI**

**Agente de Retención RESOLUCION No. 1**

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

**RUC / CI:** 1660000170001

**Fecha Emisión:** 21/06/2023

**Dirección:** FRANCISCO DE ORELLANA 739 Y 27 DE FEBRERO

| Código    | Descripción - Serie                | Cant. | Unidad | P.Unitario | Desc. | Valor Total |
|-----------|------------------------------------|-------|--------|------------|-------|-------------|
| \SVF-0001 | PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nº 03   | 1.00  |        | 93,191.56  | 0.00  | 93,191.56   |
| \SVF-0001 | REAJUSTE (PROVISIONAL) PLANILLA 03 | 1.00  |        | 2,325.30   | 0.00  | 2,325.30    |

**INFORMACION ADICIONAL:**

**Forma de pago:** CREDITO 0 días

**Vendedor:** 00002 JENNY PUNINA

**Observaciones:** PLANILLA DE AVANCE OBRA 3:"ASFALTADO DE LA VÍA CURARAY-FRANCISCO DE ORELLANA-JATUNPACCHA, HASTA EL KILOMETRO 12 VÍA 10 DE AGOSTO-EL TRIUNFO.CANTÓN PASTAZA"

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>SUBTOTAL:</b>               | <b>95,516.86</b>  |
| TOTAL DESCUENTO:               | 0.00              |
| SUBTOTAL 12%:                  | 95,516.86         |
| SUBTOTAL 0%:                   | 0.00              |
| SUB TOTAL No Objeto IVA:       | 0.00              |
| <b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:</b> | <b>95,516.86</b>  |
| IVA 12%:                       | 11,462.02         |
| <b>VALOR TOTAL:</b>            | <b>106,978.88</b> |

| Forma de Pago                                   | Valor     | Plazo | Tiempo |
|---|-----------|-------|--------|
| 20 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 106978.88 | 0     | DIAS   |
