

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 1323

Fecha: 22/08/2023

Asiento N° 3882

Compromiso N° 704

1BCE PRINCIPAL Cta Cte No 01210014

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **CONSORCIO ASFALTADOS C Y C**

USD 1,916.17

LA SUMA DE: **UN MIL NOVECIENTOS DIECISEIS Dolares 17/100 Ctvs**

PUYO, 22 de Agosto del 2023

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSORCIO ASFALTADOS C Y C.- PAGO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DEL PROYECTO ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTEGNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTEGNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR

Usuario: ALE

DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor
CTA 3001529301	CONSORCIO ASFALTADOS C Y C	1,916.17
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		1,916.17

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	1,916.17	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014		1,916.17
SUMA o PASAN USD		1,916.17	1,916.17

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.507.750501.000.000 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			1,916.17
TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	1,916.17

LCDO. ANDRE GRANDA.
Prefecto Provincial

LCDA. MARILU ORDOÑEZ.
Directora Financiera E.


LCDO. MARCELO CUEVA.
Jefe De Contabilidad E.

ING. GABRIEL SOS
Tesorero

22/08/2023 8:21

Página 1/1

A
MD3 339
23-08-2023



Orden de Pago Nro. GADPPZ-GADPPZ-2023-0189-GOP

Puyo, 18 de agosto de 2023

PARA: Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes
Directora Financiera (E)

ASUNTO: Orden de pago a favor de CONSORCIO ASFALTADOS C Y C

En conformidad con la solicitud orden de pago Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-0199-SOLOP, de 17 de agosto del 2023, considerando que la Dirección Financiera ha realizado el control previo del trámite de la **“PLANILLA DE LIQUIDACIÓN Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DEL PROYECTO “ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”**, autorizo proceda con el pago en observancia de las disposiciones legales, a favor de **CONSORCIO ASFALTADOS C Y C**, por el valor de 1,916.17 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA**.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Andre Mauricio Granda Garrido
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

Referencias:

- GADPPZ-FINANCIERO-2023-0199-SOLOP

Anexos:

- solicitud_orden_de_pago_nro._gadppz-financiero-2023-0199-solop.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Abg. Jazmin Paola Rea Sangoquiza - Asistente Administrativo 2 --> Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes - Directora Financiera (E)





Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5819-M

Número:

Hora:

10:38

Puyo, 23 de julio de 2023


PARA: Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes
Directora Financiera (E)

ASUNTO: EXPEDIENTES ORIGINALES REVISADOS

Señora Directora, en respuesta al Documento No. GADPPZ-FINANCIERO-2023-2328-M, tengo a bien adjuntar los expedientes físicos, revisados para continuar con el trámite correspondiente.

A continuación se detalla el listado de las planillas.

FECHA	COMPROBANTE	DETALLE
11/06/2023	1244	OBRACIV CIA. LTDA.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION Y REAJUSTE DEFINITIVO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL RETIRO Y REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA AV. ALBERTO ZAMBRANO DESDE EL SECTOR DEL REDONDEL DE LA Balsa HASTA SECTOR DEL CEMENTERIO, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
05/04/2023	838	OBRACIV CIA. LTDA.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N5 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N5 DE LA OBRA PARA EL RETIRO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DE LA AV. ALBERTO ZAMBRANO DESDE EL RENDONDEL DEL BALCERO HASTA EL CEMENTERIO MUNICIPAL,PUYO,CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.
09/05/2023	1189	OBRACIV CIA. LTDA.- OBRACIV CIA. LTDA.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, REAJUSTE PROVIISONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION Y REAJUSTE DEFINITIVO DE DEL ANTICIPO DEL PROYECTO RETIRO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DE LA AV. ALBERTO ZAMBRANO DESDE EL RENDONDEL DEL BALCERO HASTA EL CEMENTERIO MUNICIPAL,PUYO,CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA COBRO DEL ANTICIPO



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5819-M

Puyo, 23 de julio de 2023

18/04/2023	1211	CONSORCIO ASFALTADOS C Y C.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DEL PROYECTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTEKNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANO
28/04/2023	1189 1198	CONSORCIO ASFALTADOS C Y C.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DEL PROYECTO ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTEKNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTEKNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTO

Particular que remito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas
DIRECTOR DE FISCALIZACION

Referencias:

- GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5812-M



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5819-M

Puyo, 23 de julio de 2023

Copia:

Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - Secretaria Ejecutiva 2 /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Jomara Daniela Martinez Moya - Asistente Administrativo 1

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL

Pastaza

24 JUL 2023

Fecha:

Ejecutar el control previo y efectuar
La contabilización, conforme leyes y
Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL

Pastaza

Fecha:

24 JUL 2023

Ejecutar el control previo al pago
Conforme leyes y reglamentos
Vigentes.



firmado electrónicamente por:
JAIK FERNANDO
LEDESMA BASTIDAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**COMPROBANTE DE DIARIO N° 1198**

Fecha: 28/04/2023

Asiento N° 2170

Compromiso N° 704

Retención N° 001-010-000020834

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSORCIO ASFALTADOS C Y C.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DEL PROYECTO ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTEGNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTEGNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLT


Usuario: ALE

DOCUMENTOS			
Fecha	Documento	No Autorización	Valor
25/04/2023	FACTURA	00110000000007 74337586513	2,184.34

APLICACION CONTABLE			
Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IVA	234.04	
1.5.1.55.01.001	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA	1,950.30	
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS		1,916.17
2.1.3.75.01.112	IMPUESTO A LA RENTA 1.75%		34.13
2.1.3.81.14.001	CXP IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI		234.04
SUMAN o PASAN USD		2,184.34	2,184.34

APLICACION PRESUPUESTARIA			
Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.507.750501.000.000 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		1,950.30	
TOTAL GASTOS USD	0.00	1,950.30	0.00


 LCDA. MARILU ORDOÑEZ
 Contadora General


 ING. ALEXANDRA POZO
 Contador 1

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Compromiso No: 704

Transacción No: 4094

Fecha: 13/04/2023

Proveedor: CONSORCIO ASFALTADOS C Y C

Identificación: Ruc 1691728902001

Programa: 05 FUNCION SERVICIO CONECTIVIDAD VIALIDAD Y ENERGIA

DETALLE:

CONSORCIO ASFALTADOS C Y C.- ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTEGNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTEGNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

RIGO

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
05.01.D505.507.750501.000.000 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	52,909.14	378,231.61
Total =>	52,909.14	378,231.61



FRANCISCO RIGOBERTO
GREFA RIVADENEYRA

Subdirector Financiero

05/05/2023 10:06

Página 1/1



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 7-9-2023

Hora: 11:58:44

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: SOSA ESPINEL GABRIEL ALEJANDRO 1210014

Num. Ref. BCE.:19005474

Institución Pública: GAD PROV PASTAZA						# Cta.: 1210014		
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANECUADOR B.P.	3001529301	1,916.17	339	1691728902001	CONSORCIO ASFALTADOS C Y C	1	24-08-2023 17:23:21	ACREDITADA
Total:		7,723.52	Reg.:2					

[Atrás](#)



Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA

Dirección: Francisco de Orellana y 27 de Febrero

Teléfono: 032885380 / Fax: 032886179

E-mail: financiero@pastaza.gob.ec

Web: www.pastaza.gob.ec

Contribuyente Especial: 590

RUC: 1660000170001

COMPROBANTE DE RETENCION

N° 001-010-000020834

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2804202307166000017000120010100000208341438932219

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

09/05/2023 17:17:49

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2804202307166000017000120010100000208341438932219

Razon Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ASFALTADOS C Y C

RUC/CI: 1691728902001

Fecha Emisión: 28 de Abril del 2023

Guía de Remisión:

Número de Documento	Cód. SRI	Descrip. Reten.	% Reten.	Base Retención	Valor Retenido
001-100-000000007	346	1.75% IMPUESTO A LA RENTA	1.75	1,950.30	34.13
001-100-000000007	731	100% SRI RESOLUCION 074 075	100.00	234.04	234.04
				Total	268.17

Información Adicional:

Dirección:

Teléfono:

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1691728902001

FACTURA

No. 001-100-000000007

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202301169172890200120011000000000074337586513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2023 09:48:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202301169172890200120011000000000074337586513

2504202301169172890200120011000000000074337586513

CONSORCIO ASFALTOS C Y C

Dirección Matriz: Barrio: CIUDADELA DEL CHOFER Calle: SALINAS Intersección: COTOPAXI

Dirección Sucursal: Barrio: CIUDADELA DEL CHOFER Calle: SALINAS Intersección: COTOPAXI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Identificación 1660000170001

Fecha 25/04/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO



Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.000000	PLANILLA DE LIQUIDACION EN EL PROYECTO ESTABILIZACION DE LA BASE GRANULAR DE LA VIA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A MANOTECNOLOGIA Y EMULSION ASFALTICA SECTOR SAN JACINTO PARROQUIA TARQUI Y DE LA VIA HACIA LA COLINIA	SANTA ISABEL SECTOR LAS AMERICAS PARROQUIA PUYO CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA REAJUSTE PROVINCIAL PLANILLA DE LIQUIDACION EN NEGATIVO (-29.70)	1980.000000	0.00	0.00	29.70	1950.30

Información Adicional	
Telefono:	032885380
Email:	financiero@pastaza.gob.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2184.34

SUBTOTAL 12%	1950.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1950.30
TOTAL DESCUENTO	29.70
ICE	0.00
IVA 12%	234.04
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2184.34
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA
CONTROL PREVIO**

ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.		FINANCIERO			
CONTRATISTA:	CONSORCIO ASFALTOS CYC, CON SU PROCURADOR COMÚN ING. ÁLVAREZ CASTILLO ELIO ANDRÉS	TIPO DE PROCESO		TIPO DE PROCESO	
DOCUMENTO:	SOLICITUD DE PAGO	CONTRATO	PLANILLA	CONTRATO	PLANILLA
CONCEPTO:	PLANILLA DE LIQUIDACIÓN		x		
FECHA DEL DOCUMENTO:	27 DE MARZO DE 2023				
TIPO DE PROCESO	COTO-GADPPz-009-2022				
VALOR SIN IVA:	\$1.950,30	APLICA		APLICA	
	CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS	SI	NO	SI	NO
1	Requerimiento	X			
2	Estudios del proyecto				
3	Informe técnico y económico				
4	Factibilidad Ambiental				
5	Certificación POA				
6	Certificación Presupuestaria				
7	Convenio				
8	Pliegos del Procedimiento				
9	Informe Técnico de Evaluación de Ofertas				
10	Resolución de Adjudicación				
11	Garantía Original de fiel Cumplimiento del contrato				
12	Garantía Original de Buen Uso del Anticipo				
13	Certificado de no Adeudar al GADPPz				
14	Documentos Personales / Representante Legal				
15	Certificación Bancaria				
16	Certificado de cumplimiento Tributario (SRI)				
17	RUC Actualizado				
18	Contrato original y disposición escrita de trabajo (proceso completo)				
	Planilla de Reajuste de de precios del Anticipo				
19	Orden de Inicio de Trabajos				
20	Planilla de obra con informe de Fiscalización (Fiscalizador)	X		/	
21	Anexos de Obra	X		/	
22	Cuadro de Diferencia de Cantidades	X		/	
23	Conformidad Ambiental				
24	Informe de avance de Obra de Administrador de contrato	X		/	
25	Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales (IESS) Planilla	X		/	
26	Certificado de no ser obra nueva				
27	Multa				
28	Autorización de la máxima Autoridad para prórroga de Plazos				
29	Autorización de la máxima Autoridad para Rubros Nuevos				
30	Certificado que no es obra nueva				
31	Solicitud de recepción de Obra				
32	Solicitud de pago del Administrador del Contrato	X		/	
33	Solicitud de pago del Director de la Unidad al Financiero	X		/	
34	Factura/Nota de Venta			/	
35	Validación de la factura/Nota de Venta			/	
36	Acta de repecion provisional			/	
OBSERVACIONES:					
Revisado por:					
		 <small>Firmado electrónicamente por:</small> DANIEL ANIBAL RAMOS <small>CAMPAÑA</small>			 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MERCY JOHANNA <small>QUISHPI CUENCA</small>
DEPARTAMENTO SOLICITANTE DEL TRAMITE/ OBRAS PÚBLICAS			DEPARTAMENTO FINANCIERO		

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA

Pastaza

Fecha:

31 MAR 2023

Recibido:

Pao Rea

Número:

4893 Hora: 13h06

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4893-M

Puyo, 31 de marzo de 2023

PARA: Sr. Téc. Jose Mauricio Marin Montero
Director Financiero (E)**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL PROCESO
COTO-GADPPz-009-2022.

En referencia a los documentos: Oficio N°- 018-CACyC-2023, de fecha 10 de febrero de 2023, suscrito por el ingeniero Elio Andrés Álvarez – Procurador Común CONSORCIO ASFALTOS CyC; Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACIÓN-2023-4823-M, de fecha 23 de marzo de 2023, suscrito por el ingeniero Robert Quintana – Fiscalizador 1; y, Memorando Nro. GADPPZ-OBRA-PUBLICA-2023-10089-M, de fecha 27 de marzo de 2023, suscrito por el ingeniero Daniel Ramos – Director de Obras Públicas (Administrador de Contrato), hago hincapié lo siguiente:

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado 408-17 Administrador del contrato, que indica: *“El administrador del contrato velará porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegación y supervisión de esas tareas, la comunicación constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicación de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de sí para lograr el éxito del proyecto.- Es función del administrador del contrato establecer un sistema que evalúe el logro de los objetivos, mediante el cual pueda obtenerse información sobre su estado. Esto con el fin de tomar oportunamente acciones correctivas o para informar a las autoridades de la entidad sobre el desarrollo del proyecto”*

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado **408-18** Jefe de Fiscalización, indica: *“El Jefe de Fiscalización establecerá un sistema para asegurar la correcta ejecución de la obra, mediante el control de la calidad, el avance físico y el avance financiero de la obra. Dichos controles conllevan una evaluación mensual, de los aspectos mencionados y la comunicación de resultados a los mandos superiores, incluyendo los problemas surgidos, especialmente cuando afectan las condiciones pactadas en relación al plazo, presupuesto y calidad de la obra.- El Jefe de Fiscalización, se asegurará de que la obra se ejecute de conformidad con las bases establecidas en los estudios de preinversión, es decir, de acuerdo con el diseño definitivo, las especificaciones y demás normas técnicas aplicables, para lograr obtener del proyecto los beneficios esperados”*.

Con estos antecedentes, adjunto al presente la Planilla de Liquidación y Reajuste Provisional (con todos los anexos) del proyecto: **“ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”**, documentación que ha sido revisada y aprobada por el Administrador de Contrato y Fiscalizador; por lo que, en base a los informes anexos, se determina como viable y procedente realizar el pago de \$ 1.950,30 USD (MIL NOVECIENTOS CINCUENTA



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4893-M

Puyo, 31 de marzo de 2023

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 30/100), a favor del **CONSORCIO ASFALTOS CyC**, representado legalmente por el ingeniero Elio Andrés Álvarez, de acuerdo al siguiente detalle:

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	\$ 1.980,00 USD
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA LIQUIDACIÓN (-)	\$ 29,70 USD
VALOR TOTAL	\$ 1.950,30 USD

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Álvaro Renato Sosa Castro
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

Referencias:

- GADPPZ-OBRA-PUBLICA-2023-10089-M

Anexos:

- check_list_liquidación.pdf
- 1er_oficio_de_ingreso.pdf
- informe_enero_2023-signed-2_firmado.pdf
- 2._libro_de_obra.rar
- 3__repcion0082808001679577621.rar
- 4._planilla_liq.rar
- 5._facturas_iess.rar
- 6._ensayos.rar
- 1__anexos0210969001679577618.rar
- 7__conformidad_ambiental0111491001679577624.rar
- img20230217_14512171.pdf
- img20230217_14530547.pdf
- informe_de_conformidad_-_planilla_de_liquidación-signed.pdf
- check_list_plan_liqui_adm_contr.pdf
- coto-009-2022_inf_de_adm_contr_plan_liquid.pdf

Copia:

Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - **Secretaría Ejecutiva 2** / Sr. Ing. Daniel Anibal Ramos Campaña - **Director de Obras Publicas** /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - Secretaria Ejecutiva 2

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL



Pastaza 31 MAR 2023
Fecha:

Ejecutar el control previo y efectuar
La contabilización conforme leyes y
Reglamentos Vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL



Pastaza 31 MAR 2023
Fecha:

Ejecutar el control previo al pago
Conforme leyes y reglamentos
Vigentes.



Documento firmado electrónicamente por:
ALVARO RENATO SOSA
CASTRO



PLANILLA
LIQUIDACIÓN

CD-R

COMPACT
disc
Recordable

700 MB
Mo

52x speed
vitesse

80 min

CONSORCIO C y C
"ESTABILIZACIÓN"



GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA



DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Pastaza

27 MAR 2023

Fecha:

Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-10089-M

Recibido:

EM

Puyo, 27 de marzo de 2023

Número:

10089

Hora:

11:43

PARA: Sr. Ing. Álvaro Renato Sosa Castro
Director de Fiscalización

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL PROCESO COTO-GADPPz-009-2022.

De mi consideración:

Señor Director, en referencia al Oficio N°-018-CACyC-2022, de fecha 10 de febrero de 2023, suscrito por Consorcio Asfaltos CyC, con su procurador común el Ing. Álvarez Castillo Elio Andrés, CONTRATISTA, en el cual señala "...Se procede entregar la PLANILLA DE LIQUIDACIÓN, para su revisión, aprobación y continúe el trámite requerido para su cancelación.."; y en referencia al Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACIÓN-2023-4823-M, de fecha 23 de marzo de 2023, suscrito por el Ing. Quintana Muñoz Robert Fernando, FISCALIZADOR DE OBRA; de conformidad a lo establecido en el contrato celebrado entre el GADPPz y el Consorcio Asfaltos CyC, con su procurador común el Ing. Álvarez Castillo Elio Andrés, CONTRATISTA, del proceso COTO-GADPPz-009-2022, "ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA" CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO "...6.01. Se realizará el pago de la siguiente forma: Se otorgará un anticipo de 50% y el restante 50% contra presentación de planillas mensuales por avance de obra debidamente aprobadas y legalizadas por la fiscalización y administración de contrato...", razón por la cual por su intermedio me permito remitir el informe de Administrador de Contrato Aprobando la Planilla de Liquidación, el valor a pagar en este periodo es el siguiente:

● Monto Total Planilla de Liquidación:	\$	1.980,00	✓
● Reajuste Provisional Planilla de Liquidación:	\$	- 29.70	✓
VALOR A PAGAR	\$	1.950,30	✓
x*Valor que no incluye IVA*			
El porcentaje de avance acumulado del proyecto:	%	107.00	

Particular que remito para los fines pertinentes.

Atentamente,

$1.75 \times = 34.1311$

Ant = -

Benef = 1916.1711



Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-10089-M

Puyo, 27 de marzo de 2023

Documento firmado electrónicamente

Ing. Daniel Anibal Ramos Campaña
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Referencias:

- GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4823-M

Anexos:

- check_list_liquidación.pdf
- informe_enero_2023-signed-2_firmado.pdf
- 1er_oficio_de_ingreso.pdf
- informe_de_conformidad_-_planilla_de_liquidación-signed.pdf
- img20230217_14530547.pdf
- img20230217_14512171.pdf
- 7__conformidad_ambiental0111491001679577624.rar
- 1__anexos0210969001679577618.rar
- 6_ensayos.rar
- 5_facturas_iess.rar
- 4__planilla_liq.rar
- 3__recepcion0082808001679577621.rar
- 2__libro_de_obra.rar
- check_list_plan_liqui_adm_contr.pdf
- coto-009-2022_inf_de_adm_contr_plan_liquid.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sr. Lcdo. Jorge Roberto Arboleda Basantes - Asistente Administrativo 2



Firmado electrónicamente por:
DANIEL ANIBAL RAMOS
CAMPANA



Informe Técnico No. 107-GADPPz-OOPP-2023

Puyo, 27 de marzo de 2023

ASUNTO: PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL PROCESO COTO-GADPPz-009-2022 “ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”.

En base a la **NOTIFICACIÓN DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO Nº 124-2022**, de fecha 02 de agosto de 2022, se me designa como Administrador de Contrato del proyecto **COTO-GADPPz-009-2022**, para el “**ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**”, con un presupuesto referencial de **\$351.593,285** (Trecientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Noventa y Tres con 285/100) Dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. En un plazo de **Ciento Veinte (120) días**.

Mediante el Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACIÓN-2023-4823-M, de fecha 23 de marzo de 2023, suscrito por el Ing. Quintana Muñoz Robert Fernando, Fiscalizador del GADPPz, entrega la documentación habilitante de la Planilla de Liquidación.

Nº	REFERENCIA	DETALLE
1.-	Contrato No.	COTO-GADPPz-009-2022
2.-	Fecha de suscripción	29 DE JULIO DEL 2022
3.-	Monto del Contrato Principal	\$ 351.593,285 USD SIN IVA
4.-	Objeto del Contrato	ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.
5.-	Porcentaje del anticipo	50 %



6.-	Monto del Anticipo	\$ 175.796,64 USD
7.-	Plazo Contractual	CIENTO VEINTE (120) DÍAS

Los valores y cantidades ejecutados del contrato que constan en la Planilla de Liquidación son los siguientes:

- Periodo de la Planilla de Liquidación: 01 de enero de 2023 al 24 de enero de 2023. ✓
- Plazo contractual: 120 Días calendario ✓
- Monto Total Planilla de Liquidación: \$ 1.980,00 ✓
- Reajuste Provisional Planilla de Liquidación: \$ - 29.70 ✓
- Porcentaje de avance parcial del proyecto: % 0.56 ✓
- Porcentaje de avance acumulado del proyecto: % 107.00 ✓

De acuerdo a la Planilla de Liquidación, aprobada bajo responsabilidad de la FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO, y a su vez se encuentra aprobada por el Administrador de Contrato, el valor a pagar en este periodo es el siguiente:

- Monto Total Planilla de Liquidación: \$ 1.980,00
- Reajuste Provisional Planilla de Liquidación: \$ - 29.70
- VALOR A PAGAR** \$ **1.950,30**
- x*Valor que no incluye IVA*
- El porcentaje de avance acumulado del proyecto: % **107.00**

Es todo cuanto puedo informar para los fines pertinentes.

Atentamente,



DANIEL ANIBAL RAMOS
CAMPANA

Ing. Ramos Campaña Daniel Aníbal.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4823-M**

Puyo, 23 de marzo de 2023

PARA: Sr. Ing. Daniel Anibal Ramos Campaña
Director de Obras Publicas**ASUNTO:** TRAMITE DE PAGO PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE LA OBRA
COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-009-2022 " ESTABILIZACIÓN DE BASE
GRANULAR MUSHUWARMY Y SANTA ISABEL"

Por medio del presente me permito informarle que en mi calidad de Fiscalizador, de acuerdo a los Art. 408-19 de las NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS, he procedido a **APROBAR LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN**, del Contrato "ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMY CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", para lo cual en cumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas en el CONTRATO-CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO, agradeceré proceder con el trámite respectivo para cancelar a favor del **CONSORCIO ASFALTOS C Y C**, representada por el Procurador Común el ING. ELIO ANDRÉS ÁLVAREZ CASTILLO el valor de **\$ 1.950,30 USD** (MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 30/100), conforme al siguiente detalle:

VALOR LÍQUIDO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN:	\$ 1.980,00 USD
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN:	\$ -29,70 USD
TOTAL:	\$ 1.950,30 USD

Se adjunta toda la información relevante en físico y original, firmas y recibidos. La conformidad ambiental es recibida el 22 de marzo de 2023, mediante Memorando Nro. GADPPZ-DGA-2023-14266-M, motivo por el cual se tramita la planilla con la presente fecha.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*Ing. Robert Fernando Quintana Muñoz
FISCALIZADOR 1



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4823-M

Puyo, 23 de marzo de 2023

Referencias:

- GADPPZ-DGA-2023-14266-M

Anexos:

- img20230217_14512171.pdf
- img20230217_14530547.pdf
- informe_de_conformidad_-_planilla_de_liquidación-signed.pdf
- 1er_oficio_de_ingreso.pdf
- informe_enero_2023-signed-2_firmado.pdf
- check_list_liquidación.pdf
- 1__anexos0210969001679577618.rar
- 2._libro_de_obra.rar
- 3__recepcion0082808001679577621.rar
- 4._planilla_liq.rar
- 5._facturas_iess.rar
- 6._ensayos.rar
- 7__conformidad_ambiental0111491001679577624.rar



Firmado electrónicamente por:
**ROBERT FERNANDO
QUINTANA MUÑOZ**

Memorando Nro. GADPPZ-OBRA-PUBLICA-2023-9457-M

Puyo, 08 de febrero de 2023

PARA: Sr. Ing. Fabian Dario Salazar Laguna
Subdirector de OOPP
 Sr. Ing. Robert Fernando Quintana Muñoz
Fiscalizador 1

ASUNTO: CONSORCIO ASFALTOS C Y C - Solicita proceda con la RECEPCIÓN PROVISIONAL del Proyecto

En respuesta al Documento No. 017-CACyC-2023

En atención al **Oficio N.º- 017- CACyC-2023**, de fecha 23 de ENERO del 2023, suscrito por el Ing. Elio Andrés Álvarez, en su calidad de PROCURADOR COMÚN DEL **CONSORCIO ASFALTOS CYC** documento en el cual solicita la Recepción Provisional del proyecto **“ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”** una vez concluido los trabajos del proyecto antes mencionado solicito de la manera más atenta se designe la comisión técnica para la Recepción Provisional de la obra, para lo cual detallo lo siguiente:

DATOS DEL PROYECTO:

Proyecto:	“ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”
Fiscalizador:	Ing.: Robert Quintana
Administrador de Contrato:	Ing.: Daniel Ramos
Contratista:	CONSORCIO ASFALTO CYC
Estado del Proyecto:	Terminado



Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-9457-M

Puyo, 08 de febrero de 2023

DESIGNACIÓN:

Por lo expuesto, y de conformidad con la Resolución Administrativa No.004-GADPPz-2022, de fecha 06 de enero del 2022, en su Art. 1 numeral 2; me permito designar delegados a la Comisión de **Recepción Provisional de la obra: “ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”**, a los siguientes funcionarios:

MIEMBROS DE LA COMISION TECNICA

Técnico Delegado:	Ing. Fabian Salazar
Administrador de Contrato:	Ing: Daniel Ramos

Sera obligación de los Delegados excusarse en caso de conflicto de intereses, y velar por el cabal cumplimiento General a la ley Orgánica Nacional de Contratación Pública, las disposiciones, normativas y plazos legales, La Dirección solicitante deberá verificar y supervisar el cumplimiento del proceso y plazos de la recepción, y notificará la presente designación a los servidores públicos delegados.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Daniel Anibal Ramos Campaña
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Referencias:

- GADPPZ-RECEPCION-2023-15560-E

Anexos:

- of._recep._provision_c._original_firmado.pdf
- hr_15560_e_2023.pdf



Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-9457-M

Puyo, 08 de febrero de 2023

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Ing. Allyson Magaly Freire Medina - Asistente Administrativo 2



Documento firmado electrónicamente por:
DANIEL ANIBAL RAMOS
CAMPANA



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL/DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONSORCIO ASFALTOS C Y C, CON SU PROCURADOR COMÚN ING. ELIO ANDRÉS ÁLVAREZ CASTILLO MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA PARA: ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

En la ciudad de Puyo el dieciséis de febrero del 2023, nos constituimos los señores: Ing. Daniel Ramos como Administrador, Ing. Fabián Salazar delegado, y el (la) Ing. Robert Quintana Fiscalizador para la liquidación, en calidad de observador, por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial De Pastaza; y el (la) Consorcio Asfaltos C Y C, Con Su Procurador Común Ing. Elio Andrés Álvarez Castillo en calidad de contratista, con el objeto de celebrar la diligencia de recepción provisional de los trabajos.

Cláusula Primera.- Antecedentes

En la ciudad de Puyo el veinte y nueve de julio de 2022 se celebra el contrato suscrito por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial De Pastaza, representado por el Señor Prefecto, y por otra parte el Consorcio Asfaltos C Y C, Con Su Procurador Común Ing. Elio Andrés Álvarez Castillo en calidad de Contratista para la Estabilización De La Base Granular De La Vía Acceso A La Comunidad Mushu Warmi Con Organosilanos En Base A Nanotecnología Y Emulsión Asfáltica, Sector San Jacinto, Parroquia Tarqui, Cantón Pastaza, Provincia De Pastaza Y Estabilización De La Base Granular De La Vía Hacia La Colonia Santa Isabel Con Organosilanos En Base A Nanotecnología Y Emulsión Asfáltica, Sector Las Américas, Parroquia Puyo, Cantón Pastaza, Provincia De Pastaza, en la provincia de Pastaza.

El valor del contrato es \$351,593.29 de conformidad con el presupuesto elaborado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial De Pastaza.

Cláusula Segunda.- Plazo de Ejecución

Del análisis realizado en la cláusula anterior, revisadas las planillas de obra se desprende lo siguiente:

Plazo contractual:	120 Días/
Fecha de inicio:	26 de septiembre de 2022 /
Fecha de terminación:	24 de enero de 2023
Suspensión de plazo:	0 Días
Ampliación de plazo:	
Fecha de terminación ampliada:	24 de enero de 2023
Fecha de entrega:	24 de enero de 2023
Mora:	\$0.00



Multa diaria: \$0.00
Multa total:

Cláusula Tercera.- Inspección de la Obra

Previo al cumplimiento de los requisitos legales, la comisión de recepción se trasladó al lugar de los trabajos y efectuó la inspección de los mismos, comprobándose que la obra ha sido ejecutada en su totalidad de lo contratado, con sujeción a las especificaciones técnicas y cláusulas contractuales, con resultados satisfactorios, en consecuencia, la comisión recibe en forma provisional todos los trabajos realizados en la: Estabilización De La Base Granular De La Vía Acceso A La Comunidad Mushu Warmi Con Organosilanos En Base A Nanotecnología Y Emulsión Asfáltica, Sector San Jacinto, Parroquia Tarqui, Cantón Pastaza, Provincia De Pastaza Y Estabilización De La Base Granular De La Vía Hacia La Colonia Santa Isabel Con Organosilanos En Base A Nanotecnología Y Emulsión Asfáltica, Sector Las Américas, Parroquia Puyo, Cantón Pastaza, Provincia De Pastaza.

La comisión deja constancia expresa que será de cuenta del contratista la reparación o reposición de parte de la obra que se deba a defectos de la construcción.

Cláusula Cuarta.- Cantidades de Obra Contratadas y Ejecutadas

Es de estricta responsabilidad de la Fiscalización las cantidades de obra contratadas y ejecutadas en el contrato de Estabilización De La Base Granular De La Vía Acceso A La Comunidad Mushu Warmi Con Organosilanos En Base A Nanotecnología Y Emulsión Asfáltica, Sector San Jacinto, Parroquia Tarqui, Cantón Pastaza, Provincia De Pastaza Y Estabilización De La Base Granular De La Vía Hacia La Colonia Santa Isabel Con Organosilanos En Base A Nanotecnología Y Emulsión Asfáltica, Sector Las Américas, Parroquia Puyo, Cantón Pastaza, Provincia De Pastaza, que se detalla en el anexo adjunto, en la presente acta de entrega Recepción Provisional.

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNID.	CONTRATADO		EJECUTADO		% TOTAL
			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	1.00	433.47	1.00	\$ 433.47	100.00%
2	MATERIAL PÉTREO DE RELASTRE (MINADA, CARGADA Y REGADA)	M³	600.00	1950.00	595.00	\$ 1,933.75	99.17%
3	TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO DE RELASTRE	M³-KM	8856.00	3099.60	8925.00	\$ 3,123.75	100.78%
4	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³	1200.00	21960.00	1428.00	\$ 26,132.40	119.00%
5	TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO DE BASE GRANULAR	M³-KM	17712.00	6199.20	21420.00	\$ 7,497.00	120.93%
6	MATERIAL PÉTREO DE MEJORAMIENTO (MINADA, CARGADA Y REGADA)	M³	100.00	325.00	2280.00	\$ 7,410.00	2280.00%
7	TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	1476.00	516.60	34200.00	\$ 11,970.00	2317.07%
8	ORGANOZILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA	KG	600.00	12942.00	600.00	\$ 12,942.00	100.00%
9	CEMENTO PORTLAND	SACOS	540.00	4762.80	540.00	\$ 4,762.80	100.00%
10	EMULSIÓN ASFÁLTICA ESPECIAL (CSS- 1H)	M2	6000.00	5100.00	5890.00	\$ 5,006.50	98.17%
11	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=1"	M2	6000.00	24000.00	6479.00	\$ 25,916.00	107.98%
12	LIMPIEZA DE CUNETAS A	M	2000.00	1000.00	2000.00	\$ 1,000.00	100.00%



	MÁQUINA						
13	MARCAS EN PAVIMENTO	M	4000.00	2640.00	3000.00	\$ 1,980.00	75.00%
14	PANCARTA INFORMATIVA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1.00	253.81	1.00	\$ 253.81	100.00%
15	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	1.00	17.35	1.00	\$ 17.35	100.00%
16	KIT ANTIDERRAMES	U	1.00	161.20	1.00	\$ 161.20	100.00%
17	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2.00	149.16	2.00	\$ 149.16	100.00%
18	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	1.00	160.29	1.00	\$ 160.29	100.00%
19	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	250.00	82.50	250.00	\$ 82.50	100.00%
	VIA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL						
20	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	2.50	1083.68	2.50	\$ 1,083.68	100.00%
21	MATERIAL PÉTREO DE RELASTRE (MINADA, CARGADA Y REGADA)	M³	1830.00	5947.50	966.10	\$ 3,139.83	52.79%
22	TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO DE RELASTRE	M³-KM	34587.00	12105.45	18355.90	\$ 6,424.57	53.07%
23	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³	3528.00	64562.40	3600.00	\$ 65,880.00	102.04%
24	TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO BASE GRANULAR	M³-KM	66679.20	23337.72	68400.00	\$ 23,940.00	102.58%
25	MATERIAL PÉTREO DE MEJORAMIENTO (MINADA, CARGADA Y REGADA)	M³	250.00	812.50	2678.85	\$ 8,706.26	1071.54 %
26	TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	4725.00	1653.75	50898.15	\$ 17,814.35	1077.21 %
27	ORGANOZILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA	KG	1500.00	32355.00	1500.00	\$ 32,355.00	100.00%
28	CEMENTO PORTLAND	SACOS	1350.00	11907.00	1350.00	\$ 11,907.00	100.00%
29	EMULSIÓN ASFÁLTICA ESPECIAL (CSS- 1H)	M2	15000.00	12750.00	15000.00	\$ 12,750.00	100.00%
30	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=1"	M2	17500.00	70000.00	16500.00	\$ 66,000.00	94.29%
31	LIMPIEZA DE CUNETAS A MÁQUINA	M	5000.00	2500.00	5000.00	\$ 2,500.00	100.00%
32	MARCAS EN PAVIMENTO	M	10000.00	6600.00	7500.00	\$ 4,950.00	75.00%
33	BORDILLO DE H.S. 14X40 F°C=210 KG/CM2 (ENC. METÁLICO)	M	440.00	5812.40	0.00	\$ 0.00	0.00%
34	ACERAS DE H.S. F°C= 180 KG/CM2 E= 7CM ESCOBILLADO	M2	660.00	12447.60	0.00	\$ 0.00	0.00%
35	PANCARTA INFORMATIVA (LETRERO)-CON ESTRUCTURA	U	1.00	253.81	1.00	\$ 253.81	100.00%
36	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	3.00	52.05	3.00	\$ 52.05	100.00%
37	KIT ANTIDERRAMES	U	3.00	483.60	3.00	\$ 483.60	100.00%
38	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	6.00	447.48	0.00	\$ 0.00	0.00%
39	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	3.00	480.87	0.00	\$ 0.00	0.00%



40	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	750.00	247.50	0.00	\$ 0.00	0.00%
ORDEN DE TRABAJO							
1	S.C. TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1.50M, E=2.0 MM, PM-100	M	11.00	2835.58	11.00	\$ 2,835.58	100.00%
2	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M³	1001.46	4196.12	1001.46	\$ 4,196.12	100.00%
TOTAL PLANILLADO				\$ 358,624.98		\$ 376,203.83	

Cláusula Quinta.- Liquidación Económica

Por los trabajos realizados el contratista presentó las planillas que a continuación se detalla y cuyo valor alcanza los trescientos setenta y cuatro mil doscientos siete dólares, 84/100 centavos (\$374,207.84).

PLANILLAS	MONTO
PLANILLA DE AVANCE No. 1	\$ 208,307.63
PLANILLA DE AVANCE No. 2	\$ 42,829.50
PLANILLA DE AVANCE No. 3	\$ 100,017.00
PLANILLA DE AVANCE No. 4	\$ 16,038.00
PLANILLA DE ORDEN DE TRABAJO	\$ 7,031.70
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	\$ 1,980.00
REAJUSTE PROVISIONAL DEL ANTICIPO	\$ 0.00
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE AVANCE No. 1	-\$ 729.08
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE AVANCE No. 2	-\$ 299.81
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE AVANCE No. 3	-\$ 700.12
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE AVANCE No. 4	-\$ 237.28
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	-\$ 29.70
TOTAL PLANILLADO	\$ 374,207.84

Cláusula Sexta.- Reajuste de Precios

Se han enviado las planillas de reajuste provisionales, quedando por calcularse los reajustes definitivos que se incluirán en el acta de entrega recepción definitiva.

Cláusula Séptima.- Recepción de la Obra

Habiéndose constatado que los trabajos ejecutados se han realizado de conformidad con las normas, Especificaciones Generales y cláusulas contractuales, la comisión procede a la recepción provisional de los trabajos de Estabilización De La Base Granular De La Vía Acceso A La Comunidad Mushu Warmi Con Organosilanos En Base A Nanotecnología Y Emulsión Asfáltica, Sector San Jacinto, Parroquia Tarqui, Cantón Pastaza, Provincia De Pastaza Y Estabilización De La Base Granular De La Vía Hacia La Colonia Santa Isabel Con Organosilanos En Base A Nanotecnología Y Emulsión Asfáltica, Sector Las Américas, Parroquia Puyo, Cantón Pastaza, Provincia De Pastaza.



Para el cabal ejercicio de las atribuciones en el Art. 11 literal b de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el contratista **NO OBSTANTE DE SUSCRIBIR** el acta de entrega recepción, se compromete a responder por vicios ocultos que pudieren existir y que por su naturaleza son imperceptibles, de conformidad con el Art 126 del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, en concordancia con el Art 99 de la Ley citada Ley y el Art 1937 del Código Civil, en cualquier instancia será de cuenta del contratista responder por valores económicos que producto de errores y omisiones involuntarias se desprendan de volúmenes, reajustes y/o multas ex - ante y ex - post respecto a la recepción definitiva. Desde la recepción provisional hasta la definitiva el contratista tendrá la obligación de custodiar y velar por que la obra se encuentre en perfecto estado.

Para constancia de lo actuado, en fe de conformidad y aceptación por parte de las personas que han intervenido en esta diligencia, se suscribe en unidad de acto la presente acta de recepción en el original y dos copias de igual tenor y efecto.



Ing. Daniel Ramos

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Firmado electrónicamente por:
FABIAN DARIO
SALAZAR LAGUA

Ing. Fabián Salazar

DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
ELIO ANDRES
ALVAREZ
CASTILLO

Consorcio Asfaltos C Y C, Procurador Común Ing. Elio
Andrés Álvarez Castillo
CONTRATISTA

CONSORCIO ASFALTOS CyC

Ruc: 1691728902001
Dir: Ciudadela el Chofer, Salinas y Cotopaxi



CLB-26

Puyo, 23 de enero 2023
Oficio N°- 017- CACyC-2023

Señor, Ingeniero:

Jaime Patricio Guevara Blaschke
PREFECTO PROVINCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

En su Despacho.-

GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA	
Recibido:	<i>[Firma]</i>
Fecha:	24 ENE 2023
Hora:	11:09
Número:	15560-E

Quien suscribe, en calidad de Procurador común del **CONSORCIO ASFALTOS CyC** el cual ejecuta el Proyecto: **ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**, legalmente celebrado, y suscrito a satisfacción de las partes contratantes el 29 de julio del 2022, pongo en consideración lo siguiente:

Culminado los trabajos del contrato celebrado entre las partes, en base a la **LOSNCP** se solicita proceda con la **RECEPCIÓN PROVISIONAL** del Proyecto en referencia.

Cordialmente,



Firmado electrónicamente por:
**ELIO ANDRÉS
ALVAREZ
CASTILLO**

Ing. Elio Andrés Álvarez
PROCURADOR COMÚN
CONSORCIO ASFALTOS CyC
CONTRATISTA

Copia:

Ing. Daniel Ramos
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO
Ing. Robert Quintana
FISCALIZADOR

CONSORCIO ASFALTOS CyC

Ing. Elio Andrés Álvarez: 0994008341.
e-mail: andresalvarezcastillo@outlook.com

*DUR. DOPPE SE PROCEDE CONTRATO SEGUN LA LEY.
2023 01-24*

MEMORANDO N° 016 - FISCALIZACIÓN - 2023

FECHA : 16 de febrero de 2023
DE : FISCALIZADOR
PARA : DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
ASUNTO : Solicitud Trámite de Pago

Solicito proceder con el trámite para cancelar a favor del CONSORCIO ASFALTOS C Y C, CON SU PROCURADOR COMÚN ING. ELIO ANDRÉS ÁLVAREZ CASTILLO, contratista de la obra: ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, el valor de \$1,950.30 conforme al siguiente detalle:

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	\$ 1,980.00
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	-\$ 29.70
Total	\$ 1,950.30



Firmado electrónicamente por:
ROBERT FERNANDO
QUINTANA MUÑOZ

Ing. Robert Quintana
FISCALIZADOR

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIA DE PASTAZA
DPTO. _____ FISCALIZACIÓN

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN

ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MU SHU WABMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTEKNOLOGÍA Y EMULSIONES ASFÁLTICAS. SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TAPATI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL, CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTEKNOLOGÍA Y EMULSIONES ASFÁLTICAS. SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUJO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBRA : ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MU SHU WABMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTEKNOLOGÍA Y EMULSIONES ASFÁLTICAS. SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TAPATI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL, CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTEKNOLOGÍA Y EMULSIONES ASFÁLTICAS. SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUJO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
 FECHA DE CONTRATO : 16 de febrero de 2023
 CONTRATISTA : V. PLANILLAS : 376.203.83
 PLAZO : CONSORCIO ASFALTOS C Y C, CON SU PROCURADOR COMÚN ING. ELIO ANDRÉS GARCÍA GARCÍA : 26 de septiembre de 2022
 AMPLIACIONES : 120 Días a partir de la orden de inicio : 01 mayo 23 : A : 21 mayo 23 : 0.56%
 SUSPENSIÓN :
 TOTAL : 130 Días

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CONTRATO	TOTAL	CANTIDADES			IMPORTANTE			
						T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL	
1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	1.00	\$ 433.47	\$ 433.47	1.00	1.00	1.00	100.00%	433.47	433.47	1.980.00
2	MATERIAL PÉTREO DE RELASTRE (MINADA, CARGADA Y REGADA)	M³	600.00	\$ 3.25	\$ 1,950.00	595.00	5.00	595.00	99.17%	1,933.75	1,933.75	1.980.00
3	TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO DE RELASTRE	M³-KM	8,856.00	\$ 0.35	\$ 3,095.10	8,925.00	-	8,925.00	100.78%	3,123.75	3,123.75	1.980.00
4	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³	1,200.00	\$ 18.30	\$ 21,960.00	1,428.00	-	1,428.00	119.00%	26,132.40	26,132.40	1.980.00
5	TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO DE BASE GRANULAR	M³-KM	17,712.00	\$ 0.35	\$ 6,199.20	21,420.00	-	21,420.00	120.33%	7,497.00	7,497.00	1.980.00
6	MATERIAL PÉTREO DE MEJORAMIENTO (MINADA, CARGADA Y REGADA)	M³	100.00	\$ 3.25	\$ 325.00	2,980.00	-	2,980.00	2280.00%	7,110.00	7,110.00	1.980.00
7	TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	1,476.00	\$ 0.35	\$ 516.60	34,200.00	-	34,200.00	2317.07%	11,570.00	11,570.00	1.980.00
8	ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTEKNOLOGÍA	KG	600.00	\$ 21.57	\$ 12,942.00	600.00	-	600.00	100.00%	12,942.00	12,942.00	1.980.00
9	CEMENTO PORTLAND	SACOS	540.00	\$ 8.82	\$ 4,762.80	540.00	-	540.00	100.00%	4,762.80	4,762.80	1.980.00
10	EMULSION ASFÁLTICA ESPECIAL (CSS- 1H)	M2	6,000.00	\$ 0.85	\$ 5,100.00	5,800.00	-	5,800.00	98.17%	5,006.50	5,006.50	1.980.00
11	C. RODADURA HORMIGÓN ASF. MEZCLADO EN PLANTA, F=1"	M2	6,000.00	\$ 4.00	\$ 24,000.00	6,470.00	-	6,470.00	107.98%	25,916.00	25,916.00	1.980.00
12	LIMPIEZA DE CUNETAS A MÁQUINA	M	2,000.00	\$ 0.50	\$ 1,000.00	2,000.00	-	2,000.00	100.00%	1,000.00	1,000.00	1.980.00
13	MARCAS EN PAVIMENTO	M	4,000.00	\$ 0.66	\$ 2,640.00	3,000.00	-	3,000.00	75.00%	-	-	1.980.00
14	PANCAJETA INFORMATIVA (TETREPO)-CON ESTRUCTURA	U	1.00	\$ 253.81	\$ 253.81	1.00	-	1.00	100.00%	253.81	253.81	1.980.00
15	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	1.00	\$ 17.35	\$ 17.35	1.00	-	1.00	100.00%	17.35	17.35	1.980.00
16	KIT ANTIDERRAMES	U	1.00	\$ 161.20	\$ 161.20	1.00	-	1.00	100.00%	161.20	161.20	1.980.00
17	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2.00	\$ 74.58	\$ 149.16	2.00	-	2.00	100.00%	149.16	149.16	1.980.00
18	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	1.00	\$ 160.29	\$ 160.29	1.00	-	1.00	100.00%	160.29	160.29	1.980.00
19	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	250.00	\$ 0.33	\$ 82.50	250.00	-	250.00	100.00%	82.50	82.50	1.980.00
VIA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL												
20	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	2.50	\$ 433.47	\$ 1,083.68	2.50	-	2.50	100.00%	1,083.68	1,083.68	1.980.00
21	MATERIAL PÉTREO DE RELASTRE (MINADA, CARGADA Y REGADA)	M³	1,800.00	\$ 3.25	\$ 5,947.50	966.10	-	966.10	52.79%	3,138.83	3,138.83	1.980.00
22	TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO DE RELASTRE	M³-KM	34,887.00	\$ 0.35	\$ 12,105.45	18,355.90	-	18,355.90	53.07%	6,424.57	6,424.57	1.980.00
23	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGREGADOS	M³	3,528.00	\$ 18.30	\$ 64,562.40	3,600.00	-	3,600.00	102.04%	65,880.00	65,880.00	1.980.00
24	TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO DE BASE GRANULAR	M³-KM	66,675.20	\$ 0.35	\$ 23,335.72	68,400.00	-	68,400.00	102.58%	23,910.00	23,910.00	1.980.00
25	MATERIAL PÉTREO DE MEJORAMIENTO (MINADA, CARGADA Y REGADA)	M³	250.00	\$ 3.25	\$ 812.50	2,678.85	-	2,678.85	1071.54%	8,706.26	8,706.26	1.980.00
26	TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO DE MEJORAMIENTO	M³-KM	4,725.00	\$ 0.35	\$ 1,653.75	50,898.15	-	50,898.15	1077.21%	17,814.35	17,814.35	1.980.00
27	ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTEKNOLOGÍA	KG	1,500.00	\$ 21.57	\$ 32,355.00	1,500.00	-	1,500.00	100.00%	32,355.00	32,355.00	1.980.00
28	CEMENTO PORTLAND	SACOS	1,350.00	\$ 8.82	\$ 11,907.00	1,350.00	-	1,350.00	100.00%	11,907.00	11,907.00	1.980.00
29	EMULSION ASFÁLTICA ESPECIAL (CSS- 1H)	M2	15,000.00	\$ 0.85	\$ 12,750.00	15,000.00	-	15,000.00	100.00%	12,750.00	12,750.00	1.980.00
30	C. RODADURA HORMIGÓN ASF. MEZCLADO EN PLANTA, F=1"	M2	17,500.00	\$ 4.00	\$ 70,000.00	16,500.00	-	16,500.00	94.29%	66,000.00	66,000.00	1.980.00
31	LIMPIEZA DE CUNETAS A MÁQUINA	M	5,000.00	\$ 0.50	\$ 2,500.00	5,000.00	-	5,000.00	100.00%	2,500.00	2,500.00	1.980.00
32	MARCAS EN PAVIMENTO	M	10,000.00	\$ 0.66	\$ 6,600.00	7,500.00	-	7,500.00	75.00%	4,500.00	4,500.00	1.980.00
33	BORDILLO DE H.S. 14X40 F'C=210 KG/CM2 (ENC. METÁLICO)	M	440.00	\$ 13.21	\$ 5,812.40	-	-	-	0.00%	-	-	1.980.00
34	ACERAS DE H.S. F'C= 180 KG/CM2 E= 7CM ESCOBILLADO	M2	660.00	\$ 18.86	\$ 12,447.60	-	-	-	0.00%	-	-	1.980.00
35	PANCAJETA INFORMATIVA (TETREPO)-CON ESTRUCTURA	U	1.00	\$ 253.81	\$ 253.81	1.00	-	1.00	100.00%	253.81	253.81	1.980.00
36	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	3.00	\$ 17.35	\$ 52.05	3.00	-	3.00	100.00%	52.05	52.05	1.980.00
37	KIT ANTIDERRAMES	U	3.00	\$ 161.20	\$ 483.60	3.00	-	3.00	100.00%	483.60	483.60	1.980.00
38	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	6.00	\$ 74.58	\$ 447.48	-	-	-	0.00%	-	-	1.980.00
39	SEÑALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	3.00	\$ 160.29	\$ 480.87	-	-	-	0.00%	-	-	1.980.00
40	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	750.00	\$ 0.33	\$ 247.50	-	-	-	0.00%	-	-	1.980.00
ORDEN DE TRABAJO												
1	S.C. TUBERÍA DE AGERO CORRUGADO D= 1.50M. E=2.0 MM. PM-100	M	11.00	\$ 257.78	\$ 2,835.58	11.00	-	11.00	100.00%	2,835.58	2,835.58	1.980.00
2	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M³	1,001.46	\$ 4.19	\$ 4,196.12	1,001.46	-	1,001.46	100.00%	4,196.12	4,196.12	1.980.00
					\$ 251,503.29						\$ 175,796.64	\$ 175,796.64
					DESCUENTOS:						\$ 374,223.83	\$ 374,223.83
					Anticipo 50%						\$ 0.00	\$ 0.00
					TOTAL						\$ 1,980.00	\$ 1,980.00

TOTAL \$ 1,980.00 \$ 374,223.83 \$ 175,796.64 \$ 175,796.64

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO. _____ FISCALIZACIÓN

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN

ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA. SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TAPALI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA. SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

OBRA : ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA. SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TAPALI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA. SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

FECHA DE CONTRATO : viernes, 29 de julio de 2022
 CONTRATISTA : CONSORCIO ASFALTOS C Y C, CON SU PROCURADOR COMÚN ING. ELIO ANDRÉS ALVAREZ
 PLAZO : 120 Días a partir de la orden de inicio
 AMPLIACIONES :
 SUSPENSIÓN :
 TOTAL : 120 Días

V. CONTRATO : 351.533,29
 V. PLANILLAS : 1.980,00
 V. EXCEDENTES : 0,00
 % DE AVANCE : 0,56%
 21-mar-23 A 21-mar-23

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CONTRATO	TOTAL	CANTIDADES			IMPORTANTE ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
						T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	% TOTAL		
SON: UNO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES, 100/100 CENTAVOS										
Milla por Mora										
LÍQUIDO \$ 1.980,00										



Ing. Robert Quintana
FISCALIZADOR



Ing. Adan Marino
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN (S)



Ing. Elio Andres Alvarez Castillo
CONTRATISTA

PARCIAL

ACUMULADO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN

OBRA: ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARGUII CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA

Fecha de elaboración: 16 de febrero de 2023 Fecha de contrato: 29-jul-22

Contratista: Consorcio Asfaltos C Y C, Con Su Procurador Común Monto del contrato: \$ 351,593.29

Fecha de índices sub-cero: may-22 Valor de planilla o anticipo: \$ 1,980.00

Fecha de índices sub-uno: ago-16 Anticipo descontado: \$ 0.00

Po: \$ 1,980.00

CUADRILLA TIPO

Categoría	Coficiente C	Salarios Reales Diarios		Cx B1	CxBo
		B1 209	Bo 202		
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 (GRUPO I)	0.072	34.350	34.350	2.473	2.473
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2 (GRUPO II)	0.059	32.700	32.700	1.929	1.929
SIN TITULO D2	0.101	31.000	31.000	3.131	3.131
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3		34.410	34.410	-	-
CHOFERES PROFESIONALES CH C1	0.311	44.970	44.970	13.986	13.986
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	0.041	34.350	34.350	1.408	1.408
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2	0.001	32.700	32.700	0.033	0.033
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	0.111	31.000	31.000	3.441	3.441
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	0.304	30.620	30.620	9.308	9.308
TOTAL	1.000			35.709	35.709

	Coficiente C	Indices		Factor Cx I1/Io
		I1 209	Io 202	
Mano de obra	0.089	35.709	35.709	0.089
Cemento Portland Tipo I Sacos	0.058	181.390	191.240	0.055
Equipo y maquinaria de Construc. vial	0.258	184.950	177.210	0.269
Betún petróleo (Asfalto) (O)	0.112	746.200	746.200	0.112
Materiales pétreos Tungurahua	0.266	214.220	222.050	0.257
Combustibles	0.188	252.130	272.400	0.174
IPC AMBATO	0.029	109.390	108.020	0.029
TOTAL	1.000			0.985

Valor a reajustarse en esta planilla	(Po)	\$ 1,980.00
Factor de reajuste -1	(-1)	-0.015
Valor de reajuste	(Pr)	-\$ 29.70
Valor de reajuste provicional		
Diferencia de reajuste	(Vr)	-\$ 29.70

Descuentos:

LÍQUIDO A PAGARSE

-\$ 29.70



Firmado electrónicamente por:
ROBERT FERNANDO
QUINTANA MUÑOZ

Ing. Robert Quintana
FISCALIZADOR



Firmado electrónicamente por:
ADÁN MARIÑO
MONTESEDECA

Ing. Adán Mariño
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN (S)

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DPTO. _____ FISCALIZACIÓN

CUADRO DE DIFERENCIAS DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA : ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WAMRI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGIA Y EMULSION ASFÁLTICA. SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARIQUI, C. ACUMULADO \$ 351.593.29
 FECHA DE CONTRATO : 29 de julio de 2022 V. EJECUTADO : \$ 376.203.82 107.00%
 CONTRATISTA : CONSORCIO ASFALTOS Y C. CON SU PROCURADOR COMÚN IN4, ELHO ANDRÉS ÁLVAREZ CASTILLO/1 TERMINACIÓN DEL PLAZO: 24 de enero de 2023 V. EXCEDENTES : \$ 51.923.00 14.77%
 PLAZO : 120 Días PERÍODO : 26-sep-22 A 24-ene-23 V. DISMINUYEN : \$ 34.344.16 9.77%
 AMPLIACIONES : 0 Días SUSPENSIÓN : 0 Días ORDENES DE TRABAJO: 1.96%

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CONTRATO	TOTAL	EJECUTADO		% TOTAL	DIFERENCIAS	
						CANTIDAD	VALOR		EXCEDENTES	DISMINUYEN
1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	1.00	433.47	433.47	1.00	433.47	100.00%	-	-
2	MATERIAL PÉTREO DE RELASTRE (MINADA, CARGADA Y REGADA)	M³	6000.00	3.25	1.950.00	595.00	1.933.75	99.17%	-	5.00
3	TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO DE RELASTRE	M²-KM	8.856.00	0.35	3.099.60	8.925.00	3.123.75	100.78%	69.00	24.15
4	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGRGADOS	M³	1.200.00	18.30	21.960.00	1.428.00	26.132.40	119.00%	228.00	4.172.40
5	TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO DE BASE GRANULAR	M²-KM	17.712.00	0.35	6.199.20	21.420.00	7.497.00	120.93%	3.708.00	1.297.80
6	MATERIAL PÉTREO DE MEJORAMIENTO (MINADA, CARGADA Y REGADA)	M³	100.00	3.25	325.00	2.280.00	7.410.00	2280.00%	2.180.00	7.085.00
7	TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO DE MEJORAMIENTO	M²-KM	1.476.00	0.35	516.60	34.200.00	11.970.00	2317.07%	32.724.00	11.453.40
8	ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGIA	KG	600.00	21.57	12.942.00	600.00	12.942.00	100.00%	-	-
9	CEMENTO PORTLAND	SACOS	540.00	8.82	4.762.80	540.00	4.762.80	100.00%	-	-
10	EMULSION ASFÁLTICA ESPECIAL (GSS-1H)	M2	6.000.00	0.85	5.100.00	5.890.00	5.006.50	98.17%	-	110.00
11	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=1"	M2	6.000.00	4.00	24.000.00	6.479.00	25.916.00	107.98%	479.00	1.916.00
12	LIMPPIEZA DE CUNETAS A MAQUINA	M	2.000.00	0.50	1.000.00	2.000.00	1.000.00	100.00%	-	-
13	MARCAS EN PAVIMENTO	M	4.000.00	0.66	2.640.00	3.000.00	1.980.00	75.00%	-	1.000.00
14	PANCAFTA INFORMATIVA (LETREPO)-CON ESTRUCTURA	U	1.00	253.81	253.81	1.00	253.81	100.00%	-	-
15	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	1.00	17.35	17.35	1.00	17.35	100.00%	-	-
16	KIT ANTIDERRAMES	U	1.00	161.20	161.20	1.00	161.20	100.00%	-	-
17	SENALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	2.00	74.58	149.16	2.00	149.16	100.00%	-	-
18	SENALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	1.00	160.29	160.29	1.00	160.29	100.00%	-	-
19	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	250.00	0.33	82.50	250.00	82.50	100.00%	-	-
20	VIA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL	0	-	-	-	-	-	0.00%	-	-
20	REPLANTEO Y NIVELACIÓN A NIVEL DE ASFALTO	KM	2.50	1.083.68	1.083.68	2.50	1.083.68	100.00%	-	-
21	MATERIAL PÉTREO DE RELASTRE (MINADA, CARGADA Y REGADA)	M³	1.830.00	3.25	5.947.50	966.10	3.139.83	52.79%	-	863.90
22	TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO DE RELASTRE	M²-KM	34.587.00	0.35	12.105.45	18.355.90	6.424.57	53.07%	-	16.231.10
23	MATERIAL DE BASE GRANULAR DE AGRGADOS	M³	3.528.00	18.30	64.562.40	3.600.00	65.880.00	102.04%	72.00	1.317.60
24	TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO BASE GRANULAR	M²-KM	66.679.20	0.35	23.337.72	68.400.00	23.940.00	102.58%	1.720.80	602.28
25	MATERIAL PÉTREO DE MEJORAMIENTO (MINADA, CARGADA Y REGADA)	M³	250.00	3.25	812.50	2.678.85	8.706.26	1071.54%	2.428.85	7.893.76
26	TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO DE MEJORAMIENTO	M²-KM	4.725.00	0.35	1.653.75	50.888.15	17.814.35	1077.21%	46.173.15	16.160.60
27	ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGIA	KG	1.500.00	21.57	32.355.00	1.500.00	32.355.00	100.00%	-	-
28	CEMENTO PORTLAND	SACOS	1.350.00	8.82	11.907.00	1.350.00	11.907.00	100.00%	-	-
29	EMULSION ASFÁLTICA ESPECIAL (GSS-1H)	M2	15.000.00	0.85	12.750.00	15.000.00	12.750.00	100.00%	-	-
30	C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=1"	M2	17.500.00	4.00	70.000.00	16.500.00	66.000.00	94.29%	-	1.000.00
31	LIMPPIEZA DE CUNETAS A MAQUINA	M	5.000.00	0.50	2.500.00	5.000.00	2.500.00	100.00%	-	-
32	MARCAS EN PAVIMENTO	M	10.000.00	0.66	6.600.00	7.500.00	4.950.00	75.00%	-	2.500.00
33	BORDILLO DE H.S. 14X40 F'C=210 KG/CM2 (ENC. METÁLICO)	M	440.00	13.21	5.812.40	-	-	0.00%	-	440.00
34	ACERAS DE H.S. F'C=180 KG/CM2 E=7CM ESCOBILLADO	M2	660.00	18.86	12.447.60	-	-	0.00%	-	660.00
35	PANCAFTA INFORMATIVA (LETREPO)-CON ESTRUCTURA	U	1.00	253.81	253.81	1.00	253.81	100.00%	-	-
36	CONTENEDORES METÁLICOS DE 55 GALONES	U	3.00	17.35	52.05	3.00	52.05	100.00%	-	-
37	KIT ANTIDERRAMES	U	3.00	161.20	483.60	3.00	483.60	100.00%	-	-
38	SENALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0.60MX0.80M) MÓVILES	U	6.00	74.58	447.48	-	-	0.00%	-	6.00
39	SENALES PREVENTIVAS TIPO BARRERA (1.22MX0.60M) MÓVILES	U	3.00	160.29	480.87	-	-	0.00%	-	3.00
40	CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS (MAT. POLIETILENO)	M	750.00	0.33	247.50	-	-	0.00%	-	750.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DPTO. _____ FISCALIZACIÓN

CUADRO DE DIFERENCIAS DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA : ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MESHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASPÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, C. ACUMULADO : \$ 351.593,29
 FECHA DE CONTRATO : 29 de julio de 2022 V. EJECUTADO : \$ 376.203,82
 CONTRATISTA : CONSORCIO ASFALTOS C Y C, CON SU PROCURADOR COMÚN ING. ELIO ANDRÉS ÁLVAREZ CASTILLO V. EJECUTADO : \$ 51.923,00
 PLAZO : 120 Días INICIO DEL PLAZO : 26 de septiembre de 2022 V. EJECUTADO : \$ 34.344,16
 AMPLIACIONES : 0 Días TERMINACIÓN DEL PLAZO : 24 de enero de 2023 V. EJECUTADO : \$ 34.344,16
 SUSPENSIÓN : 0 Días PERÍODO : 26-sep-22 A 24-ene-23 V. DISMINUYEN : \$ 34.344,16
 ORDENES DE TRABAJO: 1.96%

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CONTRATO	TOTAL	CANTIDAD	EJECUTADO VALOR	% TOTAL	DIFERENCIAS	
									EXCEDENTES	DISMINUYEN
1	ORDEN DE TRABAJO S.C. TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D= 1.50M, E=2.0 MM, PM-100	M	11.00	257.78	2.835.58	11.00	2.835.58	100.00%	-	-
2	EXCAVACION PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTO	M ³	1.001.46	4.19	4.196.12	1.001.46	4.196.12	100.00%	-	-
					\$ 358.624.99		\$ 376.203.82		\$ 51.923.00	\$ 34.344.16



Ing. Robert Quintana
FISCALIZADOR



Ing. Adán Mariño
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN (S)
DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD



Ing. Daniel Ramos
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DEL INSTITUCIÓN



Consortio Asfaltos C Y C, Con Su
CONTRATISTA

CONSORCIO ASFALTOS C y C

Pastaza - Puyo
RUC 1691728902001



ANEXO DE VOLÚMEN DE OBRA

PROYECTO:	ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CONTRATISTA:	FECHA:
		CONSORCIO ASFALTOS C y C	3-ene-23
RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	
13	MARCAS EN PAVIMENTO	m	

VIA DE ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ

LINEAS DIVISORIAS DE CARRILES						
IZQUIERDA		CENTRO		DERECHO		LONGITUD TOTAL (M)
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	
0+000	1000,00 m	0+000	1000,00 m	0+000	1000,00 m	3000,00
LONGITUD TOTAL						3000,00



Firmado electrónicamente por:
**ELIO ANDRÉS ALVAREZ
CASTILLO**

ING. ELIO ANDRÉS ALVAREZ
PROCURADOR COMÚN
CONSORCIO ASFALTOS C y C
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
**ROBERT FERNANDO
QUINTANA MUÑOZ**

ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZADOR GAD PROVINCIAL

ANEXOS FOTOGRAFÍAS



CONSORCIO ASFALTOS CyC

Ruc: 1691728902001

Dir: Ciudadela el Chofer, Salinas y Cotopaxi



Puyo, 10 de febrero 2023
Oficio N°- 018- CACyC-2023

Señor, Ingeniero:

Álvaro Sosa

DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN - GADPPZ.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

En su Despacho.-

Quien suscribe, en calidad de Procurador común del CONSORCIO ASFALTOS CyC el cual ejecuta el Proyecto: **ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**, legalmente celebrado, y suscrito a satisfacción de las partes contratantes el 29 de julio del 2022, pongo en consideración lo siguiente:

Se procede entregar la **PLANILLA DE LIQUIDACIÓN**, para su revisión, aprobación y continúe el trámite requerido para su cancelación. Se adjunta en CD los respaldos de planilla.

Cordialmente



Firmado al electronearse por:
ELIO ANDRÉS ÁLVAREZ
CASTILLO

Ing. Elio Andrés Álvarez
PROCURADOR COMÚN
CONSORCIO ASFALTOS CyC
CONTRATISTA

Copia:

Ing. Daniel Ramos
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO
Ing. Robert Quintana
FISCALIZADOR

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN



Pastaza
Fecha:

10 FEB 2023

Recibido: JOMARD M

Número: _____ Hora: 14h50

Ing. Robert Quintana
Favor continuar con el
trámite pertinente

14/02/2023

CONSORCIO ASFALTOS CyC

Ing. Elio Andrés Álvarez: 0994008341.

e-mail: andresalvarezcastillo@outlook.com

INFORME DE RESULTADOS DE PAVIMENTOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL CON CAPA
ASFALTICA, BARRIO LAS AMERICAS
Y COMUNIDAD MUSHU WARMI,
(CONTROL ESPESOR CARPETA
ASFALTICA: 0+000 a 2+000)

UBICACIÓN: SECTOR LAS AMERICAS – PUYO.
PROVINCIA DE PASTAZA

PARA: CONSORCIO ASFALTOS CYC y/o ING.
ROBERT QUINTANA FISCALIZADOR

FECHA: 23-02-2023


UBICACION DE LOS SONDEOS	ANEXO 1
FORMULARIO DE ENSAYOS	ANEXO 2
RESUMEN FOTOGRAFICO	ANEXO 3

Iván
Iván Gonzalo Rubio Gálvez
INGENIERO CIVIL - M.Sc.
R.P. 16 - 01 - 0052

ANEXO N° 1

UBICACIÓN DE LOS SONDEOS


Iván Gonzalo Rubio Gálvez
INGENIERO CIVIL - M.Sc.
R.P. 16 - 01 - 0052
ECUASUELOS21

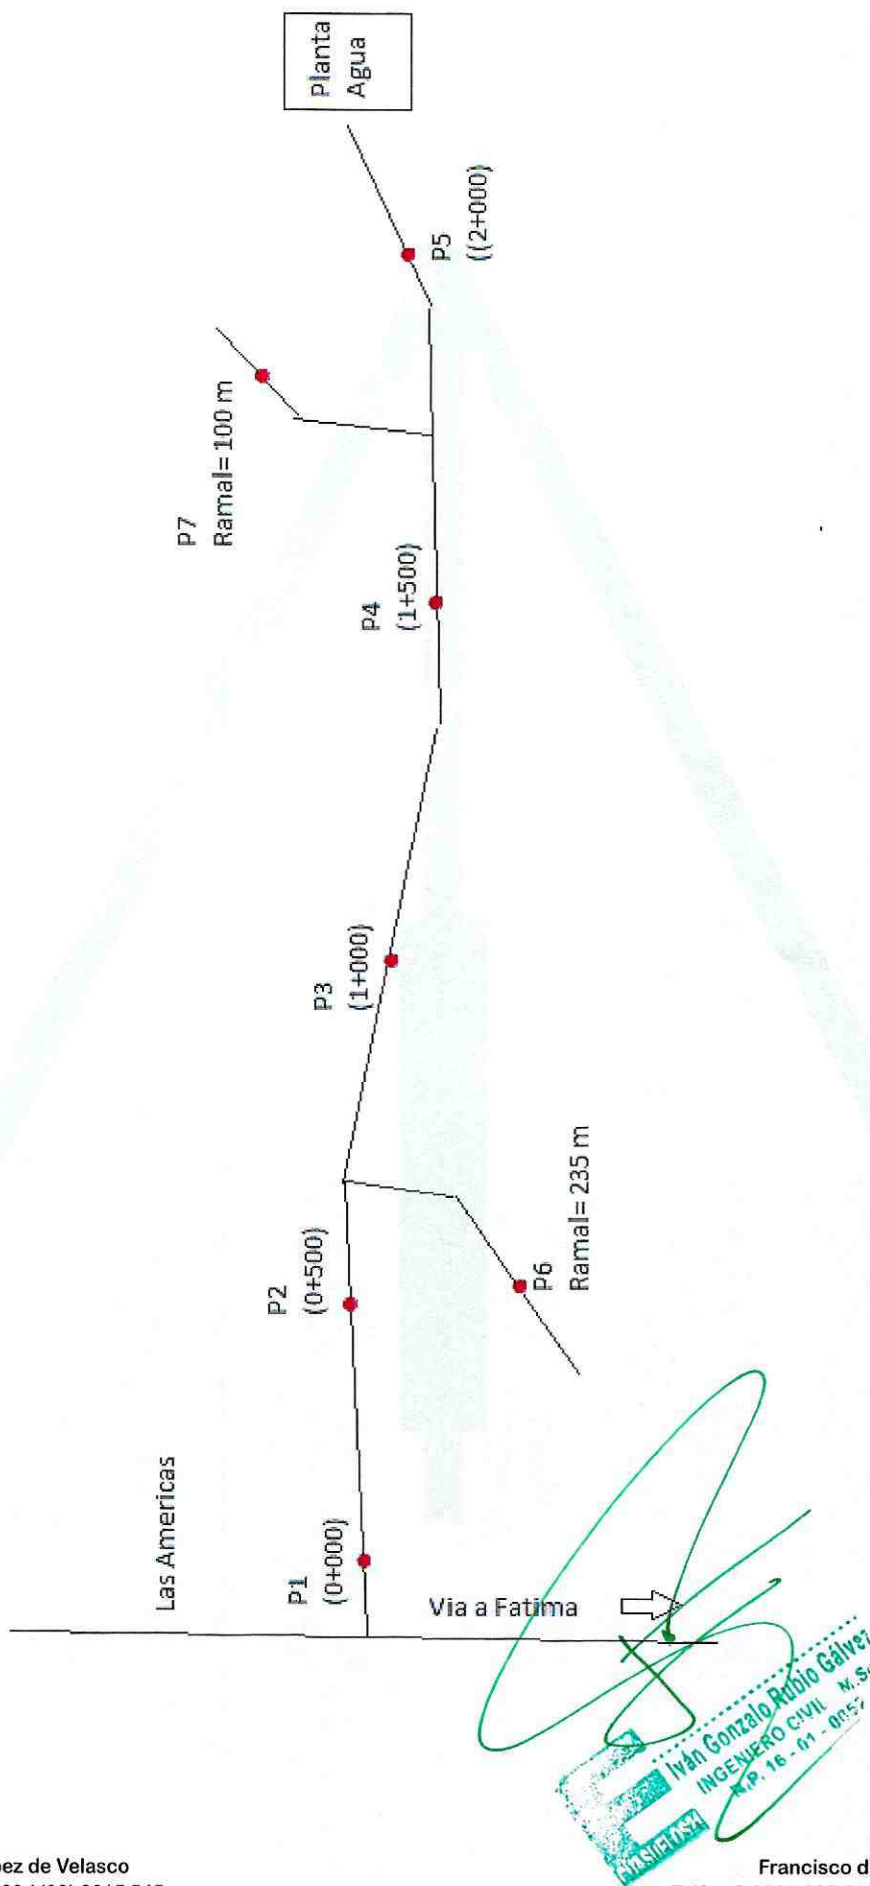

ANEXO N° 2

FORMULARIO DE ENSAYOS



Iván Gonzalo Budio Gálvez
INGENIERO CIVIL M.Sc.
R.P. 16 - 01 - 0052

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL CON CAPA ASFALTICA, BARRIO LAS AMERICAS - M
OBRA: CARPETA ASFALTICA
LOCALIZACION: SECTOR LAS AMERICAS - PUYO - PASTAZA
PARA: CONSORCIO "ASFALTOS CYC" y/o ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZADOR
FECHA DE ENSAYE: 23-02-2023
ELEMENTO: EXTRACCION DE NUCLEO (BRIQUETA)

ORDEN	ABSCISA	ESPESOR (cm)
1	0+000	3,60
2	0+500	3,00
3	1+000	3,20
4	1+500	2,90
5	2+000	3,60
6	Ramal 235 m	1,90
7	Ramal 100 m	2,60

OBSERVACIONES:

Extracción de núcleos (briquetas) de hormigón asfáltico perteneciente a la carpeta de rodadura.
Espesor de carpeta especificado 1,0 pulgada o 2,54 cm.



Iván Gonzalo Rubio Gálvez
INGENIERO CIVIL M.Sc.
R.P. 16-01-0052

Iván Rubio Gálvez
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA: SUELOS Y H₂O.
MASTER EXECUTIVE: MEDIOAMBIENTE
MASTER OF SCIENCE: CONSTRUCCIONES
R.P. 16-01-0052

ANEXO N° 3

RESUMEN FOTOGRAFICO


Iván Gonzalo Rubio Gálvez
INGENIERO CIVIL - M.Sc.
R.D. 16-01-0052
ECUASUELOS21




Iván González Rubio Gálvez
INGENIERO CIVIL - M.Sc.
R.P. 16 - 01 - 0052




Iván Gonzalo Rubio Galvez
INGENIERO CIVIL - M.Sc.
R.P. 16.01 - 0057
ECUASUELOS21



Iván
Iván Gonzalo Rubio Galvez
INGENIERO CIVIL M.Sc.
R.P. 16-01-0055

INFORME DE RESULTADOS DE ASFALTOS


PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL CON CAPA
ASFALTICA, BARRIO LAS AMERICAS
Y COMUNIDAD MUSHU WARMI.
(CONTROL DE HORMIGON
ASFALTICO DESDE ABSCISA 0+000
HASTA 2+000)

UBICACIÓN: BARRIO LAS AMERICAS – PUYO.
PROVINCIA DE PASTAZA

PARA: CONSORCIO “ASFALTOS CYC” y/o
ING. ROBERT QUINTANA

FECHA: 23-02-2023


Iván González Rubio Galvez
INGENIERO CIVIL M.Sc.
R.P. 16 - 01 - 0457

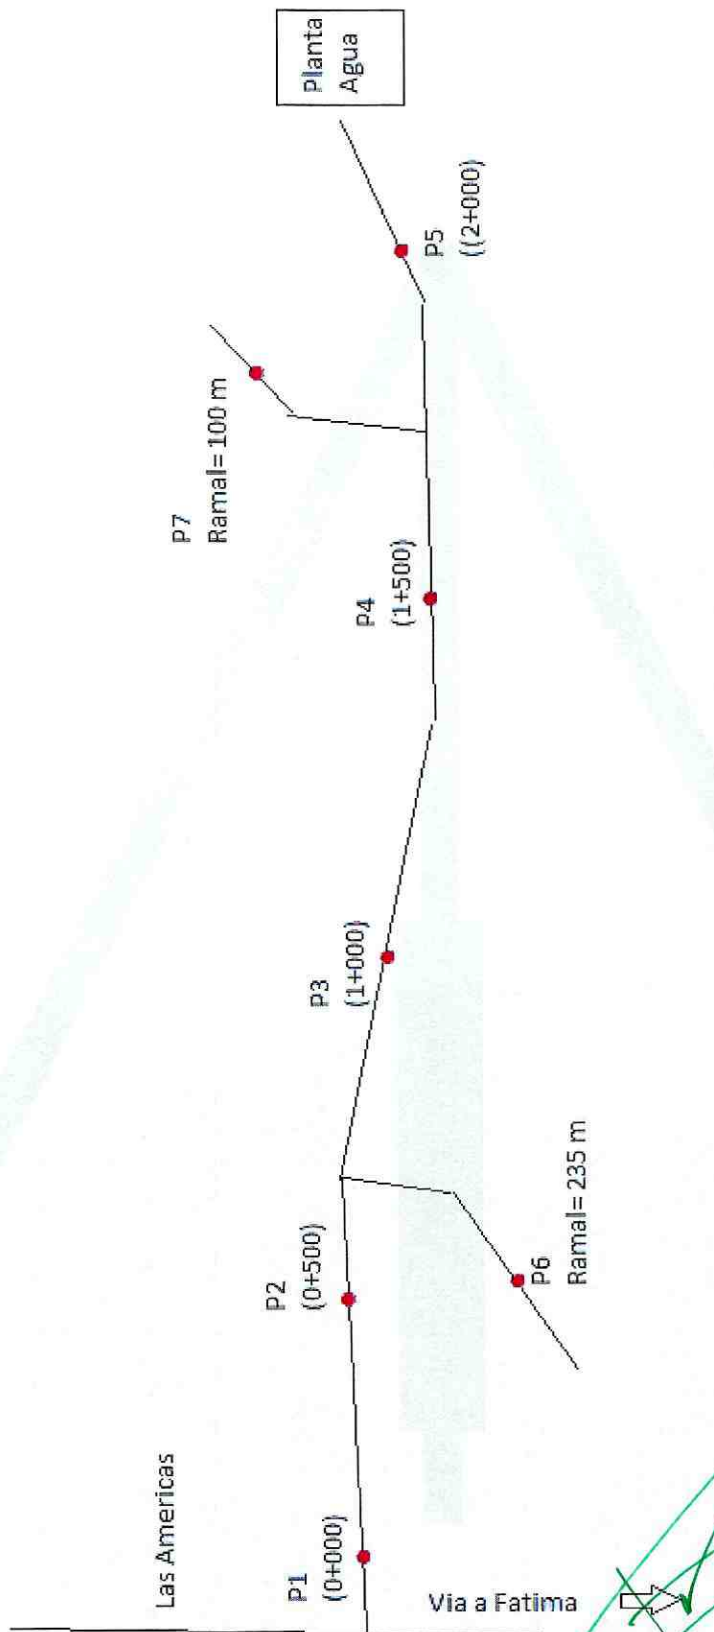


Iván González
INGENIERO CIVIL M.Sc.
R.P. 18.04.0062
ECUASUELOS21

GRANULOMETRIA

NORMA : ASTM C 136
 PROYECTO : MEJORAMIENTO CON CAPA ASFALTICA, BARRIO LAS AMERICAS Y COMUNIDAD MUSHU WARMI
 SOLICITADO POR: CONSORCIO "ASFALTOS CYC" y/o ING. ROBERT QUINTANA
 UBICACIÓN : BARRIO LAS AMERICAS - PUYO. PROVINCIA DE PASTAZA
 FECHA : 23-02-2023
 ELEMENTO : BRIQUETA 1 (ABS 0+000)

GRANULOMETRIA

MALLA No.	ABERTURA (mm)	MASA RETENIDA PARCIAL	MASA RETENIDA ACUMULADA	PORCENTAJE RETENIDO (%)	PORCENTAJE QUE PASA (%)
1"	25,400	0,00	0,00	0,00	100,00
3/4"	19,000	62,82	62,82	4,56	95,44
1/2"	12,700	132,45	195,27	14,17	85,83
3/8"	9,510	185,20	380,47	27,61	72,39
#4	4,760	179,76	560,23	40,66	59,34
#8	2,360	184,35	744,58	54,04	45,96
#16	1,190	170,14	914,72	66,38	33,62
#30	0,600	185,83	1100,55	79,87	20,13
#50	0,300	118,91	1219,46	88,50	11,50
#200	0,074	117,99	1337,45	97,06	2,94
PASA No. 200		40,46			
PESO MATERIAL TOTAL		1377,91			

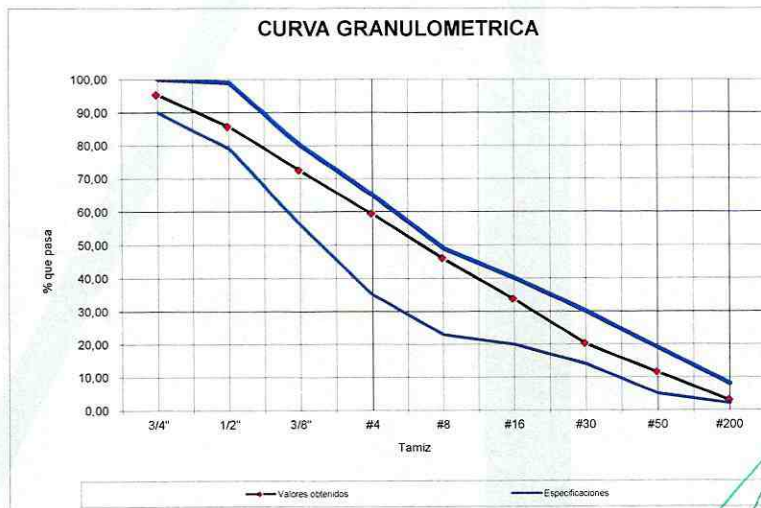

REALIZADO POR:
 Lab. Daniel Jiménez

REVISADO POR:
 Ing. Iván Rubio G. M. Sc.


Iván Gonzalo Rubio Gálvez
 INGENIERO CIVIL M.Sc.
 R.P. 18-01-0052
 ECUASUELOS21

GRANULOMETRIA

NORMA : ASTM C 136
 PROYECTO : MEJORAMIENTO CON CAPA ASFALTICA, BARRIO LAS AMERICAS Y COMUNIDAD MUSHU WARMI
 SOLICITADO POR : CONSORCIO "ASFALTOS CYC" y/o ING. ROBERT QUINTANA
 UBICACIÓN : BARRIO LAS AMERICAS - PUYO. PROVINCIA DE PASTAZA
 FECHA : 23-02-2023
 ELEMENTO : BRIQUETA 2 (ABS 0+500)

GRANULOMETRIA

MALLA No.	ABERTURA (mm)	MASA RETENIDA PARCIAL	MASA RETENIDA ACUMULADA	PORCENTAJE RETENIDO (%)	PORCENTAJE QUE PASA (%)
1"	25,400	0,00	0,00	0,00	100,00
3/4"	19,000	60,13	60,13	4,54	95,46
1/2"	12,700	131,82	191,95	14,50	85,50
3/8"	9,510	133,96	325,91	24,62	75,38
#4	4,760	181,62	507,53	38,34	61,66
#8	2,360	175,28	682,81	51,59	48,41
#16	1,190	170,21	853,02	64,45	35,55
#30	0,600	181,29	1034,31	78,14	21,86
#50	0,300	125,93	1160,24	87,66	12,34
#200	0,074	120,26	1280,50	96,74	3,26
PASA No. 200		43,12			
PESO MATERIAL TOTAL		1323,62			

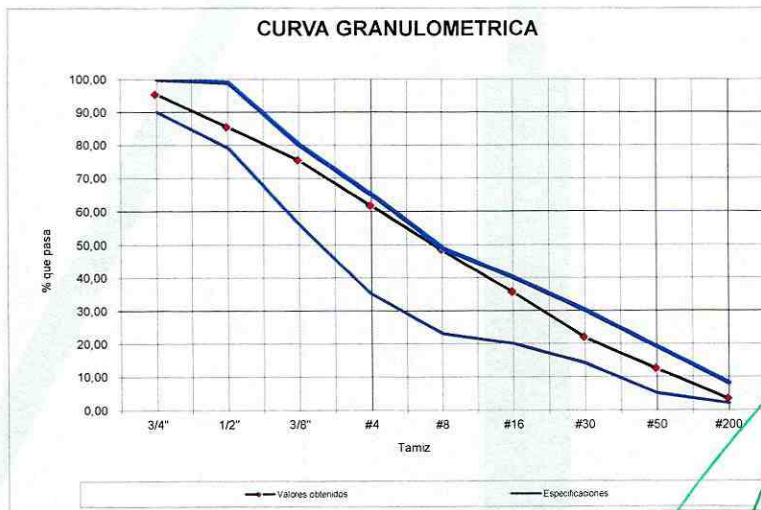

REALIZADO POR:
 Lab. Daniel Jiménez

REVISADO POR:
 Ing. Iván Rubio G. M. Sc.




GRANULOMETRIA

NORMA : ASTM C 136
 PROYECTO : MEJORAMIENTO CON CAPA ASFALTICA, BARRIO LAS AMERICAS Y COMUNIDAD MUSHU WARMI
 SOLICITADO POR : CONSORCIO "ASFALTOS CYC" y/o ING. ROBERT QUINTANA
 UBICACIÓN : BARRIO LAS AMERICAS - PUYO. PROVINCIA DE PASTAZA
 FECHA : 23-02-2023
 ELEMENTO : BRIQUETA 3 (ABS 1+000)

GRANULOMETRIA

MALLA No.	ABERTURA (mm)	MASA RETENIDA PARCIAL	MASA RETENIDA ACUMULADA	PORCENTAJE RETENIDO (%)	PORCENTAJE QUE PASA (%)
1"	25,400	0,00	0,00	0,00	100,00
3/4"	19,000	80,25	80,25	6,67	93,33
1/2"	12,700	149,26	229,51	19,07	80,93
3/8"	9,510	114,62	344,13	28,60	71,40
#4	4,760	157,97	502,10	41,72	58,28
#8	2,360	188,60	690,70	57,40	42,60
#16	1,190	183,11	873,81	72,61	27,39
#30	0,600	92,17	965,98	80,27	19,73
#50	0,300	87,44	1053,42	87,54	12,46
#200	0,074	109,81	1163,23	96,66	3,34
PASA No. 200		40,17			
PESO MATERIAL TOTAL		1203,40			

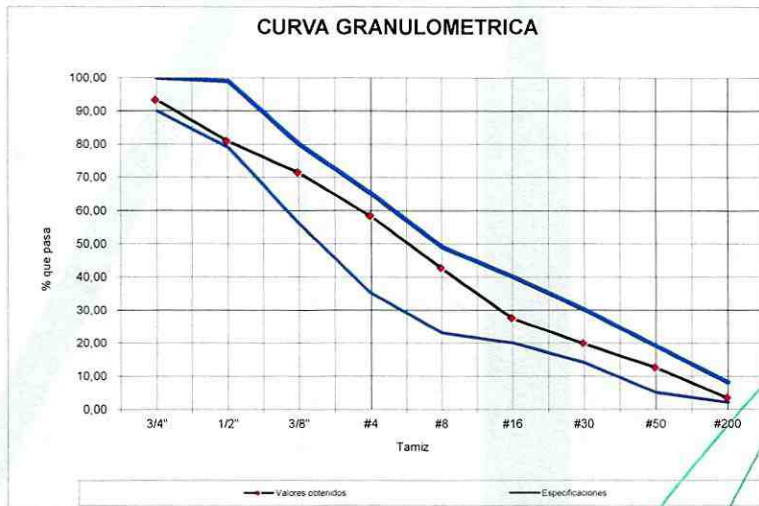

REALIZADO POR:
 Lab. Daniel Jiménez

REVISADO POR:
 Ing. Iván Rubio G. M. Sc.


Iván Gonzalo Rubio Gálvez
 INGENIERO CIVIL M.Sc.
 R.P. 16-01-0052
 ECUASUELOS21

GRANULOMETRIA

NORMA : ASTM C 136
 PROYECTO : MEJORAMIENTO CON CAPA ASFALTICA, BARRIO LAS AMERICAS Y COMUNIDAD MUSHU WARMÍ
 SOLICITADO POR : CONSORCIO "ASFALTOS CYC" y/o ING. ROBERT QUINTANA
 UBICACIÓN : BARRIO LAS AMERICAS - PUYO, PROVINCIA DE PASTAZA
 FECHA : 23-02-2023
 ELEMENTO : BRIQUETA 4 (ABS 1+500)

GRANULOMETRIA

MALLA No.	ABERTURA (mm)	MASA RETENIDA PARCIAL	MASA RETENIDA ACUMULADA	PORCENTAJE RETENIDO (%)	PORCENTAJE QUE PASA (%)
1"	25,400	0,00	0,00	0,00	100,00
3/4"	19,000	102,31	102,31	8,20	91,80
1/2"	12,700	131,42	233,73	18,74	81,26
3/8"	9,510	115,94	349,67	28,04	71,96
#4	4,760	152,32	501,99	40,26	59,74
#8	2,360	183,14	685,13	54,94	45,06
#16	1,190	182,21	867,34	69,56	30,44
#30	0,600	101,20	968,54	77,67	22,33
#50	0,300	106,36	1074,90	86,20	13,80
#200	0,074	131,27	1206,17	96,73	3,27
PASA No. 200		40,78			
PESO MATERIAL TOTAL		1246,95			

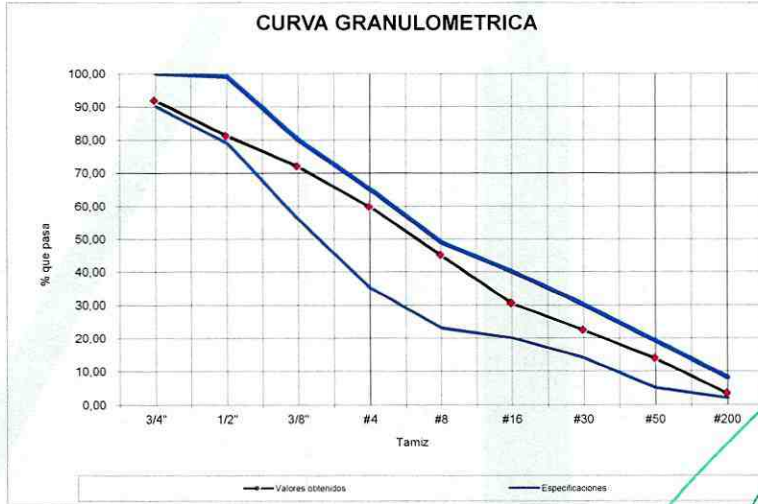

REALIZADO POR:
 Lab. Daniel Jiménez

REVISADO POR:
 Ing. Iván Rubio G., M. Sc.


Iván Gonzalo Rubio Gálvez
 INGENIERO CIVIL M.Sc.
 R.P. 16 - 01 - 0052
 ECUASUELOS21

GRANULOMETRIA

NORMA : ASTM C 136
 PROYECTO : MEJORAMIENTO CON CAPA ASFALTICA, BARRIO LAS AMERICAS Y COMUNIDAD MUSHU WAI
 SOLICITADO POR : CONSORCIO "ASFALTOS CYC" y/o ING. ROBERT QUINTANA
 UBICACIÓN : BARRIO LAS AMERICAS - PUYO. PROVINCIA DE PASTAZA
 FECHA : 23-02-2023
 ELEMENTO : BRIQUETA 5 (ABS 2+000)

GRANULOMETRIA

MALLA No.	ABERTURA (mm)	MASA RETENIDA PARCIAL	MASA RETENIDA ACUMULADA	PORCENTAJE RETENIDO (%)	PORCENTAJE QUE PASA (%)
1"	25,400	0,00	0,00	0,00	100,00
3/4"	19,000	78,23	78,23	6,26	93,74
1/2"	12,700	187,32	265,55	21,23	78,77
3/8"	9,510	145,92	411,47	32,90	67,10
#4	4,760	151,04	562,51	44,98	55,02
#8	2,360	155,95	718,46	57,45	42,55
#16	1,190	156,04	874,50	69,93	30,07
#30	0,600	149,67	1024,17	81,89	18,11
#50	0,300	98,09	1122,26	89,74	10,26
#200	0,074	89,11	1211,37	96,86	3,14
PASA No. 200		39,23			
PESO MATERIAL TOTAL		1250,60			

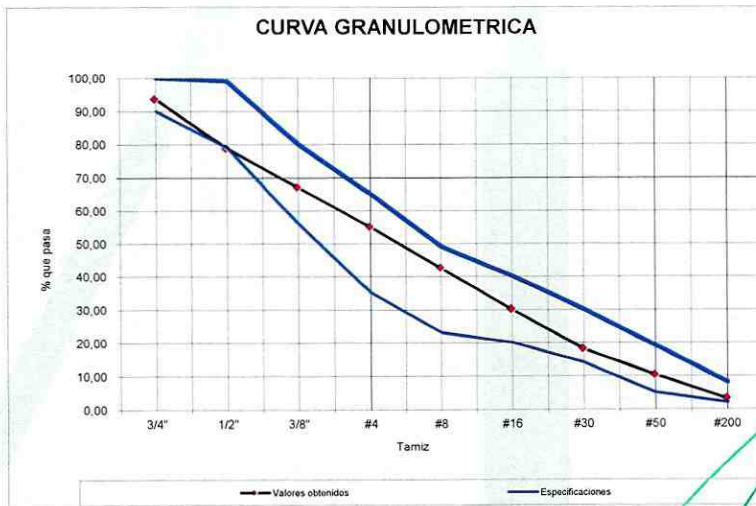

REALIZADO POR:
Lab. Daniel Jiménez

REVISADO POR:
Ing. Iván Rubio G. M. Sc.


ECUASUELOS21

GRANULOMETRIA

NORMA : ASTM C 136
 PROYECTO : MEJORAMIENTO CON CAPA ASFALTICA, BARRIO LAS AMERICAS Y COMUNIDAD MUSHU WAI
 SOLICITADO POR : CONSORCIO "ASFALTOS CYC" y/o ING. ROBERT QUINTANA
 UBICACIÓN : BARRIO LAS AMERICAS - PUYO. PROVINCIA DE PASTAZA
 FECHA : 23-02-2023
 ELEMENTO : BRIQUETA 6 (RAMAL: 235 m)

GRANULOMETRIA

MALLA No.	ABERTURA (mm)	MASA RETENIDA PARCIAL	MASA RETENIDA ACUMULADA	PORCENTAJE RETENIDO (%)	PORCENTAJE QUE PASA (%)
1"	25,400	0,00	0,00	0,00	100,00
3/4"	19,000	63,21	63,21	4,99	95,01
1/2"	12,700	177,91	241,12	19,03	80,97
3/8"	9,510	141,28	382,40	30,18	69,82
#4	4,760	161,12	543,52	42,89	57,11
#8	2,360	169,93	713,45	56,30	43,70
#16	1,190	157,36	870,81	68,72	31,28
#30	0,600	148,28	1019,09	80,42	19,58
#50	0,300	102,12	1121,21	88,47	11,53
#200	0,074	104,92	1226,13	96,75	3,25
PASA No. 200		41,14			
PESO MATERIAL TOTAL		1267,27			

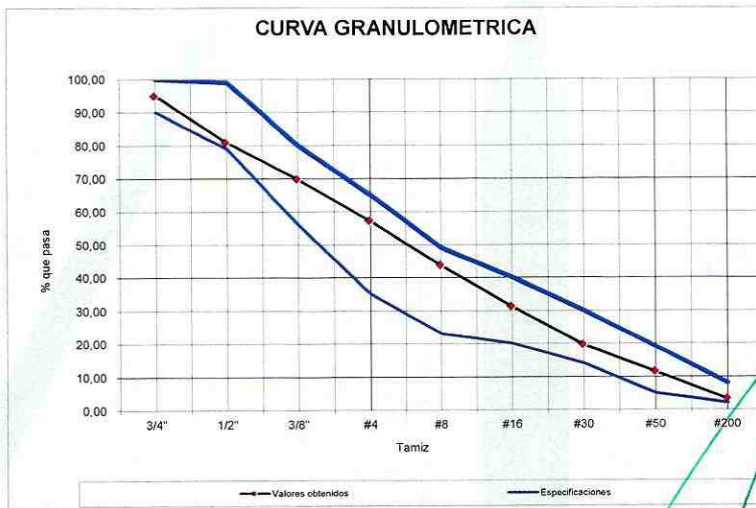

REALIZADO POR:
Lab. Daniel Jiménez

REVISADO POR:
Ing. Iván Rubio G. M. Sc.


Ivan Gonzalo Rubio Galvez
 INGENIERO CIVIL - M.Sc.
 R.P. 16-01-0052
 ECUASUELOS21

GRANULOMETRIA

NORMA : ASTM C 136
 PROYECTO : MEJORAMIENTO CON CAPA ASFALTICA, BARRIO LAS AMERICAS Y COMUNIDAD MUSHU WAI
 SOLICITADO POR : CONSORCIO "ASFALTOS CYC" y/o ING. ROBERT QUINTANA
 UBICACIÓN : BARRIO LAS AMERICAS - PUYO. PROVINCIA DE PASTAZA
 FECHA : 23-02-2023
 ELEMENTO : BRIQUETA 7 (RAMAL: 100 m)

GRANULOMETRIA

MALLA No.	ABERTURA (mm)	MASA RETENIDA PARCIAL	MASA RETENIDA ACUMULADA	PORCENTAJE RETENIDO (%)	PORCENTAJE QUE PASA (%)
1"	25,400	0,00	0,00	0,00	100,00
3/4"	19,000	57,14	57,14	4,75	95,25
1/2"	12,700	170,30	227,44	18,89	81,11
3/8"	9,510	138,81	366,25	30,42	69,58
#4	4,760	158,29	524,54	43,57	56,43
#8	2,360	162,41	686,95	57,06	42,94
#16	1,190	157,51	844,46	70,14	29,86
#30	0,600	141,92	986,38	81,93	18,07
#50	0,300	97,21	1083,59	90,01	9,99
#200	0,074	85,12	1168,71	97,08	2,92
PASA No. 200		35,20			
PESO MATERIAL TOTAL		1203,91			

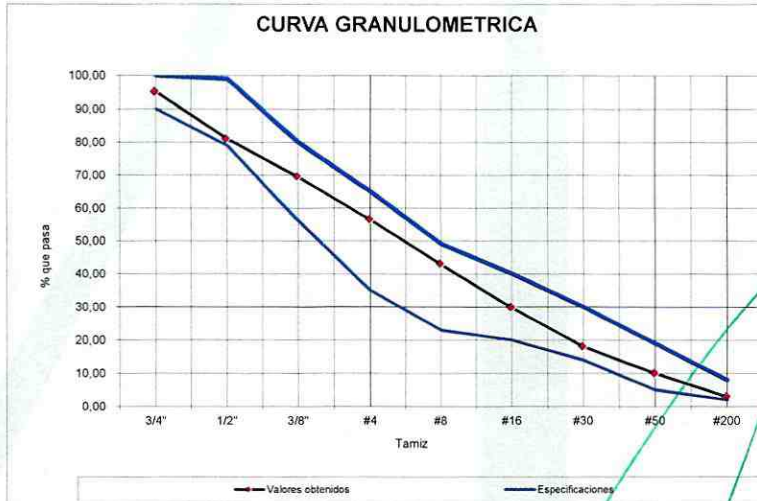

REALIZADO POR:
Lab. Daniel Jiménez

REVISADO POR:
Ing. Iván Rubio G. M. Sc.


 Ing. Iván Rubio Gálvez
 INGENIERO CIVIL - M.Sc.
 R.P. 16-01-0052

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL CON CAPA ASFALTICA
OBRA: CARPETA ASFALTICA
LOCALIZACION: BARRIO LAS AMERICAS - PUYO. PROVINCIA DE PASTAZA
PARA: CONSORCIO "ASFALOS CYC" y/o ING. ROBERT QUINTANA
FECHA DE ENSAYE: 23-02-2023
ELEMENTO: BRIQUETA

BRIQUETA 1; ABSCISA +000

PESOS	(gr)
Peso Inicial muestra(agregado+bitumen) (gr)	1377
Peso inicial del filtro (gr)	6,2
Peso seco muestra despues del ensayo (gr)	1264,56
Peso seco del filtro despues del ensayo (gr)	7,82
Peso de material fino retenido en el filtro (gr)	1,62
Peso seco Total de la muestra ensayada (gr)	1296
% de Bitumen	5,88

BRIQUETA 2; ABSCISA 0+500

PESOS	(gr)
Peso Inicial muestra(agregado+bitumen) (gr)	1324
Peso inicial del filtro (gr)	7,1
Peso seco muestra despues del ensayo (gr)	1263,2
Peso seco del filtro despues del ensayo (gr)	8,3
Peso de material fino retenido en el filtro (gr)	1,2
Peso seco Total de la muestra ensayada (gr)	1246
% de Bitumen	5,89

REALIZADO POR:

Lab. Paul Buenaño

APROBADO POR:

Ing. Iván Rubio G., M. Sc.


Iván Gonzalo Rubio Gálvez
INGENIERO CIVIL - M.Sc.
R.P. 16 - 01 - 0052

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL CON CAPA ASFALTICA
OBRA: CARPETA ASFALTICA
LOCALIZACION: BARRIO LAS AMERICAS - PUYO. PROVINCIA DE PASTAZA
PARA: CONSORCIO "ASFALOS CYC" y/o ING. ROBERT QUINTANA
FECHA DE ENSAYE: 23-02-2023
ELEMENTO: BRIQUETA

BRIQUETA 3; ABSCISA 1+000

PESOS	(gr)
-------	------

Peso Inicial muestra(agregado+bitumen) (gr)	1210
Peso inicial del filtro (gr)	7,3
Peso seco muestra despues del ensayo (gr)	1141
Peso seco del filtro despues del ensayo (gr)	8
Peso de material fino retenido en el filtro (gr)	0,7
Peso seco Total de la muestra ensayada (gr)	1139
% de Bitumen	5,87

BRIQUETA 4; ABSCISA 1+500

PESOS	(gr)
-------	------

Peso Inicial muestra(agregado+bitumen) (gr)	1245
Peso inicial del filtro (gr)	8,2
Peso seco muestra despues del ensayo (gr)	1146
Peso seco del filtro despues del ensayo (gr)	8,4
Peso de material fino retenido en el filtro (gr)	0,2
Peso seco Total de la muestra ensayada (gr)	1173
% de Bitumen	5,78

REALIZADO POR:

Lab. Paul Buenaño

APROBADO POR:

Ing. Iván Rubio G., M. Sc.




PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL CON CAPA ASFALTICA
OBRA: CARPETA ASFALTICA
LOCALIZACION: BARRIO LAS AMERICAS - PUYO. PROVINCIA DE PASTAZA
PARA: CONSORCIO "ASFALOS CYC" y/o ING. ROBERT QUINTANA
FECHA DE ENSAYE: 23-02-2023
ELEMENTO: BRIQUETA

BRIQUETA 5; ABSCISA 2+000

PESOS	(gr)
Peso Inicial muestra(agregado+bitumen) (gr)	1251
Peso inicial del filtro (gr)	7
Peso seco muestra despues del ensayo (gr)	1148
Peso seco del filtro despues del ensayo (gr)	7,4
Peso de material fino retenido en el filtro (gr)	0,4
Peso seco Total de la muestra ensayada (gr)	1179
% de Bitumen	5,76

BRIQUETA 6; RAMAL: 235 m

PESOS	(gr)
Peso Inicial muestra(agregado+bitumen) (gr)	1265
Peso inicial del filtro (gr)	7
Peso seco muestra despues del ensayo (gr)	1174
Peso seco del filtro despues del ensayo (gr)	7,9
Peso de material fino retenido en el filtro (gr)	0,9
Peso seco Total de la muestra ensayada (gr)	1193
% de Bitumen	5,69

REALIZADO POR:

Lab. Paul Buenaño

APROBADO POR:

Ing. Iván Rubio G., M. Sc.


Iván Gonzalo Rubio Galvez
INGENIERO CIVIL - M.Sc.
R.P. 16 - 01 - 0052

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL CON CAPA ASFALTICA
OBRA: CARPETA ASFALTICA
LOCALIZACION: BARRIO LAS AMERICAS - PUYO. PROVINCIA DE PASTAZA
PARA: CONSORCIO "ASFALOS CYC" y/o ING. ROBERT QUINTANA
FECHA DE ENSAYE: 23-02-2023
ELEMENTO: BRIQUETA

BRIQUETA 7; RAMAL: 100 m

PESOS	(gr)
Peso Inicial muestra(agregado+bitumen) (gr)	1203
Peso inicial del filtro (gr)	7,01
Peso seco muestra despues del ensayo (gr)	1108
Peso seco del filtro despues del ensayo (gr)	7,4
Peso de material fino retenido en el filtro (gr)	0,39
Peso seco Total de la muestra ensayada (gr)	1135
% de Bitumen	5,65

REALIZADO POR:

Lab. Paul Buenaño

APROBADO POR:

Ing. Iván Rubio G., M. Sc.

Iván Gonzalo Rubio Gálvez
INGENIERO CIVIL - M.Sc.
R.P. 18.01.0052
ECUASUELOS21

ENSAYO MARSHALL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL CON CAPA ASFALTICA
 SOLICITADO POF CONSORCIO "ASFALTOS CYC" y/o ING. ROBERT QUINTANA
 UBICACIÓN: BARRIO LOS ANGELES - PUYO. PROVINCIA DE PASTAZA
 FECHA: 23-02-2023
 ELEMENTO: BRIQUETA

FECHA	ABSCISA	Briqueta	% ASF.	Peso Seco	Peso S.S.S.	Peso Sum.	Vol. cm ³	G. Bulk g/cm ³	Estabilidad (lb)		Flujo 0.01"	
									Medida	Correc.		
23-02-2023	0+000	1	5,88	1377,00	1285,00	703,00	582,00	2,366	2319	0,96	2226	10
23-02-2023	0+500	2	5,89	1321,00	1283,00	726,00	557,00	2,372	2326	0,96	2233	11
23-02-2023	1+000	3	5,87	1208,00	1183,00	688,00	495,00	2,440	2329	0,96	2236	11
23-02-2023	1+500	4	5,78	1241,00	1236,00	703,00	533,00	2,328	2331	0,96	2238	10
23-02-2023	2+000	5	5,76	1248,00	1237,00	712,00	525,00	2,377	2336	0,96	2243	10
23-02-2023	235 m	6	5,69	1263,00	1256,00	723,00	533,00	2,370	2338	0,96	2244	10
23-02-2023	100 m	7	5,65	1261,00	1254,00	721,00	533,00	2,366	2331	0,96	2238	10
			5,79					2,374			2237	10

REALIZADO POR :
 Lab. Paul Buenafío

REVISADO POR:
 Ing. Iván Rubio G., M. Sc.

(Handwritten signature and stamp)
 INGENIERO CIVIL M. Sc.
 R. P. 16 - 07-0052
 PASTAZA

INFORME DE RESULTADOS DE PAVIMENTOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL CON CAPA
ASFALTICA, BARRIO LAS AMERICAS
Y COMUNIDAD MUSHU WARMI
(CONTROL DE PERCENT MARSHALL
EN CARPETA ASFALTICA)

UBICACIÓN: BARRIO LAS AMERICAS – PUYO.
PROVINCIA DE PASTAZA

PARA: CONSORCIO “ASFALTOS CYC” y/o
ING. ROBERT QUINTANA

FECHA: 23-02-2023


UBICACION DE LOS SONDEOS ANEXO 1
FORMULARIO DE ENSAYOS ANEXO 2
RESUMEN FOTOGRAFICO ANEXO 3


Iván Gonzalo Rubio Gálvez
INGENIERO CIVIL - M.Sc.
R.P. 16 - 01 - 0052

ANEXO N° 1

UBICACIÓN DE LOS SONDEOS

[Handwritten signature]
Iván Gonzalo Rubio Gálvez
INGENIERO CIVIL - M.Sc.
R.P. 18 - 01 - 0052
ECUASUELOS21

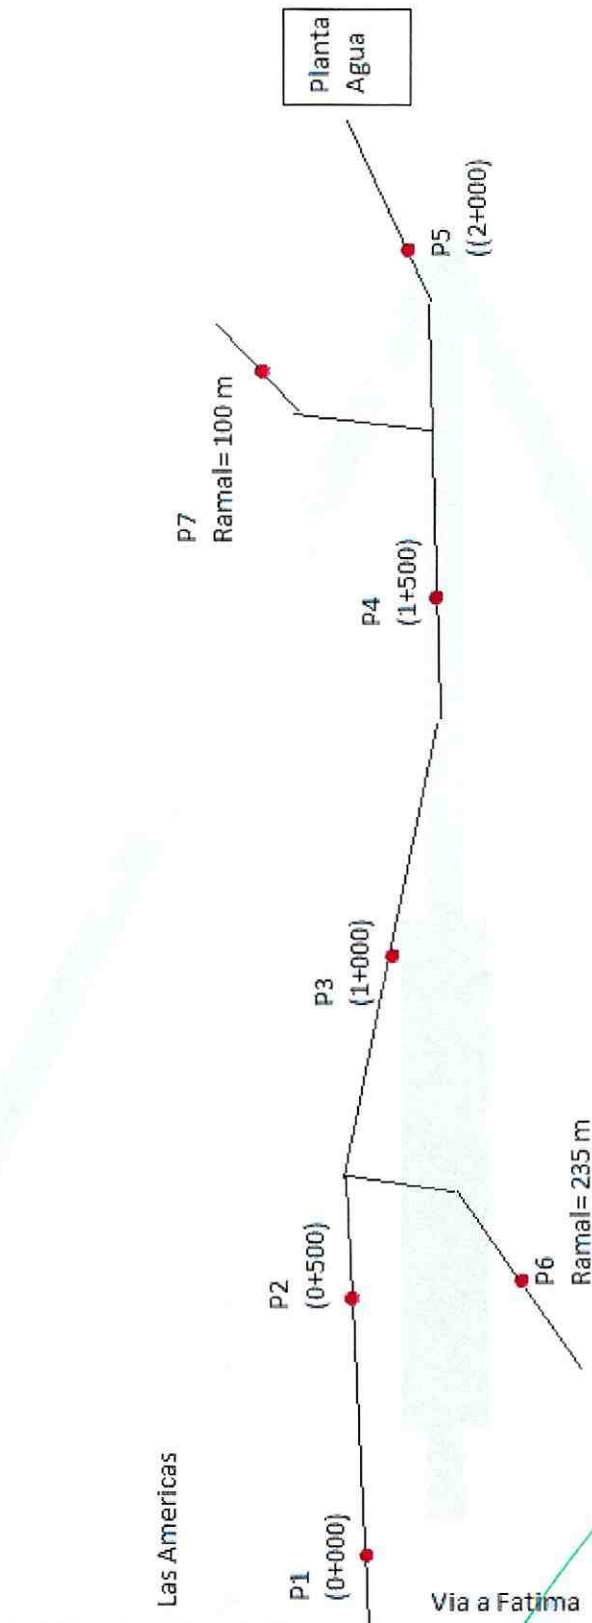

ECUASUELOS21
Ingeniero Civil
Juan Gonzalo Rubio Galvez
R.P. 14.131

ANEXO N° 2

FORMULARIO DE ENSAYOS

JM
Iván Gonzalo Rubio Gálvez
INGENIERO CIVIL - M.Sc.
R.P. 18 - 01 - 0062
ECUASUELOS21

Suelos

Servicios y Aplicaciones para la Construcción

Ing. Iván Rubio G. M. Sc.

**PERCENT MARSHALL
DENSIMETRO NUCLEAR**

ASTM D-2922
ASTM D-2950
PROYECT MEJORAMIENTO VIAL, CON CAPA ASFALTICA
UBICACIÓN: BARRIO LAS AMERICAS - MUSHU WARMI. PUYO
FECHA: 23-02-2023
EQUIPO : Troxler 3411-B
SOLICITADO POR: CONSORCIO "ASFALTOS CYC" y/o ING. ROBERT QUINTANA
FACTOR CORRECCION HUMEDAD M-BIAS: 0 gr/cm3

PRUEBA #	1	2	3	4	5
UBICACIÓN PUNTO	0+000	0+500	1+000	1+500	2+000
PUNTO	1	2	3	4	5
NIVEL	Carpeta	Carpeta	Carpeta	Carpeta	Carpeta
PROFUNDIDAD PRUEBA (cm)	0	0	0	0	0
ESPESOR DE LA CAPA (cm)	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
DENSIDAD HUMEDAD (kg/m ³)	2256	2268	2278	2287	2282
DENSID.HUMEDA CORR.(Kg/m ³)	2256	2268	2278	2287	2282
DENSIDAD SECA (Kg/m ³)	1984	1963	2065	1852	1979
% Hueco	4,50	4,00	4,30	5,00	5,10
100-%MA	3,18	2,66	2,23	1,85	2,06
MUESTRA MARSHALL #	1	1	1	1	1
VALOR	2330	2330	2330	2330	2330
% DE MARSHALL (%MA)	96,8	97,3	97,8	98,2	97,9

% MARSHALL ESPECIFICADO:

OBSERVACIONES:

El valor de densidad Bulk tomado para la comparación es de 2330.

REALIZADO POR:
Lab. Daniel Jiménez Arq.APROBADO POR:
Ing. Iván Rubio G., M. Sc.

Iván Gonzalo Rubio Gálvez
INGENIERO CIVIL - M.Sc.
R.P. 16 - 01 - 0052

Suelos

Servicios y Aplicaciones para la Construcción

Ing. Iván Rubio G. M. Sc.

**PERCENT MARSHALL
DENSIMETRO NUCLEAR**

ASTM D-2922
ASTM D-2950
PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL, CON CAPA ASFALTICA
UBICACIÓN: BARRIO LAS AMERICAS - MUSHU WARMI. PUYO
FECHA: 23-02-2023
EQUIPO: Troxler 3411-B
SOLICITADO POR: CONSORCIO "ASFALTOS CYC" y/o ING. ROBERT QUINTANA
FACTOR CORRECCION HUMEDAD M-BIAS: 0 gr/cm³

PRUEBA #	6	7			
UBICACIÓN PUNTO	Ramal 235 m	Ramal 100 m			
PUNTO	6	7			
NIVEL	Carpeta	Carpeta			
PROFUNDIDAD PRUEBA (cm)	0	0			
ESPESOR DE LA CAPA (cm)	2,54	2,54			
DENSIDAD HUMEDAD (kg/m ³)	2285	2291			
DENSID. HUMEDA CORR. (Kg/m ³)	2285	2291			
DENSIDAD SECA (Kg/m ³)	1954	2206			
% Hueco	3,90	4,80			
100-%MA	1,93	1,67			
MUESTRA MARSHALL #	1	1			
VALOR	2330	2330			
% DE MARSHALL (%MA)	98,1	98,3			

% MARSHALL ESPECIFICADO:

OBSERVACIONES:

El valor de densidad Bulk tomado para la comparación es de 2330.

REALIZADO POR:
Lab. Daniel Jiménez Arq.APROBADO POR:
Ing. Iván Rubio G., M. Sc.


Iván Rubio G. M. Sc.
INGENIERO CIVIL - M.Sc.
R.P. 16 - 01 - 0052
ECUASUELOS21

ANEXO N° 3

RESUMEN FOTOGRAFICO


Iván Gonzalo Rubio Gálvez
INGENIERO CIVIL - M.Sc
R.P. 16-01-0052
ECUASUELOS21



Ivan Gonzalo Rubio Gálvez
INGENIERO CIVIL M.Sc.
R.P. 14 - 01 - 0152



Irán González Rubio
INGENIERO CIVIL M.Sc.
R.P. 16-01-0057



Ivan Gonzalo Rubio Gálvez
INGENIERO CIVIL - M.Sc.
R.P. 16 - 01 - 0002

**GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE
PASTAZA**

Unidos por el progreso!



LIBRO DE OBRA

PROYECTO : ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

CONTRATISTA : CONSORCIO ASFALTOS CyC

FISCALIZADOR: ROBERT QUINTANA



PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: 26 / Septiembre / 2022

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

Se realizó una inspección en campo conjuntamente con fiscalización, para iniciar los trabajos a partir de la presente fecha, en la cual se efectiviza el anticipo

PERSONAL:

EQUIPO:

ESTADO DEL TIEMPO:

CONSULTAS:

ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN

INSTRUCCIONES:

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:


CONSORCIO ASFALTOS CyC
CONTRATISTA


ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZACIÓN





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: 27/Sept/2022, Mañites

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
Inicio de trabajos con motoniveladora en el sector de Mushu Warmi El trabajo consiste de limpieza y toma de ancho en la vía de 6 m.		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
Residente: 1	Motoniveladora: 1	Por la mañana:
Operador motoniveladora: 1	H. menor: 3	Soleado
M. Mayor: 1		Por la tarde:
Ayudante: 1		Soleado
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		



PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: 28/Sept/2022, Miércoles

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

Trabajos de limpieza y toma de anchos de vía en la comunidad de Santa Isabel

PERSONAL:

Residente de Obra: 1
Operador motoniveladora: 1
Maestro Mayor: 1
Ayudante: 1

EQUIPO:

Motoniveladora: 1
H. menor: 3

ESTADO DEL TIEMPO:

Por la mañana:
Soleado
Por la tarde:
Soleado

CONSULTAS:

ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN

INSTRUCCIONES:

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:


CONSORCIO ASFALTOS CyC
CONTRATISTA


ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZACIÓN



PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Jueves, 29/Sept/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

Inicio de trabajos de cajneras en la comunidad de Mushu Warmi con una distancia de 1km.

PERSONAL:

*Residente de Obra: 1
Operador Excavadora: 1
Maestro Mayor: 1
Ayudante: 2*

EQUIPO:

*Excavadora: 1
H. Menor: 4*

ESTADO DEL TIEMPO:

*Por la mañana:
Soleado
Por la tarde:
Bromoso*

CONSULTAS:

ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN

INSTRUCCIONES:

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:

[Signature]
CONSORCIO ASFALTOS CyC
CONTRATISTA

[Signature]
ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZACIÓN



PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.



CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Viernes, 30/Sept./2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Se continúa con los trabajos de cajoneras en la vía de la comunidad de Mushu Warmi.</i>		
<i>Se realiza el afirmamiento de taludes en la obra 0+300</i>		
<i>Se realiza el encauzamiento en la obra 0+250 del río</i>		
<i>Se realiza el mejoramiento de suelo en la comunidad de Mushu Warmi</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente de Obra: 1</i>	<i>Excavadora: 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Operador Excavadora: 1</i>	<i>H. Menor: 3</i>	<i>Bromoso</i>
<i>Flaestro Mayor: 1</i>	<i>Volquetes: 4</i>	<i>Por la tarde:</i>
<i>Ayudantes: 2</i>		<i>Seleado</i>
CONSULTAS:		

ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN
INSTRUCCIONES:
AUTORIZACIONES:
OBSERVACIONES:

 CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA	 ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN
--	---



PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Sábado, 01/08/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Inicio de trabajos de elaboración de cajoneras en la vía a desarrollar en la comunidad de Santa Isabel</i>		
<i>Medición y colocación del ármico de L=11m. en la abusa 0+400 de la comunidad de Santa Isabel</i>		
<i>Encorzamiento del río en la comunidad de Santa Isabel en la abusa 0+400</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente de Obra: 1</i>	<i>Excavadora: 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Operador Excavadora: 1</i>	<i>H. menor: 5</i>	<i>Lluvia</i>
<i>Maestro Mayor: 1</i>		<i>Por la tarde:</i>
<i>Ayudantes: 2</i>		<i>Bromoso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		

[Signature]
CONSORCIO ASFALTOS CyC
CONTRATISTA

[Signature]
ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZACIÓN





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Lunes, 03 Octubre 2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Se continúa con la elaboración de cajoneras en la comunidad de Santa Isabel</i>		
<i>Colocación de encofrado para la construcción de cabezales en la obra 01400 de la Colonia Santa Isabel</i>		
<i>Mejoramiento de sub con material de relleno en dicha colonia</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente de Obra: 1</i>	<i>Excavadora: 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Operador Excavadora: 1</i>	<i>Encofrados</i>	<i>Brumoso</i>
<i>Maestro Mayor: 1</i>	<i>H. Menor: 8</i>	<i>Por la tarde:</i>
<i>Ayudante: 8</i>	<i>Volquetes: 2</i>	<i>Lluvia</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		

 CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA	 ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN
--	---





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: Martes, 09/Oct/2022

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
Elaboración y relleno de canastas para el muro de guirres en la abscisa 0+600 en la comunidad de Mushu Warmi		
Fundación de cabezales en la Colonia de Santa Isabel en la abscisa 0+1400		
Mejoramiento de Seb en la Colonia de Santa Isabel		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
Residente de Obra: 1	Excavadora: 1	Por la mañana:
Oprador Excavadora: 1	Concreteira: 1	Bromoso
Maestro Mayor: 1	H. menor: 10	Por la tarde:
Ayudantes: 8	Volquetes: 6	Seleado
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
 CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA		
 ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN		



PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Miércoles, 05/Oct/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Se continúa con la formación de muro de gaviones en la obra 01600 de la comunidad de Santa Isabel, Mushu Warmi</i>		
<i>Se continúa con el mejoramiento de suelo en la colonia de Santa Isabel desmenuzando de los cabezales en la Colonia de Santa Isabel</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente de Obra: 1</i>	<i>Excavadora: 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Operador Excavadora: 1</i>	<i>H. menor: 6</i>	<i>Brumoso</i>
<i>Maestro Mayor: 1</i>	<i>Volquetes: 6</i>	<i>Por la tarde:</i>
<i>Ayudantes: 8</i>		<i>Brumoso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		

[Signature]
CONSORCIO ASFALTOS CyC
CONTRATISTA

[Signature]
ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZACIÓN





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Jueves, 06/Oct/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Finalización de muros de gaviones en la comunidad de Mushu Warmi, en la abscisa 0+600</i>		
<i>Se continúa con la elaboración de cajoneras y mejoramiento de suelo en la Colonia de Santa Isabel desde la abscisa 0+200 hasta la abscisa 1+600</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente de Obra: 1</i>	<i>Excavadora: 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Maestro Mayor: 1</i>	<i>Volquetes: 5</i>	<i>Brumoso</i>
<i>Ayudantes: 2</i>	<i>H. Menor: 3</i>	<i>Por la tarde:</i>
		<i>Lluvia</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: Viernes, 07/Oct/2022

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
Se continúa con el mejoramiento de sub en la colonia de Santa Isabel desde la abscisa 14600 hasta la abscisa 24000		
Se continúa con la elaboración de cajoneras en la colonia de Santa Isabel		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
Residente de Obra: 1	Excavadora: 1	Por la mañana:
Maestro Mayor: 1	Volquetes: 5	Brumoso
Operador Excavadora: 1	H. Menor: 2	Por la tarde:
		Lluvia
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		

 CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA	 ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN
--	---





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Sábado, 08/Oct/22*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Se realiza limpieza de taludes en la obra 04400 en la comunidad de Mushu Warmi</i>		
<i>Fuerte precipitaciones impiden el desarrollo normal de los trabajos</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente de Obra: 1</i>	<i>Excavadora: 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Operador Excavadora: 1</i>	<i>H. Menor: 2</i>	<i>Lluvia</i>
<i>Maestro Mayor: 1</i>		<i>Por la tarde:</i>
<i>Ayudantes: 1</i>		<i>Lluvia</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		



PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Lunes, 10 Oct 2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

Relleno de muro de gaviones en la obra 0+600 en la comunidad de Mushu Warmi
Fuertes precipitaciones impiden el desarrollo de los trabajos

PERSONAL:

Residente de Obra: 1
Maestro Mayor: 1
Operador Excavadora: 1
Ayudantes: 1

EQUIPO:

Excavadora: 1
Volquetes = 4
H. menor: 1

ESTADO DEL TIEMPO:

Por la mañana:
Lluvia
Por la tarde:
Lluvia

CONSULTAS:

ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN

INSTRUCCIONES:

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:

[Signature]
CONSORCIO ASFALTOS CyC
CONTRATISTA

[Signature]
ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZACIÓN



PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: Martes, 11 / Oct / 2022

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

Fuertes precipitaciones impiden realizar los trabajos

PERSONAL:

Residente de Obra: 1

Maestro Mayor: 1

Operador Excavadora: 1

EQUIPO:

Excavadora: 1

ESTADO DEL TIEMPO:

Por la mañana:

Lluvia

Por la tarde:

Lluvia

CONSULTAS:

ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN

INSTRUCCIONES:

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:

CONSORCIO ASFALTOS CyC
CONTRATISTA

ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZACIÓN



PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: Miércoles, 12 / Oct / 2022

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

- Colocación de letreros informativos tanto en la comunidad de Mushu Warmi como en la colonia de Santa Isabel
- Continuación del desarrollo de cajoneras en la colonia de Santa Isabel en la abscisa 14500 hasta la abscisa 2+000

PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
Residente de Obra: 1	Excavadora: 1	Por la mañana:
Operadora 1	H. Menor: 7	Soleado
Maestro Mayor: 1		Por la tarde:
Peones: 2		Bromoso

CONSULTAS:

ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN

INSTRUCCIONES:

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:


CONSORCIO ASFALTOS CyC
CONTRATISTA


ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZACIÓN





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: Jueves, 13 / Oct / 22

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
- Inicio de mejoramiento de sube con el material de relleno en la colonia de Santa Isabel, en las abejas 17500 a 17800		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
Residente de obra: 1	Excavadora: 1	Por la mañana:
Maestro Mayor: 1	Volquetes: 5	Soleado
Operador: 1	H. menor: 3	Por la tarde:
Ayudantes: 2		Soleado
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Viernes, 14/Oct/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Continuación con mejoramiento de Sube a través del material de relleno y continuación del desarrollo de cajoneras en la Colonia de Santa Isabel</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente de Obra: 1</i>	<i>Excavadora: 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Maestro Mayor: 1</i>	<i>Volquetes: 5</i>	<i>Bromoso</i>
<i>Oprador: 1</i>	<i>H. menor: 4</i>	<i>Por la tarde:</i>
<i>Ayudantes: 2</i>		<i>Lluvia</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		



PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Lunes, 17/Oct/2002*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

Continúan los trabajos de elaboración de cajoneras en el ramal no. 1 de la colonia Santa Isabel

PERSONAL:

*Residente de Obra: 1
Maestro Maya: 1
Operador: 1*

EQUIPO:

*Excavadora: 1
H. menor: 5*

ESTADO DEL TIEMPO:

*Por la mañana:
Secado
Por la tarde:
Lluvia*

CONSULTAS:

ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN

INSTRUCCIONES:

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:

[Signature]
CONSORCIO ASFALTOS CyC
CONTRATISTA

[Signature]
ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZACIÓN



PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Martes, 18/Oct/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

Se continúan con los trabajos de mejoramiento de Suelo

PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente de Obra: 1</i>	<i>Volquetes: 4</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Maestro Mayor: 1</i>	<i>Excavadora: 1</i>	<i>Bromoso</i>
<i>Operador: 1</i>		<i>Por la tarde:</i>
<i>Ayudantes: 2</i>		<i>Soleado</i>

CONSULTAS:

ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN

INSTRUCCIONES:

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:

[Signature]
CONSORCIO ASFALTOS CyC
CONTRATISTA

[Signature]
ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZACIÓN





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Miércoles, 19 de Oct, 2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Fuertes precipitaciones impiden el desarrollo normal de los trabajos</i>		
<i>Por la tarde mejora el clima y se continúa con los trabajos de mejoramiento de sube</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente de Obra: 1</i>	<i>Excavadora: 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Maestro Mayor: 1</i>	<i>H. menor: 3</i>	<i>Lluvia</i>
<i>Operador: 1</i>		<i>Por la tarde:</i>
<i>Ayudante: 2</i>		<i>Bromoso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		



PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: Jueves, 20/Oct/2022

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
Se continúa con los trabajos de mejoramiento de subo y elaboración de cajoneras en la Colonia de Santa Isabel		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
Residente de Obra: 1	Excavadora: 1	Por la mañana:
Maestro Mayor: 1	Volquetes: 4	Lluvia
Operador: 1	H. menor: 3	Por la tarde:
Ayudantes: 2		Brumoso
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		

CONSORCIO ASFALTOS CyC
CONTRATISTA

ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZACIÓN





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Viernes, 21 Oct / 2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Fuertes precipitaciones impiden el desarrollo normal del desarrollo de actividades y trabajos en obra</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>Excavadora: 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Operador: 1</i>	<i>H-menor: 2</i>	<i>Lluvia</i>
<i>Maestro Mayor: 1</i>		<i>Por la mañana:</i>
<i>Ayudante: 1</i>		<i>Lluvia</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *SABADO, 22 / Oct / 2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Fuertes precipitaciones impiden el desarrollo normal de las actividades en obra</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>H. menor: 2</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Maestro Mayor: 1</i>		<i>Lluvia</i>
<i>Ayudante: 1</i>		<i>Por la tarde:</i>
		<i>Lluvia</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
 CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA	 ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN	





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Lunes, 24/oct/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Se continúa con los trabajos de mejoramiento de sube en Santa Isabel</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>H. menor: 3</i>	<i>Por la mañana</i>
<i>Maestro: 1</i>		<i>Brumoso</i>
<i>Ayudante:</i>		<i>Por la tarde</i>
		<i>Brumoso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		



PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: Noite, 25 / Oct / 2022

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

Colocación de niveles por parte de topografía en un tramo de la Colonia Santa Isabel obra 2+000 hasta 2+500

PERSONAL:

Residente : 1
Maestro : 1
Ayudante : 1

EQUIPO:

H. menor: 5
Excavadora: 1

ESTADO DEL TIEMPO:

Por la mañana:
Brumoso
Por la tarde
Brumoso

CONSULTAS:

ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN

INSTRUCCIONES:

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:


CONSORCIO ASFALTOS CyC
CONTRATISTA


ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZACIÓN



PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Miércoles, 26/Oct/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

Fuertes precipitaciones impiden el desarrollo normal de los trabajos

PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>Excavadora: 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Puestro: 1</i>	<i>H. menor: 3</i>	<i>Lluvioso</i>
<i>Ayudante:</i>		<i>Por la tarde:</i>
		<i>Lluvioso</i>

CONSULTAS:

ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN

INSTRUCCIONES:

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:

Andrés Álvarez
CONSORCIO ASFALTOS CyC
CONTRATISTA

Robert Quintana
ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZACIÓN



PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Jueves, 27/Oct/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

Fuertes precipitaciones impiden el desarrollo normal de los trabajos

PERSONAL:

Residente: 1

Ayudante: 1

Maestro: 1

EQUIPO:

Excavadora: 1

H. menor: 3

ESTADO DEL TIEMPO:

Por la mañana:

Lluvioso

Por la tarde:

Lluvioso

CONSULTAS:

ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN

INSTRUCCIONES:

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:

Andrés Suárez
CONSORCIO ASFALTOS CyC
CONTRATISTA

Robert Quintana
ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZACIÓN




PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Sábado, 29/Oct/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Se continúa con el desarrollo de las cajoneras en la colonia de Santa Isabel</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>Excavadora: 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Maestro: 1</i>	<i>H. menor: 2</i>	<i>Bromoso</i>
<i>Ayudante: 1</i>		<i>Por la tarde:</i>
		<i>Bromoso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<hr/> CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA	 <hr/> ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN	





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Lunes, 31/Oct/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Se continuó con los trabajos de mejoramiento de suelo en la colonia de Santa Isabel</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>Excavadora: 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Maestro: 1</i>	<i>H. menor: 2</i>	<i>Soleado</i>
<i>Ayudante: 1</i>		<i>Por la tarde:</i>
		<i>Lluvioso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Portes, 01/Nov/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Se continúan con los trabajos de mejoramiento de sube en la Colonia de Santa Isabel</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>Excavadora: 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Maestro: 1</i>	<i>H. menor: 2</i>	<i>Bromoso</i>
<i>Ayudante:</i>		<i>Por la tarde:</i>
		<i>Lluvioso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Miércoles, 02/Nov/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Se continúa con trabajos de mejoramiento de sube, visita de fiscalización para verificación de trabajos</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>Excavadora: 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Maestro: 1</i>	<i>H. menor: 2</i>	<i>Bromoso</i>
<i>Ayudante: 1</i>		<i>Por la tarde:</i>
		<i>Lluvioso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Jueves, 03/Nov/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Visita de Fiscalización Ambiental, recorrido de obra tanto en la comunidad de Mushuc Warmi como en la colonia de Santa Isabel</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>Extrusora: 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Maestro: 1</i>	<i>H. menor: 2</i>	<i>Lluvioso</i>
<i>Ayudante: 1</i>		<i>Por la tarde:</i>
		<i>Brumoso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		



PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Viernes, 04/06/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Fuertes precipitaciones impiden el desarrollo normal de los trabajos</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>Excavadora: 1</i>	<i>Por la mañana: 1</i>
<i>Maestro: 1</i>	<i>H. menor: 1</i>	<i>Lluvioso</i>
<i>Ayudante: 1</i>		<i>Por la tarde:</i>
		<i>Lluvioso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		

Andrés Quintero
CONSORCIO ASFALTOS CyC
CONTRATISTA

Robert Quintana
ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZACIÓN



PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Sábado, 05/11/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Fuertes precipitaciones impiden el desarrollo de los trabajos.</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>Excavadora: 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Maestro: 1</i>	<i>H. menor: 1</i>	<i>Lluvioso</i>
<i>Ayudante: 1</i>		<i>Por la tarde:</i>
		<i>Lluvioso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		

[Signature]
CONSORCIO ASFALTOS CyC
CONTRATISTA

[Signature]
ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZACIÓN





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: Lunes, 07/Nov/2022

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
Transporte de base granular desde la mina Nueva Vida hacia la comunidad Mushu Warmi		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
Residente: 1	Excavadora: 1	Por la mañana:
Maestro: 1	H. menor: 2	Brumoso
Ayudante: 1		Por la tarde:
		Lluvioso
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
 CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA		
 ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN		



PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Martes, 08/Nov/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Elaboración de cajoneras en el sector de la colonia de Santa Isabel abasco</i>		
<i>04100 a 04200</i>		
<i>Por la tarde fuertes precipitaciones impiden el desarrollo de los trabajos</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>Retroexcavadora: 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Maestro Ployor: 1</i>	<i>H. menor: 3</i>	<i>Brumoso</i>
<i>Ayudante: 1</i>		<i>Por la tarde:</i>
		<i>Lluvioso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		

[Signature]
CONSORCIO ASFALTOS CyC
CONTRATISTA

[Signature]
ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZACIÓN





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Miércoles / 09 / 11 / 2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Fuertes precipitaciones impiden el desarrollo normal de los trabajos</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>H. menor: 4</i>	<i>Por la mañana</i>
<i>Maestra Mayor: 1</i>		<i>y por la tarde:</i>
<i>Ayudante: 1</i>		<i>Lluvioso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: Jueves, 10/Nov./2022

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
Fuertes precipitaciones impiden el desarrollo normal de los trabajos		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
Maestro Mayor: 1	H. menor: 3	Por la mañana y
Residente : 1		por la tarde:
Ayudante: 1		Lluvioso
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Viernes, 11/Nov/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Fuertes precipitaciones impiden el desarrollo normal de los trabajos</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>H. Menor: 1</i>	<i>Por la mañana y</i>
<i>Maestro: 1</i>		<i>tarde:</i>
<i>Ayudante:</i>		<i>Lluvioso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Sábado, 12/11/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Socialización con los moradores de la colonia Santa Isabel sobre un rediseño de vía.</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>H. menor: 2</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Maestro: 1</i>		<i>Brumoso</i>
<i>Ayudante: 1</i>		<i>Por la tarde:</i>
		<i>Brumoso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Lunes, 14/Nov/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Transporte de base desde la mina Nueva Vida hacia la comunidad de Mushu Warmi</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>H. Menor: 1</i>	<i>Por la mañana</i>
<i>Mayor Maestro: 1</i>	<i>Elotniveladora: 1</i>	<i>y tarde:</i>
<i>Ayudante: 1</i>	<i>Rodillo: 1</i>	<i>Brumoso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		



PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Martes, 15/10/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Transporte de base de la Mina Nueva Vida hacia la comunidad de Mushu Warmi</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>H. Menor: 4</i>	<i>Por la mañana y</i>
<i>Maestro: 1</i>	<i>Motonieladora</i>	<i>tarde:</i>
<i>Ayudante: 1</i>	<i>Redillo</i>	<i>Brumoso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		

[Signature]
CONSORCIO ASFALTOS CyC
CONTRATISTA

[Signature]
ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZACIÓN



PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Miércoles, 16 Nov 2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Transporte de Base granular desde la mina Udeva Uida hacia la comunidad de Mushu Warmi</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>Plataniveladora</i>	<i>Por la mañana y</i>
<i>Maestro Mayor: 1</i>	<i>Rodillo</i>	<i>por la tarde:</i>
<i>Ayudante: 1</i>	<i>H. menor: 4</i>	<i>Brumoso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		

[Signature]
CONSORCIO ASFALTOS CyC
CONTRATISTA

[Signature]
ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZACIÓN





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: Jueves, 17/Nov/2022

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
Fuerzas precipitaciones impiden el paso del acceso desde la mina Ubeza Ubeza hacia Mushu Warmi		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
Residente: 1	Fl. menor: 6	Por la mañana y por la tarde.
Maestro Mayor: 1		Lluvioso
Ayudante: 1		
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Viernes, 18/Nov/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Fuertes precipitaciones impiden el acceso hacia la mina Nueva Vida para el traslado de base granular hacia la comunidad Mushu Warmi</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>H. Menor: 4</i>	<i>Por la mañana y</i>
<i>Maestro Mayor: 1</i>		<i>por la tarde:</i>
<i>Ayudante:</i>		<i>Lluvioso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Sábado, 19/Nov/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Fuertes precipitaciones impiden el ingreso a la Mina Nueva Vida para el traslado de la base granular hasta la comunidad Mushu Warmi</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>H. menor: 3</i>	<i>Por la mañana y</i>
<i>M. Mayor: 1</i>		<i>por la tarde.</i>
<i>Ayudante: 1</i>		<i>Lluvioso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Lunes, 21 / Nov / 2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Transporte de base granular desde la mina Nueva Vida hacia la Colonia Santa Isabel</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>Motoniveladora: 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Ma Mayor: 1</i>	<i>Rodillo: 1</i>	<i>Soleado</i>
<i>Ayudante: 1</i>		<i>Por la tarde:</i>
		<i>Brumoso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		



PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Martes, 22 Nov 2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Transporte de Base granular desde la mina Nueva Vida hacia la Colonia Sta Isabel</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>Motorizadora: 1</i>	<i>Por la mañana</i>
<i>17. Mayor: 1</i>	<i>Rodillo: 1</i>	<i>y por la tarde:</i>
<i>Ayudante: 1</i>		<i>Brumoso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		

[Signature]
CONSORCIO ASFALTOS CyC
CONTRATISTA

[Signature]
ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZACIÓN





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Miércoles, 23/11/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Transporte de Material desde la mina Nueva Vida hacia la colonia Santa Isabel</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>H. menor: 1</i>	<i>Por la mañana y</i>
<i>M. Mayor: 1</i>	<i>Flotoniiveladora: 1</i>	<i>tarde:</i>
<i>Ayudante: 1</i>	<i>Rodillo: 1</i>	<i>Brumoso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		



PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Jueves, 24 Nov 2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Transporte de Base granular desde la mina Nueva Vida hacia la colonia Santa Isabel</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>Motoniveladora</i>	<i>Por la mañana y</i>
<i>H. menor: 1</i>	<i>Rodillo</i>	<i>por la tarde:</i>
<i>Ayudante: 1</i>	<i>H menor</i>	<i>Bromoso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		

[Signature]
CONSORCIO ASFALTOS CyC
CONTRATISTA

[Signature]
ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZACIÓN





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Viernes, 25/Nov/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Fuertes precipitaciones impiden el ingreso a la mina Nueva Vida</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Fl. Mayor: 1</i>	<i>Motoniveladora: 1</i>	<i>Por la mañana y</i>
<i>Residente: 1</i>	<i>Rodillo compactador: 1</i>	<i>tarde:</i>
<i>Ayudante: 1</i>		<i>Bromoso y</i>
		<i>Lluvioso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Sábado, 26/Nov/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Fuertes precipitaciones impiden el ingreso a la mina Nueva Vida para transportar base granular desde la colonia Santa Isabel</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>H. menor: 3</i>	<i>Por la mañana y</i>
<i>M. Mayor: 1</i>		<i>tarde:</i>
<i>Ayudante: 1</i>		<i>Lluvioso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Lunes, 28/Nov/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Compactación desde la abscisa 0+000 hasta la abscisa 0+000 en la comunidad Mushu Warmi</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>Rodillo compactador: 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>M. Mayor: 1</i>	<i>H. menor: 1</i>	<i>Brumoso</i>
<i>Ayudante: 1</i>		<i>Por la tarde:</i>
		<i>Brumoso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: Martes, 29 / Dic / 2022

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<p>Compactación en la comunidad Mushu Warmi desde la obiso 0+000 hasta la 1+000</p> <p>Compactación del material de mejoramiento previo a la colocación de la base</p>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
Residente: 1	Rodillo Compactador: 1	Por la mañana:
N. Mayor: 1		Brumoso
Ayudante: 1		Por la tarde:
		Brumoso
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Miércoles 30/10/22*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Compactación del material de mejoramiento en la Colonia Sta. Isabel desde la abscisa 01000 hasta la 01600</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>Rodillo compactador: 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>M. Mayor: 1</i>	<i>H. menor: 3</i>	<i>Bromoso</i>
<i>Ayudante: 1</i>		<i>Por la tarde:</i>
		<i>Bromoso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		



PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Jueves, 01/Dic/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Fuertes precipitaciones impiden el desarrollo normal de los trabajos</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>H. menor: 1</i>	<i>Por la mañana y</i>
<i>Fl. Mayor: 1</i>		<i>por la tarde:</i>
<i>Ayudante: 1</i>		<i>Lluvioso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		

Andrés Alvarado
CONSORCIO ASFALTOS CyC
CONTRATISTA

Robert Quintana
ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZACIÓN





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Viernes, 02/Dic/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Fuertes precipitaciones impiden el desarrollo normal de los trabajos.</i>		
<i>Se inicia trabajos del Contrato Complementario</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>H. menor: 3</i>	<i>Por la mañana y</i>
<i>M. Mayor: 1</i>		<i>tarde:</i>
<i>Ayudante: 1</i>		<i>Lluvioso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES: <i>Inician con trabajos del Contrato Complementario</i>		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Sábado, 03/Dic/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Compactación del mejoramiento de suelo desde la obra 0+600 hasta la obra 0+2000 en la colonia de Santa Isabel</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>Rodillo compactador: 1</i>	<i>Por la mañana</i>
<i>M. Mayor: 1</i>		<i>y por la tarde:</i>
<i>Ayudante: 1</i>		<i>Bromoso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Lunes, 05/Dic/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Compactación del material de mejoramiento en la colonia de Sta Isabel desde la 2+000 hasta la 2+500</i>		
<i>Colocación de brmos</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>Motoniveladora</i>	<i>Por la mañana y</i>
<i>Pl. Mayor: 1</i>		<i>por la tarde:</i>
<i>Ayudante: 1</i>		<i>Brumoso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		



PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Nantes, 06 Dic 2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Reconformación del material de base de la comunidad de Mushu Warmi desde la abscisa 0+000 hasta la abscisa 0+500</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>Motoniveladora</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Pl. Mayor: 1</i>		<i>Bromoso</i>
<i>Ayudante: 1</i>		<i>Por la tarde:</i>
		<i>Bromoso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		

Adrian Alvarez
CONSORCIO ASFALTOS CyC
CONTRATISTA

Robert Quintana
ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZACIÓN



PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Miércoles, 07/Dic/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

Reconfirmación de material base granular desde la obra 0+500 hasta la obra 1+000 en la comunidad de Mushu Warmi

PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>Motor niveladora: 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>M. Mayor: 1</i>		<i>Bromazo</i>
<i>Ayudante: 1</i>		<i>Por la tarde:</i>
		<i>Bromazo</i>

CONSULTAS:

ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN

INSTRUCCIONES:

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:

[Signature]
CONSORCIO ASFALTOS CyC
CONTRATISTA

[Signature]
ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZACIÓN





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: Jueves, 08/Dic/2022

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
Reconformación de la base granular en la Colonia de Santa Isabel desde la abscisa 0+000 hasta la abscisa 0+800		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
Residente: 1	Motoniveladora: 1	Por la mañana:
M. Mayor: 1		Bromoso
Ayudante: 1		Por la tarde:
		Bromoso
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Viernes, 09 Dic / 2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Fuertes precipitaciones impiden el desarrollo normal de los trabajos</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>Motoniiveladora: 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Ayudante: 1</i>		<i>Bromoso y Lluvioso</i>
<i>M. Mayor: 1</i>		<i>Por la tarde:</i>
		<i>Lluvioso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Sábado, 10 Dic/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Fuertes precipitaciones impiden el desarrollo normal de los trabajos</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>Motorizadora: 1</i>	<i>Por la mañana: 1</i>
<i>M. Mayor: 1</i>		<i>Lluvioso</i>
<i>Ayudantes: 1</i>		<i>Por la tarde:</i>
		<i>Lluvioso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Lunes, 12/Dic/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Inicio de asfalto en la comunidad Mushu Warmi desde la abscisa 0+000 hasta la abscisa 0+250</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>Notoniveladora</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Maestro Mayor: 1</i>		<i>Bromoso</i>
<i>Ayudante: 1</i>		<i>Por la tarde:</i>
		<i>Bromoso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: Martes 13 Dic 2022

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
Continuación de asfaltado, previo trabajos de compactación, paso de agua y colocación de líquido de imprimación en la comunidad de Mushu Warmi desde la obra 01250 hasta la 01500		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
Residente: 1	Rodillo compactador: 1	Por la mañana:
Maestro Mayor: 1	Tanquero Camión: 1	Bromoso
Ayudante: 1	H. menor: 1	Por la tarde:
	Equipo y maquinaria asfalto	Bromoso
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Miércoles, 14 / Dic / 22*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Fuertes precipitaciones impiden el desarrollo normal de los trabajos</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>N. Mayor: 1</i>	<i>H. menor: 4</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Residente: 1</i>		<i>Uuuioso</i>
<i>Ayudante: 1</i>		<i>Por la tarde:</i>
		<i>Uuuioso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Jueves 15/Dic/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Fuertes precipitaciones impiden el desarrollo normal de los trabajos</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>Excavadora: 1</i>	<i>Por la mañana y por</i>
<i>Maestro Mayor: 1</i>	<i>H. menor: 1</i>	<i>la tarde:</i>
<i>Ayudante: 1</i>		<i>Lluvioso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Viernes, 16/Dic/2022.*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Fuertes precipitaciones impiden el desarrollo normal de los trabajos</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>H. menor: 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Maestro Mayor: 1</i>		<i>Lluvioso</i>
<i>Ayudante: 1</i>		<i>Por la tarde:</i>
		<i>Lluvioso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		



PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Sábado, 17/Dic/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

Continuación del Asfalto desde la abscisa 0+500 hasta la abscisa 1+000 en solo carril

PERSONAL:

Residente: 1

Maestro Mayor: 1

Ayudantes: 6

Operarios: 5

EQUIPO:

Rodillo: 1

Notoniveladora: 1

Volquetes: 4

Flaquina Asfalto: 1

ESTADO DEL TIEMPO:

Por la mañana:

Brumoso

Por la tarde:

Brumoso

CONSULTAS:

ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN

INSTRUCCIONES:

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:

[Signature]
CONSORCIO ASFALTOS CyC
CONTRATISTA

[Signature]
ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZACIÓN



PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Lunes, 19/Dic/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Continuación de los trabajos de pavimentación y colocación de asfalto en la comunidad Mushu Warmi desde la abisa 0+500 hasta la abisa 1+000, segundo carril</i>		
<i>Se Culmino con los trabajos del Contrato Complementario</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>Tanquero (Camión Cisterna): 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>M. Mayor: 1</i>	<i>Volquetas: 4</i>	<i>Bromoso</i>
<i>Ayudantes: 6</i>	<i>Podillo: 1</i>	<i>Por la tarde:</i>
<i>Operarios: 4</i>	<i>Motociclista: 1</i>	<i>Bromoso</i>
CONSULTAS:		

ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN
INSTRUCCIONES:
AUTORIZACIONES:
OBSERVACIONES:

Andrés Muñoz
CONSORCIO ASFALTOS CyC
CONTRATISTA

Robert Quintana
ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZACIÓN





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Martes, 20/Dic/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Toma de correcciones de asfalto en la Comunidad de Mushu Warmi</i>		
<i>Traslado de maquinarias hacia el otro tramo del proyecto, es decir, la</i>		
<i>Colonia Santa Isabel</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente de Obra: 1</i>	<i>H. menor: 4</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>1. Mayor: 1</i>		<i>Bromoso</i>
<i>Ayudantes: 2</i>		<i>Por la tarde:</i>
		<i>Bromoso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Miércoles, 21 Dic/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Fuertes lluvias impiden el desarrollo normal de los trabajos</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>H. menor: 2</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Maestro Mayor: 1</i>	<i>Niveladora: 1</i>	<i>Lluvioso</i>
<i>Ayudantes: 2</i>	<i>Zodillo: 1</i>	<i>Por la tarde:</i>
		<i>Lluvioso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Jueves, 22 Dic, 2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Fuertes precipitaciones impiden el desarrollo adecuado de los trabajos previstos</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente de Obra: 1</i>	<i>Motoniveladora: 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Maestro Mayor: 1</i>	<i>Rodillo: 1</i>	<i>Lluvioso</i>
<i>Ayudantes: 2</i>	<i>Camión Cisterna: 1</i>	<i>Por la tarde:</i>
		<i>Lluvioso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		



PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: Martes, 27 / Dic / 2022

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS

Colocación de material pétreo de triturado a la Colonia de Santa Isabel,
Compactación, Tendido del material

PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
Residente de Obra: 1	Platoniueladora: 1	Por la mañana:
M. Mayor: 1	Rodillo: 1	Soleado
Ayudantes: 2	H. menor: 3	Por la tarde:
Operadores: 2		Bromoso


CONSULTAS:


ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN

INSTRUCCIONES:

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:


 CONSORCIO ASFALTOS CyC
 CONTRATISTA


 ING. ROBERT QUINTANA
 FISCALIZACIÓN





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Miércoles, 28/Dic/2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Se continúa con los trabajos de compactación, fendido del material petreo triturado con la base granular en la colonia de Santa Isabel</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente de Obra: 1</i>	<i>Rodillo: 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>M. Mayor: 1</i>	<i>Motoniueadora: 1</i>	<i>Secado</i>
<i>Ayudantes: 2</i>	<i>H. menor: 2</i>	<i>Por la tarde:</i>
<i>Operadores: 2</i>		<i>Brumoso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		



PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS C y C

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Jueves, 29 Dic, 2022*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Fuertes precipitaciones impiden el desarrollo normal de los trabajos</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente de Obra: 1</i>	<i>H. menor: 4</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Maestro Placer: 1</i>	<i>Rodillo: 1</i>	<i>Lluvioso</i>
<i>Ayudante: 1</i>	<i>Motor niveladora: 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
		<i>Lluvioso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		

[Signature]
CONSORCIO ASFALTOS C y C
CONTRATISTA

[Signature]
ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZACIÓN





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Martes, 03/Enero/2023*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Fuertes precipitaciones impiden el desarrollo normal de los trabajos</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente de Obra: 1</i>	<i>H. menor: 3</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Maestro Mayor: 1</i>		<i>Lluvioso</i>
<i>Ayudante: 1</i>		<i>Por la tarde:</i>
		<i>Lluvioso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Miércoles, 04/Ene/2023*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Se realiza conetas para drenar las aguas lluvias, son trabajos previos antes de la colocación de la carpeta asfáltica en la Colonia Santa Isabel</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente de Obra: 1</i>	<i>Excavadora: 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Maestro Mayor: 1</i>	<i>H. menor: 3</i>	<i>Brumoso</i>
<i>Ayudante: 1</i>	<i>Volqueta: 1</i>	<i>Por la tarde:</i>
		<i>Lluvioso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		



PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Jueves, 05/Enero/2023*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Se realizan trabajos de mejoramiento de suelo, retiro de tubería, en la Colonia de Santa Isabel</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente de Obra: 1</i>	<i>Retroexcavadora: 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Plastero Mayor: 1</i>	<i>Volquetes: 1</i>	<i>Bromoso</i>
<i>Ayudante: 1</i>	<i>H. menor: 4</i>	<i>Por la tarde:</i>
<i>Operador Retroexcavadora: 1</i>		<i>Ullucioso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		

[Signature]
CONSORCIO ASFALTOS CyC
CONTRATISTA

[Signature]
ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZACIÓN





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Viernes, 06/Enero/2023*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Capacitaciones al personal de Seguridad Industrial y Control Ambiental</i>		
<i>Por la tarde lluvias intensas no permiten el desarrollo normal de los trabajos</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente de Obra: 1</i>	<i>H. menor: 4</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Técnico Ambiental: 1</i>		<i>Lluvioso</i>
<i>Maestro Mayor: 1</i>		<i>Por la tarde:</i>
<i>Ayudantes: 2</i>		<i>Lluvioso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		



PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Sábado, 07/Enero/2023*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Continuación de capacitaciones al personal sobre Seguridad y Salud Ocupacional, Control Ambiental</i>		
<i>Fuertes precipitaciones impiden el desarrollo normal de los trabajos</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente de Obra: 1</i>	<i>H. menor: 4</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Técnico Ambiental: 1</i>		<i>Lluvioso</i>
<i>Maestro Mayor: 1</i>		<i>Por la tarde:</i>
<i>Ayudantes: 3</i>		<i>Lluvioso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		

[Signature]
CONSORCIO ASFALTOS CyC
CONTRATISTA

[Signature]
ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZACIÓN



PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: Lunes, 09 / Enero / 2023

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
Tendido mezclado y encolvimiento con Motoniveladora de base con material de triturado en la colonia de Santa Isabel		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
Residente de Obra: 1	Motoniveladora: 1	Por la mañana:
Operador: 1	H. menor: 3	Soleado
Ayudante: 1		Por la tarde:
		Bromoso
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		

CONSORCIO ASFALTOS CyC
CONTRATISTA

ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZACIÓN





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Martes, 10 / Enero / 2023*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Continuación de los trabajos de tendido de material triturado con la mezcla de base en la Colonia de Santa Isabel (2da pasada)</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente de Obra: 1</i>	<i>Motoniveladora: 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Operador: 1</i>	<i>H. menor: 3</i>	<i>Soleado</i>
<i>Ayudantes: 2</i>		<i>Por la tarde:</i>
		<i>Bromoso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Miércoles, 11/Ene/2023*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Fuertes precipitaciones impiden el desarrollo normal de los trabajos</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente de Obra: 1</i>	<i>Tanque: 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Operarios: 2</i>	<i>H. menor: 4</i>	<i>Lluvioso</i>
<i>Ayudantes: 2</i>	<i>Notoniveladora: 1</i>	<i>Por la tarde:</i>
	<i>Podillo Compactador: 1</i>	<i>Lluvioso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Jueves, 12/Ene/2023*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Se realizan trabajos de tendido, compactación de base con triturado y cemento Portland desde la obra 01000 hasta la obra 01200 en la Colonia de Santa Isabel</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente de Obra: 1</i>	<i>Motorizadora: 1</i>	<i>Por la mañana: Brumoso</i>
<i>Operadores: 2</i>	<i>Tanquero: 1</i>	
<i>Ayudantes: 2</i>	<i>Rodillo: 1</i>	<i>Por la tarde: Brumoso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Viernes, 13/Ene/2023*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Fuertes precipitaciones impiden el desarrollo de los trabajos</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente: 1</i>	<i>H. menor: 2</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Ayudantes: 2</i>		<i>Bromoso</i>
		<i>Por la tarde:</i>
		<i>Lluvioso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		

 CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA	 ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN
--	---





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Sábado, 14/Ene/2023*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Fuertes precipitaciones impiden el desarrollo normal de los trabajos</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente de Obra: 1</i>	<i>H. menor: 4</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Maestro Mayor: 1</i>		<i>Lluvioso</i>
<i>Ayudantes: 2</i>		<i>Por la tarde:</i>
		<i>Lluvioso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: Domingo, 15/Ene/2023

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
Se continúan los trabajos de encolamiento, tendido y compactación de material de base, triturado y cemento Portland en la colonia de Santa Isabel		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
Residente de Obra: 1	Rodillo: 1	Por la mañana:
Ayudantes: 2	Plataniveladora: 1	Lluvioso
Operadores: 2	Tanque: 1	Por la tarde:
	H. menor: 6	Bromaxo
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Lunes, 16/Ene/2023*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Se continúan con los trabajos de tendido y compactación de base tinturada y cemento portland en la colonia de Santa Isabel abscisa 0+200 hasta la abscisa 0+400</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente de Obra: 1</i>	<i>Camión Cisterna: 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Operadores: 2</i>	<i>Podillo: 1</i>	<i>Soleado</i>
<i>Ayudantes: 2</i>	<i>Motoniveladora: 1</i>	<i>Por la tarde:</i>
	<i>H. menor: 5</i>	<i>Bromoso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: Noites, 17/Ene/2023

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
Se continúan los trabajos de tendido y compactación de base, triturado, cemento portland en la colonia de Santa Isabel		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
Residente de Obra: 1	Tanque: 1	Por la mañana:
Operadores: 1	H. menor: 6	Bromoso
Ayudantes: 2	Rodillo: 1	Por la tarde:
	Motor niveladora: 1	Soleado
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Miércoles, 18/Enero/2023*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Continuación de los trabajos de tendido, mezclado y compactación de base granular triturado y cemento pozzolán obasa 0+600 a 0+800 en la colonia de Santa Isabel</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente de Obra: 1</i>	<i>Rodillo: 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Operador: 1</i>	<i>Plomiveladora: 1</i>	<i>Bromoso</i>
<i>Ayudantes: 2</i>	<i>Camión Tongero: 1</i>	<i>Por la tarde:</i>
	<i>H. menor: 5</i>	<i>Lluvioso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Jueves, 19/Enero/2023*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Se continúan los trabajos en la Colonia Santa Isabel de tendido y compactación mezclado de base granular, con triturado y cemento Portland abusa 0+800 a 1+000</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente de Obra: 1</i>	<i>Camión Tanquero: 1</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Ayudantes: 2</i>	<i>Planimeteadora: 1</i>	<i>Bromoso</i>
<i>Operador: 1</i>	<i>Podillo: 1</i>	<i>Por la tarde:</i>
	<i>H. menor: 6</i>	<i>Bromoso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Viernes, 20/Ene/2023*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Fuertes precipitaciones impiden el desarrollo normal de los trabajos</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente de Obra: 1</i>	<i>H. menor: 3</i>	<i>Por la mañana:</i>
<i>Ayudantes: 2</i>		<i>Lluvioso</i>
		<i>Por la tarde:</i>
		<i>Lluvioso</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: *Sábado, 21 Ene 2023*

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
<i>Se realizan limpiezas de cunetas</i>		
<i>Se inician trabajos de asfaltado en la Colonia Santa Isabel desde la abscisa 0+000 hasta la abscisa 0+800.</i>		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
<i>Residente de Obra: 1</i>	<i>Finisher Pavimentadora: 1</i>	<i>Mañana:</i>
<i>Maestro Placer: 1</i>	<i>Rodillo: 1</i>	<i>Brumoso:</i>
<i>Ayudantes: 5</i>	<i>Volquetas: 5</i>	<i>Tarde:</i>
		<i>Soleado:</i>
CONSULTAS:		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA </div> <div style="text-align: center;">  ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN </div> </div>		





PROYECTO: Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.

CONTRATISTA: CONSORCIO ASFALTOS CyC

LIBRO DE OBRA

FECHA: Lunes, 23/Enero/2023

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA		
TRABAJOS REALIZADOS		
Se ulminan trabajos de colocación de emulsión asfáltica desde la obra 14800 hasta la 24500 en el sector de la Colonia Santa Isabel.		
Se presenta oficio de entrega de recepción provisional una vez finalizado los trabajos en este Proyecto.		
Cabe indicar que tanto en el tramo de Mushu Warmi como Santa Isabel se cumplió con los ensayos de compactación, asfalto, y mixturas que serán anexados en conjunto con la planilla respectiva		
PERSONAL:	EQUIPO:	ESTADO DEL TIEMPO:
Residente de Obra: 1	Finisher Pavimentadora: 1	Por la mañana:
Maestro Mayor: 1	Rodillo: 1	Secado
Ayudantes: 5	Volquetes: 3	Por la tarde:
		Brumoso
CONSULTAS:		
Se dejará pintada la vía tal cual las especificaciones técnicas recibidas por parte de la Prefectura de Pastaza		
ESPACIO PARA FISCALIZACIÓN		
INSTRUCCIONES:		
AUTORIZACIONES:		
OBSERVACIONES:		
 CONSORCIO ASFALTOS CyC CONTRATISTA		
 ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZACIÓN		



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSORCIO ASFALTOS C Y C

febrero 15 del 2023 11:02

ALVAREZ CASTILLO ELIO ANDRES

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000166740926

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - AJUSTES,		Emitido en:	2023-02-15
No. RUC / REGISTRO:	1691728902001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2023-02-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSORCIO ASFALTOS C Y C - CONSORCIO ASFALTOS C Y C			
Periodo de Pago:	2023 - 01 ✓			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2023 - 1	35	1600382244	CAZA YUQUILEMA TANIA ALEXANDRA	168.20	11	ENT	34.65	0.00
				168.20			34.65	0.00

Valor	36.33
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	36.33
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	36.33

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmege

*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

CONSORCIO ASFALTOS C y C

Pastaza - Puyo
RUC: 1691778907001



ANEXO DE VOLÚMEN DE OBRA

PROYECTO:	ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	CONTRATISTA:	FECHA:
		CONSORCIO ASFALTOS C y C	3-ene-23
RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	
13	MARCAS EN PAVIMENTO	m	

VIA DE ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ

LINEAS DIVISORIAS DE CARRILES						LONGITUD TOTAL (M)
IZQUIERDA		CENTRO		DERECHO		
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	
0+000	1000,00 m	0+000	1000,00 m	0+000	1000,00 m	3000,00
LONGITUD TOTAL						3000,00 M



Firmado: elioandresalvarez.castillo.docx
ELIO ANDRES ALVAREZ
CASTILLO

ING. ELIO ANDRES ALVAREZ
PROCURADOR COMÚN
CONSORCIO ASFALTOS C y C
CONTRATISTA



Firmado: robertfernandomuñoz.docx
ROBERT FERNANDO
QUINTANA MUÑOZ

ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZADOR GAD PROVINCIAL

ANEXOS FOTOGRAFÍAS



RED DE SERVICIOS FACILITO

COAC 29 DE OCTUBRE

RUC: 1790567699001

COMPROBANTE DE IESS

COMPROBANTE: 00000028015014

TIPO RECAUDACION: IESS (TODOS)
REFERENCIA: 16917289020010001
NOMBRE: CONSORCIO ASFALTOS C Y C
CEDULA: 169XXXXXX2001
NUMERO COMPROBANTE: 0000000166740926
PERIODO: 202301
RUBRO: PLANI
AGENCIA: 1106 PUYO
USUARIO: lhanntony
SEC LOC/SW: 628722/226142
FECHA HORA: 15/02/2023 11:51:51
CIUDAD: PASTAZA

VALOR RECAUDADO: 36.33
COMISION: 0.57
TOTAL: 36.90

MENSAJE: TRANSACCION OK
FACTURA: 001-341-001948607

Descargue su factura electrónica en
documentoselectronicos.facilito.com.ec

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600317059001

FACTURA

No. 001-100-000000031

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101202301160031705900120011000000000314070264415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/01/2023 16:16:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101202301160031705900120011000000000314070264415

VILEMA VILLA MARIA PATRICIA

Dirección Matriz: Calle: CESLAO MARIN

Dirección Sucursal: Calle: CESLAO MARIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CONSORCIO ASFALTOS C Y C

Identificación 1691728902001

Fecha 31/01/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: SALINAS Y COTOPAXI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	HONORARIOS CONTADORA MES DE ENERO		312.50	0.00	0.00	0.00	312.50

Información Adicional

Email: consorcioasfaltoscyc2022@gmail.com

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 350.00

SUBTOTAL 12%	312.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	312.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	37.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	350.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1691714086001

FACTURA

No. 001-002-000000108

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1201202301169171408600120010020000001081234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/01/2023 10:42:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1201202301169171408600120010020000001081234567814

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSGERANIOS SA

TRANSGERANIOS

Dirección Matriz: LOS PINDOS Y 12 DE FEBRERO, BARRIO EL DORADO

Dirección Sucursal: LOS PINDOS Y 12 DE FEBRERO, BARRIO EL DORADO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ASFALTOS C Y C

Identificación 1691728902001

Fecha 12/01/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Salinas y Cotopaxi

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Transporte		35.00	TRANSPORTE DE BASE	Transporte de material pétreo en el proyecto estabilización de la base granular vía de acceso a la comunidad mushu warmi y colonia santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica.	60.00	0.00	0.00	0.00	2100.00
Transporte		3.00	TRANSPORTE DE ARENA SUCIA		45.00	0.00	0.00	0.00	135.00
Trans		5.00	TRANSPORTE DE BASE		45.00	0.00	0.00	0.00	225.00

Información Adicional	
Dirección:	Salinas y Cotopaxi
Email:	consorcioasfaltoscyc2022@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2460.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	2460.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2460.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2460.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0502696768001

FACTURA

No. 001-010-000000006

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

200120230105026967680012001010000000066973667116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/01/2023 12:43:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



200120230105026967680012001010000000066973667116

Caiza Caiza Efrain Medardo

Caiza Caiza Efrain Medardo

Dirección Matriz: PUYO / RIO TIGRE Y BOBONAZA Y ARAJUNO

Dirección Sucursal: PUYO / RIO TIGRE Y BOBONAZA Y ARAJUNO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO



Razón Social / Nombres y Apellidos:

Consortio Asfaltos C Y C

Identificación 1691728902001

Fecha 20/01/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: PASTAZA / PASTAZA / PUYO / SALINAS Y COTOPAXI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALQUILER	ALQUILER	15.80	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA		30.00	0.00	0.00	0.00	474.00

Información Adicional

Código de cliente: consorcioasfaltoscyc2022@gmail.com

Enviar los comprobantes de jairominta22@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	530.88

SUBTOTAL 12%	474.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	474.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	56.88
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	530.88

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790007502001

FACTURA

No. 007-001-000186719

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2001202301179000750200120070010001867190921373410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/01/2023 19:18:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001202301179000750200120070010001867190921373410

SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.

Seguros Equinoccial

Dirección Matriz: DE LAS HIEDRAS N41-130 Y AV. DE LOS GRANADOS

Dirección Sucursal: AMBATO:AV. RODRIGO PACHANO 1589 INTERSECCION DELICIA OFIC. PB

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CONSORCIO ASFALTOS C Y C		
Identificación	1691728902001	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	20/01/2023		
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
9213734	0	1.00	BUEN USO DE ANTICIPO		214.84	0.00	0.00	0.00	214.84

Información Adicional		
Emisor:	consorcioasfaltoscyc@gmail.com	
fecha_desde:	Fecha Vigencia Desde (21/01/2023)	
fecha_hasta:	Fecha Vigencia Hasta (20/02/2023)	
nro_poliza:	Numero Poliza : 43818	
nro_endoso:	Numero Endoso : 14313	
sucursal:	AMBATO	
negocio:	BUEN USO DE ANTICIPO	
primaneta:	206,10	
dispositivodet:	0,00	
DERECHO EMISION:	0,50	
Seguro Campesino 0 5%:	1,03	
Contribucion Super Clas. 3.5%:	7,21	

SUBTOTAL 12%	214.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	214.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	25.78
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	240.62
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	240.62

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
ALBAN GREFA EFREN RODRIGO
 ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS
 Dir.: Miguel Navarro y Hugo Cifuentes
 PUYO - PASTAZA

RUC: 1600288581001
 NOTA DE VENTA 001-001-

000000001

AUTORIZACIÓN SRI # 1130894095

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
3	02	2023

Cliente: CONSORCIO ASFALTOS CYC

RUC/C.I.: 1691728902001

Dir.: Salinas y Cotacachi

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Mazo de obra en el proyecto	977,00	977,00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	VALOR TOTAL
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	977,00
	DINERO ELECTRONICO	OTROS	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	


 Firma Autorizada


 Recibi Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2866 032
 RUC 0501582935001 del 0909001 al 0909050 - Fecha Autorización 09-ENERO-2023-Fecha Caducidad 09-ENERO-2024

MINA TARABITA
LLANO GASPATA MARIA ROSA
 Dir... Via Mecas km 1 1/2 Via Madre Tierra sn y Colonia Agua Santa 2
 Madre Tierra * Pastaza

RUC: 1600040594001
 Autorización SRI N° 1130750846

NOTA DE VENTA
002-001-

00000007

Fecha de Emisión

03 02 2023
 DIA MES AÑO

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Sr(es): Consorcio Asfaltos C, C

Dirección: Salinas y Cotacachi Telf.: _____

RUC/CI: 1691728902001 Guía de Remisión: _____

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V./ VENTA
2	Material Pecho Poleno	22,00	44,00
2	Material Pecho Piedra h.	65,00	130,00
3	Material Pecho Piedra l.	40,00	120,00
1	Material Pecho Arena	40,00	40,00

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta De Crédito/ Débito Otras

TOTAL USD
334,00

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
 RECIBI CONFORME

Original: Adquirente / Copia: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600380214001

FACTURA

No. 001-100-000000010

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0901202301160038021400120011000000000106728304110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/01/2023 09:31:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0901202301160038021400120011000000000106728304110

PIEDRA AREVALO DARWIN ROLANDO

Dirección Matriz: Barrio: OBRERO Calle: MANABI Número: S/N Intersección: PICHINCHA

Dirección Sucursal: Barrio: OBRERO Calle: MANABI Número: S/N Intersección: PICHINCHA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ASFALTOS C Y C

Identificación 1691728902001

Fecha 09/01/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0007		2.00	SERICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL EN EL PROYECTO "ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANT		300.00	0.00	0.00	0.00	600.00

TAMAYO LEDESMA MARCO VINICIO

*CULTIVOS DE PITAHAYA. *CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES. *ALQUILER DE GRÚAS CON OPERADOR Y OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN CON OPERARIO. *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Dir.: Vía a Shell * PUYO - PASTAZA

RUC: 1600375826001

FACTURA 001-001

000000335

AUTORIZACIÓN SRI # 1130478722

Fecha de Emisión: 17 / 01 / 2023
DIA MES AÑO

Guía de Remisión: _____

Cliente: CONSORCIO ASFALTOS CYC

Dirección: Salinas y Cotapaxi

RUC/C.I.: 1691728902001 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V/TOTAL
11,10	Alfileres de maquinaria Gallineta en el proy. c/10.0/mosilanzales en B de a nano tecnología Parqueja tarqui y Puyo	30,00	333,00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

SUB TOTAL 12 %	333,00
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	333,00
IVA 12 %	39,96
VALOR TOTAL	372,96

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesus del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf: 2885 032
 RUC: 0691582935001-del 0000301 al 00000350 - F. Autorización 14-SEPTIEMBRE-2022- F. Caducidad 14-SEPTIEMBRE-2023

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1691710080001

FACTURA

No. 001-101-000000077

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3012202201169171008000120011010000000770000007711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/01/2023 16:58:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3012202201169171008000120011010000000770000007711

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S A

AMAZONBUILD SA

Dirección Matriz: BARRIO EL DORADO, AV TARQUI SN Y LOS LAURELES

Dirección Sucursal: BARRIO EL DORADO, AV TARQUI SN Y LOS LAURELES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ASFALTO C Y C

Identificación 1691728902001

Fecha 30/12/2022 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: CIUDADELA DEL CHOFER

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SVF-0001		7653.06	IMPRIMACION Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA EN LA COMUNIDAD MUSHUWARMÍ PARROQUIA TARQUI		3.92	0.00	0.00	0.00	30000.00

Información Adicional

AGENTERETENCION: Agente de Retencion RESOLUCION No. 1
CORREOELECTRONICO: sincorreo@correo.com
CONTROL: 0101000000077
OBSERVACIONES: IMPRIMACION Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA EN LA COMUNIDAD MUSHUWARMÍ PARROQUIA TARQUI
VENDEDOR: 00001 VENDEDOR GENERAL
FORMA_PAGO: CREDITO
FECHA_VENCIMIENTO: 30/12/2022

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	33600.00

SUBTOTAL 12%	30000.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30000.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3600.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	33600.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600739955001

FACTURA

No. 001-100-000000008

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

301220220116007399550012001100000000083828303013

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 30/12/2022 23:02:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



301220220116007399550012001100000000083828303013

SARMIENTO SANCHEZ MARJORIE ESTEFANIA

Dirección Matriz: Calle: CARRION Número: SN Intersección: AVENIDA LA UNIDAD

Dirección Sucursal: Calle: CARRION Número: SN Intersección: AVENIDA LA UNIDAD

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ASFALTOS C Y C

Identificación 1691728902001

Fecha 30/12/2022 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: CIUADELA EL CHOFER, SALINAS Y COTOPAXI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S004		1.00	HONORARIO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO MES DE DICIEMBRE-2022		223.21	0.00	0.00	0.00	223.21

Información Adicional

Email: consorcioasfaltoscyc@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	250.00

SUBTOTAL 12%	223.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	223.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	26.79
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	250.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600317059001

FACTURA

No. 001-100-000000017

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


3012202201160031705900120011000000000175414783118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/12/2022 16:31:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3012202201160031705900120011000000000175414783118

VILEMA VILLA MARIA PATRICIA

Dirección Calle: CESLAO MARIN
Matriz:

Dirección Calle: CESLAO MARIN
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ASFALTOS C Y C

Identificación 1691728902001

Fecha 30/12/2022 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: SALINAS Y COPOTAXI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	HONORARIOS CONTADORA MES DE DICIEMBRE		312.50	0.00	0.00	0.00	312.50

Información Adicional	
Teléfono:	0994008341
Email:	consorcioasfaltoscyc@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	350.00

SUBTOTAL 12%	312.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	312.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	37.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	350.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

MAYORGA FLORES WILSON ROLANDO
 ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS
 Dir.: Lirios y Anturios
 PUYO - PASTAZA

RUC: 1600379539001
FACTURA 001-001
 000000013
 AUTORIZACIÓN SRI # 1130305116
 Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión:

17	01	2023
DIA	MES	AÑO

Guía de Remisión: _____

Cliente: CONSORCIO ASFALTOS CYC

Dirección: Salinas y Cotacachi

RUC/C.I.: 1691728902001 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
01	mano de obra en el proyecto	55,00	1.100,00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR		FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12 %		1.100,00
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			SUB TOTAL 0%		
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS			DESCUENTO		
				SUBTOTAL		
				IVA 12 %		
				VALOR TOTAL		1.100,00

 FIRMA AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME
 LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Ofset ' Jesús del Gran Poder' - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2885 032
 RUC: 0801582935901 del 0000001 al 00000050 - F. Autorización 03-AGOSTO-2022- F. Caducidad 03-AGOSTO-2023

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1691710080001

FACTURA

No. 001-101-000000073

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2612202201169171008000120011010000000730000007314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/12/2022 09:52:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2612202201169171008000120011010000000730000007314

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S A

AMAZONBUILD SA

Dirección Matriz: BARRIO EL DORADO, AV TARQUI SN Y LOS LAURELES

Dirección Sucursal: BARRIO EL DORADO, AV TARQUI SN Y LOS LAURELES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ASFALTO C Y C

Identificación: 1691728902001

Fecha: 26/12/2022 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: CIUDADELA DEL CHOFER

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SVF-0001		1.00	IMPRIMACION Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA EN LA COMUNIDAD MUSHUWARMÍ PARROQUIA TARQUI		36750.00	0.00	0.00	0.00	36750.00

Información Adicional

AGENTE RETENCIÓN: Agente de Retención RESOLUCION No. 1
CORREO ELECTRÓNICO: sincorreo@correo.com
CONTROL: 0101000000073
OBSERVACIONES: IMPRIMACION Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA EN LA COMUNIDAD MUSHUWARMÍ PARROQUIA TARQUI
VENDEDOR: 00001 VENDEDOR GENERAL
FORMA_PAGO: CREDITO
FECHA_VENCIMIENTO: 26/12/2022

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	41160.00

SUBTOTAL 12%	36750.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	36750.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4410.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	41160.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1712680949001

FACTURA

No. 001-002-000000001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2312202201171268094900120010020000000019846951118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/12/2022 15:14:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2312202201171268094900120010020000000019846951118

ZURITA SONO LEONIDAS RODRIGO

ELECTROMECHANICA INTERNACIONAL

Dirección Matriz: PASAJE 1 #E14-43 Y CALLE G / LA CONCEPCIÓN / QUITO / PICHINCHA

Dirección Sucursal: PASAJE 1 #E14-43 Y CALLE G / LA CONCEPCIÓN / QUITO / PICHINCHA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ASFALTOS C Y C

Identificación: 1691728902001

Fecha: 23/12/2022 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: PASTAZA / PASTAZA / PUYO / SALINAS Y COTOPAXI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01		21000.00	ALQUILER DE MOTONIVELDORA Y RODILLO		0.50	0.00	0.00	0.00	10500.00

Información Adicional	
DIRECCIÓN:	PASTAZA / PASTAZA / PUYO / SALINAS Y COTOPAXI
TELÉFONO:	-
EMAIL:	consorcioasfaltoscyc2022@gmail.com
Proyecto:	Nanotecnología sectores mushu warmi y Santa Isabel

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11760.00

SUBTOTAL 12%	10500.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10500.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1260.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11760.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

ALTAMIRANO LITUMA MÓNICA ADRIANA
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:
 PIEDRA, ARENA, GRAVA, CEMENTO, ETC.
 Dir.: Vía a Puerto Santa Ana
 Pastaza

R.U.C.: 1600524639001

FACTURA 001-001-

000000081

RUT.SRI: 1129812645

FECHA EMISION: 09/01/2023

R.U.C./C.I. 1691728902001

GUÍA DE REMISIÓN:

Sr(es): Consorcio Astilleros C.A.S.

DIRECCION: Salina y Colapacari

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
00	m ³ de material pabeo	15.00	900.00

FORMA DE PAGO Original: Adquirente / Copia: Emisor

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/ DEBITO

OTROS

RECIBI CONFORME

[Signature]

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

SUB TOTAL	900.00
DESCUENTO	
IVA 12 %	
IVA 0 %	900.00
VALOR TOTAL	900.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790007502001

FACTURA

No. 007-001-000184779

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2012202201179000750200120070010001847790915787211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/12/2022 18:48:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2012202201179000750200120070010001847790915787211

SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.

SEGUROS EQUINOCCIAL

Dirección DE LAS HIEDRAS N41-130 Y AV. DE LOS GRANADOS
Matriz:

Dirección RODRIGO PACHANO 1589 INTERSECCION DELICIA
Sucursal:

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:		CONSORCIO ASFALTOS C Y C	
Identificación	1691728902001	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	20/12/2022	Dirección:	SALINAS SN COTOPAXI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
9157872		1.00	BUEN USO DE ANTICIPO		214.84	0.00	0.00	0.00	214.84

Información Adicional	
prim. cuota:	206.10
sucursal:	AMBATO
vigDesde:	22/12/2022
vigHasta:	21/01/2023
nroPoliza:	43818
nroEndoso:	14066
negocio:	BUEN USO DE ANTICIPO
SUPER INTENDENCIA 3,50%:	7.21
SEGURO SOCIAL CAMPESINO	1.03
DERECHO DE EMISION:	0.50
mailCliente:	consorcioasfaltoscy@gmail.com
Dispositivo de T.:	0.00

SUBTOTAL 12%	214.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	214.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	25.78
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	240.62
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	240.62

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1691714086001

FACTURA

No. 001-002-000000055

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1912202201169171408600120010020000000551234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/12/2022 09:08:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1912202201169171408600120010020000000551234567816

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSGERANIOS SA

TRANSGERANIOS

Dirección Matriz: LOS PINDOS Y 12 DE FEBRERO, BARRIO EL DORADO

Dirección Sucursal: LOS PINDOS Y 12 DE FEBRERO, BARRIO EL DORADO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Monte de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ASFALTOS C Y C

Identificación 1691728902001

Fecha 19/12/2022

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Salinas y Cotopaxi

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Transporte		12.00	TRANSPORTE DE MATERIAL		30.00	0.00	0.00	0.00	360.00
Transporte		32.00	TRANSPORTE DE MATERIAL		30.00	0.00	0.00	0.00	960.00

Información Adicional

Dirección: Salinas y Cotopaxi

Email: consorcioasfaltoscyc2022@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1320.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	1320.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1320.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1320.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

YUMBO TAPUY ABELARDO
ACTIVIDADES DE SE. SERVICIOS DIVERSOS

Dirección.: Km-16, . a Macas
 POMONA - PASTAZA

RUC. 1500440530001

NOTA DE VENTA 001 - 001-

Nº 000000035

Cód. Aut. SRI. 1129238793

Cliente: CONDOLAS ASFALTOS CYC

Dirección: Salinas y Catopaxi 22/12/2022
DÍA MES AÑO

RUC/CL: 1691728902001

FECHA DE EMISIÓN

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	mano de obra en el Proyecto	4950,00	4950,00

Contribuyente Negocio Popular
 Régimen RUMPE

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Documento Categorizado: SI

-Actividades de Servicio hasta \$ 850.00

TOTAL S 4950

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	
DIN. ELECTRONICO	
TARJETA DÉB/CRED	
OTROS	<u> x </u>

 P
 RECIBI CONFORME

CHÁVEZ PUALACÍN HOMERO JHOFFRE Aut.13356 Nº 000001 al 000050
 RI C. 1600492944001 Imp. 22/12/2021 CADUCA: 22 / Diciembre / 2022

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600739955001

FACTURA

No. 001-100-000000007

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1612202201160073995500120011000000000072891376118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/12/2022 17:51:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1612202201160073995500120011000000000072891376118

SARMIENTO SANCHEZ MARJORIE ESTEFANIA

Dirección Matriz: Calle: CARRION Número: SN Intersección: AVENIDA LA UNIDAD

Dirección Sucursal: Calle: CARRION Número: SN Intersección: AVENIDA LA UNIDAD

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ASFALTOS C Y C

Identificación: 1691728902001

Fecha: 16/12/2022 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: CIUDADELA EL CHOFER, SALINAS Y COTOPAXI S/N

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SO04		1,00	HONORARIO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO MES DE NOVIEMBRE-2022		223,21	0,00	0,00	0,00	223,21

Información Adicional	
Teléfono:	0994008341
Email:	consorcioasfaltoscyc@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	250,00

SUBTOTAL 12%	223,21
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	223,21
TOTAL DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	26,79
TOTAL DEVOLUCION IVA	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	250,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1718919473001

FACTURA

No. 001-002-000000047

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1312202201171891947300120010020000000470882763211

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/12/2022 10:27:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312202201171891947300120010020000000470882763211

CORDOVA REYES JOHANNA RENATA

CORDOVA REYES JOHANNA RENATA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / PUENGASI / AV. SIMON BOLIVAR E17A

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / PUENGASI / AV. SIMON BOLIVAR E17A

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Rate de Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Consorcio Asfaltos C Y C

Identificación 1691728902001

Fecha 13/12/2022

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Salinas y Cotopaxi

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0003	0003	75.00	GAVIONES	gavión triple torsión 2x1x1	44.00	0.00	0.00	0.00	3300.00

Información Adicional

Descripción: Dirección Salinas y Cotopaxi Teléfono 0994008341 Correo consorcioasfaltoscyc2022@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3300.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	3300.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3300.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3300.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600380214001

FACTURA

No. 001-100-000000006

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1312202201160038021400120011000000000061585334412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/12/2022 09:40:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312202201160038021400120011000000000061585334412

PIEDRA AREVALO DARWIN ROLANDO

Dirección Matriz: Barrio: OBRERO Calle: MANABI Número: S/N Intersección: PICHINCHA

Dirección Sucursal: Barrio: OBRERO Calle: MANABI Número: S/N Intersección: PICHINCHA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ASFALTOS C Y C

Identificación 1691728902001

Fecha 13/12/2022

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		1,00	SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL EN EL PROYECTO "ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANT		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Información Adicional

Email: consorcioasfaltoscyc@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	336.00

SUBTOTAL 12%	300.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	300.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	36.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	336.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

All-Top Topografía
 Muñoz Villamarín Saskia Dayanara
 Dir.: Calle Casiao Marín sn y Severo Varg
 Puyo - Pastaza
RUC: 1600786220001
 Autorización SRI N° 1130832928

NOTA DE VENTA
 001-001-

00000005 X

Fecha de Emisión
 22 12 2022
 DIA MES AÑO

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Sr(es) CONSORCIO ASFALTOS CYC

Dirección: Salinas y Cutapan y Telf.:

RUC/CI: 1691728902001 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V./ VENTA
1	Replanteo y nieta con anial de base y asfalto en el Proyecto Neotec mología de base granular, masha resina y los Ame ries	3200,00	3200,00

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta De Crédito/ Débito Otros

TOTAL USD
 3200,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Original: Adquirente / Copia: Emisor

*Imprenta "ARTES" Fono: 03 2885 614 *Aut.: 14083 *RUC:1803599388001* José Luis Cárdenas Fonseca
 Impreso desde N° 000001 al 000025 Fecha Impresión: 16-12-2022 Válido hasta: 16 de Diciembre.-2023

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600547606001

FACTURA

No. 001-100-000000005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1212202201160054760600120011000000000051483572518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/12/2022 21:46:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212202201160054760600120011000000000051483572518

CRUZ PEREZ CESAR ANDRES

Dirección Barrio: LA MERCED Calle: VIA A UNION BASE
Matriz:

Dirección Barrio: LA MERCED Calle: VIA A UNION BASE
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:		CONSORCIO ASFALTOS C Y C							
Identificación	1691728902001	Fecha		12/12/2022	Placa / Matrícula:		Guía		
Dirección:	salinas y cotopaxi								

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		19.70	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA AL PROYECTO ASFALTOS C Y C ORGANOSILANOS EN BASE NAOTECNOLOGIA PARROQUIA TARQUI Y PUYO CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA		30.00	0.00	0.00	0.00	591.00
005		1.00	RODAJE RETROEXCAVADORA PARA EL PROYECTO		80.36	0.00	0.00	0.00	80.36

Información Adicional

Telefono: 0994008341
 Email: consorcioasfaltoscyc@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	751.92

SUBTOTAL 12%	671.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	671.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	80.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	751.92

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600380214001

FACTURA

No. 001-100-000000005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

121220220116003802140012001100000000052029416716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/12/2022 15:38:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



121220220116003802140012001100000000052029416716

PIEDRA AREVALO DARWIN ROLANDO

Dirección Matriz: Barrio: OBRERO Calle: MANABI Número: S/N Intersección: PICHINCHA

Dirección Sucursal: Barrio: OBRERO Calle: MANABI Número: S/N Intersección: PICHINCHA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ASFALTOS C Y C

Identificación 1691728902001

Fecha 12/12/2022

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
07		1.00	SERICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL EN EL PROYECTO "ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANT		300.00	0.00	0.00	0.00	300.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600495608001

FACTURA

No. 002-100-000000003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

091220220116004956080012002100000000039091954719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/12/2022 12:32:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



091220220116004956080012002100000000039091954719

ESCOBAR MONTENEGRO JUAN FERNANDO

Dirección Matriz: Calle: 3 FUNDADORES Número: S/N Intersección: 3 DE NOVIEMBRE

Dirección Sucursal: Ciudadela: DEL CHOFER Calle: CRISTOBAL COLON Intersección: PASAJE BALAO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ASFALTOS C Y C

Identificación 1691728902001

Fecha 09/12/2022 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: SALINAS Y COTOPAXI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002-004		10.00	VIAJES DE BASE		60.00	0.00	0.00	0.00	600.00

Información Adicional	
Teléfono:	0994008341
Email:	consorcioasfaltoscyc2022@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	600.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	600.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	600.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	600.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

MINA TARABITA
LLANO GASPATA MARIA ROSA
 Dir.: Via Macas km 1 1/2 Via Madre Tierra sn y Colonia Agua Santa 2
 Madre Tierra * Pastaza

NOTA DE VENTA
002-001-

RUC: 1600040594001 - **000000001** †
 Autorización SRI N° 1130750846

Fecha de Emisión
 09 / 12 / 2022
 DIA MES AÑO

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Sr(es): Consorcio Asbulfos C y C
 Dirección: Saúlbas y Cotacachi Telf.: _____
 RUC/CI: 1691728902001 Guía de Remisión: _____

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V./ VENTA
65	transporte Relleno	22,00	1430,00

FORMA DE PAGO
 Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta De Crédito/ Débito Otros **TOTAL USD**
 1430,00

[Firma] **FIRMA AUTORIZADA** [Firma] **RECIBI CONFORME**
 Original: Adquirente / Copia: Emisor

TRANSPORTE PESADO FREIRE CORTEZ S.A.

DIRECCIÓN: VIA PUYO TENA
PASTAZA - ECUADOR

PUNTO DE EMISION 001 - 004
RAZÓN SOCIAL: FREIRE CORTEZ REGINALDO RIGOBERTO
RUC.: 1600219057001
REGIMEN: GENERAL

FACTURA 001 - 004		
Nº 000068		
R.U.C.: 1691713381001		
AUT.S.R.I.: 1128960453		
DIA 21	MESES 10	AÑO 2022

AGENTE DE RETENCIÓN Y EL N° DE RESOLUCIÓN INAC-DHCRASC20-00000001

Señor: CONSORCIO ASFALTOS LXC

Dirección: Salinas y Cotacachi

RUC/CI: 1691728902001

Giro de Retención:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
5	TRANSPORTE PELLENO	36,00	180,00
3	TRANSPORTE PELLENO	58,00	174,00

<input checked="" type="checkbox"/> INYARI - AG 0983260V11 Vázquez Benavides Juan Fernando RUC: 0102315166001/AUT 13681 Serie: 000001 al 000100 Fecha de Activación: 26/Octubre/2021 Fecha de Caducidad: 26/Octubre/2022	SUBTOTAL..... 354,00 DESCUENTO I.V.A. 0% I.V.A. 12% TOTAL USD: 354,00
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO - DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS	 Recibi Conforme

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA 1 - EMISOR - COPIA 2 ARCHIVO

TRANSPORTE PESADO FREIRE CORTEZ S.A.

DIRECCIÓN: VIA PUYO TENA
PASTAZA - ECUADOR
PUNTO DE EMISION 001 - 004
RAZON SOCIAL: FREIRE CORTEZ REGINALDO RIGOBERTO
RUC: 1600219057001
REGIMEN: GENERAL

FACTURA 001 - 004
Nº 000067
R.U.C.: 1691713381001
AUT.S.R.I.: 1128960453

AGENTE DE RETENCIÓN Y EL N° DE RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001

DIA 21 MES 10 AÑO 22

Señor: CONSORCIO ASFALTOS ETC

Dirección: SAUMAS Y COTOACHI

RUC/CI: 1691728902001

Glos de Retención

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
6	TRANSPORTE RELLENO	58,00	348,00
8	TRANSPORTE RELLENO	36,00	288,00
1	DESPLAZO	10,00	10,00

IMVARI - AG Vázquez Benavides Juan Fernando
 0983260911 RUC: 0102315165001/AUT.13681
 Serie: 010051 al 090100
 Fecha de Autorización: 26/Octubre/2021
 Fecha de Caducidad: 26/Octubre/2022

SUBTOTAL..... 646,00
 DESCUENTO
 I.V.A. 0%
 I.V.A. 12 %
 TOTAL USD. 646,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO - DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Por el Emisor

CONSORCIO ASFALTOS CyC

Ruc: 1691728902001

Dir: Ciudadela el Chofer, Salinas y Cotopaxi



Puyo, 23 de enero 2023
Oficio N°- 017- CACyC-2023

Señor, Ingeniero:

Jaime Patricio Guevara Blaschke

PREFECTO PROVINCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

	GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA
Recibido:	<i>[Handwritten Signature]</i>
Fecha:	24 ENE 2023
Hora:	11:09
Numero:	15560-E

En su Despacho.-

Quien suscribe, en calidad de Procurador común del CONSORCIO ASFALTOS CyC el cual ejecuta el Proyecto: **ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**, legalmente celebrado, y suscrito a satisfacción de las partes contratantes el 29 de julio del 2022, pongo en consideración lo siguiente:

Culminado los trabajos del contrato celebrado entre las partes, en base a la **LOSNCP** se solicita proceda con la **RECEPCIÓN PROVISIONAL** del Proyecto en referencia.

Cordialmente,



ELIO ANDRÉS
ALVAREZ
CASTILLO

Ing. Elio Andrés Álvarez
PROCURADOR COMÚN
CONSORCIO ASFALTOS CyC
CONTRATISTA

Copia:

Ing. Daniel Ramos
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO
Ing. Robert Quintana
FISCALIZADOR

CONSORCIO ASFALTOS CyC

Ing. Elio Andrés Álvarez: 0994008341.

e-mail: andresalvarezcastillo@outlook.com

DIRE. DOPPE SE RECIBIÓ CON FECHA 24 ENE 2023 11:09

Anexo 12. Oficio solicitud de recepción

Anexo 11. Estado actual del proyecto



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600434151001

FACTURA

No. 001-100-000000006

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

081220220116004341510012001100000000062585218413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/12/2022 11:23:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



081220220116004341510012001100000000062585218413

ROSERO MARTINEZ HAMILTON ALEXIS

Dirección Matriz: Barrio: EL CHOFER Calle: MANABI Número: SN Intersección: ATAHUALPA

Dirección Sucursal: Barrio: EL CHOFER Calle: MANABI Número: SN Intersección: ATAHUALPA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CONSORCIO ASFALTOS C Y C

Identificación 1691728902001

Fecha 08/12/2022

Placa / Matriculación:

Guía

Dirección: SALINAS Y COTOPAXI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004		61.90	ALQUILER DE MAQUINARIA EN EL PROYECTO ESTABILIZACION DE LA BASE GRANULAR MUSHUWARMÍ EN LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGIA Y EMULSION ASFALTICA.		45.00	0.00	0.00	0.00	2785.50

Información Adicional

Telefono: 0994008341

Email: consorcioasfaltoscyc@gmail.com

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

3119.76

SUBTOTAL 12%	2785.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2785.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	334.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3119.76

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791290275001

FACTURA

No. 001-003-000001432

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0712202201179129027500120010030000014320000450114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/12/2022 12:46:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0712202201179129027500120010030000014320000450114

BREM CIA LTDA

BREM CIA LTDA

Dirección Matriz: Pasaje Alfonso Jerves N26-114 y Av. Orellana

Dirección Sucursal: Pasaje Alfonso Jerves N26-114 y Av. Orellana

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

● te de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ASFALTOS C Y C

Identificación 1691728902001

Fecha 07/12/2022

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Salinas y Cotopaxi

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
IPZYDE004		1600.00	TERRASIL		19.35	0.00	0.00	0.00	30960.00

Información Adicional	
em	consorcioasfaltoscyc2022@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34675.20

SUBTOTAL 12%	30960.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30960.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3715.20
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34675.20
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

ALTAMIRANO LITUMA MÓNICA ADRIANA
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:
 PIEDRA, ARENA, GRAVA, CEMENTO, ETC.
 Dir.: Vía a Puerto Santa Ana
 Pastaza

R.U.C.: 1600524639001

FACTURA 001-001-

00000072

AUT.SRI: 1129812645

FECHA EMISION: 16/12/2022

R.U.C / C.I. 1691720902001

GUÍA DE REMISIÓN:

Sr(es): CONSORCIO ASFALTO CYC

DIRECCION: SAUCES Y COTOPAXI

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
12	MATERIAL TRINCHADO	150,00	1800,00
32	MATERIAL TRINCHADO	150,00	4800,00

FORMA DE PAGO Original: Adquirente / Copia: Emisor

EFFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/ DEBITO
 OTROS



RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 6.600,00

DESCUENTO

IVA 12 %

IVA 0 %

VALOR TOTAL 6.600,00

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aul: 14083 RUC: 1803599388001 José Luis Cárdenas Fonseca
 Impreso desde Nº 000051 al 000100 Fecha Impresión: 19-04-2022 Válido hasta: 19 de Abril -2023

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400310361001

FACTURA

No. 001-003-000030158

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3011202201140031036100120010030000301587477040611

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 01/12/2022 17:31:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3011202201140031036100120010030000301587477040611

RIVERA OTACOMA BLANCA MARLENE

FERRETERIA TOAPANTA RIVERA

Dirección Matriz: 27 DE FEBRERO Y TENIENTE HUGO ORTIZ

Dirección Sucursal: 27 DE FEBRERO Y TENIENTE HUGO ORTIZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

● te de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CONSORCIO ASFALTOS C Y C

Identificación 1691728902001

Fecha 30/11/2022

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CA001375		3.00	CUMBRERO ANCHO T/D 3MTS		6.92	0.00	0.00	0.00	20.76
PLS00044		9.00	PLASTICO NEGRO 1.50*2		1.75	0.00	0.00	0.00	15.75
PLS00044 1		24.00	PLASTICO NEGRO 1.50*2		1.75	0.00	0.00	0.00	42.00
Z001352		24.00	ZINC ACESCO 3.60*0.20		8.35	0.00	0.00	0.00	200.36
CLA00036 6		3.00	CLAVO P MD 2 C C		1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
C06092		1.00	INODORO MILAN BLANCO FV		51.79	0.00	0.00	0.00	51.79
LL001305		1.00	LAVAVO ROMA BLANCO FV		26.79	0.00	0.00	0.00	26.79
25049		1.00	FREGADERO 304 PAOLO 120*50		70.54	0.00	0.00	0.00	70.54
CLA00036 8		5.00	CLAVO P MD 2 1/2 C C		1.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	488.31

SUBTOTAL 12%	435.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	435.99
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	52.32
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	488.31
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

COOPERATIVA RIO PASTAZACOOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA
EN VOLQUETES RIO PASTAZA

Dir.: Las Palmas Av. Alberto Zambrano s/n

PUYO - PASTAZA

"AGENTE DE RETENCIÓN No. RESOLUCIÓN 1"

Fecha de Emisión: 23 11 2022
DIA MES AÑO

RUC: 1690015133001

FACTURA

001 - 012 -

0000189

Aut. SRI N°1130245952

Sr.(es): Consorcio Asfaltos CYCDirección: Salinas y CatapaxiRUC/CI: 1691729902001 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. / VENTA
91	transporte base	60.00	5460.00
11	transporte base	45.00	495.00
1	transporte Desarrollo	10.00	10.00
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	5965.00
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		IVA %	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		IVA 0%	
OTROS	/	TOTAL \$	5965.00
		RECIBI CONFORME	
PUNTO DE EMISIÓN: 012			
RUC.: 1600376402001 CONTRIBUYENTE: RÉGIMEN GENERAL			
RAZON SOCIAL: LOZADA MARTINEZ ALEX RAFAEL			

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Carrión Jenny del Carmen
Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo - Telef.: 2888-257 - Aut. 3306
RUC. 160097552001 - F Impresión 21/07/2022 del 0000176 al 0000225 - Válido 21/07/2023

ORIGINAL: Adquiere - IERA. COPIA: Emisor - ZDA. COPIA: Sin Valor Tributario

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO ESCOBAR
GUEVARA SERVESCOG CIA LTDA
 Dir.: Cristobal Colón y calle s/n
 PUYO - PASTAZA
RUC: 1691705427001
AUT. SRI. 1129815060

FACTURA
 S 001- 005
 Nº **00000147**
 FECHA: **28** / **11** / **2022**
DÍA MES AÑO

Sr: CONSORCIO ASFALTOS CYC
 Dirección: Salinas y Colapaxi
 RUC/CI: 1691728902001 Guía de Remisión: _____ Teli: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL
18	TRANSPORTE DE MATERIAL BASE EN EL PROYECTO	60,00	1.080,00
	10		

AGENTE DE RETENCION N° Resolución 1		SUB-TOTAL 12%	
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 0%	1.080,00
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	 FIRMA AUTORIZADA RESEÑA CONFORME	DESCUENTOS	
<input type="checkbox"/> DIN. ELECTRÓNICO		SUBTOTAL	
<input type="checkbox"/> TARJETA DÉB/CRED		IVA 12%	
<input type="checkbox"/> OTROS		VALOR TOTAL	1.080,00

PUNTO DE EMISIÓN: 005 RUC: 1600095747001 RÉGIMEN: GENERAL
 RAZÓN SOCIAL: ESCOBAR HIDALGO JESUS EMILIANO * PLACA .:

CHÁVEZ PUALACÍN HOMERO JHOFFRE Aut.13356 Imp. 19/ Abril/2022
 RUC. 1600492944001 N° 000101 al 000150 / CADUCA: 19/ Abril/2023

Original: ACCURRIENTE y Copias: EMCCOR 2 Copias: SRI Remisorio o Chesto 7/abril/2022

TRANSPORTE PESADO FREIRE CORTEZ S.A.

DIRECCIÓN: VIA PUYO TENA
PASTAZA - ECUADOR

PUNTO DE EMISIÓN 001 - 002
RAZÓN SOCIAL: FREIRE CORTEZ ROMULO RUPERTO
R.U.C.: 1602057560001
REGIMEN: GENERAL

FACTURA 001 - 002

Nº 000110

R.U.C.: 1691713381001
AUT S.R.L. 1130662378

AGENTE DE RETENCIÓN Y EL N° DE RESOLUCIÓN NACIONAL 001-990000:

DIA 27
MES 11
AÑO 2022

Señor: Consorcio Asfaltos C y C

Dirección: Salinas y Cotacachi

RUC/C: 1691720902001

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL								
9	transporte base	60,00	540,00								
2	transporte base	45,00	90,00								
<input checked="" type="checkbox"/> INVARI - AG Vázquez Benavides Juan Francisco <small>DPR3240911 RUC: 0102316186001/AUT.13621</small>			SUBTOTAL								
<small>Serie: 000101 a 000195 Fecha de Adopción: 01/Noviembre/2022 Fecha de Caducidad: 01/Noviembre/2023</small>			DESCUENTO								
<small>FORMA DE PAGAR</small> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; border: 1px solid black;"><input type="checkbox"/> EFECTIVO</td> <td style="width: 60%; border: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;"><input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO</td> <td style="border: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;"><input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO - DEBITO</td> <td style="border: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;"><input type="checkbox"/> OTROS</td> <td style="border: 1px solid black;"> </td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/> EFECTIVO		<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO - DEBITO		<input type="checkbox"/> OTROS		I.V.A. 0%
<input type="checkbox"/> EFECTIVO											
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO											
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO - DEBITO											
<input type="checkbox"/> OTROS											
<div style="text-align: center;"> <small>Fecha: 27/11/2022</small> </div>			I.V.A. 12%								
			TOTAL USD								
			630,00								

COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO RIO AMAZONAS
 COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO RIO AMAZONAS
 Dir.: Cononaco s/n y Conambo
 PUYO - PASTAZA
 "Régimen Simplificado para EPS"

RUC: 1690019376001
FACTURA 001-006
 0000000350
 AUTORIZACIÓN SRI # 1129206774

Fecha de Emisión: 28 11 2022
DIA MES AÑO

Documento Categorizado: NO
 Guía de Remisión: _____

Cliente: Consorcio Asfaltos S y C
 Dirección: Ciudadela del Choler, Salinas y Colopari
 RUC./C.I.: 1691728902001 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VUNTARIO	V./TOTAL
1	Servicio transporte Chapinza Mushu Warmi	200.00	200.00
1	Servicio transporte Mushu Warmi Las Américas	100.00	100.00
1	Servicio transporte Las Américas Mushu Warmi	100.00	100.00
2	Servicio transporte Mbojudedo	100.00	200.00
1	Servicio transporte Pifrisca a San Jacinto	380.00	380.00

Punto de Emisión: 001-006 Régimen: GENERAL
 RUC: 1600277113001 Placa: SAA 1179
 Razón Social: VILLAVICENCIO GUEVARA VILMA ISABEL
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0%	980.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	980.00
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	980.00


 FIRMA AUTORIZADA

 RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Adquirente - 1RA. COPIA: Emisor
 2DA. COPIA: Sin Valor Tributario

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Av. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2695 032
 RUC: 0601582935001 del 000301 al 000350 - F. Autorización: 16-DICIEMBRE-2021 - F. Caducidad: 16-DICIEMBRE-2022

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600317059001

FACTURA

No. 001-100-000000006

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

301120220116003170590012001100000000069046758115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/11/2022 23:38:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



301120220116003170590012001100000000069046758115

VILEMA VILLA MARIA PATRICIA

Dirección Calle: CESLAO MARIN
Matriz:

Dirección Calle: CESLAO MARIN
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ASFALTOS C Y C

Identificación 1691728902001

Fecha 30/11/2022

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: SALINAS Y COTOPAXI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	HONORARIOS CONTADORA MES DE NOVIEMBR		312.50	0.00	0.00	0.00	312.50

Información Adicional

Teléfono: 0994008341

Email: consorcioasfaltoscyc@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	350.00

SUBTOTAL 12%	312.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	312.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	37.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	350.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600380214001

FACTURA

No. 001-100-000000004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

231120220116003802140012001100000000044657152514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/11/2022 08:41:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



231120220116003802140012001100000000044657152514

PIEDRA AREVALO DARWIN ROLANDO

Dirección Matriz: Barrio: OBRERO Calle: MANABI Número: S/N Intersección: PICHINCHA

Dirección Sucursal: Barrio: OBRERO Calle: MANABI Número: S/N Intersección: PICHINCHA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ASFALTOS C Y C

Identificación 1691728902001

Fecha 23/11/2022

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000		2.00	SERICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL EN EL PROYECTO "ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANT		300.00	0.00	0.00	0.00	600.00

Información Adicional	
Email:	consorcioasfaltoscyc@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	672.00

SUBTOTAL 12%	600.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	600.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	72.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	672.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790007502001

FACTURA

No. 007-001-000182582

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111202201179000750200120070010001825820909484915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/11/2022 20:48:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111202201179000750200120070010001825820909484915

SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.

SEGUROS EQUINOCCIAL

Dirección DE LAS HIEDRAS N41-130 Y AV. DE LOS GRANADOS
Matriz:

Dirección RODRIGO PACHANO 1589 INTERSECCION DELICIA
Sucursal:

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:		CONSORCIO ASFALTOS C Y C	
Identificación	1691728902001	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	21/11/2022		
Dirección:	SALINAS SN COTOPAXI		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
9094849		1.00	BUEN USO DE ANTICIPO		528.95	0.00	0.00	0.00	528.95

Información Adicional	
prim:	505,72
sucursal:	AMBATO
vigDesde:	22/11/2022
vigHasta:	22/12/2022
nroPoliza:	43818
nroEndoso:	13861
negocio:	BUEN USO DE ANTICIPO
SUPER INTENDENCIA 3,50%:	17,70
SEGURO SOCIAL CAMPESINO	2,53
DERECHO DE EMISION:	3,00
mailCliente:	consorcioasfaltoscyc@gmail.com
Dispositivo de T.:	0,00

SUBTOTAL 12%	528.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	528.95
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	63.47
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	592.42

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	592.42

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600415341001

FACTURA

No. 001-100-000000004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

151120220116004153410012001100000000044051351511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/11/2022 16:04:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



151120220116004153410012001100000000044051351511

HIDALGO CASTILLO JUAN CARLOS

Dirección Matriz: Calle: SALINAS Número: S/N Intersección: COTOPAXI

Dirección Sucursal: Calle: SALINAS Número: S/N Intersección: COTOPAXI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ASFALTOS C Y C

Identificación 1691728902001

Fecha 15/11/2022

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: SALINAS Y COTOPAXI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		3.00	SERVICIO DE LOGISTICA EN EL PROYECTO ESTABILIZACION DE LA BASE GRANULAR DE LA VIA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A MANOTECNOLOGIA Y EMULSION ASFALTICA SECTOR SAN JACINTO PARROQUIA TARQUI Y DE LA	VIA HACIA LA COLINIA SANTA ISABEL SECTOR LAS AMERICAS PARROQUIA PUYO CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE	1339.29	0.00	0.00	0.00	4017.87

Información Adicional

Email: consorcioasfaltoscyc@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4500.01

SUBTOTAL 12%	4017.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4017.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	482.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4500.01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790007502001

FACTURA

No. 007-001-000182738

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311202201179000750200120070010001827380909663115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/11/2022 12:57:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311202201179000750200120070010001827380909663115

SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.

SEGUROS EQUINOCCIAL

Dirección DE LAS HIEDRAS N41-130 Y AV. DE LOS GRANADOS
Matriz:

Dirección RODRIGO PACHANO 1589 INTERSECCION DELICIA
Sucursal:

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CONSORCIO ASFALTOS C Y C		
Identificación	1691728902001	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	23/11/2022		
Dirección:	SALINAS SN COTOPAXI		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
9096631		1.00	FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		52.50	0.00	0.00	0.00	52.50

Información Adicional	
primaria:	50.00
sucursal:	AMBATO
vigDesde:	23/11/2022
vigHasta:	20/08/2023
nroPoliza:	53396
nroEndoso:	0
negocio:	FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
SUPER INTENDENCIA 3.50%:	1.75
SEGURO SOCIAL CAMPESINO	0.25
DERECHO DE EMISION:	0.50
mailCliente:	consorcioasfaltoscyc@gmail.com
Dispositivo de T.:	0.00

SUBTOTAL 12%	52.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	52.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.30
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	58.80

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	58.80

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0691758516001

FACTURA

No. 001-111-000016543

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311202201069175851600120011110000165431234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/11/2022 20:45:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311202201069175851600120011110000165431234567813

COMERCIAL SAN FRANCISCO COMSAFRAN CIA. LTDA.

COMSAFRAN CIA. LTDA

Dirección Matriz: AV ALFONSO CHAVEZ SN Y EL ESPECTADOR - Telef - 032370245

Dirección Sucursal: AV ALFONSO CHAVEZ SN Y EL ESPECTADOR - Telef - 032370245

Contribuyente Especial 954E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ASFALTOS C Y C

Identificación 1691728902001

Fecha 23/11/2022

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: SALINAS Y COTOPAXI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
047010003	047010003	660.00	CEMENTO CA ANTIHUMEDAD 50KG		6.65	0.00	0.00	0.00	4390.12

Información Adicional

DIRECCIÓN: SALINAS Y COTOPAXI
TELÉFONO: 0983286135
EMAIL: consorcioasfaltoscyc2022@gmail.com
VENDEDOR: 010-0604533190-ERAZO YUQUI JUAN CARLOS
VENCER: 2022/12/23
DÍAS PLAZO: 030

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4916.93

SUBTOTAL 12%	4390.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4390.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	526.81
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4916.93

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600547606001

FACTURA

No. 001-100-00000003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

221120220116005476060012001100000000033430329017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/11/2022 10:27:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



221120220116005476060012001100000000033430329017

CRUZ PEREZ CESAR ANDRES

Dirección Matriz: Barrio: LA MERCED Calle: VIA A UNION BASE

Dirección Sucursal: Barrio: LA MERCED Calle: VIA A UNION BASE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CONSORCIO ASFALTOS C Y C		
Identificación	1691728902001	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	22/11/2022		
Dirección:	salinas y cotopaxi		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003		3.00	ALQUILER RETROEXCAVADORA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE ASFALTO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y PLUVIAL BARRIO JUAN MONTALVO CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA		30.00	0.00	0.00	0.00	90.00
004		1.00	RODAJE RETROEXCAVADORA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE ASFALTO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y PLUVIAL BARRIO JUAN MONTALVO CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA		40.00	0.00	0.00	0.00	40.00

Información Adicional	
Telefono:	0994008341
Email:	consorcioasfaltoscyc@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	145.60

SUBTOTAL 12%	130.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	130.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	15.60
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	145.60

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total

ELECTROMECAÁNICA INTERNACIONAL

ZURITA SONO LEONIDAS RODRIGO
SERVICIO TÉCNICO Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

Dir.: Madre de la Merced Pasaje 1 E14-43 y Calle G
Telf.: 3452-012 / 09 9337 2660
E-mail: electromecanica_internacional@hotmail.com • Quito - Ecuador
rodruzura@gmail.com

RUC: 1712680949001

FACTURA

No. 001-001-00 0001174

Fecha de Autorización: 11/MAYO/2022
Fecha de Caducidad: 11/MAYO/2023
Número de Autorización: 1129916986

Facturado A

Fecha: 01-11-2022

Cliente: Consorcio Asfaltos C y C
Dirección: Avenida de la Libertad, Soledad
C.I./R.U.C.: 1691728902001
Telf.:

Código Cliente	Código Cliente	Vencimiento
Nota de Entrega	Orden de compra	Vendedor

Cantidad	Código	Descripción	P. Venta	P. Total
27.30		Alquiler de motor niveladora	40.00	1092.00

Observaciones:

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de ELECTROMECAÁNICA INTERNACIONAL en el lugar que se reconvenga el valor total expresado en este documento, más el máximo interés legal por mora autorizado. Sin protesto eximese de presentación, para el pago así como de aviso por falta de este hecho. Denuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Quito y al trámite ejecutivo o verbal sumario a la elección de la empresa vendedora a sus cesaríos. Acepto que la empresa vendedora ceda y transfiera en cualquier momento los derechos de este documento sin que sea necesaria notificación de mi parte. Suscribo esta factura en conformidad con todos sus términos.

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN - RIMPE

SON:

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS

SUBTOTAL % 1092.00

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12% 131.04

TOTAL 1223.04

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600415341001

FACTURA

No. 001-100-000000004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

151120220116004153410012001100000000044051351511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/11/2022 16:04:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



151120220116004153410012001100000000044051351511

HIDALGO CASTILLO JUAN CARLOS

Dirección Matriz: Calle: SALINAS Número: S/N Intersección: COTOPAXI

Dirección Sucursal: Calle: SALINAS Número: S/N Intersección: COTOPAXI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ASFALTOS C Y C

Identificación 1691728902001

Fecha 15/11/2022

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: SALINAS Y COTOPAXI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00		3.00	SERVICIO DE LOGISTICA EN EL PROYECTO ESTABILIZACION DE LA BASE GRANULAR DE LA VIA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A MANOTECNOLOGIA Y EMULSION ASFALTICA SECTOR SAN JACINTO PARROQUIA TARQUI Y DE LA	VIA HACIA LA COLINIA SANTA SABEL SECTOR LAS AMERICAS PARROQUIA PUYO CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE	1339.29	0.00	0.00	0.00	4017.87

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600739955001

FACTURA

No. 001-100-000000004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1011202201160073995500120011000000000047050288712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/11/2022 22:41:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1011202201160073995500120011000000000047050288712

SARMIENTO SANCHEZ MARJORIE ESTEFANIA

Dirección Matriz: Calle: CARRION Número: SN Intersección: AVENIDA LA UNIDAD

Dirección Sucursal: Calle: CARRION Número: SN Intersección: AVENIDA LA UNIDAD

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ASFALTOS C Y C

Identificación: 1691728902001

Fecha: 10/11/2022 Placa / Matrícula:

Dirección: CIUDADELA EL CHOFER, SALINAS Y COTOPAXI S/N

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S004		1.00	HONORARIO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO MES DE OCTUBRE-2022		223.21	0.00	0.00	0.00	223.21

Información Adicional

Email: consorcioasfaltoscyc@gmail.com

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 250.00

SUBTOTAL 12%	223.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	223.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	26.79
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	250.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

COOPERATIVA RIO PASTAZA
 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA
 EN VOLQUETES RIO PASTAZA
 Dir.: Las Palmas Av. Alberto Zambrano s/n
 PUYO - PASTAZA
 "AGENTE DE RETENCIÓN No. RESOLUCIÓN 1"

RUC: 1690015133001

FACTURA
 001 - 012 -

Fecha de Emisión:

10	11	2022
DÍA	MES	AÑO

0000187
 Aut. SRI N°1130245952

Sr.(es): CONSORCIO ASFALTOS CYC
 Dirección: SALINAS Y CATOPAXI
 RUC/CI: 1691720902001 Guía de Remisión: _____

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V./VENTA
45	TRANSPORTE BASE	45,00	2025,00
4	TRANSPORTE RELENDO	45,00	180,00

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	2205,00
<input type="checkbox"/>	EFECTIVO	DESCUENTO	
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	IVA %	
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	IVA 0%	
<input type="checkbox"/>	OTROS	TOTAL \$	2205,00

PUNTO DE EMISIÓN: 012
 RUC.: 1600376402001 CONTRIBUYENTE: RÉGIMEN GENERAL
 RAZON SOCIAL: LOZADA MARTINEZ ALEX RAFAEL

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Carrión Jenny del Carmen
 Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo - Telef.: 2888-257 - Aut. 3306
 RUC. 1600097552001 - F. Impresión 21/07/2022 del 0000176 al 0000225 - Válido 21/07/2023

ORIGINAL - Adquiriente - TERA. COPIA - Emisor - ZDA. COPIA - Sin Valor Tributario

**COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA
EN VOLQUETES TRANSCHEVI CIA LTDA**
Dir.: Av. Brasilia y Asunción
PUYO - PASTAZA

**RUC: 1691708337001-
FACTURA 001-010**

000000208 *f*

AUTORIZACIÓN SRI # 1138307755

Fecha de Emisión:

18	11	2022
DIA	MES	AÑO

Documento Categorizado: NO

Guía de Remisión: _____

Cliente: CONSORCIO ASFALTOS CYC

Dirección: Salinas y Cotopaxi

RUC/C.I.: 1691728902001 Telf.: _____

CANT	DESCRIPCION	VUNITARIO	V/TOTAL
8	TRANSPORTE DE MATERIAL BASE	4500	360,00

Punto de Emisión: 001-010 Régimen: GENERAL

RUC: 1400560817001 Placa: _____

Razón Social: RIVERA OTACOMA MILTON EDUARDO

FORMA	ESPECIFICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DE PAGO	DINERO ELECTRONICO	OTROS

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0%	360,00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	360,00

ORIGINAL: Adquirente - 1RA. COPIA: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME

2DA. COPIA: Sin Valor Tributario

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2885 032
RUC 0601582355001-del 0000201 al 0000300 - F. Autorización 04-AGOSTO-2022- F. Caducidad 04-AGOSTO-2023

Anexo 9. Fundas para desechos comunes



Anexo 10. Botellón de agua en obra



Anexo 8 Buzón de quejas



Anexo 7. Botiquín y extintor



Anexo 6. Kit anti derrames



Anexo 5. Volqueta con lona







GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA



DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Pastaza

23 MAR 2023

Fecha:

Recibido:

JOMARA M.

Número:

Hora:

15h26

Memorando Nro. GADPPZ-DGA-2023-14266-M

Puyo, 22 de marzo de 2023

PARA: Sr. Ing. Álvaro Renato Sosa Castro
Director de Fiscalización

ASUNTO: CONFORMIDAD AMBIENTAL DEL CONTRATO COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-009-2022

De mi consideración:

Estimado Director, en atención al memorando GADPPZ-JGA-GA-2023-6635-M, suscrito por el Ing. Jorge Antonio Vargas Escobar JEFE DE GESTIÓN AMBIENTAL (E), adjunto al presente el informe ambiental de cumplimiento con su respectivas **OBSERVACIONES SUBSANADAS** del proyecto "ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", correspondiente al periodo del **01 de enero al 24 de enero del 2023**, para su revisión y evaluación respectivo, al respecto, remito el memorando No. GADPPz-DGA-2023-14141-M suscrito por el Ing. Joseph Mésias Chimbo Zabala, responsable del monitoreo y control ambiental.

Al respecto, conforme a la documentación ingresada y luego del análisis al Informe de Cumplimiento a la Guía de Buenas Prácticas Ambientales descrito mediante **INFORME No.003-DGA-FA-JGA - JCH - 2023**, se determina que la Contratista **CUMPLE** con lo que respecta a la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, por lo que se concede la **CONFORMIDAD AMBIENTAL** bajo la revisión y criterio técnico del Ing. Joseph Mésias Chimbo Zabala, del mencionado proyecto, con la finalidad de seguir los trámites pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. David Alejandro Yedra Machado
DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

Referencias:

- GADPPZ-JGA-GA-2023-6635-M

Anexos:

- check_list_liquidación.pdf
- informe_enero_2023-signed-2_firmado.pdf
- 1er_oficio_de_ingreso.pdf
- informe_de_conformidad_-_planilla_de_liquidación-signed.pdf
- img20230217_14530547.pdf



Memorando Nro. GADPPZ-DGA-2023-14266-M

Puyo, 22 de marzo de 2023

- img20230217_14512171.pdf

Copia:

Sr. Ing. Jorge Antonio Vargas Escobar - **Jefe de Gestión Ambiental (E)** / Sra. Lcda. Mayra Elizabeth Yucailla Valencia - **Asistente Administrativo 1 /**

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Lcda. Mayra Elizabeth Yucailla Valencia - Asistente Administrativo 1



DAVID ALEJANDRO
YEDRA MACHADO



Memorando Nro. GADPPZ-JGA-GA-2023-6635-M

Puyo, 13 de marzo de 2023

PARA: Sr. Mgs. David Alejandro Yedra Machado
Director de Gestión Ambiental

ASUNTO: CONFORMIDAD AMBIENTAL DEL CONTRATO COTIZACIÓN DE
OBRA-GADPPz-009-2022

De mi consideración:

Estimado Director, en referencia al **Oficio N°-013-CACyC-2023**, el Contratista Ing. ELIO ANDRÉS ÁLVAREZ CASTILLO – PROCURADOR COMUN – CONSROCIO ASFALTOS C Y C, ingresa a la Dirección de Gestión Ambiental el 17 de febrero del 2023, el Informe de Cumplimiento Ambiental a la Guía de Buenas Prácticas Ambientales con su respectivas **OBSERVACIONES SUBSANADAS** del proyecto “**ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**”, correspondiente al periodo del **01 de enero al 24 de enero del 2023**, para su revisión y evaluación respectivo, al respecto, remito el memorando No. GADPPz-DGA-2023-14141-M, responsable del monitoreo y control ambiental.

Al respecto, conforme a la documentación ingresada y luego del análisis al Informe de Cumplimiento a la Guía de Buenas Prácticas Ambientales descrito mediante **INFORME No.003-DGA-FA-JGA/JCH - 2023**, se determina que la Contratista **CUMPLE** con lo que respecta a la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, por lo que se concede la **CONFORMIDAD AMBIENTAL** bajo la revisión y criterio técnico del Ing. Joseph Mésias Chimbo Zabala, del mencionado proyecto.

Para lo cual, se solicita poner en conocimiento de la Dirección de Fiscalización, con la finalidad de seguir los trámites pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Antonio Vargas Escobar
JEFE DE GESTIÓN AMBIENTAL (E)

Referencias:
- GADPPZ-DGA-2023-14141-M



Memorando Nro. GADPPZ-JGA-GA-2023-6635-M

Puyo, 13 de marzo de 2023

Anexos:

- img20230217_14512171.pdf
- img20230217_14530547.pdf
- informe_de_conformidad_-_planilla_de_liquidación-signed.pdf
- 1er_oficio_de_ingreso.pdf
- informe_enero_2023-signed-2_firmado.pdf
- check_list_liquidación.pdf

Copia:

Sr. Ing. Joseph Mesias Chimbo Zabala - **Técnico de Calidad Ambiental** / Sra. Lcda. Mayra Elizabeth Yucailla Valencia - **Asistente Administrativo 1** /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Lcda. Mayra Elizabeth Yucailla Valencia - Asistente Administrativo 1



JORGE ANTONIO
VARGAS ESCOBAR



Memorando Nro. GADPPZ-DGA-2023-14141-M

Puyo, 10 de marzo de 2023

PARA: Sr. Ing. Jorge Antonio Vargas Escobar
Jefe de Gestión Ambiental (E)

ASUNTO: CONFORMIDAD AMBIENTAL DEL CONTRATO COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-009-2022

En respuesta al Documento No. GADPPZ-DGA-2023-0933-E

Estimado Ingeniero, en el marco del Área de Gestión Ambiental se encuentra establecido el proyecto de Regularización, Seguimiento y Control Ambiental de las Actividades a Desarrollarse por el GADPPz, es así que en referencia al **Oficio N°-013-CACyC-2023**, el Contratista Ing. ELIO ANDRÉS ÁLVAREZ CASTILLO – PROCURADOR COMUN – CONSROCIO ASFALTOS C Y C, ingresa a la Dirección de Gestión Ambiental el 17 de febrero del 2023, el Informe de Cumplimiento Ambiental a la Guía de Buenas Prácticas Ambientales con su respectivas **OBSERVACIONES SUBSANADAS** del proyecto **“ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”**, correspondiente a las actividades desarrolladas en el periodo 01 de enero al 24 de enero del 2023.

Al respecto, conforme a la documentación ingresada y luego del análisis al Informe de Cumplimiento a la Guía de Buenas Prácticas Ambientales descrito mediante **INFORME N° 003-DGA-FA-JGA-JCH-2023** se determina que la Contratista **CUMPLE** con lo que respecta a la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, por lo que se concede la **CONFORMIDAD AMBIENTAL** del mencionado proyecto.

Para lo cual, se solicita poner en conocimiento de la Dirección de Fiscalización, con la finalidad de seguir los trámites pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Joseph Mesias Chimbo Zabala
TÉCNICO DE CALIDAD AMBIENTAL

Referencias:
- GADPPZ-DGA-2023-0933-E

Recibido
10-03-2023
16:50



Memorando Nro. GADPPZ-DGA-2023-14141-M

Puyo, 10 de marzo de 2023

Anexos:

- img20230217_14530547.pdf
- img20230217_14512171.pdf
- check_list_liquidación.pdf
- informe_enero_2023-signed-2_firmado.pdf
- ler_oficio_de_ingreso.pdf
- informe_de_conformidad_-_planilla_de_liquidación-signed.pdf



Firmado electrónicamente por:
JOSEPH MESTAS
SCHIMBO ZABALA



INFORME No. 003-DGA-FA-JGA-JCH-2023

Proyecto:	ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
Responsable de Seguimiento:	Ing. Joseph Chimbo
Contratista:	Ing. Elio Andres Alvarez Castillo – Procurador Común – Consorcio Asfaltos C Y C
Fiscalizador:	Ing. Robert Quintana
Administrador de Contrato:	Ing. Daniel Ramos
Monto total del contrato:	USD \$351.593,285 / TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 285/100).
Plazo del Contrato:	120 días, contados a partir de la ORDEN DE INICIO emitida por el ADMINISTRADOR DE CONTRATO

1. ANTECEDENTES.

Que, mediante Memorando Nro. GADPPZ-DGA-2022-11706-M, se designa a mi persona como responsable del Seguimiento, Monitoreo y Control Ambiental para el proyecto "ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Que, mediante **CERTIFICADO AMBIENTAL No. MAAE-SUIA-DZDCH-2022-CA-0204** con código del Proyecto **NO. MAAE-RA-2022-426031**, de fecha 17 de marzo de 2022 el Ministerio del Ambiente, Agua, y Transición Ecológica aprueba el Certificado Ambiental y la Guía de Buenas Prácticas ambientales a favor de **“MANTENIMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTEGNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTEGNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”**

En la ciudad de Puyo, a los veinte y nueve (29) días del mes de julio del año dos mil veinte y dos, comparecen a la suscripción del presente Contrato, por una parte, en calidad de Contratante, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, legalmente representado por el Ing. Jaime Patricio Guevara Blaschke, Prefecto Provincial; y, por otra parte, en calidad de Contratista, el CONSORCIO ASFALTOS C Y C, con su Procurador Común Ing. Elio Andrés Álvarez Castillo, las partes se obligan en virtud del presente Contrato.

En la ciudad de Puyo, a los veinte y seis (26) días del mes de septiembre de 2022, se procede a la entrega del sitio donde se ejecutarán los trabajos concernientes al Contrato con fecha 29 de julio de 2022, cuyo objeto de contratación es: **“ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”**. Por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza con su representante legal Ing. Guevara Blaschke Jaime Patricio, Prefecto de Pastaza; por otra parte, el Consorcio Asfaltos CYC, con su Procurador Común el Ing. Álvarez Castillo Elio Andrés, Contratista; para este propósito se reúnen el Ing. Ramos Campaña Daniel Aníbal, en calidad de Administrador de Contrato, el Ing. Quintana Muñoz Robert Fernando en calidad de Fiscalizador de obra, los mismos en representación del GADPPz y el contratista ejecutor, con la finalidad de suscribir la presente Acta de inicio de obra.

En la **CLAUSULA TERCERA: PLAZO.-** En conformidad con lo previsto en la Cláusula Octava del contrato, el plazo previsto para ejecutar la totalidad de los trabajos es de Ciento Veinte (120) días, contados a partir de la fecha de **ORDEN DE INICIO** de obra, por tanto, se inicia a partir de la misma.

Con **Oficio N°-002-CACyC-2022** de fecha 30 de septiembre de 2022, el Contratista CONSORCIO ASFALTOS CyC representado legalmente por su Procurador Común Ing. Elio Andrés Álvarez, ingresa a la Dirección de Gestión Ambiental el Informe de Cumplimiento Ambiental del proyecto **“ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”**, correspondiente a las actividades del período del 27 de septiembre al 30 de septiembre del año 2022.

Mediante **Oficio Nro. GADPPZ-DGA-2022-1443-O**, se emite observaciones al Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto **“ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”**, correspondiente a las actividades del período del 27 de septiembre al 30 de septiembre del año 2022.

Con **Oficio N°-005-CACyC-2022**, el Contratista CONSORCIO ASFALTOS CyC representado legalmente por su Procurador Común Ing. Elio Andrés Álvarez, ingresa a la Dirección de Gestión Ambiental el 05 de octubre de 2022, las observaciones subsanadas al Informe de Cumplimiento Ambiental del proyecto **“ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA**

DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”, correspondiente a las actividades del período del 26 de septiembre al 30 de septiembre del año 2022.

Con **Oficio N°-006-CACyC-2022** de fecha 31 de octubre de 2022, el Contratista CONSORCIO ASFALTOS CyC representado legalmente por su Procurador Común Ing. Elio Andrés Álvarez, ingresa a la Dirección de Gestión Ambiental el Informe de Cumplimiento Ambiental del proyecto **“ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”,** correspondiente a las actividades del período del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2022.

Mediante **Oficio Nro. GADPPZ-DGA-2022-1484-O,** se emite observaciones al Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto **“ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”,** correspondiente a las actividades del período del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2022.

Con **Oficio N°- 007-CACyC-2022,** de fecha 07 de noviembre de 2022, el Contratista CONSORCIO ASFALTOS CyC representado legalmente por su Procurador Común Ing. Elio Andrés Álvarez, ingresa a la Dirección de Gestión Ambiental las observaciones subsanadas al Informe de Cumplimiento Ambiental del proyecto **“ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA,**



SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”, correspondiente a las actividades del período del 01 de octubre al 31 de octubre del año 2022.

Con **Oficio N°- 011-CACyC-2022**, de fecha 30 de noviembre de 2022, el Contratista **CONSORCIO ASFALTOS CyC** representado legalmente por su Procurador Común Ing. Elio Andrés Álvarez, ingresa a la Dirección de Gestión Ambiental el Informe de Cumplimiento Ambiental del proyecto **“ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”**, correspondiente a las actividades del período del 01 de noviembre al 30 de noviembre del año 2022.

Con **Oficio N°- 001-CACyC-2023**, de fecha 03 de enero de 2023, el Contratista **CONSORCIO ASFALTOS CyC** representado legalmente por su Procurador Común Ing. Elio Andrés Álvarez, ingresa a la Dirección de Gestión Ambiental el Informe de Cumplimiento Ambiental del proyecto **“ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”**, correspondiente a las actividades del período del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2022.

Mediante **Oficio Nro. GADPPZ-DGA-2022-1608-O**, se emite observaciones al Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto **“ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA,**

SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”, correspondiente a las actividades del período del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2022.

Mediante **Oficio Nro. GADPPZ-DGA-2022-1610-O**, se emite un alcance al **Oficio Nro. GADPPZ-DGA-2022-1608-O** en el cual se realiza observaciones al Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto **“ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”**, correspondiente a las actividades del período del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2022.

Con **Oficio N°- 004-CACyC-2023**, de fecha 16 de enero de 2023, el Contratista **CONSORCIO ASFALTOS CyC** representado legalmente por su Procurador Común Ing. Elio Andrés Álvarez, ingresa a la Dirección de Gestión Ambiental las observaciones subsanadas al Informe de Cumplimiento Ambiental del proyecto **“ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”**, correspondiente a las actividades del período del 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2022.

Mediante **Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICAS-2022-8656-M**, se emite la **NOTIFICACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL PROCESO COTO-GADPPz-009-2022.**

En la Ciudad del Puyo, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil veinte y dos, comparecen a la suscripción del presente contrato, por una parte, en calidad de “Contratante”, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, representado legalmente por el Ing. Jaime Guevara Blaschke, Prefecto Provincial; y, por otra parte, en calidad de “Contratista” el Consorcio Asfaltos CyC, con su Procurador Común Ing. Elio Andrés Álvarez Castillo. Los mismos que para efectos del presente contrato se denominaran el “Contratante” y el “Contratista”.

En la ciudad de Puyo, al segundo (02) día del mes de diciembre de 2022, se procede a la entrega en sitio donde se ejecutarán los trabajos concernientes al Contrato Complementario suscrito con fecha 30 de noviembre del 2022, cuyo objeto de contratación es: **“ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”** por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza con su representante legal Ing. Jaime Patricio Guevara Blaschke, Prefecto de Pastaza, y por otra parte, el Consorcio Asfaltos CYC, con su Procurador Común el Ing. Álvarez Castillo Elio Andrés, CONTRATISTA, para este propósito se reúnen el Ing. Daniel Ramos Campaña, en calidad de Administrador de Contrato, el Ing. Quintana Muñoz Robert Fernando, en calidad de Fiscalizador de Obra, los mismos en representación del GADPPz y el contratista ejecutor, con la finalidad de suscribir la presente Acta de inicio de Obra del Contrato Complementario.

En la **CLAUSULA TERCERA: PLAZO.-** En conformidad con lo previsto en la Cláusula Tercera del contrato complementario, *“...El contratista se compromete y se obliga para con la Institución a ejecutar, terminar y entregar la obra objeto del presente contrato complementario en su totalidad en un plazo de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de **ORDEN DE INICIO** impartida por el Administrador del Contrato...”*, por tanto, se inicia a partir de la misma.

Con **Oficio N°- 002-CACyC-2023**, de fecha 03 de enero de 2023, el Contratista CONSORCIO ASFALTOS CyC representado legalmente por su Procurador Común Ing. Elio Andrés Álvarez, ingresa a la Dirección de Gestión Ambiental el Informe de Cumplimiento Ambiental para el **CONTRATO COMPLEMENTARIO** del proyecto **“ESTABILIZACIÓN DE LA BASE**

GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”, correspondiente a las actividades del período del 02 de diciembre al 18 de diciembre del año 2022.

Mediante **Oficio Nro. GADPPZ-DGA-2022-1609-O**, se emite observaciones al Informe Ambiental de Cumplimiento para el **CONTRATO COMPLEMENTARIO** del proyecto **“ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”**, correspondiente a las actividades del período del 02 de diciembre al 18 de diciembre del año 2022.

Mediante **Oficio Nro. GADPPZ-DGA-2022-1611-O**, se emite un alcance al **Oficio Nro. GADPPZ-DGA-2022-1609-O** en el cual se realiza observaciones al Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto **“ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”**, correspondiente a las actividades del período del 02 de diciembre al 18 de diciembre del año 2022.

Con **Oficio N°- 002-CACyC-2023**, de fecha 16 de enero de 2023, el Contratista **CONSORCIO ASFALTOS CyC** representado legalmente por su Procurador Común Ing. Elio Andrés Álvarez, ingresa a la Dirección de Gestión Ambiental el Informe de Cumplimiento Ambiental con sus

respectivas **OBSERVACIONES SUBSANDAS** para el **CONTRATO COMPLEMENTARIO** del proyecto “**ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**”, correspondiente a las actividades del período del 02 de diciembre al 19 de diciembre del año 2022.

Con **Oficio N°- 009-CACyC-2023**, de fecha 10 de febrero de 2023, el Contratista **CONSORCIO ASFALTOS CyC** representado legalmente por su Procurador Común Ing. Elio Andrés Álvarez, ingresa el 10 de febrero a la Dirección de Gestión Ambiental el Informe de Cumplimiento Ambiental para el **CONTRATO COMPLEMENTARIO** del proyecto “**ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**”, correspondiente a las actividades del período del 01 de enero al 23 de enero del año 2022.

Mediante **Oficio Nro. GADPPZ-DGA-2023-1724-O**, se emite observaciones al Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto “**ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**”, correspondiente a las actividades del período del 01 de enero al 23 de enero del año 2023.



Con Oficio N°- 013-CACyC-2023, de fecha 17 de febrero de 2023, el Contratista CONSORCIO ASFALTOS CyC representado legalmente por su Procurador Común Ing. Elio Andrés Álvarez, ingresa a la Dirección de Gestión Ambiental el Informe de Cumplimiento Ambiental con sus respectivas **OBSERVACIONES SUBSANDAS** para el proyecto **“ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”**, correspondiente a las actividades del período del 01 de enero al 24 de enero del año 2023.

Con este antecedente, se procede a la revisión de la documentación previo a inspecciones de control y seguimiento al proyecto para su respectivo pronunciamiento.

2. OBJETIVOS.

2.1. General.

- Evaluar el cumplimiento de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales y condicionantes establecidas en los contratos, procesos contractuales y permiso Ambiental del proyecto **“ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”**.

2.2. Específicos.

- Establecer, verificar y documentar el Cumplimiento de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, mediante el cual se verifique el grado de cumplimiento de lo establecido en los parámetros a evaluar, (Observaciones, Cumple, No Cumple y No Aplica).
- Elaborar el informe de Conformidad o No Conformidad Ambiental para su respectiva planilla.

3. MARCO LEGAL APLICABLE.

- ***CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008.***

Art. 14 donde se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Art. 395 reconoce los siguientes principios ambientales:

- El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.

- Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.

Art. 396 La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas.

- **CÓDIGO ORGÁNICO DE AMBIENTE** (publicada en Registro Oficial Suplemento 983 de 12 de abril del 2017 y en vigencia a partir del 12 de abril de 2018).

Art. 173.- De las obligaciones del operador. El operador de un proyecto, obra y actividad, pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en los casos que sea posible, eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su actividad. Cuando se produzca algún tipo de afectación al ambiente, el operador establecerá todos los mecanismos necesarios para su restauración.

El operador deberá promover en su actividad el uso de tecnologías ambientalmente limpias, energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto, prácticas que garanticen la transparencia y acceso a la información, así como la implementación de mejores prácticas ambientales en la producción y consumo.

- **Normativa de la C.G.E.** – Normas de Control Interno.
- Procesos contractuales establecidos en el Contrato/ **COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-009-2022.**

4. ANÁLISIS Y DESARROLLO.

4.1. METODOLOGÍA.

El Monitoreo Ambiental (o Fiscalización Ambiental) es un proceso sistemático y de permanente control y vigilancia sobre las actividades que pueden conllevar a la generación de impactos potenciales. Busca monitorear el cumplimiento de los estándares ambientales, a través de los planes presentes en la Guía de Buenas Prácticas Ambientales.

El fundamento del monitoreo es, por tanto, la búsqueda o selección de acciones establecidas para dar solución a los problemas y conflictos ambientales, siendo un instrumento importante para el seguimiento de medidas y/u obras implementadas para evitar, reducir o mitigar los impactos y acciones que se pueden presentar. Se lo ejecuta mediante la observación, registro continuo, mediciones y análisis de laboratorio (de ser necesario), que permiten evaluar y determinar la incidencia sobre el ambiente.

El monitoreo entonces consistirá en:

- Verificar o supervisar el cumplimiento y no cumplimiento de las medidas establecidas en la Guía de Buenas Prácticas Ambientales.
- Observar el desarrollo de las diferentes actividades.
- Plantear soluciones a problemas detectados en los frentes de trabajo con respecto a la parte ambiental.

4.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto “ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”, se ubica en las coordenadas

COMUNIDAD MUSHU WARMI – SECTOR SAN JACINTO – PARROQUIA TARQUI

UTM DATUM WGS 84 ZONA 17S.

N	X	Y
1	835692	9831402
2	835735	9831424
3	836386	9830910
4	836400	9830880


COLONIA SANTA ISABEL – SECTOR LAS AMERICAS – PARROQUIA PUYO

UTM DATUM WGS 84 ZONA 17S.

N	X	Y
1	832373	9840169
2	832391	9840185
3	834239	9839380
4	834245	9839369


MAPA DE UBICACIÓN DE PROYECTOS

ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VIA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGIA Y EMULSION ASFALTICA SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

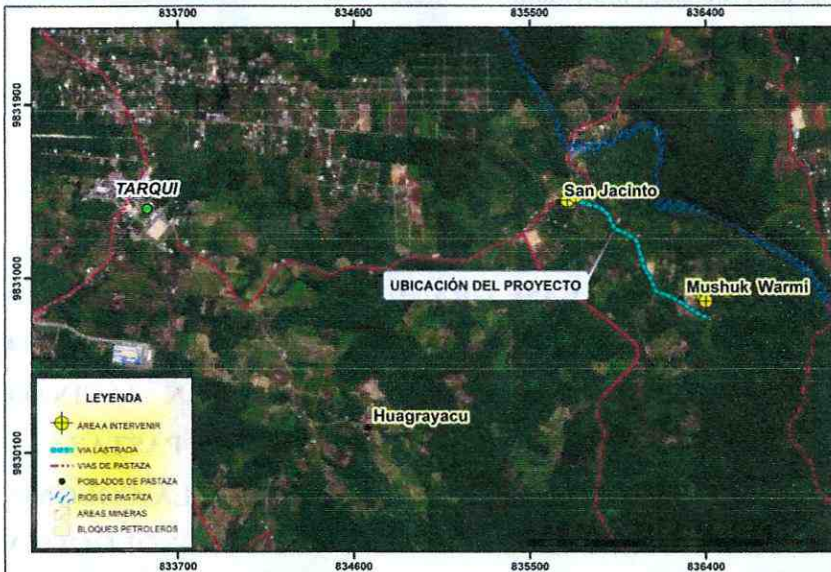


	PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	SECTOR
	PASTAZA	PASTAZA	PUYO	SAN JACINTO
	ELABORADO POR		AREA	
	ING. JOSEPH CHIMBO		DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 17S
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
False Easting: 500,000,0000
False Northing: 10,000,000,0000
Central Meridian: -81,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter




ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VIA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGIA Y EMULSION ASFALTICA SECTOR LAS AMERICAS, PARROQUIA PUYO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA



	PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	SECTOR
	PASTAZA	PASTAZA	PUYO	SANTA ISABEL
	ELABORADO POR		AREA	
	ING. JOSEPH CHIMBO		DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 17S
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
False Easting: 500,000,0000
False Northing: 10,000,000,0000
Central Meridian: -81,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter



A continuación, se detalla los aspectos constructivos del proyecto

- ✓ Tendido de carpeta asfáltica

4.3. RESULTADOS.

En base a la revisión y análisis del Informe Ambiental de Cumplimiento con sus respectivas **OBSERVACIONES SUBSANADA** para el proyecto “**ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**”, ingresado con **Oficio N°-013- CACyC-2023** a la Dirección de Gestión Ambiental, se determina que el proyecto **CUMPLE** con las actividades planteadas en la Guía de Buenas Prácticas Ambientales.

5. CONCLUSIONES.

Luego de la revisión y análisis del documento referente al Informe de Cumplimiento para el **CONTRATO COMPLEMENTARIO** de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales del proyecto “**ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**”; se determina el **CUMPLIMIENTO** de las actividades establecidas en la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, por lo tanto, se **CONCEDE LA CONFORMIDAD AMBIENTAL** para las actividades que constan dentro de lo especificado en el contrato, para el período del 01 de enero al 24 de enero del año 2023, cabe mencionar que el proyecto se encuentra en la etapa de abandono y cierre, puesto que las actividades constructivas han culminado, dando como resultado el 100% de ejecución del proyecto y por ende la culminación del antes mencionado.

6. RECOMENDACIONES.

Conforme contrato **COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-009-2022**, *Clausula decima septima. - Obligaciones por impactos medio ambientales; numeral 8) Independientemente del proyecto, actividad o nivel de impacto, constituirá obligación del Contratista cumplir con las disposiciones dictadas por la Autoridad Ambiental. Por lo que es de carácter obligatorio el cumplimiento de las medidas ambientales dispuestas en la Guía de Buenas Prácticas Ambientales del proyecto en cuestión, conforme el tiempo de ejecución de la obra será este el instrumento principal para actuar ante las dependencias de control y seguimiento ambiental en caso de presentarse afectaciones o daños al medio ambiente.*

Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:
**JOSEPH MESIAS
CHIMBO ZABALA**

Ing. Joseph Chimbo

TÉCNICO DE CALIDAD AMBIENTAL

Declaro bajo juramento, la veracidad de la información consignada y que los documentos presentados como anexos son originales v/o copia fiel del original.

ANEXOS

CUMPLIMIENTO A LA GUIA DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES DEL PROYECTO “ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”.

FASE DE CONSTRUCCIÓN

Imagen 1. Señalética







Imagen 2. Tachos para los residuos



Imagen 3. Maquinaria en el área de influencia

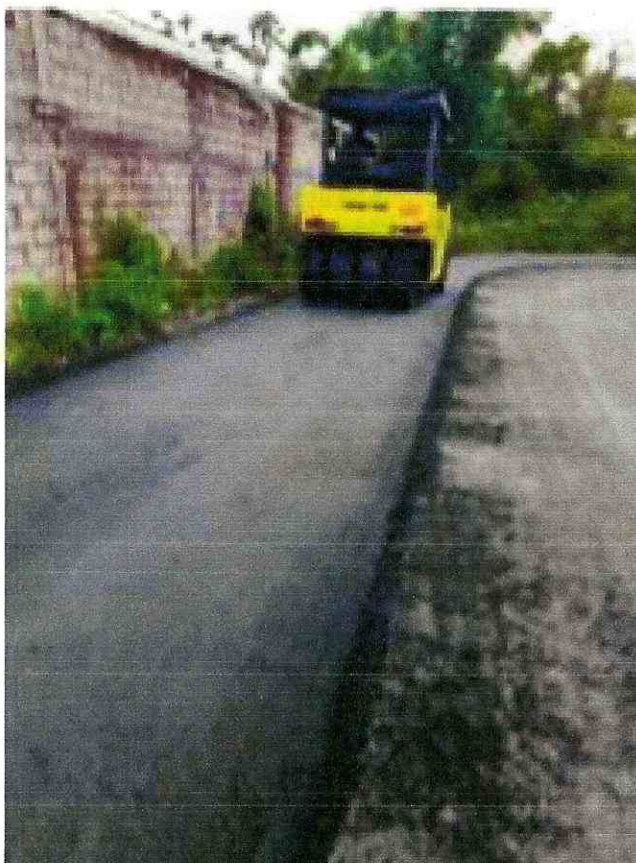




Imagen 4. Personal con su respectivo EPP





Imagen 5. Volquetas con la cubierta de lona

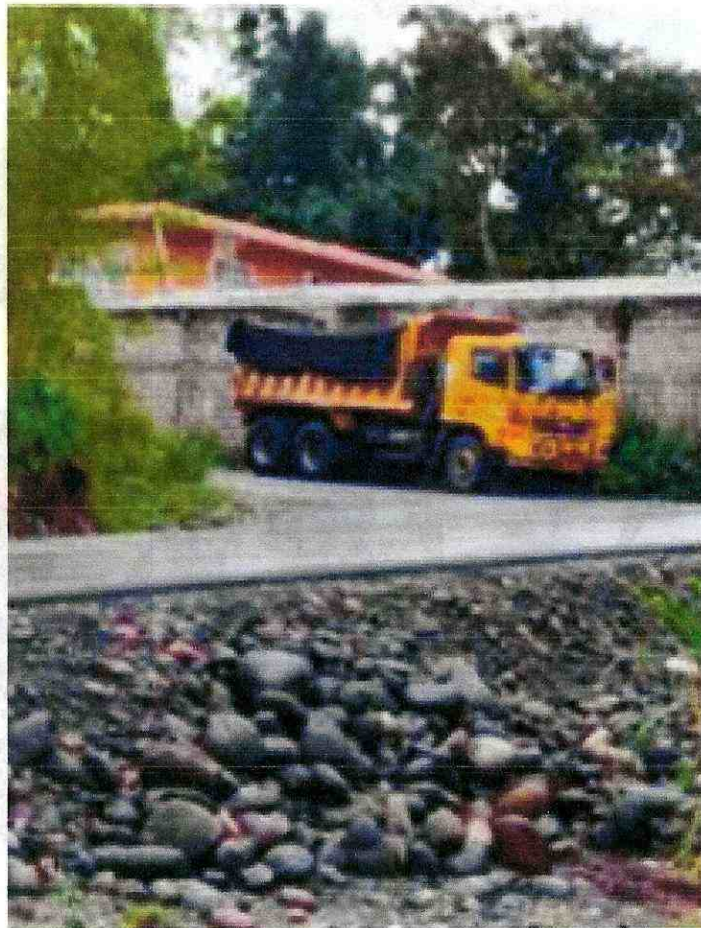


Imagen 6. Kit anti derrames



Imagen 7. Socialización con la Comunidad





CONSORCIO ASFALTOS CyC

RUC: 1691728902001
Dir. Ciudadela el Choler, Salinas y Cotopaxi




"ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TANGUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA RAFAEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUÑO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"		Fecha: 01/10/2022 Responsable: <i>[Signature]</i> Rango de Deseechos
REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
<i>Luis M. Incauca</i>	16014849	<i>[Signature]</i>
<i>Josson Andi</i>	160053888-7	<i>[Signature]</i>
<i>Rosales Alvarez</i>	171209000-3	<i>[Signature]</i>
<i>Juan Carlos Hidalgo</i>	160045341	<i>[Signature]</i>
<i>Nilda Zambrano</i>	1710203826	<i>[Signature]</i>
<i>Dany Salcedo</i>	1723825504	<i>[Signature]</i>

Imagen 8. Botiquín y extintor



ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO / PROYECTO FINALIZADO

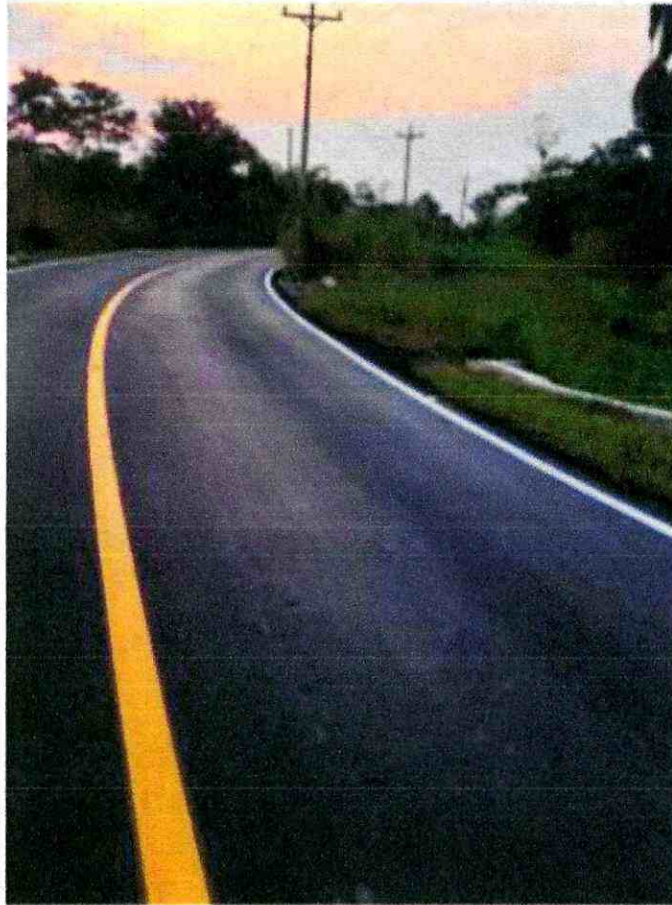



1. INFORMACIÓN GENERAL

Responsable de la elaboración de la ficha:	Ing. Joseph Chimbo	Administrador de contrato:	Ing. Daniel Ramos
Modalidad de Ejecución:	Contratación	Fiscalizador:	Ing. Robert Quintana
		Contratista:	Ing. Elio Álvarez
Descripción del estado del Proyecto:	El proyecto en su etapa de construcción se encuentra al 100% concluido dando como resultado la culminación del mismo		

2. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD

Proyecto / Obra / Actividad	ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA					
Etapas del proyecto	Culminado					
Ubicación Geográfica	Provincia	Pastaza	Cantón	Pastaza	Parroquia	Tarqui - Puyo
	Descripción	X	Y	Referencia de la Ubicación:		
	INICIO	832373	9840169			
FIN	834245	9839369				

3. CUMPLIMIENTO GUIA DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

USO DE LA ENERGÍA	# Medidas	Cumple	No Cumple	N/A	Observaciones
		EQUIPOS DE OFIMÁTICA			
	Una vez finalizada la jornada de trabajo apaga las luces, impresoras, computadoras y demás aparatos eléctricos.			X	
	Cuando te ausentes por más de una hora, mejor apaga el monitor de la computadora o ponlo en hibernar, ya que gasta un 70% total del consumo energético del equipo. Un monitor encendido tiene una potencia de 60 W, unos 6,5 W en espera, y 1W apagado			X	
	El único protector de pantalla que ahorra energía es negro. Es deseable configurarlo para que se active tras 10 minutos de inactividad.			X	
	Los ordenadores portátiles son más eficientemente energéticos que los de mesa.			X	
	Reduce el uso del papel o del secador de manos, utiliza tu propia toalla.			X	
	Da preferencia al uso de las escaleras en lugar de los ascensores; es mucho más saludable, económico y ecológico.			X	
	Llama al ascensor pulsando solo un botón para evitar hacer viajes innecesarios. O si vas a bajar o subir solo un piso mejor haz ejercicio, es bueno para tu salud.			X	
	No conectes varios aparatos al mismo tiempo porque puede producirse una sobrecarga,			X	

	posibles apagones y deterioro de las instalaciones a largo plazo.			
	Configura los equipos de tu dependencia administrativa como computadoras, copiatoras, impresoras, etc. en modo de "ahorro de energía" para reducir el consumo de electricidad hasta en un 50%.			x
	Para sacar tres o menos copias, es mejor imprimir. A partir de cuatro hojas, la copiadora es la mejor opción			x
	Comparte eficientemente los equipos de dependencia administrativa entre compañeros			x
	Reporta a la unidad de tecnología de la institución daños o dificultades en el uso de equipos informáticos, ya que requieren de un adecuado mantenimiento para su óptimo rendimiento.			x
	Evitar el uso del fax térmico, ya que consume más energía y el papel no puede reciclarse.			x
	CLIMATIZACIÓN			
	Usar estos dispositivos sólo cuando sea necesario. Siempre que sea posible, aprovechar la regulación natural de la temperatura, por ejemplo, en verano las ventanas entornadas o las corrientes de aire pueden refrescar algunas salas sin necesidad de encender el aire acondicionado.			x
	Apagar o minimizar los sistemas de calefacción o aire acondicionado en las salas no ocupadas: sala de reuniones vacías, fuera de las horas de trabajo			x
	Conocer adecuadamente cómo funcionan los sistemas de calefacción y refrigeración, para maximizar la eficiencia de los equipos de climatización.			x
	Mantener la temperatura aproximadamente en 20°C en invierno, y aproximadamente en 24°C en verano, para disminuir el consumo energético.			x
	Asegurarse de que los equipos de climatización se programan para funcionar exclusivamente en el período de trabajo, a excepción de situaciones en las que haga falta calefacción o refrigeración previas.			x
	Asegurarse de que las puertas y ventanas están cerradas mientras funcionan los equipos de climatización, para impedir pérdidas y derroche			x
	ILUMINACIÓN			
	Sustituir progresivamente las antiguas bombillas incandescentes y tubos fluorescentes, que usan tecnología ineficiente que desprende más calor que luz			x
	Usar interruptores independientes para iluminar sólo las zonas necesitadas de una misma área			x
	Aprovechar la iluminación natural, organizando los puestos de trabajo de manera que se mantenga una adecuada iluminación, manteniendo limpias las ventanas y abriendo las persianas, cortinas u otros elementos similares, etc.			x
	Antes de encender las luces para encubrir los reflejos del sol en los ordenadores, probar cambiando los puestos de trabajo de lugar o la orientación de la pantallas, así como instalando láminas antirreflectantes en las ventanas o cortinas orientables.			x

	Asegurar una gestión apropiada de los tubos fluorescentes y bombillas, pues son residuos especiales				
USO DEL AGUA	Colocar temporizadores o detectores de presencia para grifos. Esto puede suponer ahorros entre el 20 y el 40% del recurso			x	
	Las cisternas deberán ser de doble descarga o de interrupción de descarga, en todo caso con limitador del volumen de descarga como máximo de seis litros. Esto puede suponer ahorros de hasta un 40%. Utilizar sistemas de detección de fugas en las cañerías enterradas u ocultas			<	
	Las fuentes de consumo humano deben estar dotadas de sistemas temporizadores o limitadores de caudal.			x	
	Soltar el agua del inodoro cuando así lo requiera y no usarlo como cesto de residuos (papel higiénico)			x	
GESTIÓN DE LOS DESECHOS	Eliminar los tachos de cada puesto de los funcionarios y colocar los tachos en un solo lugar con los colores y etiquetas correspondientes, esto ayudará a mejorar la clasificación de los desechos (tacho verde-residuos orgánicos, tacho gris-papel y cartón, tacho azul-plástico, tacho blanco-vidrio y latas, tacho negro - desechos ordinarios)			b	
	Reducir: Normalmente adquirimos productos que tienen muchos envoltorios como el plástico, espuma Flex, etc. que tardan mucho tiempo en descomponerse y que son fabricados con materiales escasos como el petróleo, agua y madera. Antes de comprar debemos pensar en lo que realmente necesitamos, y evitar envoltorios innecesarios.			x	
	Reutilizar: En este mundo modernizado se ha hecho normal el adquirir un bien y después de usarlo, fácilmente desecharlo sin pensar a dónde va eso que consideramos basura. Hay productos que podemos volver a usar muchas veces o darles otro uso haciendo algún artículo necesario para el hogar u dependencia administrativa evitando generar tanto desecho			b	
	Reciclar: A este término se le suele confundir con el de "separar" o "reutilizar", sin embargo, el reciclar tiene que ver con la adquisición de materiales viejos o usados para ser procesados química o físicamente y obtener una materia prima y a partir de ésta fabricar productos nuevos			x	
	Elimina el uso de botellas individuales de plástico, consume el agua del dispensador usando tomatodo o tu vaso personal			x	
	Elimina el uso excesivo de fundas plásticas, en su lugar utilizar fundas reutilizables.			x	
USO DEL PAPEL	Evitar su uso siempre que sea posible, por ejemplo, guardando los documentos en formato digital, optimizando el número de copias necesarias, compartiendo Información en lugar de generar copias para cada persona, aprovechando las posibilidades de Internet, correos electrónicos, teléfono, etc.			Y	
	Utilizar de forma preferente y en la medida de lo posible papel reciclado. No se debe olvidar que el papel reciclado puede llegar a tener una calidad similar a la del papel convencional			x	

Evitar imprimir documentos innecesarios o de aquellos que tienen mucho espacio libre (Ej: presentaciones de power point)				
Antes de imprimir, comprobar los posibles fallos y mejoras del documento, utilizando, por ejemplo, la "vista previa": ajuste de márgenes, división de párrafos eficiente, paginación correcta, reducción del tamaño de las fuentes, etc.				b
Utilizar el papel por las dos caras en el fotocopiado e impresión de documentos, siempre que sea posible. Igualmente, ajustar en la medida de lo posible, los textos para que quepan dos páginas de un documento, libro o publicación en una hoja estándar.				y
Todos los documentos internos se imprimirán reutilizando papel o bien, usando papel reciclado y a doble cara				x
Utilizar medios de comunicación electrónicos en la medida de lo posible para reducir el uso de impresoras y faxes				v
Reutilizar todo el papel que haya sido impreso sólo por una cara para imprimir borradores, fabricar bloc de notas, etc				x
Reutilizar todo el papel que haya sido impreso sólo por una cara				x
Utilizar papel reciclado para hacer fotocopias.				v
Imprimir en calidad de borrador para evitar el derroche de tinta y facilitar la reutilización, especialmente en el caso de los documentos internos, y el reciclaje.				x
Separar el papel inservible, haciendo uso de los contenedores puestos a disposición a tal fin. Resulta interesante, siempre que sea posible, romper el papel antes de depositarlo en los contenedores para reducir el volumen que ocupa				v
Para los residuos, tener una pequeña papelera junto a cada mesa de trabajo optimizará la reutilización y reciclaje				x
CONSUMO RESPONSABLE				
Ajústate a las necesidades reales en cuanto a los insumos que existen en tu lugar de trabajo, así evitarás comprar inútilmente				b
Utiliza adecuadamente y comparte el material de la dependencia administrativa para alargar su vida útil, al mismo tiempo que se genera ahorro para la institución				b
Si vas a almorzar en la dependencia administrativa evita comprar alimentos que sabes te darán en envases de polietileno (espuma flex) para transportarlos, es un material que no se puede reciclar y contamina por mucho tiempo el ambiente, lleva tus propios recipientes y pide que te pongan los alimentos en ellos. Seamos coherentes con nosotros mismos y con la institución donde trabajamos.				b
Prefiere las pilas recargables, ya que las pilas comunes contaminan de 3 mil a 175 mil litros de agua dependiendo de sus componentes como el mercurio. Las pilas recargables pueden usarse hasta unas dos mil veces según el tipo y uso adecuado.				x
Compra lápices y marcadores recargables, de esta manera evitarás generar más desechos.				y

	Prefiera productos cuyos envases tengan el logotipo de reciclable o reutilizable.				✓	
	Adquiere productos naturales para tu aseo personal, recuerda que el uso de aerosoles perjudica al ambiente				✓	
TRANSPORTE Y MOVILIDAD	Desplazamiento a pie				✓	
	Utilizar el transporte público.				✓	
	Utilizar bicicleta.				✓	
	Cuando es inevitable el uso del vehículo privado, el sistema de carro compartido puede ser una opción bastante eficiente.				✓	

4. OTROS (Incorporación de medidas conforme a la actividad del proyecto)

	# Medidas	Cumple	No Cumple	N/A	Observaciones		
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS	Implementar señalética Señalética de Prohibición Señalética de condición obligatoria Señalética de condición segura Señalética preventiva Señalética ambiental Señalética informativa. -Usar las figuras geométricas, colores de seguridad, y colores de contraste para señales de seguridad de la Tabla N°1 de la Norma INEN ISO 3864 -Usar los diseños para señales de prohibición, acción obligatoria, precaución, condición segura.				x	Proyecto Culminado	
	Humedecer la vía en días soleados para evitar material particulado, optimizando el recurso agua.				x	Proyecto Culminado	
	Zonificar las áreas de trabajo con cinta de peligro.				x	Proyecto Culminado	
	Cubrir con una lona las volquetas que trasladen material pétreo hacia el lugar de la obra				x	Proyecto Culminado	
	Las vías por donde circula el equipo caminero deben estar despejadas y sin obstáculos.				x	Proyecto Culminado	
	Realizar mantenimiento regular de la maquinaria y equipos utilizados.				x	Proyecto Culminado	
	El transporte del equipo se realizará utilizando las vías accesos existentes, considerando no causar molestias a los habitantes del costado de la vía y el posible deterioro de la misma.				x	Proyecto Culminado	
	Implementar un kit anti derrame y equipos de respuesta rápida, para combatir posibles emergencias. Contenido del Kit Anti Derrame: -Pala, paños absorbentes, (salchicha observante), guantes, botas, gafas protectoras, escoba, fundas o recipientes para recolectar los desechos contaminados.					x	Proyecto Culminado
	Se deberá instalar de forma permanente un extintor y botiquín de primeros auxilios en los vehículos y/o maquinaria pesada. Contenido del botiquín de primeros auxilios: - Antisépticos, alcohol gel, gasas, tijeras, algodón, termómetro, esparadrapo.					x	Proyecto Culminado
	Dotar al personal que labora en el proyecto de EPP.					x	Proyecto Culminado
	Implementar un área para el almacenamiento temporal de combustibles, el cual deberá cumplir con las siguientes características: -Deberá estar ubicado alejado de cuerpos hídricos, y aislado					x	Proyecto Culminado

	<p>-Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no inundables.</p> <p>-La estructura será realizada con vigas de madera y cubierta de dura techo o también pueden ser hojas de zinc (Las dimensiones del área se las realizara en base a la cantidad de tanques de almacenamiento a utilizar).</p> <p>-El tanque de almacenamiento deberá estar protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones que contaminen el ambiente, y contará manguera y llaves de distribución.</p> <p>-El tanque de almacenamiento deberá estar rodeado de un cubeto o estructura de contención impermeable técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque.</p> <p>-En el área se deberá implementar un extintor para prevenir cualquier riesgo de incendio.</p> <p>-Tener un acceso adecuado para la carga de combustible y en caso de ser necesario para la entrada del carro de los bomberos.</p> <p>-El área deberá estar señalizado en base a la normativa NTE INEN-ISO 2266.</p>				
	<p>Ubicar el material de desalojo en los sitios descritos en el Ítem 7. del presente documento. Los cuales han sido ubicado de acuerdo a los siguientes criterios técnicos:</p> <p>-Deberán encontrarse dentro del área de influencia del proyecto.</p> <p>-El terreno debe estar desprovisto de vegetación.</p> <p>-Alejados de cursos hídricos.</p> <p>-Las áreas destinadas para escombreras deberán ser estables y seguras a corto y largo plazo.</p> <p>-Deberán contar con una capacidad mínima de 1500 m3</p> <p>-El transporte del material deberá realizarse en una volqueta con cubierta (lona), con el fin de evitar derrames en la carretera.</p>			x	<p>Proyecto Completado</p>
<p>PLAN DE MANEJO DE DESECHOS</p>	<p>Implementar un área de almacenamiento temporal de desechos peligrosos el cual deberá tener las siguientes características:</p> <p>-Estar bajo cubierta</p> <p>-Iluminación natural</p> <p>-En un espacio abierto, cercado.</p> <p>-El acceso a estos locales debe ser restringido, y el personal que ingrese estará provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad industrial;</p> <p>-Contar con señalización apropiada en lugares y formas visibles; en base a la norma NTE INEN 2266.</p> <p>-Contar con el material y equipamiento para atender contingencias</p> <p>-Contar con sistemas de extinción contra incendios</p> <p>-Contar con bases o pisos impermeabilizados o similares, según el caso.</p> <p>Colores de los contenedores a implementar Rojo: Desechos Peligrosos Los desechos no peligrosos no se podrán almacenar por más de un año; deberán ser entregados a un gestor calificado para su tratamiento final.</p>			x	<p>Proyecto Completado</p>
	<p>Dotar de fundas plásticas a los conductores de volquetes y maquinaria pesada para los desechos comunes.</p>			x	<p>Proyecto Completado</p>

	<p>Implementar de contenedores de colores debidamente etiquetados para la clasificación de los residuos en la vía, se deberá cumplir con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Encontrarse bajo techo. -Contenedores de 55 galones (4) <p>El rotulado estará en un lugar visible con caracteres legibles según lo establecido en la NTE INEN 878. El nombre o denominación de los residuos con su logo respectivo y la distancia de observación según lo establecido en la NTE INEN ISO 3864-1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizará una clasificación general de residuos: <p>Colores de los contenedores a implementar. Azul: Reciclables Negro: No Reciclables Verde: Orgánicos Rojo: Peligrosos</p>			x	Proyecto Completado
PLAN DE CAPACITACIÓN	<p>Capacitar al personal de trabajo sobre temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Medidas propuestas en el PMA -Manejo de los procedimientos de seguridad -Trabajos en altura -Protección del ambiente -Primeros Auxilios y procedimiento en caso de emergencias -Manejo de desechos peligros y no peligros. -Técnicas para prevenir conflictos con la comunidad. 			x	Proyecto Completado
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS	Realizar una reunión previa con los involucrados directos del proyecto para darles a conocer las ventajas de la implementación del proyecto obra o actividad.			x	Proyecto Completado
	Implementar un buzón donde se recepte las quejas y sugerencias de la población.			x	Proyecto Completado
	Participar activamente en reuniones y procesos comunales que se realicen en el área de influencia.			x	Proyecto Completado
PLAN DE CONTINGENCIA	Elaborar un Plan de Contingencia accesible a todo el personal en el cual se aborde la gestión de contingencia en caso de incendio, derrame, fuga o explosión.			x	Proyecto Completado
	Crear un comité de seguridad que actúe en caso de emergencias.			x	Proyecto Completado
	Se deberá realizar simulacros, de evacuación. Incendios, derrames o fugas para agilizar los tiempos de reacción del personal y su actuación frente a un evento.			x	Proyecto Completado
	<p>Actuar de la siguiente manera en caso de:</p> <p>En Caso de Incendio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si alguien detecta un fuego incipiente y sabe usar un extintor, actúe inmediatamente. - Se recomienda el uso de extintores industriales ubicados estratégicamente <p>Tipos de extintores: El tipo A: Se usará durante la combustión de sólidos comunes, El tipo B: Se usará para líquidos y gases inflamables El tipo C: para equipo eléctrico energizado y el tipo D para metales combustibles.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salve su vida y la de los demás abandonando el lugar de incendio. - Una vez a salvo, avisar a la brigada (hágalo 			x	Proyecto Completado

	<p>sin pensar que otros ya lo han hecho).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solicite auxilio. - Mantenga la calma y espere al rescate. - Si se encuentra atrapado por el humo, trate de salir arrastrándose o permanezca lo más cerca del suelo, el humo tiende a subir y existe aire no contaminado a nivel del suelo. - Si el humo es muy denso, cúbrase con un pañuelo o ropa (mojados) la boca y nariz, manténgase cerca del suelo. - Cuando se inflaman las ropas de una persona, impida que corra, el viento aviva el fuego. Cobijelo con una manta húmeda y haga que se proteja la cara y cuello con las manos. <p>En Caso de Explosión:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evacue la zona de riesgo y proceda de acuerdo a lo establecido en el programa de contingencias. - Acordone el área y restrinja el acceso a personal ajeno. - Utilice el extintor adecuado. <p>No intente extinguir el fuego hasta que las fugas hayan sido detenidas, de otra manera, existe grave riesgo de reignición y explosión.</p> <p>En caso de sismos o fenómenos naturales</p> <p>Antes de un Sismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conozca las zonas de seguridad. - Contar con un mapa de peligros potenciales y zonas seguras. - Reciba entrenamiento en primeros auxilios y evacuación. - Manténgase plenamente informado de cómo interrumpir de forma segura sus labores habituales o el proceso de construcción. - Observe la ubicación de su área de trabajo, buscar sitios de protección contra materiales que pudieran desprenderse. - Haga una evaluación de vulnerabilidad de su entorno de trabajo para determinar los peligros potenciales. <p>En caso derrame o fuga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Localice el derrame o fuga - Antes de comenzar con el control o contención del derrame, debe colocarse los elementos de protección personal necesarios: Ropa adecuada impermeable y resistente a los productos químicos; guantes protectores; lentes de seguridad; protección respiratoria. - Contenga con barreras, diques y/o materiales absorbentes. - Colocar fluidos y desechos en recipientes o fundas para recolección de materiales contaminados. - Entregar el material contaminado a un Gestor Calificado. 			
<p>PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO</p>	<p>Verificar el nivel de cumplimiento al presente PMA, a través de un informe internos de cumplimiento de las medidas del Plan Aprobado por la Autoridad Ambiental.</p>	<p>x</p>		<p>Informe de Seguimiento</p>

	Monitorear el Manejo de los desechos peligrosos y no peligrosos dentro del área de influencia del proyecto.			x	Proyecto Culminado
	Realizar el mantenimiento de los extintores			x	Proyecto Culminado
PLAN DE REHABILITACIÓN	Revegetación o reforestación de áreas degradadas en el proyecto con plantas nativas de la zona.			x	Por la naturaleza del proyecto, área intervenida
	Retirar el suelo contaminado, y entregarlo a un Gestor Calificado para sus disposición final, revegetar el área con especies nativas			x	Proyecto Culminado
PLAN DE ENTREGA Y ABANDONO DEL ÁREA	Desmantelamiento de la infraestructura temporal existente en el área del proyecto (campamento, área de almacenamiento de combustibles y desechos peligrosos)			x	Proyecto Culminado
	Limpieza general del área del proyecto.	7			Se cumple esta medida


5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Conforme la inspección realizada al proyecto se evidencia la ejecución del 100%, obra como resultado la culminación del mismo y haciendo del cumplimiento de las medidas establecidas a la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, conforme las inspecciones realizadas en su etapa de construcción. Una vez terminada la inspección en la etapa de construcción y a su vez en su etapa de abandono y cierre para el terreno evaluado, se observa que no existe alteraciones al medio ambiente, bajo este contexto se otorga la Conformidad Ambiental.


Fecha de monitoreo:

08/03/2023

Firma de responsabilidad de Control y Monitoreo:



 Ing. Joseph Chimbo
 C.I. 160061152
 Técnico Ambiental


 Ing. Elio Álvarez
 C.I. 171709694-3
 Contratista


 Ing. Darwin Piedra
 C.I. 1600340214
 Técnico Ambiental - Contratista

CONSORCIO ASFALTOS CyC

Ruc: 1691728902001
Dir: Ciudadela el Chofer, Salinas y Cotopaxi



Fecha: 17 FEB 2023
Recibido: CRIS G.
Número: 0933-E Hora: 12:04

Puyo, 17 febrero 2023
Oficio N°-013-CACyC-2023

Ingeniero
David Yedra

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL GADPPz
Presente.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en respuesta al Oficio Nro. GADPPZ-DGA-2023-1724-O, del 14 de febrero de 2023 y en cumplimiento a lo establecido en el contrato del proyecto "ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA". COTO-GADPPz-009-2022, adjunto el informe de cumplimiento ambiental, correspondiente a la Planilla de Liquidación.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por
**ELIO ANDRÉS
ALVAREZ
CASTILLO**

Ing. Álvarez Castillo Elio Andrés

PROCURADOR COMÚN CONSORCIO ASFALTOS CYC

Recibido
27/02/2023
08:42
[Handwritten signature]

Joseph



Oficio Nro. GADPPZ-DGA-2023-1724-O

Puyo, 14 de febrero de 2023

Asunto: OBSERVACIONES AL INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-009-2022

Ingeniero

Elio Andres Álvarez Castillo

PROCURADOR COMUN DEL CONSORCIO ASFALTOS C Y C

En su Despacho

En respuesta al Documento No. GADPPZ-DGA-2023-0918-E

En respuesta al **Oficio N°-009-CACyC-2023**, ingresado a la Dirección de Gestión Ambiental, de fecha 03 de enero de 2023, en el que se emite el Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto **"ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**, para revisión y pronunciamiento.

Luego del análisis y revisión del proyecto **"ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**, se concluye que el Informe Ambiental de Cumplimiento no cumple con los siguientes requisitos descritos a continuación:

- En el Oficio de ingreso y dentro del Informe Ambiental de Cumplimiento el periodo correcto es del 01 – 24 de enero del 2023, puesto que debe ser en relación al Oficio de Recepción Provisional ingresado.
- En el Oficio de ingreso mencionar si el Informe Ambiental de Cumplimiento ingresado esta en relación a la Planilla de **Liquidación** de la Dirección de Fiscalización con respecto al periodo evaluado de ser el caso.
- En la Ficha Técnica determinar si el proyecto se encuentra la fase de construcción o culminación.
- En el ítem 3.1 Objetivo General, determinar si el Informe Ambiental de Cumplimiento presentado a esta dependencia pertenece al N°04 o N°05, como menciona en la ficha técnica Numero de Informe y en relación a la Planilla 05.
- En el Ítem 9. Resumen de la Guía de Buenas Practicas Ambientales, en el Plan de Capacitación la medida se califica como CUMPLE, sin embargo, no se anexa el Registro Fotográfico y el Registro de Asistencia correspondiente.
- En el Ítem 9. Resumen de la Guía de Buenas Practicas Ambientales, en el Plan de Monitoreo y



Oficio Nro. GADPPZ-DGA-2023-1724-O

Puyo, 14 de febrero de 2023

Seguimiento en el inciso 2 la medida se califica como CUMPLE, sin embargo no se agrega el medio de verificación correspondiente.

- Las medidas que se califiquen como **CUMPLE**, deberán tener los medios de verificación respectivos, las medidas que **NO CUMPLA** deberán tener su respectivo **PLAN DE ACCIÓN** que ayude a subsanar lo que respecta a las medidas y por ultimo las medidas que **NO APLIQUE** se deberá colocar la razón del porque no aplican siendo claros, concisos y de ser el caso, los medios de verificación correspondientes.
- En el Ítem 13. Conclusiones, aclarar si el proyecto se encuentra en ejecución o culminado puesto que en la ficha técnica menciona que se encuentra en construcción.
- En el Anexo 3. Actualizar el registro fotográfico de la maquinaria, puesto que son fotografías del Informe Ambiental de Cumplimiento del mes de Diciembre.
- En el Anexo 4. Actualizar el registro fotográfico de los Equipos de Protección Personal (EPP), puesto que son fotografías del Informe Ambiental de Cumplimiento del mes de Diciembre.
- En el Anexo 11. Agregar el registro de asistencia en la socialización con la comunidad.
- Agregar el Registro Fotográfico del estado actual del proyecto puesto que menciona que se encuentra al 100% de su ejecución.
- Por último, solicitar el Informe Ambiental de Cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y el reporte de extracción de material pétreo del área minera "Nueva Vida", de los meses de Noviembre, Diciembre y Enero.

En este contexto me permito solicitar acoger las siguientes observaciones, corregirlas y presentarlas en un nuevo documento para su posterior revisión y pronunciamiento, mismas que deberán ser entregadas en un plazo de 48 horas termino, dicha información será enviada al Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica (MAATE), como lo establece el **REGLAMENTO AL CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE en su Art. 488.- Informes ambientales de cumplimiento.- Los informes ambientales de cumplimiento deberán ser presentados por los operadores de proyectos, obras o actividades regularizados mediante registro ambiental, con el fin de evaluar la observancia y cumplimiento de la normativa ambiental vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas de la autorización administrativa ambiental, de acuerdo a los lineamientos que para el efecto emita la Autoridad Ambiental Nacional.**

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Joseph Mesias Chimbo Zabala
TÉCNICO DE CALIDAD AMBIENTAL

Referencias:

- GADPPZ-DGA-2023-0918-E

Anexos:

- img20230210_16142575.pdf
- img20230210_16121317.pdf



Oficio Nro. GADPPZ-DGA-2023-1724-O

Puyo, 14 de febrero de 2023

Copia:

Señor Magíster David Alejandro Yedra Machado - **Director de Gestión Ambiental** - / Señor Ingeniero Jorge Antonio Vargas Escobar - **Jefe de Gestión Ambiental (E)** - / Señor Ingeniero Daniel Anibal Ramos Campaña - **Director de Obras Públicas** - / Señor Ingeniero Robert Fernando Quintana Muñoz - **Fiscalizador 1** - /



Firmado electrónicamente por:
**JOSEPH MESIAS
CHIMBO ZABALA**

CONSORCIO ASFALTOS CyC

Ruc: 1691728902001

Dir: Ciudadela el Chofer, Salinas y Cotopaxi



Puyo, 01 de noviembre 2022
Oficio N°- 009- CACyC-2022

Señor, Ingeniero:

Adan Mariño

DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN (SUBROGANTE)- DADPPZ.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

En su Despacho.-

Quien suscribe, en calidad de Procurador común del CONSORCIO ASFALTOS CyC el cual ejecuta el Proyecto: **ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**, legalmente celebrado, y suscrito a satisfacción de las partes contratantes el 29 de julio del 2022, pongo en consideración lo siguiente:

Se procede entregar Planilla de avance N° 2, para su revisión, aprobación y continúe el trámite requerido para su cancelación. Se adjunta en CD los respaldos de planilla.

Cordialmente



Firmado electrónicamente por:
**ELIO ANDRES
ALVAREZ
CASTILLO**

Ing. Elio Andrés Álvarez
**PROCURADOR COMÚN
CONSORCIO ASFALTOS CyC
CONTRATISTA**

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA



DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Pastaza

01 NOV 2022

Fecha:

Recibido: SOMARRA M

Número: _____ Hora: 12h53

Copia:

Ing. Daniel Ramos
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO
Ing. Robert Quintana
FISCALIZADOR

CONSORCIO ASFALTOS CyC

Ing. Elio Andrés Álvarez: 0994008341.

e-mail: andresalvarezcastillo@outlook.com



PROYECTO: "ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

COTO-GADPPz-009-2022

INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS
AMBIENTALES

PLANILLA N^o. 05

ENERO
2023

577 (20)

Contenido

1. DATOS GENERALES.....	2
2. ANTECEDENTES	3
3. OBJETIVOS	3
3.1 Objetivo General.....	3
3.2 Objetivos Específicos	3
4. ALCANCE.....	4
5. MARCO LEGAL	4
6. METODOLOGIA.....	5
7. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	5
7.1 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL.....	8
8. RESUMEN DE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	12
9. IMPACTOS Y RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES DE OBRA.....	25
10. RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	25
11. RECOMENDACIONES	27
12. ANEXOS.....	28

FICHA TECNICA

1. DATOS GENERALES

PROYECTO	ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	
PROCESO	COTO-GADPPz-009-2022	
MONTO	351.593,285	
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 días	
CERTIFICADO AMBIENTAL	MAAE-SUIA-DZDCH-2022-CA-0204, 17 de marzo de 2022	
CATALOGO ACTIVIDADES SUIA	Obras de superficie en calles, carreteras.	
TIPO DE ESTUDIO	Cumplimiento de guía de buenas prácticas ambientales	
FASE	Culminación	
PERIODO MENSUAL	Del 01 al 24 de enero de 2023	
INFORME No.	5	
UBICACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA	Provincia: Pastaza Cantón: Pastaza Parroquia: Tarquí / Puyo	
PROMOTOR DEL PROYECTO	Nombre: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza Representante legal: Ing. Jaime Guevara	
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	Ing. Ramos Campaña Daniel Administrador de Contrato.	
TECNICO AMBIENTAL	Nombre: Ing. Piedra Arévalo Darwin Rolando Dirección: Puyo, Calle Pichincha y Manabí Teléfono: 0995077840 E-mail: darwin_juniorpiedra@yahoo.com	
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD	 Ing. Álvarez Castillo Elio Andrés PROCURADOR COMÚN CONSORCIO ASFALTOS CYC	 Ing. Piedra Arévalo Darwin Rolando TÉCNICO AMBIENTAL

2. ANTECEDENTES

El CONSORCIO ASFALTOS CYC, representado por el Ing. Ing. Álvarez Castillo Elio Andrés, mantiene un contrato con el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, denominado "ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", el monto de la obra es \$ 351.593,285 (Trecientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Noventa y Tres con 285/100) Dólares de los Estados Unidos de América sin IVA, suscrito el 29 de julio de 2022, con orden de inicio de trabajos a partir del 26 de septiembre de 2022, y con un plazo de 120 días.

El proyecto consiste en el mejoramiento de dos ejes viales, a nivel de carpeta asfáltica.

El proyecto posee el Certificado Ambiental MAE-SUIA-DZDCH-2022-CA-0204, con fecha 17 de marzo de 2022, donde se aprueba el Certificado Ambiental y se emite la Guía de Buenas Prácticas Ambientales otorgado al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

- a. Presentar el Informe ambiental de cumplimiento N°05 correspondiente a la Planilla 05 del mes de enero de 2023; del Proyecto "ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".
- b. Cumplir con las medidas ambientales establecidas en la Guía de Buenas Prácticas.

3.2 Objetivos Específicos

- a) Informar a la Autoridad Ambiental Competente (Departamento de Gestión Ambiental) sobre el avance, efectividad y cumplimiento de las obligaciones definidas en la Guía de Buenas Prácticas Ambientales; conforme a los términos establecidos en el otorgamiento del Certificado Ambiental.

4. ALCANCE

El alcance del presente informe de cumplimiento, comprende una evaluación objetiva del cumplimiento de las actividades descritas en el CERTIFICADO AMBIENTAL No. MAAE-SUIA-DZDCH-2022-CA-0204, donde se aprueba el Certificado Ambiental del Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

El alcance geográfico es en la Región Amazónica, provincia de Pastaza, Cantón Pastaza; Parroquia Tarqui y Parroquia Puyo.

5. MARCO LEGAL

El presente Informe Ambiental de Cumplimiento se realizó sobre la base de los siguientes instrumentos jurídicos:

- ✓ Constitución de la República del Ecuador (R.O. 449, 20-oct-2008)

Título II Derechos, Capítulo II Derechos del Buen Vivir, Sección II Ambiente Sano.

Título VII Régimen del Buen Vivir, Capítulo II Biodiversidad y Recursos Naturales, Sección I Naturaleza y Ambiente.

- ✓ Código Orgánico del Ambiente (R.O. 983, 12-abr-2017)

Libro III De la Calidad Ambiental, Título II Sistema Único de Manejo Ambiental, Capítulo I Del Régimen Institucional.

- ✓ Reglamento al Código Orgánico del Ambiente (R.O. 507, 12-jun-2019)

Libro III De la Calidad Ambiental, Título IV Proceso de Participación Ciudadana para la Regularización Ambiental, Capítulo III Mecanismos de control y seguimiento de la calidad ambiental.

- ✓ Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente
(R.O. 51, 31-mar-2003)

Libro VI De la Calidad Ambiental (A.M. 061, R.O. 316, 04-may-2015), Título III Sistema Único de Manejo Ambiental, Capítulo X Control y Seguimiento Ambiental, Informes Ambientales de Cumplimiento.

6. METODOLOGIA

La metodología para realizar el Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto denominado "ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMÍ CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", consistió en el desarrollo secuencial de varias actividades contenidas en tres etapas genéricas:

- Fase de preparación

Incluye actividades de planificación, revisión de información primaria y secundaria, y de documentación.

- Inspección de campo

Mediante observación directa se evaluó el cumplimiento de ciertas medidas planteadas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado, y de la normativa ambiental aplicable.

- Fase de procesamiento y sistematización de datos

El trabajo de gabinete consistió en evaluar los resultados obtenidos, contrastando las obligaciones técnicas y legales, con los medios de verificación existentes. Luego de esto se preparó el informe respectivo.

7. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Se utilizará los criterios de calificación establecidos en el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente. Art 499. Art 500, Art 501.

Art. 499.- Conformidades. - Se establecerán conformidades cuando la Autoridad Ambiental Competente determine, mediante los mecanismos de control y seguimiento, que las actividades del

operador cumplan con lo establecido en el plan de manejo ambiental, las obligaciones derivadas de las autorizaciones administrativas y la normativa ambiental vigente.

Art. 500.- No conformidades menores. - Se consideran no conformidades menores las siguientes:

- a) Incumplimiento a los límites permisibles o a los criterios de calidad por parámetro y fuente muestreada;
- b) Retraso o no presentación de los documentos administrativos de control y seguimiento ambiental en los términos establecidos;
- c) Incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los estudios ambientales, plan de manejo ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competente;
- d) Incumplimiento de las medidas de producción más limpia expedidas por la Autoridad Ambiental Nacional;
- e) Incumplimiento de las medidas para el manejo adecuado de productos o elementos considerados peligrosos, conforme la norma técnica correspondiente;
- f) Uso, comercialización, tenencia o importación de productos prohibidos o restringidos de acuerdo a la norma técnica correspondiente;
- g) Gestión de residuos, desechos o sustancias químicas, en cualquiera de sus fases, sin la autorización correspondiente o sin cumplir las condiciones administrativas y técnicas establecidas en la normativa ambiental aplicable;
- h) Incumplimiento parcial de las medidas de remediación, restauración o reparación aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente;
- i) Incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente o plan de acción aprobado;
- j) Incumplimiento de obligaciones establecidas en las autorizaciones administrativas y normativa ambiental, que permiten el seguimiento, monitoreo y control, requeridas por la Autoridad Ambiental Competente;
- k) Incumplimiento de las observaciones y solicitudes de información realizadas por la Autoridad Ambiental Competente en los términos señalados en el presente Reglamento; y, l) Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

Art. 501.- No conformidades mayores. - Se consideran no conformidades mayores, cuando se determine:

- a) Reiteración de una no conformidad menor que se haya determinado por los mecanismos de control y seguimiento establecidos en este Reglamento;
- b) Incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro y fuente muestreada;
- c) Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a largo plazo, producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativa ambiental aplicable;
- d) Incumplimiento total de las medidas de reparación, remediación y restauración aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente;
- e) Incumplimiento total de la ejecución del plan emergente o plan de acción aprobado;
- f) Abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con la aprobación de la Autoridad Ambiental Competente;
- g) Incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de contingencia;
- h) Realización de actividades no contempladas o distintas a las autorizadas por la Autoridad Ambiental Competente;
- i) Movimiento transfronterizo de residuos y desechos sin autorización administrativa;
- j) Disposición final o temporal de escombros, residuos o desechos en lugares no autorizados;

k) Determinación de responsabilidad por daño ambiental mediante resolución en firme; y, l) Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

Para la fácil identificación de los criterios anteriormente expuestos, se asignará un color de acuerdo al nivel de cumplimiento, así:

Conformidad	C
No Conformidad Mayor	NC+
No Conformidad Menor	NC-
No Aplica	N/A

La evaluación ambiental del Proyecto "Construcción de las Unidades Básicas de Saneamiento en todas las comunidades rurales del Cantón Santa Clara que no dispongan de un sistema de eliminación de aguas residuales y disposición final de excreta", se realizó en los siguientes aspectos:

- Evaluación del cumplimiento de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales.

A continuación, se presenta la matriz de Cumplimiento y No Cumplimiento de las actividades descritas en el Marco Normativo Ambiental y CERTIFICADO AMBIENTAL No. MAAE-SUIA-DZDCH-2022-CA-0204.

Anexo 4. Equipos de protección personal






Anexo 3. Maquinaria



Anexo 2. Punto Ecológico




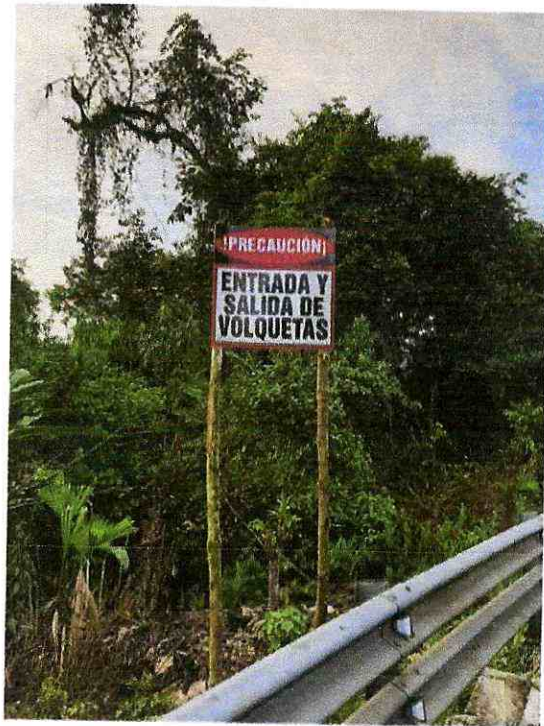



14. ANEXOS

Anexo 1. Señalética

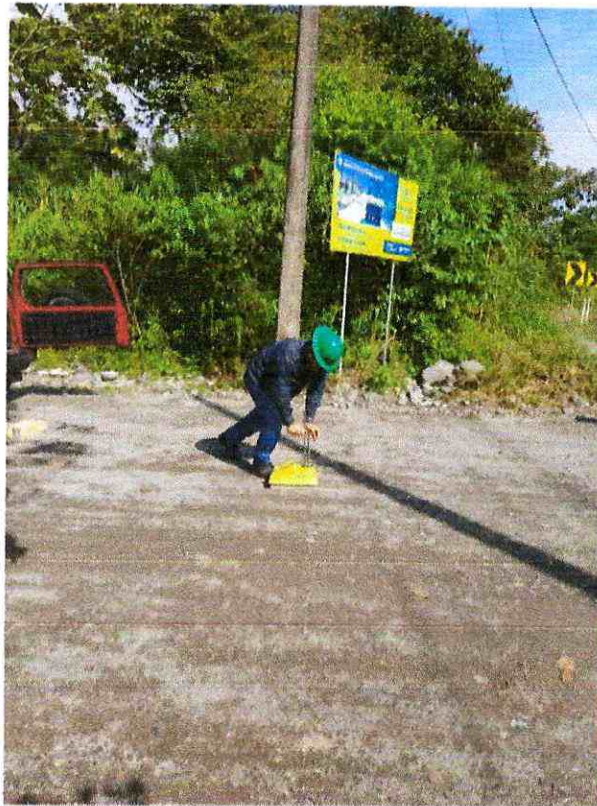

12. RECOMENDACIONES

Se recomienda seguir con el seguimiento y cumplimiento a la guía de buenas prácticas ambientales del proyecto "ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", e implementar un plan de mantenimiento

13. CONCLUSIONES


- El bajo porcentaje de cumplimiento, se ve evidenciado, por la aplicabilidad de las medidas al proyecto, al tratarse de una obra civil.
- El proyecto se encuentra concluido al 100%, con oficio de recepción provisional.

Se coordina las capacitaciones al personal de la obra, con la finalidad de instruirlo en el manejo adecuado de los residuos sólidos, su clasificación, composición y disposición final.

- No existe la generación de chatarra dentro de la obra, los trabajos de reparación de maquinaria se los realiza en talleres externos.
- Se da cumplimiento con la Norma INEN de identificación de los recolectores para basura diferenciados por su composición.
- Existe el lugar de acopio para la colocación de los recolectores de los residuos.
- La disposición de residuos es ubicada en el área destinada para este fin, donde son entregados al servicio de recolección de basura del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pastaza.

Matriz resumen de hallazgos

MEDIDAS AMBIENTALES	Cumple	No Cumple	N/A	TOTAL
USO DE LA ENERGÍA	0	0	25	25
USO DEL AGUA	0	0	4	4
GESTIÓN DE LOS DESECHOS	5	0	1	6
USO DEL PAPEL	0	0	19	19
TRANSPORTE Y MOVILIDAD	0	0	4	4
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS	9	0	3	12
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS	2	0	1	3
PLAN DE CAPACITACIÓN	1	0		1
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS	2	0	1	3
PLAN DE CONTINGENCIA	2	0	2	4
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	3	0	0	3
PLAN DE REHABILITACIÓN	0	0	2	2
PLAN DE ENTREGA Y ABANDONO DEL ÁREA	0	0	2	2
TOTAL	24	0	64	68

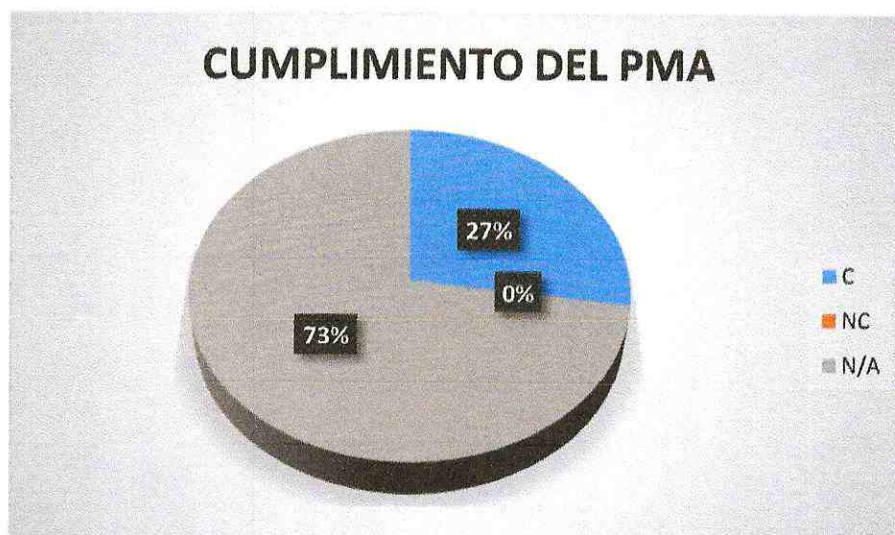

10. IMPACTOS Y RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES DE OBRA

A continuación, se presenta un breve análisis de los principales impactos asociados en la ejecución de obra a través de los rubros contractuales:

- **Excavación.** - La excavación es el movimiento de tierras realizado a cielo abierto y por medios manuales, utilizando pico y palas, o en forma mecánica con excavadoras, y cuyo objeto consiste en alcanzar el plano de arranque de la edificación, es decir las cimentaciones. Esta excavación motiva una afectación principalmente al recurso físico aire, debido a la generación de ruido, por el uso de las maquinarias, así como polvo por la acción en sí de movimiento de tierras.
- **Desalojo de Material de Excavación.** - Es el material no apto para el relleno, que se desaloja en sitios destinados cercanos al proyecto. Esta actividad motiva una afectación hacia la población, ya que las volquetas cada vez que ingresan a las escombreras sus neumáticos se contaminan con este material y a medida que se va transportando este se desprende y empieza a afectar la carretera.

En virtud de los principales riesgos antes acotados, el consorcio ha dispuesto una serie de medidas para que sean aplicadas en la obra.

- a) *Las maquinarias que se encuentren laborando dentro del proyecto deben ser revisadas debidamente en lugares autorizados.*
- b) *Una vez terminada la jornada de trabajo, el personal se encargará de mantener limpio y ordenado su lugar de trabajo.*
- c) *Señalización del lugar de trabajo, en los lugares que se requiera.*

11. RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

Los siguientes aspectos ambientales que se detallan son aquellos que no aplican dentro del proyecto.

- Equipo de Ofimática
- Climatización
- Iluminación
- Uso del Agua
- Uso del Papel
- Consumo Responsable
- Transporte y Movilidad

Aspecto ambiental que se cumple dentro de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales y de acuerdo con la naturaleza del proyecto.

GESTIÓN DE LOS DESECHOS:

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	Verificar el nivel de cumplimiento al presente PMA, a través de un informe interno de cumplimiento de las medidas del Plan Aprobado por la Autoridad Ambiental.	X				Informe de seguimiento y cumplimiento
	Monitorear el Manejo de los desechos peligroso y no peligrosos dentro del área de influencia del proyecto. Realizar el mantenimiento de los extintores	X				No se producen desechos en obra En su debido momento
PLAN DE REHABILITACIÓN	Revegetación o reforestación de áreas degradadas en el proyecto con plantas nativas de la zona.				X	El proyecto recién inicia, esta actividad se realizará al final de los trabajos
	Retirar el suelo contaminado, y entregarlo a un Gestor Calificado para sus disposición final, revegetar el área con especies nativas				X	No se generan suelos contaminados
PLAN DE ENTREGA Y ABANDONO DEL ÁREA	Desmantelamiento de la infraestructura temporal existente en el área del proyecto (campamento, área de almacenamiento de combustibles y desechos peligrosos)				X	No se dispone de infraestructura o campamento
	Limpieza general del área del proyecto.				X	El proyecto recién inicia, esta actividad se realizará al final de los trabajos

	<p>manos.</p> <p>En Caso de Explosión:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evacue la zona de riesgo y proceda de acuerdo a lo establecido en el programa de contingencias. - Acordone el área y restrinja el acceso a personal ajeno. - Utilice el extintor adecuado. <p>No intente extinguir el fuego hasta que las fugas hayan sido detenidas, de otra manera, existe grave riesgo de reignición y explosión.</p> <p>En caso de sismos o fenómenos naturales</p> <p>Antes de un Sismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comozca las zonas de seguridad. - Contar con un mapa de peligros potenciales y zonas seguras. - Reciba entrenamiento en primeros auxilios y evacuación. - Manténgase plenamente informado de cómo interrumpir de forma segura sus labores habituales o el proceso de construcción. - Observe la ubicación de su área de trabajo, buscar sitios de protección contra materiales que pudieran desprenderse. - Haga una evaluación de vulnerabilidad de su entorno de trabajo para determinar los peligros potenciales. <p>En caso derrame o fuga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Localice el derrame o fuga - Antes de comenzar con el control o contención del derrame, debe colocarse los elementos de protección personal necesarios: Ropa adecuada impermeable y resistente a los productos químicos; guantes protectores; lentes de seguridad; protección respiratoria. - Contenga con barreras, diques y/o materiales absorbentes. - Colocar flujos y desechos en recipientes o fundas para recolección de materiales contaminados. - Entregar el material contaminado a un Gestor Calificado. 		
--	---	--	--

	<p>caso de incendio, derrame, fuga o explosión.</p> <p>Crear un comité de seguridad que actúe en caso de emergencias.</p>			<p>X</p>	<p>No aplica por el número de trabajadores, sin embargo, estará contemplado en el plan de contingencias.</p>
	<p>Se deberá realizar simulacros, de evacuación. Incendios, derrames o fugas para agilizar los tiempos de reacción del personal y su actuación frente a un evento.</p>			<p>X</p>	<p>No aplica dicha medida, los trabajos son de mantenimiento vial, no existen fuentes de riesgo para incendios o derrames.</p>
	<p>Actuar de la siguiente manera en caso de: En Caso de Incendio: - Si alguien detecta un fuego incipiente y sabe usar un extintor, actúe inmediatamente. - Se recomienda el uso de extintores industriales ubicados estratégicamente Tipos de extintores: El tipo A: Se usará durante la combustión de sólidos comunes, El tipo B: Se usará para líquidos y gases inflamables El tipo C: para equipo eléctrico energizado y el tipo D para metales combustibles. - Salve su vida y la de los demás abandonando el lugar de incendio. - Una vez a salvo, avisar a la brigada (hágalo sin pensar que otros ya lo han hecho). - Solicite auxilio. - Mantenga la calma y espere al rescate. - Si se encuentra atrapado por el humo, trate de salir arrojándose o permanezca lo más cerca del suelo, el humo tiende a subir y existe aire no contaminado a nivel del suelo. - Si el humo es muy denso, cúbrase con un pañuelo o ropa (mojados) la boca y nariz, manténgase cerca del suelo. - Cuando se inflaman las ropas de una persona, impida que corra, el viento aviva el fuego. Cobijelo con una manta húmeda y haga que se proteja la cara y cuello con las</p>	<p>X</p>		<p>Establecido en el plan de contingencias</p>	

	<p>Los desechos no peligrosos no se podrán almacenar por más de un año; deberán ser entregados a un gestor calificado para su tratamiento final.</p> <p>Dotar de fundas plásticas a los conductores de volquetes y maquinaria pesada para los desechos comunes.</p> <p>Implementar de contenedores de colores debidamente etiquetados para la clasificación de los residuos en la vía, se deberá cumplir con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Encontrarse bajo techo. -Contenedores de 55 galones (4) <p>El rotulado estará en un lugar visible con caracteres legibles según lo establecido en la NTE INEN 878. El nombre o denominación de los residuos con su logo respectivo y la distancia de observación según lo establecido en la NTE INEN ISO 3864-1</p> <p>- Se realizará una clasificación general de residuos:</p> <p>Colores de los contenedores a implementar.</p> <p>Azul: Reciclables</p> <p>Negro: No Reciclables</p> <p>Verde: Orgánicos</p> <p>Rojo: Peligrosos</p>	<p>X</p> <p>X</p>	<p>Fundas para desechos comunes (Anexo 9)</p> <p>Se dispone de un punto ecológico</p>
<p>PLAN DE CAPACITACIÓN</p>	<p>Capacitar al personal de trabajo sobre temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Medidas propuestas en el PMA -Manejo de los procedimientos de seguridad -Trabajos en altura -Protección del ambiente -Primeros Auxilios y procedimiento en caso de emergencias -Manejo de desechos peligrosos y no peligrosos. -Técnicas para prevenir conflictos con la comunidad. <p>Realizar una reunión previa con los involucrados directos del proyecto para darles a conocer las ventajas de la implementación del proyecto obra o actividad.</p> <p>Implementar un buzón donde se recepte las quejas y sugerencias de la población.</p> <p>Participar activamente en reuniones y procesos comunales que se realicen en el área de influencia.</p>	<p>X</p> <p>X</p>	<p>Se brindó capacitación en el mes de diciembre 2022</p> <p>Se visitó las viviendas aledañas al proyecto</p> <p>Buzón de quejas implementado (Anexo 8)</p> <p>No se han realizado aun alguna reunión de la comunidad</p> <p>Plan de contingencias</p>
<p>PLAN DE CONTINGENCIA</p>	<p>Elaborar un Plan de Contingencia accesible a todo el personal en el cual se aborde la gestión de contingencia en</p>	<p>X</p>	<p>Plan de contingencias</p>

<p>PLAN DE MANEJO DE DESECHOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> -En el área se deberá implementar un extintor para prevenir cualquier riesgo de incendio. -Tener un acceso adecuado para la carga de combustible y en caso de ser necesario para la entrada del carro de los bomberos. -El área deberá estar señalizado en base a la normativa NTE INEN-ISO 2266. <p>Ubicar el material de desalajo en los sitios descritos en el ítem 7. del presente documento. Los cuales han sido ubicado de acuerdo a los siguientes criterios técnicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Deberán encontrarse dentro del área de influencia del proyecto. -El terreno debe estar desprovisto de vegetación. -Alejados de cursos hídricos. -Las áreas destinadas para escombreras deberán ser estables y seguras a corto y largo plazo. -Deberán contar con una capacidad mínima de 1500 m3 -El transporte del material deberá realizarse en una volqueta con cubierta (lona), con el fin de evitar derrames en la carretera. 			<p>El proyecto, al ser de mantenimiento vial, no genera desalajos ni escombros.</p>
	<p>Implementar un área de almacenamiento temporal de desechos peligrosos el cual deberá tener las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Estar bajo cubierta -Iluminación natural -En un espacio abierto, cercado. -El acceso a estos locales debe ser restringido, y el personal que ingrese estará provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad industrial; -Contar con señalización apropiada en lugares y formas visibles; en base a la norma NTE INEN 2266. -Contar con el material y equipamiento para atender contingencias -Contar con sistemas de extinción contra incendios -Contar con bases o pisos impermeabilizados o similares, según el caso. <p>Colores de los contenedores a implementar Rojo: Desechos Peligrosos</p>		<p>X</p>	<p>No se generan desechos peligrosos</p>

	<p>El transporte del equipo se realizará utilizando las vías accesos existentes, considerando no causar molestias a los habitantes del costado de la vía y el posible deterioro de la misma.</p> <p>Implementar un kit anti derrame y equipos de respuesta rápida, para combatir posibles emergencias. Contenido del Kit Anti Derrame: - Pala, paños absorbentes, (salchicha observante), guantes, botas, gafas protectoras, escoba, fundas o recipientes para recolectar los desechos contaminados.</p> <p>Se deberá instalar de forma permanente un extintor y botiquín de primeros auxilios en los vehículos y/o maquinaria pesada. Contenido del botiquín de primeros auxilios: - Antisépticos, alcohol gel, gasas, tijeras, algodón, termómetro, esparadrapo.</p> <p>Dotar al personal que labora en el proyecto de EPP.</p> <p>Implementar un área para el almacenamiento temporal de combustibles, el cual deberá cumplir con las siguientes características: -Deberá estar ubicado alejado de cuerpos hídricos, y aislado - Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no inundables. -La estructura será realizada con vigas de madera y cubierta de dura techo o también pueden ser hojas de zinc (Las dimensiones del área se las realizará en base a la cantidad de tanques de almacenamiento a utilizar). -El tanque de almacenamiento deberá estar protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones que contaminen el ambiente, y contará manguera y llaves de distribución. -El tanque de almacenamiento deberá estar rodeado de un cubeto o estructura de contención impermeable técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque.</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>			<p>mantenimiento, hay que mencionar que la maquinaria es contratada. La circulación es por la red vial provincial, respetando toda señal y reglamento de tránsito Kit anti derrame (Anexo 6)</p> <p>Botiquín y extintor en obra (Anexo 7)</p> <p>Personal con EPP (Anexo 4)</p> <p>No se almacena combustibles, esto dada las condiciones de cercanía del proyecto a la ciudad, se transporta el combustible necesario para la maquinaria</p>
--	---	-------------------------------------	--	--	---

TRANSPORTE Y MOVILIDAD	Utilizar el transporte público.	X		El trabajo es netamente de campo, obra civil.
	Utilizar bicicleta.	X		El trabajo es netamente de campo, obra civil.
	Cuando es inevitable el uso del vehículo privado, el sistema de carro compartido puede ser una opción bastante eficiente.	X		El trabajo es netamente de campo, obra civil.
2. OTROS (Incorporación de medidas conforme a la actividad del proyecto)				
# Medidas				
Implementar señalética				
Señalética de Prohibición				
Señalética de condición obligatoria Señalética de condición segura Señalética preventiva				
Señalética ambiental				
Señalética informativa.				
-Usar las figuras geométricas, colores de seguridad, y colores de contraste para señales de seguridad de la Tabla N°1 de la Norma INEN ISO 3864				
-Usar los diseños para señales de prohibición, acción obligatoria, precaución, condición segura.				
Humedecer la vía en días soleados para evitar material particulado, optimizando el recurso agua.				
Zonificar las áreas de trabajo con cinta de peligro.				
Cubrir con una lona las volquetas que trasladan material pétreo hacia el lugar de la obra				
Las vías por donde circula el equipo caminero deben estar despejadas y sin obstáculos.				
Realizar mantenimiento regular de la maquinaria y equipos utilizados.				
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS				

	Reutilizar todo el papel que haya sido impreso sólo por una cara			X	El trabajo es netamente de campo, obra civil.
	Utilizar papel reciclado para hacer fotocopias.			X	El trabajo es netamente de campo, obra civil.
	Imprimir en calidad de borrador para evitar el derroche de tinta y facilitar la reutilización, especialmente en el caso de los documentos internos, y el reciclaje.			X	El trabajo es netamente de campo, obra civil.
	Separar el papel inservible, haciendo uso de los contenedores puestos a disposición a tal fin. Resulta interesante, siempre que sea posible, romper el papel antes de depositarlo en los contenedores para reducir el volumen que ocupa.			X	El trabajo es netamente de campo, obra civil.
	Para los residuos, tener una pequeña papelería junto a cada mesa de trabajo optimizará la reutilización y reciclaje			X	El trabajo es netamente de campo, obra civil.
	CONSUMO RESPONSABLE				
	Ajústate a las necesidades reales en cuanto a los insumos que existen en tu lugar de trabajo, así evitarás comprar inútilmente			X	El trabajo es netamente de campo, obra civil.
	Utiliza adecuadamente y comparte el material de la dependencia administrativa para alargar su vida útil, al mismo tiempo que se genera ahorro para la institución			X	El trabajo es netamente de campo, obra civil.
	Si vas a almacenar en la dependencia administrativa evita comprar alimentos que sabes te darán en envases de polietileno (espuma flex) para transportarlos, es un material que no se puede reciclar y contamina por mucho tiempo el ambiente, lleva tus propios recipientes y pide que te pongan los alimentos en ellos. Seamos coherentes con nosotros mismos y con la institución donde trabajamos.			X	El trabajo es netamente de campo, obra civil.
	Prefiere las pilas recargables, ya que las pilas comunes contaminan de 3 mil a 175 mil litros de agua dependiendo de sus componentes como el mercurio. Las pilas recargables pueden usarse hasta unas dos mil veces según el tipo y uso adecuado.			X	El trabajo es netamente de campo, obra civil.
	Compra lápices y marcadores recargables, de esta manera evitarás generar más desechos. Prefiera productos cuyos envases tengan el logotipo de reciclable o reutilizable.			X	El trabajo es netamente de campo, obra civil.
	Adquiere productos naturales para tu aseo personal, recuerda que el uso de aerosoles perjudica al ambiente			X	El trabajo es netamente de campo, obra civil.
	Desplazamiento a pie			X	El trabajo es netamente de campo, obra civil.

	<p>Reciclar: A este término se le suele confundir con el de "separar" o "reutilizar", sin embargo, el reciclado tiene que ver con la adquisición de materiales viejos o usados para ser procesados química o físicamente y obtener una materia prima y a partir de ésta fabricar productos nuevos</p> <p>Elimina el uso de botellas individuales de plástico, consume el agua del dispensador usando toma <u>todo</u> o tu vaso personal</p> <p>Elimina el uso excesivo de fundas plásticas, en su lugar utilizar fundas reutilizables.</p> <p>Evitar su uso siempre que sea posible, por ejemplo, guardando los documentos en formato digital, optimizando el número de copias necesarias, compartiendo la información en lugar de generar copias</p> <p>para cada persona, aprovechando las posibilidades de Internet, correos electrónicos, teléfono, etc.</p> <p>Utilizar de forma preferente y en la medida de lo posible papel reciclado. No se debe olvidar que el papel reciclado puede llegar a tener una calidad similar a la del papel convencional</p> <p>Evitar imprimir documentos innecesarios o de aquellos que tienen mucho espacios libres (Ej: presentaciones de power point)</p> <p>Antes e imprimir, comprobar los posibles fallos y mejoras del documento, utilizando, por ejemplo, la "vista previa": ajuste de márgenes, división de párrafos eficiente, paginación correcta, reducción del tamaño de las fuentes, etc.</p> <p>Utilizar el papel por las dos caras en el fotocopiado e impresión de documentos, siempre que sea posible. Igualmente, ajustar en la medida de lo posible, los textos para que quepan dos páginas de un documento, libro o publicación en una hoja estándar.</p> <p>Todos los documentos internos se imprimirán reutilizando papel o bien, usando papel reciclado y a doble cara</p> <p>Utilizar medios de comunicación electrónicos en la medida de lo posible para reducir el uso de impresoras y faxes</p> <p>Reutilizar todo el papel que haya sido impreso <u>sólo</u> por una cara para imprimir borradores, fabricar bloc de notas, etc</p>	X			Se dispone de un punto ecológico (Anexo 2)
		X		X	Se dispone de botellones de agua (Anexo 10)
				X	No se utilizan en obra
				X	El trabajo es netamente de campo, obra civil.
				X	El trabajo es netamente de campo, obra civil.
				X	El trabajo es netamente de campo, obra civil.
				X	El trabajo es netamente de campo, obra civil.
				X	El trabajo es netamente de campo, obra civil.
				X	El trabajo es netamente de campo, obra civil.
				X	El trabajo es netamente de campo, obra civil.

USO DEL PAPEL

	<p>Reporta a la unidad de tecnología de la institución daños o dificultades en el uso de equipos informáticos, ya que requieren de un adecuado mantenimiento para su óptimo rendimiento.</p> <p>Evitar el uso del fax térmico, ya que consume más energía y el papel no puede reciclarse.</p>			<p>X</p>	<p>El trabajo es netamente de campo, obra civil. No se hace uso de equipos informáticos</p>
	<p style="text-align: center;">CLIMATIZACIÓN</p> <p>Usar estos dispositivos sólo cuando sea necesario. Siempre que sea posible, aprovechar la regulación natural de la temperatura, por ejemplo, en verano las ventanas entornadas o las corrientes de aire pueden refrescar algunas salas sin necesidad de encender el aire acondicionado.</p> <p>Apagar o minimizar los sistemas de calefacción o aire acondicionado en las salas no ocupadas: sala de reuniones vacías, fuera de las horas de trabajo</p> <p>Conocer adecuadamente cómo funcionan los sistemas de calefacción y refrigeración, para maximizar la eficiencia de los equipos de climatización.</p> <p>Mantener la temperatura aproximadamente en 20°C en invierno, y aproximadamente en 24°C en verano, para disminuir el consumo energético.</p> <p>Asegurarse de que los equipos de climatización se programan para funcionar exclusivamente en el período de trabajo, a excepción de situaciones en las que haga falta calefacción o refrigeración previas.</p> <p>Asegurarse de que las puertas y ventanas están cerradas mientras funcionan los equipos de climatización, para impedir pérdidas y derroche</p> <p style="text-align: center;">ILUMINACIÓN</p> <p>Sustituir progresivamente las antiguas bombillas incandescentes y tubos fluorescentes, que usan tecnología ineficiente que desprende más calor que luz</p> <p>Usar interruptores independientes para iluminar sólo las zonas necesitadas de una misma área</p> <p>Aprovechar la iluminación natural, organizando los puestos de trabajo de manera que se mantenga una adecuada iluminación, manteniendo limpias las ventanas y abriendo las persianas, cortinas</p>			<p>X</p>	<p>El trabajo es netamente de campo, obra civil. No se hace uso de equipos informáticos</p>
				<p>X</p>	<p>El trabajo es netamente de campo, obra civil.</p>
				<p>X</p>	<p>El trabajo es netamente de campo, obra civil.</p>
				<p>X</p>	<p>El trabajo es netamente de campo, obra civil.</p>
				<p>X</p>	<p>El trabajo es netamente de campo, obra civil.</p>
				<p>X</p>	<p>El trabajo es netamente de campo, obra civil.</p>
				<p>X</p>	<p>El trabajo es netamente de campo, obra civil.</p>
				<p>X</p>	<p>El trabajo es netamente de campo, obra civil.</p>
				<p>X</p>	<p>El trabajo es netamente de campo, obra civil.</p>
				<p>X</p>	<p>El trabajo es netamente de campo, obra civil.</p>

Evaluación de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales para la obra vial.

1. CUMPLIMIENTO GUIA DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES		Cumple	No Cumple	N/A	Observaciones
# Medidas					
EQUIPOS DE OFIMÁTICA					
Una vez finalizada la jornada de trabajo apaga las luces, impresoras, computadoras y demás aparatos eléctricos.				X	No se trabaja con fuentes eléctricas
Cuando te ausentes por más de una hora, mejor apaga el monitor de la computadora o ponlo en hibernar, ya que gasta un 70% total del consumo energético del equipo. Un monitor encendido tiene una potencia de 60 W, unos 6,5 W en espera, y 1W apagado				X	El trabajo es netamente de campo, obra civil. No se hace uso de equipos informáticos
El único protector de pantalla que ahorra energía es negro. Es deseable configurarlo para que se active tras 10 minutos de inactividad.				X	El trabajo es netamente de campo, obra civil. No se hace uso de equipos informáticos
Los ordenadores portátiles son más eficientemente energéticos que los de mesa.				X	El trabajo es netamente de campo, obra civil.
Reduce el uso del papel o del secador de manos, utiliza tu propia toalla.				X	El trabajo es netamente de campo, obra civil.
Da preferencia al uso de las escaleras en lugar de los ascensores; es mucho más saludable, económico y ecológico.				X	El trabajo es netamente de campo, obra civil.
Llama al ascensor pulsando solo un botón para evitar hacer viajes innecesarios. O si vas a bajar o subir solo un piso mejor haz ejercicio, es bueno para tu salud.				X	El trabajo es netamente de campo, obra civil.
No conectes varios aparatos al mismo tiempo porque puede producirse una sobrecarga, posibles apagones y deterioro de las instalaciones a largo plazo.				X	El trabajo es netamente de campo, obra civil. No se hace uso de equipos informáticos
Configura los equipos de tu dependencia administrativa como computadoras, copiadoras, impresoras, etc. en modo de "ahorro de energía" para reducir el consumo de electricidad hasta en un 50%.				X	El trabajo es netamente de campo, obra civil. No se hace uso de equipos informáticos
Para sacar tres o menos copias, es mejor imprimir. A partir de cuatro hojas, la copiadora es la mejor opción				X	El trabajo es netamente de campo, obra civil. No se hace uso de equipos informáticos
Comparte eficientemente los equipos de dependencia administrativa entre compañeros				X	El trabajo es netamente de campo, obra civil. No se hace uso de equipos informáticos

USO DE LA ENERGÍA

8. RESUMEN DE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

La Guía Ambiental es el resultado final de este proceso de evaluación y presenta disposiciones de prevención, control y mitigación enmarcados en una serie de medidas para que el contratista las cumpla en el proyecto "ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA ACCESO A LA COMUNIDAD MUSHU WARMI CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE GRANULAR DE LA VÍA HACIA LA COLONIA SANTA ISABEL CON ORGANOSILANOS EN BASE A NANOTECNOLOGÍA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, SECTOR LAS AMÉRICAS, PARROQUIA PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA" con el objetivo primordial de cumplir con el marco Legal Ambiental Ecuatoriano y las Políticas Ambientales del Constructor.

La guía de buenas prácticas se encuentra aprobada por el ente rector, se detalla las medidas y actividades ambientales para la Obra.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Tendido de carpeta asfáltica

Matriz 3. Cumplimiento a la Normativa (D.E. No. 2393)

D.E. No. 2393 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO						
No.	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN				Observaciones
		C	NC -	NC +	N/A	
1	Art. 11.- Obligaciones de los Empleadores 1. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro 5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios.	X				Anexo 3 y 4

En base a lo anterior, se puede observar en la Matriz 3, existe 1 medida en el cumplimiento del Decreto Ejecutivo 2393; como resultado se ha obtenido 1 conformidades (100%), tal como se evidencia en la Grafico 3.

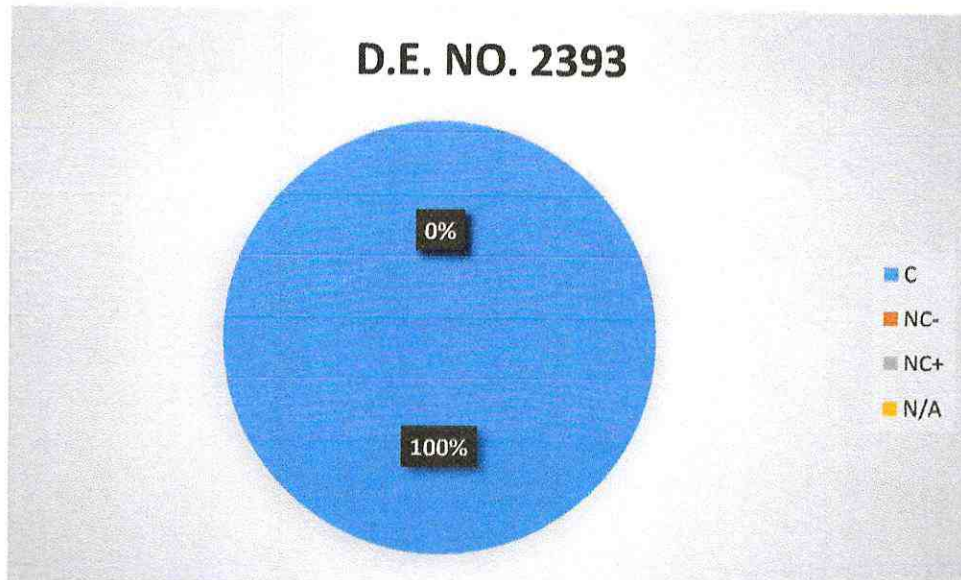


Gráfico 3. Porcentaje de Cumplimiento al D.E. No. 2393

Matriz 2. Cumplimiento de la Normativa Ambiental (Norma Técnica INEN)

NORMA TÉCNICA INEN						
No	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN				Observaciones
		C	NC -	NC +	N/A	
1	Norma INEN 3864, Relacionada a la señalética.	X				Anexo 1.
2	Norma INEN 2841, Estandarización de colores para recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos.	X				Anexo 2.

En base a lo anterior, se puede observar en la Matriz 2, existe 2 medidas en el cumplimiento de la Norma INEN; como resultado se ha obtenido 2 conformidades (100%), tal como se evidencia en la Gráfico 2.

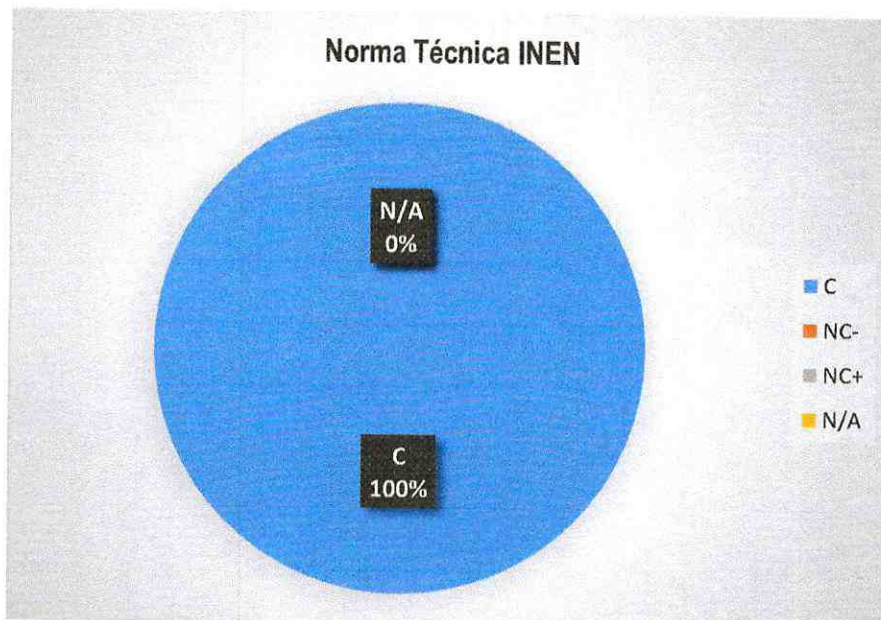


Gráfico 2. Porcentaje de cumplimiento Norma Técnica INEN

Cumplimiento Codigo Organico Ambiental




Gráfico 1. Porcentaje de cumplimiento Código Orgánico Ambiental

7.1 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL

Matriz 1. Cumplimiento de la Normativa Ambiental (Código Orgánico Ambiental)

CODIGO ORGANICO AMBIENTAL						
No	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN				Observaciones
		C	NC -	NC +	N/A	
1	<p>CAPITULO III</p> <p>Art. 201.- De los mecanismos. El control y seguimiento ambiental puede efectuarse por medio de los siguientes mecanismos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoreos; 2. Muestras; 3. Inspecciones; 4. Informes ambientales de cumplimiento; 5. Auditorías Ambientales; 6. Vigilancia ciudadana o comunitaria; y, 7. Otros que establezca la Autoridad Ambiental Competente. 	X				Informe Ambiental de Cumplimiento Mensual
2	<p>CAPITULO IV</p> <p>Artículo. 177.- De la información de los proyectos, obras o actividades que puedan afectar al ambiente. La autorización administrativa emitida por la Autoridad Ambiental Competente deberá incorporarse inmediatamente al Sistema Único de Información Ambiental. Las autorizaciones emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional son de acceso público, de conformidad con la ley</p>	X				CERTIFICADO AMBIENTAL No. MAAE-SUIA-DZDCH-2022-CA-0204.
3	<p>CAPITULO IV</p> <p>Art. 181.- De los planes de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental será el instrumento de cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo que comprende varios subplanes, en función de las características del proyecto, obra o actividad. La finalidad del plan de manejo será establecer en detalle y orden cronológico, las acciones cuya ejecución se requiera para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, compensar, restaurar y reparar, según corresponda.</p> <p>Además, contendrá los programas, presupuestos, personas responsables de la ejecución, medios de verificación, cronograma y otros que determine la normativa secundaria.</p>	X				CERTIFICADO AMBIENTAL No. MAAE-SUIA-DZDCH-2022-CA-0204.

En base a lo anterior, se puede observar en la Matriz 1, existe 3 medidas en el cumplimiento del Código Orgánico Ambiental; como resultado se ha obtenido 3 conformidades (100%), tal como se evidencia en la Grafico 1.

MINA TARABITA
 LLANO GASPATA MARIA ROSA
 Dir.: Vía Macas Km. 1 ½
 Vía Madre Tierra s/n y Colonia Agua Santa 2
 Puyo * Pastaza

R.U.C. 1600040594001

FACTURA 002-001-

00000255

AUT.SRI: 1130275076

FECHA EMISION: 14/10/2022


R.U.C./C.I. 1691728902001

GUÍA DE REMISIÓN:

Sr(es): CONSORCIO ASFALTADOS CYC

DIRECCION: SALINAS Y COTOPAXI

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
31	MATERIAL RELLENO	22,00	682,00

FORMA DE PAGO Original: Adquirente / Copia: Emisor		SUB TOTAL	682,00
EFFECTIVO	 RECIBI CONFORME	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		IVA 12 %	
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO		IVA 0 %	
OTROS		VALOR TOTAL	682,00

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"
 Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 14083 RUC. 1803599388001 José Luis Cárdenas Fonseca
 Impreso desde Nº 000251 al 000275 Fecha Impresión: 28-07-2022 Válido hasta: 28 de Octubre.-J2022

SANCHEZ QUISHPE MARCELO HERNAN

-ALQUILER DE GRÚAS CON OPERADOR Y OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN. -ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN SIN OPERADORES. -CONSTRUCCIÓN DE CALLETERAS, CALLES, AUTOPISTAS Y OTRAS VÍAS PARA VEHÍCULOS CIRCULANTES.
Dir.: 9 de Octubre y Sadog Valladares
PUYO - PASTAZA
"Obligado a Llevar Contabilidad"

RUC: 1801950393001
FACTURA 004-001
000000441
AUTORIZACIÓN SRI # 1129731399

Fecha de Emisión: 12 10 2022
DIA MES AÑO
Documento Categorizado: NO
Guía de Remisión: _____

Cliente: CONSORCIO PAVIMENTOS CYC

Dirección: SALINAS Y COLPAXI

RUC/C.I.: 1691728902001 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V/TOTAL
40,49	ALQUILER MAQUINARIA EXCAVADORA CTA 320 EN EL PROYECTO ORGANOSISTEMAS EN BASE NANOTECNOLOGIA PARA PRODUCCION TAPAJI Y PUYO	40,18	1.626,89

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR
FORMA DE PAGO
EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO OTROS

AGENTE DE RETENCIÓN No. De Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%	1.626,89
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	1.626,89
IVA 12%	195,23
VALOR TOTAL	1.822,12

**COMPANIA DE SERVICIO & TRANSPORTE
DE ARIDOS JUOMAVILL CIA. LTDA.**

Dir.: Cestao Marín sn y Morona
PUYO - PASTAZA

"AGENTE DE RETENCIÓN No. De Resolución
NAC-GTRRIOC21-0000001"

RUC: 1691716623001
FACTURA 001-005

Nº 0000501

AUTORIZACIÓN SRI # 1130543494

Fecha de Emisión: 3 10 2022
DIA MES AÑO

Guía de Remisión: _____

Cliente: CONSORCIO ASFALTOS CYC

Dirección: Salinas y Cotacachi

RUC/C.I.: 1691728902001 Telf: _____

CANT	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
135	TRANSPORTE DE MATERIAL RELLENO Y PLAZA	40,00	5400,00

Punto de Emisión: 001-005 Régimen: GENERAL

RUC: 1609261323001 Placa: _____

Razón Social: VILLACIS TUBON JOSE EDUARDO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / TARJETA DE CREDITO / DEBITO / OTRO

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0%	5400,00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	5400,00

ORIGINAL: Adquirente - 1RA. COPIA: Emisor
2DA. COPIA: Sin Valor Tributario

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

**COMPAÑIA DE SERVICIO & TRANSPORTE
DE ARIDOS JUOMAVILL CIA. LTDA.**
Dir.: Ceslao Marín sn y Morona
PUYO - PASTAZA
"AGENTE DE RETENCIÓN No. De Resolución
NAC-GTRFIOC21-00000001"

RUC: 1691716623001
FACTURA 001-005
Nº 0000502
AUTORIZACIÓN SRI # 1130543494

Fecha de Emisión: 24 10 2022
DIA MES AÑO

Guía de Remisión: _____

Cliente: CONSORCIO ASFALTOS C9C

Dirección: SALINAS Y COMODAXI

RUC/C.I.: 1691728902001 Telf.: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL
10	TRANSPORTE RELLENO-PIEDRA	40,00	400,00
75	TRANSPORTE RELLENO-PIEDRA	36,00	2700,00
106	TRANSPORTE RELLENO-PIEDRA	59,00	6.148,00
5	DESALAZO	10,00	50,00

Punto de Emisión: 001-005 Régimen: GENERAL

RUC: 1600261323001 Placa: _____

Razón Social: VILLACIS TUBÓN JOSÉ EDUARDO

FORMA	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DE PAGO	DINERO ELECTRONICO	OTROS	

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0%	9.298,00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	9.298,00


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Adquirente - 1RA. COPIA: Emisor

2DA. COPIA: Sin Valor Tributario

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp Offset "Jesús del Gran Poder" - Av. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2686 032
RUC: 0601582935001 del 0002501 al 0003000- F. Autorización 29-SEPTIEMBRE-2022- F. Caducidad 29-SEPTIEMBRE-2023

**TRANSPORTE PESADO
FREIRE CORTEZ S.A.**

DIRECCIÓN: VIA PUYO TENA
PASTAZA - ECUADOR

PUNTO DE EMISION 001 - 002
RAZON SOCIAL: FREIRE CORTEZ ROMULO RUPERTO
RUC.: 1600237500001
REGIMEN: GENERAL

FACTURA 001 - 002

Nº 000095

R.U.C.: 1691713381001
AUT.S.R.L.: 1128926664

AGENTE DE RETENCION Y EL N° DE RESOLUCION MAC-DNCRASC20-0000001

DIAS 18 MES 10 AÑO 2022

Señor: Consorcio Asfaltos C y C

Dirección: Selva y Colopaxi

RUC/CI: 1691728902001

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V UNIT.	V TOTAL
2	transporte lleno	36.00	72.00
13	transporte lleno	58.00	754.00

BAVARI - AG Vázquez Benavides Juan Fernando
0768260911 RUC.: 0102315106001/AUT 13591
Serie: 000051 al 000100
Fecha de Autorización: 19/Octubre/2021
Fecha de Caducidad: 19/Octubre/2022

SUBTOTAL..... 826.00

DESCUENTO
I.V.A. 0% 826.00

I.V.A. 12 %

TOTAL USD: 826.00

FORMA DE PAGO

ELECTRÓNICO

ORDEN ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO - DEBITO

OTROS

[Firma]
Firma Conforme

137
**COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
 INTERNACIONAL BUITRAGO S.A.**

Dir. Matriz: Vía a Tarqui 5a y 5a
 Puyo - Pastaza

RUC: 1691715783001
Aut. SRI. N° 1130322736
FACTURA-001-024

INFORMACION DE SERIE: 001-024 PLACA:
 RUC: 1691715783001 REGIMEN GENERAL
 PAZÓN SOCIAL: MARTÍNEZ CARRERA JOSÉ PATRICIO
 SERIE DE EMISIÓN

00000005 X

AÑO	MESES	DÍA
2022	10	24


F. AUT.: 08/08/2022 - CADUCA: 08/08/2023
 del 00000001 al 00000050

St. (Es): CONSORCIO ASFALTOS CYC

RUC: 1691729902001

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
18	TRANSPORTE RELLENOS	58,00	1.044,00
1	TRANSPORTE PIEDRAS	40,00	40,00
2	TRANSPORTE RELLENOS	40,00	80,00
1	TRANSPORTE RELLENOS	36,00	36,00
4	DESPIESADO	10,00	40,00

Forma de pago:		SUB TOTAL 12%	
<input type="checkbox"/> Efectivo		SUB TOTAL 0%	1.240,00
<input type="checkbox"/> Con utilización del sistema financiero		DESCUENTO	
<input type="checkbox"/> Otros sin utilización del sistema financiero		SUB TOTAL	
 RECIBI/ CONFORME		IVA 12%	
		VALOR TOTAL	1.240,00

1394197823001 - LINO VASQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
TELF. 03 2894 729 - PUYO - PASTAZA AUT. SRI. 4851

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA 1: EMISOR/ COPIA 2: ARCHIVO

YUMBO TAPUY GILDO ABELARDO
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS

Dirección.: Km 16, vía a Macas
 POMONA - PASTAZA

RUC. 1500440530001
NOTA DE VENTA 001 - 001-
 Cód. Aut. SRI. 1129238793

Nº - 00000023

Cliente: Coosaroca Asfaltos Syc
 Dirección: Ciudad de Chumbay Salomon 19/10/2022
 RUC/CL: 1691720902501 DÍA MES AÑO
 FECHA DE EMISIÓN

CANT	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	mano de obra en el proyecto chumbay chapizaca Simon hualvar.	390.00	390.00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"
 Documento Categorizado: SI
 -Actividades de Servicio hasta \$ 850.00

TOTAL \$ 390.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DIN. ELECTRÓNICO	
TARJETA DÉB/CRED	
OTROS	


 RECIBI CONFORME

CHÁVEZ PUALACÍN HOMERO JHOFFRE Art. 13356 Nº 000001 al 000050
 RUC: 1600492914001 Emis: 22/12/2021 CADUCA: 22/Diciembre/2022

ALBAN GREFA EFREN RODRIGO

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS

Dir.: Miguel Navarro y Hugo Cifuentes

PUYO - PASTAZA

"Contribuyente Régimen Microempresas"

RUC: 1600288581001

FACTURA 001-001

000000109

AUTORIZACIÓN SRI # 1129165729

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 6 10 2022

DIA MES AÑO

Guía de Remisión: _____

Cliente: CONSORCIO ASFALTOS CYC

Dirección: SALINAS 1 COTOPAXI

RUC./C.I.: 1691728902001

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V./TOTAL
58	MANO DE OBRAS EN LA ELABORACION DE CANAL TAS EN EL PROYECTO DE ES MÓVILES EN BASE NA NOTECNOLOGIA PODEROSAS TUBOS Y PUNOS	27,00	1566,00
Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE			

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR


FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	x

SUB TOTAL 12 %	1566,00
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	1566,00



FIRMA AUTORIZADA



RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0000101 al 0000150 - F. Autorización 08-DICIEMBRE-2021 - F. Caducidad 08-DICIEMBRE-2022

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400310361001

FACTURA

No. 001-001-000032489

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2909202201140031036100120010010000324897477040612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2022 14:44:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2909202201140031036100120010010000324897477040612

RIVERA OTACOMA BLANCA MARLENE

FERRETERIA TOAPANTA RIVERA

Dirección 27 DE FEBRERO Y TENIENTE HUGO ORTIZ
Matriz:Dirección 27 DE FEBRERO Y TENIENTE HUGO ORTIZ
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Ag de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CONSORCIO ASFALTOS C Y C

Identificación 1691728902001

Fecha 29/09/2022

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CA001375		13.00	CUMBRERO ANCHO T/D 3MTS		6.49	0.00	0.00	0.00	84.40
CLA00036 8		4.00	CLAVO P MD 2 1/2 C C		1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
GOP00017 1		5.00	GUANTE DE OPERADOR		2.23	0.00	0.00	0.00	11.15
AHG00039 2		1.00	ALAMBRE HG 12		117.76	0.00	0.00	0.00	117.76
ANG00044 8		1.00	ALAMBRE RECOCIDO #18 ADELCA		40.13	0.00	0.00	0.00	40.13
692807367 5656		3.00	ALICATE AISLADO 8*(200mm) INGCO HICP01200		5.00	0.00	0.00	0.00	15.00
CAT00052 6		1.00	CARRETILLA DE TOL		132.14	0.00	0.00	0.00	132.14
PLA00046 5		3.00	PALA TIPO TOMBO CABO METALICA		17.81	0.00	0.00	0.00	53.43
ANG00044 8		1.00	ALAMBRE RECOCIDO #18 ADELCA		40.12	0.00	0.00	0.00	40.12
CCA360		110.00	CEMENTO CAMPEON ANTIHUMEDAD		6.92	0.00	0.00	0.00	761.20
CLA00036 8		30.00	CLAVO P MD 2 1/2 C C		1.00	0.00	0.00	0.00	30.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1803123932001

FACTURA

No. 002-001-000000243

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2209202201180312393200120020010000002433779218419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/09/2022 15:51:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2209202201180312393200120020010000002433779218419

VILLA SAA JOSE XAVIER

VILLA SAA JOSE XAVIER ALQUILER MAQUINARIA

Dirección Matriz: PUYO / QUITO SN Y PICHINCHA

Dirección Sucursal: PUYO / QUITO SN Y PICHINCHA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Alícuota de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ASFALTOS C Y C

Identificación 1691728902001

Fecha 22/09/2022

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Salinas y Cotopaxi

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALC		16.02	Alquiler de maquinaria excavadora en el proyecto Estabilización de la base Granular de la vía comunidad Mushu Warmi sector San Jacinto y vía Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica.		40.00	0.00	0.00	0.00	640.80

Información Adicional

Sucursal: CONSORCIO ASFALTOS C Y C
Dirección: Salinas y Cotopaxi
E-MAIL: consorcioasfaltoscyc2022@gmail.com
Teléfono: 098 328 6135

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 717.70

SUBTOTAL 12%	640.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	640.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	76.90
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	717.70

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600246621001

FACTURA

No. 003-011-000065391

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1209202201160024662100120030110000653910006539116

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/09/2022 16:26:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1209202201160024662100120030110000653910006539116

MORENO MARCO BINICIO

ACERO PUYO

Dirección Matriz: AMAZONAS, BOLIVAR SN Y MANABI

Dirección Sucursal: AMAZONAS, BOLIVAR SN Y MANABI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ASFALTOS C Y C

Identificación 1691728902001

Fecha 12/09/2022

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: CIUDADELA DEL CHOFER, SALINAS Y COTOPAXI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ARM0004		11.00	ARMICOS GALVANIZADO D=1.50MXES=2.00XLA=1.00MT R		226.62	0.00	0.00	0.00	2492.88

Información Adicional

AGENTE DE RETENCION: AGENTE DE RETENCION RESOLUCION No 1

CORREOELECTRONICO: sincorreos@correo.com

CONTROL: 0101A0065391

OBSERVACIONES: SIN ASIGNAR CORREO

VENDEDOR: 00001 VENDEDOR 1

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2792.02

SUBTOTAL 12%	2492.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2492.88
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	299.15
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2792.02

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
 INTERNACIONAL BUITRAGO S.A.
 Dir. Matriz: Via a Tarqui Sn y Sn
 Puyo - Pastaza

RUC: 1691715783001
 Aut. SRI. N° 1130322736
FACTURA-001-024

DPS-EMISION: SERIE: 601-024 PLACA:
 RUC: 1734197823001 REGIMEN: GENERAL
 PATRON SOCIAL: MARTINEZ CARRERA JOSE PATRICIO

000000002

FECHA DE EMISION
 AÑO: 2022 MES: 09 DIA: 15

F. AUT.: 08/08/2022 - CADUCA: 08/08/2023
 del 00000001 al 00000050

Sr. (Es): Consortio Asfaltos C y C
 RUC: 1691728902001 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
23	transporte sub base proyecto mejoramiento	16,00	348,00
6	transporte sub base	65,00	390,00

Forma de pago:		SUB TOTAL 12%	
<input type="checkbox"/> Efectivo		SUB TOTAL 0%	238,00
<input type="checkbox"/> Con utilización del sistema financiero		DESCUENTO	
<input type="checkbox"/> Otras sin afiliación del sistema financiero	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB TOTAL	
RECIBI CONFORME		IVA 12%	
		VALOR TOTAL	238,00

Consigna 1304197823001 - LINO VASQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
 TEL.F. 03 2894 729 - PUYO - PASTAZA AUT. SRI. 4851
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA 1: EMISOR/ COPIA 2: ARCHIVO

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
INTERNACIONAL BUITRAGO S.A.
Dir. Hubiz: Via a Tarqui Sn y Sn
Puyo - Pastaza

RUC: 1691715783001
Aut. SRI. N° 1130322736
FACTURA-001-024

REGISTRACION DEL N° 08-024 PLACA:
RUC: 170019430001 REGIMEN: GENERAL
DATOS SOCIAL: MARTINEZ CARRERA JOSE PATRICIO

000000003

FECHA DE EMISION
AÑO: 2022 MES: 09 DIA: 19

F. AUT.: 08/08/2022 - CADUCA: 08/08/2023
del 00000001 al 00000050

Br (Es): Consorcio Asfaltos CyC

RUC: 1691728902001 Guía de Remisión:

Canf.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
25	transporte x lleno por yecto moshuarmi	40	1000,00
2	transporte piedra proyecto moshuarmi	40	80,00

Forma de pago:		SUB TOTAL 12%	
<input type="checkbox"/> Efectivo		SUB TOTAL 0%	1080,00
<input type="checkbox"/> Con utilización del sistema financiero		DESCUENTO	
<input type="checkbox"/> Otras sin utilización del sistema financiero		SUB TOTAL	
		RECEBI CONFORME IVA 12%	
		VALOR TOTAL	1080,00

1304197823001 - LINO VASQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
TELEF. 03 2894 729 - PUYO - PASTAZA AUT. SRI. 4851

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA 1: EMISOR / COPIA 2: ARCHIVO

VILEMA ALVAREZ JENNIFER ALEJANDRA

ALEJANDRA

Dirección.: Av. Ceslao Marín y Oriente

PUYO - PASTAZA

RUC. 1600631020001

FACTURA 001-001 - Nº 000000175

Cód. Aut. SRI. 1130259822

FECHA DE EMISIÓN 15/09/2022

Cliente: Consorcio Asfaltos C.y.C

Dirección: Av. Ceslao Marín y Oriente

RUC/CL: 1691728902001 Fecha de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR
57	Servicio de logística transporte sub base	16.00	912.00
44	Servicio de logística transporte de trabajo	8.00	352.00

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE		SUB-TOTAL 12%	
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 0%	1264.00
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTOS	
DIN. ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL	
TARJETA DÉBITO/C	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	1264.00
RECIBI CONFORME			

CHÁVEZ PUALACÍN HOMERO JHOFFRE Aut.13356 Imp.25/07/2022 CADUCA: 25/07/2023
RUC.1600492944001 N° 0000171 al 000220 Original: ADQUIRIENTE Copia: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1803123932001

FACTURA

No. 002-001-000000237

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1708202201180312393200120020010000002379386013511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/08/2022 15:41:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1708202201180312393200120020010000002379386013511

VILLA SAA JOSE XAVIER

VILLA SAA JOSE XAVIER ALQUILER MAQUINARIA

Dirección Matriz: PUYO / QUITO SN Y PICHINCHA

Dirección Sucursal: PUYO / QUITO SN Y PICHINCHA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Alícuota de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ASFALTOS C Y C

Identificación: 1691728902001

Fecha: 17/08/2022

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Salinas y Cotopaxi

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALOTXC		191.10	Alquiler de maquinaria excavadora en el proyecto Estabilización de la base Granular de la vía comunidad Mushu Warmi sector San Jacinto y vía Colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica.		40.00	0.00	0.00	0.00	7644.00

Información Adicional

Sucursal: CONSORCIO ASFALTOS C Y C
Dirección: Salinas y Cotopaxi
E-MAIL: consorcioasfaltoscyc2022@gmail.com
Teléfono: 098 328 6135

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8561.28

SUBTOTAL 12%	7644.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7644.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	917.28
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8561.28

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600739955001

FACTURA

No. 001-002-000002019

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1508202201160073995500120010020000020192208151610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/08/2022 16:29:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1508202201160073995500120010020000020192208151610

MARJORIE ESTEFANIA SARMIENTO SANCHEZ

FARMACIA LOS LAURELES 2

Dirección Matriz: AVENIDA ALBERTO ZAMBRANO Y MANUEL SANTOS

Dirección Sucursal: AVENIDA ALBERTO ZAMBRANO Y MANUEL SANTOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CONSORCIO ASFALTOS CYC		
Identificación	1691728902001	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	15/08/2022	Dirección:	CALLE SALINAS S/N Y COTOPAXI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0001	0001	1.00	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO		223.21	0.00	0.00	0.00	223.21

SUBTOTAL 12%									223.21
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									223.21
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									26.79
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									250.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	250.00

VILEMA VILLA MARIA PATRICIA
- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
- ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES
(LOCALES COMERCIALES) (VIVIENDA)
- OTRAS ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD
 Dirección.: Ceslao Marín / PUYO - PASTAZA

RUC. 1600317059001

FACTURA 001-001-

Cód. Aut. SRI. 1129585197

Nº 00000697

31/08/2022

FECHA DE EMISIÓN DÍA MES AÑO

Cliente: CONCRETO ASFALTOS S Y C

Dirección: Ceslao Marín

RUC/CI: 1691728902001 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	14900 pesos. CONCRETO	312,50	312,50
	PAÑOS DE DODADO		

REGIMEN GENERAL		SUB-TOTAL 12%	312,50
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 0%	
EFECTIVO		DESCUENTOS	
DIN. ELECTRÓNICO		SUBTOTAL	312,50
TARJETA DÉB/CRED		IVA 12%	37,50
OTROS		VALOR TOTAL	350,00


 RECIBI CONFORME

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
INTERNACIONAL BUITRAGO S.A.
Dir. Matriz: Vía a Tarquí 5m y 5m
Puyo - Pastaza

RUC: 1691715783001
Aut. SRI. N° 1130322736
FACTURA-001-024

REPÚBLICA DE SERIE: 001-024 PLACA:
RUC: 1691715783001 REGIMEN: GENERAL
RAZÓN SOCIAL: MARTÍNEZ CARREÑA JOSÉ PATRICIO

000000001 ✓

FECHA DE EMISIÓN
AÑO: 2022 MES: 08 DÍA: 15


F. AUT.: 08/08/2022 - CADUCA: 08/08/2023
del 00000001 al 00000050

Sr. (Es): consorcio Asfaltos C y C
RUC: 1691728902001 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
149	Transporte Sub base para el proyecto estable- cimiento de la base granada Vía comunal al muelle warmi y colonia Santa Isabel	16,00	2384,00

Forma de pago:

Efectivo	<input type="checkbox"/>
Con utilización del sistema financiero	<input type="checkbox"/>
Otros sin utilización del sistema financiero	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12%
SUB TOTAL 0% 2384,00
DESCUENTO
SUB TOTAL
IVA 12%
RECIBI CONFORME 
VALOR TOTAL 2384,00



1304197823001 - LINO VASQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
TELF. 03 2894 729 - PUYO - PASTAZA AUT. SRI. 4851

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA 1: EMISOR / COPIA 2: ARCHIVO

VILEMA ALVAREZ JENNIFER ALEJANDRA
ALEJANDRA

Dirección.: Av. Ceslao Marín y Oriente
 PUYO - PASTAZA

RUC. 1600631020001

FACTURA 001-001 - Nº 000000172

Cód. Aut. SRI. 1130259822

FECHA DE EMISIÓN 15/08/2022
 DÍA MES AÑO

Cliente: Consorcio ASFALTOS CYC.

Dirección: SHUUS Y COTOMAXI

RUC/CI: 16017209102001 Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
185	Servicio de Logística en el Proyecto Estabilización de la base granular con comunidad Mushu Waimi y Co Coma, Santa Isabel con ergonomilanos.	16,27	2960,00
Contribuyente Negocio Popular Regimen RIMPE			
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE		SUB-TOTAL 12%	2960,00
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 0%	
EFFECTIVO		DESCUENTOS	
DNI. ELECTRÓNICO		SUBTOTAL	
TARJETA DÉBITO/CRÉDITO		IVA 12%	
OTROS		VALOR TOTAL	2960,00

CHÁVEZ PUALACÍN HOMERO JHOFFRE Aut.13356 Imp.25/07/2022 CADUCA: 25/07/2023
 RUC.1600492944001 Nº 0000171 al 000220 Original: ADQUIRIENTE Copia: EMISOR

VILEMA VILLA MARIA PATRICIA ✓
 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
 - ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES
 (LOCALES COMERCIALES) (VIVIENDA)
 - OTRAS ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD
 Dirección.: Ceslao Marín / PUYO - PASTAZA

RUC. 1600317059001
FACTURA 001-001-
 Cód. Aut. SRI. 1129585197

Nº 00000696

FECHA DE EMISIÓN 15/08/2022
 DIA MES AÑO

Cliente: CONSORCIO ASFALTOS CYC

Dirección: Salinas y Cotopaxi

RUC/CI.: 1691720902001 Cota de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	UNIT.	V. TOTAL
1	HONORARIOS CONTRATO PA RES DE JULIO 2022	312,50	312,50
REGIMEN GENERAL		SUB-TOTAL 12%	312,50
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 0%	
EFFECTIVO		DESCUENTOS	
DIN. ELECTRONICO		SUBTOTAL	312,50
TARJETA DEB/CRED		IVA 12%	37,50
OTROS		VALOR TOTAL	350,00

RECIBI CONFORME

CHAVEZ PUALACIN HOMERO JHOFFRE Aut.13356 Imp. 03/03/2022 CADUCA: 03/03/2023
 RUC. 1600492944001 Nº 000651 al 000750 Original: ADQUIRIENTE Copia: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790007502001

FACTURA

No. 007-001-000173295

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1307202201179000750200120070010001732950880178215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/07/2022 17:27:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1307202201179000750200120070010001732950880178215

SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.

SEGUROS EQUINOCCIAL

Dirección DE LAS HIEDRAS N41-130 Y AV. DE LOS GRANADOS
Matriz:

Dirección RODRIGO PACHANO 1589 INTERSECCION DELICIA
Sucursal:

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ASFALTOS C Y C

Identificación 1691728902001

Fecha 13/07/2022

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: SALINAS SN COTOPAXI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
8801782		1.00	FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		581.54	0.00	0.00	0.00	581.54

Información Adicional	
primera:	556.29
sucursal:	AMBATO
vigDesde:	25/07/2022
vigHasta:	20/06/2023
nroPoliza:	53176
nroEndoso:	0
negocio:	FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
SUPER INTENDENCIA 3.50%:	19.47
SEGURO SOCIAL CAMPESINO	2.78
DERECHO DE EMISION:	3.00
mailCliente:	consorcioasfaltoscyc@gmail.com
Dispositivo de T.:	0.00

SUBTOTAL 12%	581.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	581.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	69.78
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	651.32

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	651.32

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790007502001

FACTURA

No. 007-001-000173296

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1307202201179000750200120070010001732960880178318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/07/2022 17:27:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1307202201179000750200120070010001732960880178318

SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.

SEGUROS EQUINOCCIAL

Dirección DE LAS HIEDRAS N41-130 Y AV. DE LOS GRANADOS
Matriz:

Dirección RODRIGO PACHANO 1589 INTERSECCION DELICIA
Sucursal:

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO ASFALTOS C Y C

Identificación 1691728902001

Fecha 13/07/2022

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: SALINAS SN COTOPAXI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
8801783		1.00	BUEN USO DE ANTICIPO		2110.78	0.00	0.00	0.00	2110.78

Información Adicional

prima: 2022.87
sucursal: AMBATO
vigDesde: 25/07/2022
vigHasta: 22/11/2022
nroPoliza: 43818
nroEndoso: 0
negocio: BUEN USO DE ANTICIPO
SUPER INTENDENCIA 3.50%: 70.80
SEGURO SOCIAL CAMPESINO 10.11
DERECHO DE EMISION: 7.00
mailCliente: consorcioasfaltoscyc@gmail.com
Dispositivo de T.: 0.00

SUBTOTAL 12%	2110.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2110.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	253.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2364.07

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2364.07
